

Odborné vyjádření

Název a číslo stavby: **Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4**

Věc: Vyjádření k předložené ZBV č. 5/225.3 – SO 300.42.1/4 – Úzká – Kanalizace

V předložené změně dochází ke zvýšení ceny objektu z 2 876 069,54 Kč na 3 016 970,68 Kč, tedy o + **140 901,14 Kč**.

V předložené čtvrté změně dochází k úpravě výměr položek z nabídky a vyskytuje se zde třináct nových položek:

- Pol. č. 502 – 113107172 - Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m² z betonu prostého do tl 300 mm, navrhovaná jednotková cena 256,40 Kč/m².

Jednotková cena položky byla převzata ze stavby (vážený průměr stavby). **Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky.**

- Pol. č. 503 – 997241531R - Vodorovné přemístění suti na skládku, navrhovaná jednotková cena 408,10 Kč/t.

Jednotková cena položky byla převzata ze stavby (SO 450.40.1). Vážený průměr stavby činí 367,68 Kč/t. **Konzultant navrhuje vysvětlit použití jednotkové ceny.**

- Pol. č. 504 – 997221815R - Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné), navrhovaná jednotková cena 115,20 Kč/t.

Jednotková cena položky byla převzata ze stavby (SO 450.40.1). Vážený průměr stavby činí 110,88 Kč/t. **Konzultant navrhuje vysvětlit použití jednotkové ceny.**

- Pol. č. 505 – 17110180R01 - Uložení sypaniny do násypů zhutněných z nakupovaných materiálů, navrhovaná jednotková cena 406,00 Kč/m³.

Jednotková cena položky byla převzata ze stavby (pol. č. 17180, vážený průměr stavby). **Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky.**

- Pol. č. 506 – 916261111R - Osazení silniční obruby z dlažebních kostek z kostek drobných, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15, navrhovaná jednotková cena 151,00 Kč/m.

Jednotková cena položky byla převzata ze stavby (vážený průměr stavby). **Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky.**


- Pol. č. 507 – 917862111R - Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15, navrhovaná jednotková cena 241,00 Kč/m.
Jednotková cena položky byla převzata ze stavby (vážený průměr stavby). **Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky.**
- Pol. č. 508 – 59217472R - obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá, navrhovaná jednotková cena 93,00 Kč/kus.
Položka je materiál. Jednotková cena položky byla převzata ze stavby (vážený průměr stavby). **Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky.**
- Pol. č. 509 – 592451170R - dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm, navrhovaná jednotková cena 205,00 Kč/m².
Položka je materiál. Jednotková cena položky byla převzata ze stavby (vážený průměr stavby). **Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky.**
- Pol. č. 510 – 180402111R - Založení trávníku parkového výsevem v rovině, navrhovaná jednotková cena 17,00 Kč/m².
Jednotková cena položky byla převzata ze stavby (SO 100.10.2-1). **Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky.**
- Pol. č. 511 – 181301112R - Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m², tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm, navrhovaná jednotková cena 29,00 Kč/m².
Jednotková cena položky byla převzata ze stavby (vážený průměr stavby). **Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky.**
- Pol. č. 512 – 00572410R - směs travní parková, pro mírnou zátěž, navrhovaná jednotková cena 136,00 Kč/kg.
Položka je materiál. Jednotková cena položky byla převzata ze stavby (SO 100.10.2-1). **Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky.**
- Pol. č. 513 – 10364200R - ornice pro pozemkové úpravy, navrhovaná jednotková cena 417,00 Kč/m³.
Položka je materiál. Jednotková cena položky byla převzata ze stavby (vážený průměr stavby). **Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky.**
- Pol. č. 514 – 999119 - Přechnodné dopravní značení na ul. Úzká, navrhovaná jednotková cena 24 725,00 Kč/kpl.
Položka je subdodávka. Jednotková cena položky byla stanovena z nabídkové ceny subdodavatele s dopočtem režií a zisku. **Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky.**

Závěr:

Veškeré přílohy směrnice GR č. 18/2017 verze 1.2 byly doloženy.

Konzultant doporučuje zpracovat připomínky k položkám č. 503 a 504 a opravit údaje v příloze č. 8 (není započítána třetí změna č. 5/212.1).

V Brně dne 8. 6. 2022



Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Úzká - Kanalizace

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

SO 300.42.1/4

Číslo ZBV:

5/225.3

Objednatel: Statutární město Brno
 Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
 IČ: 449 927 85

Dopravní podnik města Brna, a.s.
 Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno
 IČ: 255 088 81

Ředitelství silnic a dálnic ČR
 Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
 IČ: 659 933 90

Teplárny Brno, a.s.
 Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno
 IČ: 463 475 34

Zhotovitel: Společnost "Výstavba Tramvajové tratě Plotní"
 Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
 IČ: 253 22 257

Rekapitulace ZBV č. 5/225.3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/225.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/225.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/225.3	0,00	138 104,89	138 104,89

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/225.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/225.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/225.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/225	0,00	138 104,89	138 104,89

**Průvodní list zařazení do skupiny
pro ZBV číslo: 5/225.3**

Věcně příslušný útvar:	Statutární město Brno
Název stavby:	Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 300.42.1/4
Název SO/PS:	Úzká - Kanalizace

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijátá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	1 197 447 545,43 Kč (bez DPH);
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	2 611 501,92 Kč (bez DPH)
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:	0,00 Kč, 0,00 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	138 104,89 Kč, 5,29 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	1 200 254 118,25 Kč, 100,23 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy):

Tato ZBV řeší uvedení středního a dělicího pásu na ul. Úzká do původního stavu po realizaci kanalizačního řadu.

Vzhledem k příčině vzniku řešené změny lze říci, že Změna nevyvolá řetězení Změn a zároveň Změna nevyvolá vznik odpovědnostních závazků objednavatele, respektive vznik Smluvních kompenzačních nároků.

ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ: Z jakých důvodů Změny záporné vznikají, včetně posouzení možnosti vzniku podstatné Změny záporné, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla mít vliv na výběr dodavatele (pořadí nabídek jednotlivých uchazečů) (viz § 16 a § 17 této Směrnice):
Změny záporné nejsou vyvolány.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODS. (3) ZZVZ:
(NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍCÍ SE PODTRHNĚTE)

ANO / NE

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 – Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ): Uveďte důvody pro zařazení do této Skupiny.

Tato Změna řeší změny ve stavebním objektu SO 300.42.1.

V průběhu realizace nového kanalizačního řadu v rámci SO 300.42.1 na ul. Úzká bylo na žádost investora provedeno přechodné dopravní opatření, kdy bylo možné kanalizační řad provádět za provozu motorových vozidel v předmětném místě. Aby byl provoz motorových vozidel možný, musel být upraven střední a dělicí pás, který byl v délce 25 m upraven na přejezdový koridor z betonového povrchu. Po dokončení stavebních prací je nutné uvést střední a dělicí pás do původního stavu, což je předmětem této ZBV. Bylo provedeno odstranění betonového povrchu, dosypání tělesa SDP zeminou z nakupovaných materiálů, osazení obrub s přidlážděním z dvojřádku a úprava povrchu zatravněním. V průběhu úpravy bylo nutné zřídit přechodné dopravní značení, aby oprava mohla být provedena za plného dopravního provozu.

Změny množství položek dotčených Změnou v rozpočtu SO 300.42.1.04.4:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství rozdílu	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
33	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	100,000	2 300,00	138,31%
502	113107172	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého do tl 300 mm	m2	100,000	25 640,00	100,00%
503	997241531R	Vodorovné přemístění suti na skládku	t	62,500	25 506,25	100,00%
504	997221815R	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	62,500	7 200,00	100,00%
505	17110180R01	Uložení sypaniny do násypů zhutněných z nakupovaných materiálů	m3	25,000	10 150,00	100,00%

Příloha č. 4

506	916261111R	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek z kostek drobných, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	100,000	15 100,00	100,00%
507	917862111R	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	50,000	12 050,00	100,00%
508	59217472R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	50,500	4 696,50	100,00%
509	592451170R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	10,100	2 070,50	100,00%
510	180402111R	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	100,000	1 700,00	100,00%
511	181301112R	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	100,000	2 900,00	100,00%
512	00572410R	směs travní parková, pro mírnou zátěž	kg	3,090	420,24	100,00%
513	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy	m3	15,450	6 442,65	100,00%
514	999119	Přechodné dopravní značení na ul. Úzká	kpl	1,000	24 725,00	100,00%

ZPRACOVATEL:

Správce stavby

Jméno: [redacted]

Podpis: [redacted]

datum:

SCHVALOVATEL – ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:

Statutární město Brno

Jméno: [redacted]

Podpis: [redacted]

datum:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 300.42.1/4	Číslo ZBV: 5/225.3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Úzká - Kanalizace		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.12.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel:

Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Dopravní podnik města Brna, a.s. se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno
Teplárny Brno, a.s., se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno

Zhotovitel: Společnost "Výstavba tramvajové tratě Plotní" se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

<u>Přílohy Změnového listu:</u>	Paré č.	Příjemce
Rozpis ocenění změn položek	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4-7	Objednatelé

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Tato Změna řeší změny ve stavebním objektu SO 300.42.1.

V průběhu realizace nového kanalizačního řadu v rámci SO 300.42.1 na ul. Úzká bylo na žádost investora provedeno přechodné dopravní opatření, kdy bylo možné kanalizační řad provádět za provozu motorových vozidel v předmětném místě. Aby byl provoz motorových vozidel možný, musel být upraven střední a dělicí pás, který byl v délce 25 m upraven na přejezdový koridor z betonového povrchu. Po dokončení stavebních prací je nutné uvést střední a dělicí pás do původního stavu, což je předmětem této ZBV. Bylo provedeno odstranění betonového povrchu, dosypání tělesa SDP zeminou z nakupovaných materiálů, osazení obrub s přídlážděním z dvojřádku a úprava povrchu zatravněním. V průběhu úpravy bylo nutné zřídit přechodné dopravní značení, aby oprava mohla být provedena za plného dopravního provozu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	138 104,89	138 104,89

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Statutární město Brno (Oprávněná osoba objednatel)	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis

Číslo paré:

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro celou ZBV číslo: 5/225.3**

Název Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4	Skupina 3
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 300.42.1/4	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Úzká - Kanalizace	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
2 611 501,92

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	265 954,50	2 877 456,42	265 954,50

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	138 104,89	404 059,39	15,47%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH


	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	3 015 561,31	404 059,39	15,47%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis


Zhotovitel (stavbyvedoucí):



Projektant (autorský dozor):



Správce stavby



Statutární město Brno



Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5/225.3

Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4			ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)						
Číslo a název SO/PS: SO 300.42.1 Úzká - Kanalizace			č. SO 300.42.1/4						
Číslo a název rozpočtu: SO 300.42.1 Rekapitulace			Skupina Změn: 3						
Příloha č.	Číslo rozpočtu:	Název položky	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem dle dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Příloha č. 9.1	42.1.04.4	Napojení uličních stok	560 749,46	593 860,57	0,00	138 104,89	731 965,46	138 104,89	23,26%
Příloha č. 9.2	42.1.07.11	šachta ŠD36	697 820,59	697 820,59	0,00	0,00	697 820,59	0,00	0,00%
Příloha č. 9.3	42.1.07.12	šachta ŠD37	801 310,29	1 032 766,90	0,00	0,00	1 032 766,90	0,00	0,00%
Příloha č. 9.4	42.1.07.13	šachta ŠD38	551 621,58	551 621,58	0,00	0,00	551 621,58	0,00	0,00%
Celkem			2 611 501,92	2 876 069,64	0,00	138 104,89	3 014 174,53	138 104,89	4,80%

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5/225.3

Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4									ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)						
Číslo a název SO/PS: SO 300.42.1 Úzká - Kanalizace									č. SO 300.42.1/4						
Číslo a název rozpočtu: 42.1.04.4 Napojení uličních stok									Skupina Změn: 3						
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství dřívější ZBV	Množství dle Změny	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem dle dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5			7	8	9		10	11	12	13	14
	1	Zemní práce													
1	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	2,020	2,020	2,020	0,000	310,00	626,20	626,20	0,00	0,00	626,20	0,00	0,00%
2	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	52,950	52,950	52,950	0,000	117,00	6 195,15	6 195,15	0,00	0,00	6 195,15	0,00	0,00%
3	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	4,545	4,545	4,545	0,000	322,00	1 463,49	1 463,49	0,00	0,00	1 463,49	0,00	0,00%
4	131101203	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 5000 m3	m3	44,461	44,461	44,461	0,000	182,00	8 091,90	8 091,90	0,00	0,00	8 091,90	0,00	0,00%
5	131201203	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	88,922	88,922	88,922	0,000	186,00	16 539,49	16 539,49	0,00	0,00	16 539,49	0,00	0,00%
6	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	26,677	26,677	26,677	0,000	31,00	826,99	826,99	0,00	0,00	826,99	0,00	0,00%
7	131301203	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	14,820	14,820	14,820	0,000	260,00	3 853,20	3 853,20	0,00	0,00	3 853,20	0,00	0,00%
8	131301209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4	m3	4,446	4,446	4,446	0,000	45,00	200,07	200,07	0,00	0,00	200,07	0,00	0,00%
9	132101203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 5000 m3	m3	7,714	7,714	7,714	0,000	202,00	1 558,23	1 558,23	0,00	0,00	1 558,23	0,00	0,00%
10	132201203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	15,427	15,427	15,427	0,000	202,00	3 116,25	3 116,25	0,00	0,00	3 116,25	0,00	0,00%
11	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	4,628	4,628	4,628	0,000	41,00	189,75	189,75	0,00	0,00	189,75	0,00	0,00%
12	132301203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	2,571	2,571	2,571	0,000	279,00	717,31	717,31	0,00	0,00	717,31	0,00	0,00%
13	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	0,771	0,771	0,771	0,000	57,00	43,95	43,95	0,00	0,00	43,95	0,00	0,00%
14	151811112	Osazení a odstranění pažicího boxu těžkého hl výkopu do 4 m š do 2,5 m	m2	133,940	133,940	133,940	0,000	135,00	18 081,90	18 081,90	0,00	0,00	18 081,90	0,00	0,00%
15	151811122	Osazení a odstranění pažicího boxu těžkého hl výkopu do 6 m š do 2,5 m	m2	184,460	184,460	184,460	0,000	135,00	24 902,10	24 902,10	0,00	0,00	24 902,10	0,00	0,00%
16	151811212	Příplatek k pažicímu boxu těžkému hl výkopu do 4 m š do 2,5 m za první a ZKD den zapažení	m2	401,820	401,820	401,820	0,000	22,00	8 840,04	8 840,04	0,00	0,00	8 840,04	0,00	0,00%
17	151811222	Příplatek k pažicímu boxu těžkému hl výkopu do 6 m š do 2,5 m za první a ZKD den zapažení	m2	553,380	553,380	553,380	0,000	22,00	12 174,36	12 174,36	0,00	0,00	12 174,36	0,00	0,00%
18	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	25,438	25,438	25,438	0,000	88,00	2 238,54	2 238,54	0,00	0,00	2 238,54	0,00	0,00%
19	161101103	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m	m3	12,627	12,627	12,627	0,000	139,00	1 755,15	1 755,15	0,00	0,00	1 755,15	0,00	0,00%
20	162201102R	Vodorovné přemístění zásypů a obsypů na stavbě	m3	252,292	252,292	252,292	0,000	85,00	21 444,82	21 444,82	0,00	0,00	21 444,82	0,00	0,00%
21	162701102R	Vodorovné přemístění materiálu z provizorní vozovky na skládku nebo meziskládku	m3	52,950	52,950	52,950	0,000	80,00	4 236,00	4 236,00	0,00	0,00	4 236,00	0,00	0,00%
22	162701105R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku	m3	173,915	173,915	173,915	0,000	152,00	26 435,08	26 435,08	0,00	0,00	26 435,08	0,00	0,00%

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství dřívější ZBV	Množství dle Změny	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem dle dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5		7		8	9		10	11	12	13	14
23	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	252,292	252,292	252,292	0,000	81,00	20 435,65	20 435,65	0,00	0,00	20 435,65	0,00	0,00%
24	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	226,865	226,865	226,865	0,000	19,00	4 310,44	4 310,44	0,00	0,00	4 310,44	0,00	0,00%
25	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	278,264	278,264	278,264	0,000	110,00	30 609,04	30 609,04	0,00	0,00	30 609,04	0,00	0,00%
26	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	158,532	158,532	158,532	0,000	103,00	16 328,80	16 328,80	0,00	0,00	16 328,80	0,00	0,00%
27	583441550	štěrkodrt frakce 0-22	t	211,164	211,164	211,164	0,000	180,00	38 009,52	38 009,52	0,00	0,00	38 009,52	0,00	0,00%
28	589811080	recyklát směsný frakce 0/32	t	101,220	101,220	101,220	0,000	60,00	6 073,20	6 073,20	0,00	0,00	6 073,20	0,00	0,00%
29	589811000	recyklát směsný frakce 0/16	t	4,680	4,680	4,680	0,000	49,00	229,32	229,32	0,00	0,00	229,32	0,00	0,00%
30	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	40,810	40,810	40,810	0,000	296,00	12 079,76	12 079,76	0,00	0,00	12 079,76	0,00	0,00%
31	583313450	kamenivo těžené drobné tříděné frakce 0-4	t	29,340	29,340	29,340	0,000	208,00	6 102,72	6 102,72	0,00	0,00	6 102,72	0,00	0,00%
32	583373440	štěrkopísek frakce 0-32	t	52,280	52,280	52,280	0,000	242,00	12 651,76	12 651,76	0,00	0,00	12 651,76	0,00	0,00%
33	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	72,300	72,300	172,300	100,000	23,00	1 662,90	1 662,90	0,00	2 300,00	3 962,90	2 300,00	138,31%
1		Zemní práce							312 023,08	312 023,08	0,00	2 300,00	314 323,08	2 300,00	0,74%
2		Zakládání													
34	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	43,850	43,850	43,850	0,000	224,00	9 822,40	9 822,40	0,00	0,00	9 822,40	0,00	0,00%
2		Zakládání							9 822,40	9 822,40	0,00	0,00	9 822,40	0,00	0,00%
3		Svislé a kompletní konstrukce													
35	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	43,850	43,850	43,850	0,000	48,00	2 104,80	2 104,80	0,00	0,00	2 104,80	0,00	0,00%
3		Svislé a kompletní konstrukce							2 104,80	2 104,80	0,00	0,00	2 104,80	0,00	0,00%
4		Vodorovné konstrukce													
36	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	11,596	11,596	11,596	0,000	766,00	8 882,54	8 882,54	0,00	0,00	8 882,54	0,00	0,00%
37	452111111	Osazení betonových pražců otevřený výkop pl do 25000 mm2	kus	9,000	9,000	9,000	0,000	65,00	585,00	585,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00%
38	592237R1	podkladek betonový pod hrdlové trouby IZX 12 / 60	kus	9,000	9,000	9,000	0,000	176,00	1 584,00	1 584,00	0,00	0,00	1 584,00	0,00	0,00%
39	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	1,300	1,300	1,300	0,000	3 254,00	4 230,20	4 230,20	0,00	0,00	4 230,20	0,00	0,00%
4		Vodorovné konstrukce							15 281,74	15 281,74	0,00	0,00	15 281,74	0,00	0,00%
8		Trubní vedení													
40	831392121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 400	m	10,500	10,630	10,630	0,000	717,00	7 528,50	7 621,71	0,00	0,00	7 621,71	0,00	0,00%
41	597107060	trouba kameninová glazovaná DN400mm L2,50m spojovací systém C Třída 200	m	10,658	10,789	10,789	0,000	2 610,00	27 817,38	28 159,29	0,00	0,00	28 159,29	0,00	0,00%
42	871442111	Montáž kanalizačního potrubí z laminátových trub DN 600 se spojkami v otevřeném výkopu	m	28,050	27,760	27,760	0,000	1 037,00	29 087,85	28 787,12	0,00	0,00	28 787,12	0,00	0,00%
43	286412700	roury z odstředivě litého laminátu PN 1 SN 10000 se spojkou DN 600	m	28,050	27,760	27,760	0,000	3 239,00	90 853,95	89 914,64	0,00	0,00	89 914,64	0,00	0,00%
44	8924211R1	Zkoušky těsnosti kanalizace DN 400 nebo 500	m	11,430	11,560	11,560	0,000	509,00	5 817,87	5 884,04	0,00	0,00	5 884,04	0,00	0,00%
45	8924411R1	Zkoušky těsnosti kanalizace DN 600	m	32,420	32,130	32,130	0,000	472,00	15 302,24	15 165,36	0,00	0,00	15 165,36	0,00	0,00%
46	899623181	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 30/37 v otevřeném výkopu	m3	6,118	6,118	6,118	0,000	4 539,00	27 769,60	27 769,60	0,00	0,00	27 769,60	0,00	0,00%

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství dřívější ZBV	Množství dle Změny	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem dle dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5		7		8	9		10	11	12	13	14
47	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm	m	10,030	10,160	10,160	0,000	20,00	200,60	203,20	0,00	0,00	203,20	0,00	0,00%
48	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	26,290	26,000	26,000	0,000	34,00	893,86	884,00	0,00	0,00	884,00	0,00	0,00%
49	8999300R2	Napojení potrubí DN 400 na stávající šachtu včetně obetonování	kpl	1,000	1,000	1,000	0,000	4 616,00	4 616,00	4 616,00	0,00	0,00	4 616,00	0,00	0,00%
	8	Trubní vedení							209 887,85	209 004,96	0,00	0,00	209 004,96	0,00	0,00%
	997	Přesun sutě													
50	99722181R	Poplatek za uložení recyklátu	t	105,900	105,900	105,900	0,000	70,00	7 413,00	7 413,00	0,00	0,00	7 413,00	0,00	0,00%
	997	Přesun sutě							7 413,00	7 413,00	0,00	0,00	7 413,00	0,00	0,00%
	998	Přesun hmot													
51	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	13,386	13,386	13,386	0,000	315,00	4 216,59	4 216,59	0,00	0,00	4 216,59	0,00	0,00%
	998	Přesun hmot							4 216,59	4 216,59	0,00	0,00	4 216,59	0,00	0,00%
	VRN3	Zařízení staveniště													
52	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	1,000	1,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	VRN3	Zařízení staveniště							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	VRN7	Provozní vlivy													
53	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	1,000	1,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	VRN7	Provozní vlivy							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	999	Nové položky													
501	999114	Dodávka, montáž a demontáž mobilního oplocení	kpl	0,000	1,000	1,000	0,000	33 994,00	0,00	33 994,00	0,00	0,00	33 994,00	0,00	0,00%
502	113107172	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého do tl 300 mm	m2	0,000	0,000	100,000	100,000	256,40	0,00	0,00	0,00	25 640,00	25 640,00	25 640,00	100,00%
		<i>odstranění betonové vozovky 25 * 4 m, tl. 250 mm</i>													
503	997241531R	Vodorovné přemístění suti na skládku	t	0,000	0,000	62,500	62,500	367,68	0,00	0,00	0,00	22 980,00	22 980,00	22 980,00	100,00%
		<i>pol. 502: 0,625*100</i>													
504	997221815R	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládku (skládkovné)	t	0,000	0,000	62,500	62,500	110,88	0,00	0,00	0,00	6 930,00	6 930,00	6 930,00	100,00%
505	17110180R01	Uložení sypaniny do násypů zhutněných z nakupovaných materiálů	m3	0,000	0,000	25,000	25,000	406,00	0,00	0,00	0,00	10 150,00	10 150,00	10 150,00	100,00%
		<i>srovnání plochy a navezení zeminy do SDP: 100 m2 * 0,25</i>													
506	916261111R	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek z kostek drobných, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	0,000	0,000	100,000	100,000	151,00	0,00	0,00	0,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	100,00%
		<i>přídlažba - dvojřádek: 2*2*25 m</i>													
507	917862111R	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	0,000	0,000	50,000	50,000	241,00	0,00	0,00	0,00	12 050,00	12 050,00	12 050,00	100,00%
		<i>osazení obrub: 2*25 m</i>													
508	59217472R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	0,000	0,000	50,500	50,500	93,00	0,00	0,00	0,00	4 696,50	4 696,50	4 696,50	100,00%
		<i>50*1,01</i>													
509	592451170R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	0,000	0,000	10,100	10,100	205,00	0,00	0,00	0,00	2 070,50	2 070,50	2 070,50	100,00%

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství dřívější ZBV	Množství dle Změny	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem dle dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5		7		8	9		10	11	12	13	14
		<i>2*2*25*0,10*1,01</i>													
510	180402111R	Založení trávníku parkového výsevem v rovině <i>zatravnění SDP</i>	m2	0,000	0,000	100,000	100,000	17,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
511	181301112R	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	0,000	0,000	100,000	100,000	29,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
		<i>rozprostření ornice pro zatravnění</i>													
512	00572410R	směs travní parková, pro mírnou zátěž <i>100*0,03*1,03</i>	kg	0,000	0,000	3,090	3,090	136,00	0,00	0,00	0,00	420,24	420,24	420,24	100,00%
513	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy <i>100*0,15*1,03</i>	m3	0,000	0,000	15,450	15,450	417,00	0,00	0,00	0,00	6 442,65	6 442,65	6 442,65	100,00%
514	999119	Přechodné dopravní značení na ul. Úzká <i>Zajištění a dodání přechodného dopravního značení na ul. Úzká mezi OD Vaňkovka a OD Tesco</i>	kpl	0,000	0,000	1,000	1,000	24 725,00	0,00	0,00	0,00	24 725,00	24 725,00	24 725,00	100,00%
	999	Nové položky							0,00	33 994,00	0,00	135 804,89	169 798,89	135 804,89	399,50%
		Celkem							560 749,46	593 860,57	0,00	138 104,89	731 965,46	138 104,89	23,26%

501	999114	Dodávka, montáž a demontáž mobilního oplocení	kpl	cenová hladina:		Rozbor ceny položky 999114
502	113107172	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého do tl 300 mm	m2	cenová hladina:		pol. č. 3, SO 450.40.1
503	997241531R	Vodorovné přemístění suti na skládku	t	cenová hladina:		vážený průměr dle položek ze SOD
504	997221815R	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	cenová hladina:		vážený průměr dle položek ze SOD
505	17110180R01	Uložení sypaniny do násypů zhutněných z nakupovaných materiálů	m3	cenová hladina:		oceněno dle pol. 17180, p.č. 12 SO 100.30.1
506	916261111R	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek z kostek drobných, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	cenová hladina:		pol. č. 47, SO 100.10.2-1
507	917862111R	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	cenová hladina:		pol. č. 48, SO 100.10.2-1
508	59217472R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	cenová hladina:		pol. č. 51, SO 100.10.2-1
509	592451170R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	cenová hladina:		pol. č. 54, SO 100.10.2-1
510	180402111R	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	cenová hladina:		pol. č. 12, SO 100.10.2-1
511	181301112R	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	cenová hladina:		pol. č. 14, SO 100.10.2-1
512	00572410R	směs travní parková, pro mírnou zátěž	kg	cenová hladina:		pol. č. 15, SO 100.10.2-1
513	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy	m3	cenová hladina:		pol. č. 16, SO 100.10.2-1
514	999119	Přechodné dopravní značení na ul. Úzká	kpl	cenová hladina:		Rozbor ceny položky 999119

Za Zhotovitele:

Datum:

Za Objednatele:

Datum:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	1 197 447 545,43	6=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	-170 566,69	bez ABS
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	1 200 254 118,25	7=(61)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	-0,01%	
3=(21)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	100,23%	8=10+3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	359 234 263,63 Kč	
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	-0,28%				
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	-0,01%				
41=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b)	8,85%	ABS			

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	13,86%	ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%	ABS
11=10+5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	598 723 772,72 Kč	

12=(39/1)*100	Sledování limitu 15 %	2,58%	ABS
13=39	Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč	30 876 498,54 Kč	ABS
14=149224000-39	Zbývá do limitu	106 489 501,46	

Skupiny změn

SO	ZBV č.	Investor	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)		Změny kladné		Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)		Změny kladné		Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)		Změny kladné		Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)		Změny kladné		Změny kladné		
							22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=28+29	32	33	34=32+33	35=32+33	36	37		38=(39/1)*100	39=36+37
				- 106 012 752,04	108 819 324,86	2 806 572,82	- 4 049 588,92	655 768,61	- 3 393 820,31	- 6 686 208,48	6 576 342,70	- 109 865,78	- 83 079 118,17	82 908 551,48	-170 566,69	165 987 669,65	0,00	0,00	0,00	0,00	- 12 197 836,47	18 678 662,07	2,58%	30 876 498,54	0,00
740.24	3/81.3	SMB	Veřejné osvětlení, vnitroblok	- 1 197 139,00	0,00	- 1 197 139,00			0,00				- 1 197 139,00	0,00	- 1 197 139,00	1 197 139,00			0,00				0,00%	0,00	
740.34	3/82.3	SMB	Veřejné osvětlení, ul. Plotní	- 48 591,00	333 700,00	285 109,00			0,00				- 48 591,00	333 700,00	285 109,00	382 291,00			0,00				0,00%	0,00	
740.34	3/83.3	SMB	Veřejné osvětlení, ul. Spěšná	0,00	26 030,00	26 030,00			0,00				0,00	26 030,00	26 030,00	26 030,00			0,00				0,00%	0,00	
740.44	3/84.3	SMB	Veřejné osvětlení, ul. Dorných 2.část	0,00	372 680,00	372 680,00			0,00				0,00	372 680,00	372 680,00	372 680,00			0,00				0,00%	0,00	
140.34	3/85.3	SMB	Rekonstrukce SSZ 3.12. Dorných - Úzká	0,00	212 280,00	212 280,00			0,00				0,00	212 280,00	212 280,00	212 280,00			0,00				0,00%	0,00	
100.24	3/86.3	RSD	Křižovatka Dorných - Zvonarka, komunikace	- 78 690,28	77 384,37	- 1 305,91			0,00				- 78 690,28	77 384,37	- 1 305,91	156 074,65			0,00				0,00%	0,00	
100.34	3/87.3	RSD	Křižovatka Zvonarka - Plotní, komunikace	- 204 664,21	203 978,50	- 685,71			0,00				- 204 664,21	203 978,50	- 685,71	408 642,71			0,00				0,00%	0,00	
500.34	3/88.3	SMB	STL plynovod PE 110 - Plotní, 2.část	0,00	974 271,30	974 271,30			0,00				0,00	974 271,30	974 271,30	974 271,30			0,00				0,00%	0,00	
100.34	3/89.3	SMB	Ul. Plotní - 1. část, komunikace	0,00	1 370 904,12	1 370 904,12			0,00				0,00	1 370 904,12	1 370 904,12	1 370 904,12			0,00				0,00%	0,00	
100.34	3/90.3	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část, komunikace	0,00	796 133,93	796 133,93			0,00				0,00	796 133,93	796 133,93	796 133,93			0,00				0,00%	0,00	
100.34	3/91.3	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část, chodníky	0,00	295 831,22	295 831,22			0,00				0,00	295 831,22	295 831,22	295 831,22			0,00				0,00%	0,00	
100.34	3/92.5	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část, komunikace	0,00	2 719 545,42	2 719 545,42			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	2 719 545,42	0,23%	2 719 545,42	
100.34	3/93.5	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část, chodníky	0,00	49 926,00	49 926,00			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	49 926,00	0,00%	49 926,00	
100.34	3/94.5	SMB	Ul. Nová AGROZET, Komárovská - Plotní, chodníky	0,00	27 394,20	27 394,20			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	27 394,20	0,00%	27 394,20	
100.34	3/95.5	SMB	Ul. Plotní - 1. část, komunikace	0,00	205 695,84	205 695,84			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	205 695,84	0,02%	205 695,84	
100.24	3/96.3	SMB	Vnitroblok, komunikace	- 3 162 870,18	0,00	- 3 162 870,18			0,00				- 3 162 870,18	0,00	- 3 162 870,18	3 162 870,18			0,00				0,00%	0,00	
300.24	3/97.3	SMB	Vnitroblok - Kanalizace	- 2 457 939,75	0,00	- 2 457 939,75			0,00				- 2 457 939,75	0,00	- 2 457 939,75	2 457 939,75			0,00				0,00%	0,00	
300.24	3/98.3	SMB	Vnitroblok - Kanalizační přípojky	0,00	0,00	0,00			0,00				- 12 272,07	0,00	- 12 272,07	12 272,07			0,00				0,00%	0,00	
152.24	3/99.3	SMB	Stavební úpravy obj. Plotní č.39 k.ú. Komárov é.p.1141	- 5 874 186,00	0,00	- 5 874 186,00			0,00				- 5 874 186,00	0,00	- 5 874 186,00	5 874 186,00			0,00				0,00%	0,00	
100.34	3/100.3	SMB	Ul. Plotní - 1. část, chodníky	0,00	152 953,17	152 953,17			0,00				0,00	152 953,17	152 953,17	152 953,17			0,00				0,00%	0,00	
130.34	4/101.3	SMB	Demolice obj. Plotní č.6a.k.ú. Trnitá č.p.768/18	0,00	5 733 818,19	5 733 818,19			0,00				0,00	5 733 818,19	5 733 818,19	5 733 818,19			0,00				0,00%	0,00	
130.34	4/102.3	SMB	Demolice obj. Plotní č.33, objektu firmy Famko	- 562 255,00	0,00	- 562 255,00			0,00				- 562 255,00	0,00	- 562 255,00	562 255,00			0,00				0,00%	0,00	
152.24	4/103.3	SMB	Stavební úpravy obj. Plotní č.33 k.ú. Trnitá č.p.758/4 (průjezd)	- 3 064 481,18	0,00	- 3 064 481,18			0,00				- 3 064 481,18	0,00	- 3 064 481,18	3 064 481,18			0,00				0,00%	0,00	
203.34	4/104.5	DPMB	Informační zařízení DPMB-oblast Brno střed	0,00	550 144,00	550 144,00			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	550 144,00	0,05%	550 144,00	
400.34	4/105.5	DPMB	Tramvajová trať Plotní, tramvajový spodek	0,00	4 549 189,20	4 549 189,20			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	4 549 189,20	0,38%	4 549 189,20	
100.34	4/106.5	SMB	Ulice Plotní - 2. část, komunikace	0,00	8 429 196,56	8 429 196,56			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	8 429 196,56	0,70%	8 429 196,56	
130.34	4/107.3	SMB	Demolice obj. Dorných 60	- 22 698,00	1 426 012,73	1 403 314,73			0,00				- 22 698,00	1 426 012,73	1 403 314,73	1 448 710,73			0,00		0,00	0,00	0,00%	0,00	
300.44	4/108.3	SMB	Úzká - Kanalizace	0,00	231 456,61	231 456,61			0,00				0,00	231 456,61	231 456,61	231 456,61			0,00				0,00%	0,00	
800.24	4/109.3	TB	Parovod 2xDN100 - Plotní - J64	0,00	44 981,76	44 981,76			0,00				0,00	44 981,76	44 981,76	44 981,76			0,00				0,00%	0,00	
100.34	4/110.3	SMB	Ul. Plotní - 1. část, komunikace	0,00	2 231 303,37	2 231 303,37			0,00				0,00	2 231 303,37	2 231 303,37	2 231 303,37			0,00				0,00%	0,00	
100.34	4/111.3	SMB	Ul. Plotní - 2. část, komunikace	0,00	878 854,46	878 854,46			0,00				0,00	878 854,46	878 854,46	878 854,46			0,00				0,00%	0,00	
140.34	4/112.3	SMB	Rekonstrukce SSZ 3.12. Dorných - Úzká	0,00	1 291 544,51	1 291 544,51			0,00				0,00	1 291 544,51	1 291 544,51	1 291 544,51			0,00				0,00%	0,00	
301.14	4/113.5	SMB	Čerpání podzemní vody během realizace kanalizace - I-IV	- 8 091 884,80	0,00	- 8 091 884,80			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	- 8 091 884,80	0,00%	8 091 884,80	
201.34	5/114.3	DPMB	Kamerový systém DPMB-oblast Brno jih	- 540 052,00	0,00	- 540 052,00			0,00				- 540 052,00	0,00	- 540 052,00	540 052,00			0,00				0,00%	0,00	
201.34	5/115.3	DPMB	Kamerový systém DPMB-oblast Brno střed	- 270 026,00	0,00	- 270 026,00			0,00				- 270 026,00	0,00	- 270 026,00	270 026,00			0,00				0,00%	0,00	
430.34	5/116.1	DPMB	Tramvajová trať Plotní, kabelovod DPMB	- 2 115 617,75	0,00	- 2 115 617,75	- 2 115 617,75	0,00	- 2 115 617,75	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00%	0,00	
600.24	5/117.3	TB	Parovod 2xDN100 - Plotní - J64	- 1 047 964,68	0,00	- 1 047 964,68			0,00				- 1 047 964,68	0,00	- 1 047 964,68	1 047 964,68			0,00				0,00%	0,00	
100.10	5/118.2	RSD	Ul. Svatopetrská - Dorných 1.část, komunikace	- 1 154 400,00	1 136 850,00	- 17 550,00			0,00	- 1 154 400,00	1 136 850,00	- 17 550,00		0,00	0,00	0,00			0,00				0,00%	0,00	
800.10	5/119.1	SMB	Kabelovod Dorných - Svatopetrská	- 6 261,36	0,00	- 6 261,36	- 6 261,36	0,00	- 6 261,36	0,00			0,00												

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	1 197 447 545,43	6=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	-170 566,69	bez ABS
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	1 200 254 118,25	7=(61)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	-0,01%	
3=(21)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	100,23%	8=10,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	359 234 263,63 Kč	
4=(241)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	-0,28%				
5=(271)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	-0,01%				
41=(191)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b)	8,85%	ABS			

9=(311)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	13,86%	ABS
10=(351)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%	ABS
11=10,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	598 723 772,72 Kč	

12=(391)*100	Sledování limitu 15 %	2,58%	ABS
13=39	Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč	30 876 498,54 Kč	ABS
14=149224000-39	Zbývá do limitu	106 489 501,46	

Skupiny změn

SO	ZBV č.	Investor	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)		Změny kladné		Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)		Změny kladné		Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)		Změny kladné		Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)		Změny kladné		Smluvní kompenzační nároky		
							22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=28+29	32	33	34=32+33	35=32+33	36	37		38=(391)*100	39=36+37
				- 106 012 752,04	108 819 324,86	2 806 572,82	- 4 049 588,92	655 768,61	- 3 393 820,31	- 6 686 208,48	6 576 342,70	- 109 865,78	- 83 079 118,17	82 908 551,48	- 170 566,69	165 987 669,65	0,00	0,00	0,00	0,00	- 12 197 836,47	18 678 662,07	2,58%	30 876 498,54	0,00
130.34	5/161.3	SMB	Prothluková stěna, clona Dornych	- 27 929,00	0,00	- 27 929,00			0,00				- 27 929,00	0,00	- 27 929,00	27 929,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
152.24	5/162.3	SMB	Doplnění rozvaděče	- 13 975,00	0,00	- 13 975,00			0,00				- 13 975,00	0,00	- 13 975,00	13 975,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.16	5/163.3	RSD	STL plynovod PE 225 - Dornych, 1. část	- 10 445,70	0,00	- 10 445,70			0,00				- 10 445,70	0,00	- 10 445,70	10 445,70			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.26	5/164.3	RSD	STL plynovod PE 225 - Dornych, 2. část	- 36 924,60	0,00	- 36 924,60			0,00				- 36 924,60	0,00	- 36 924,60	36 924,60			0,00	0,00			0,00%	0,00	
200.16	5/165.3	SMB	Vodovodní řady - ulice: Kovářská	- 16 207,65	0,00	- 16 207,65			0,00				- 16 207,65	0,00	- 16 207,65	16 207,65			0,00	0,00			0,00%	0,00	
200.26	5/166.1	RSD	Vodovodní řady - ulice: Dornych, Spěšná	0,00	4 757,07	4 757,07	0,00	4 757,07	4 757,07	0,00	0,00	0,00	0,00	44 716,16	44 716,16	44 716,16			0,00	0,00			0,00%	0,00	
200.2	5/167.3	SMB	Vodovodní přípojky - ulice: Dornych	0,00	44 716,16	44 716,16	0,00	44 716,16	44 716,16	0,00	0,00	0,00	0,00	44 716,16	44 716,16	44 716,16			0,00	0,00			0,00%	0,00	
200.34	5/168.1	SMB	Vodovodní řady - ulice: Svatopetrská	- 199 605,95	0,00	- 199 605,95	- 199 605,95	0,00	- 199 605,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
200.34	5/169.1	SMB	Vodovodní řady - ulice: Plotní, Kovářská	- 124 801,61	7 883,57	- 116 918,04	- 124 801,61	7 883,57	- 116 918,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
200.34	5/170.1	SMB	Vodovodní řady - ulice: Plotní, Železniční	- 16 327,79	0,00	- 16 327,79	- 16 327,79	0,00	- 16 327,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
200.34	5/171.1	RSD	Vodovodní řady - ulice: Zvonarka	0,00	318,77	318,77	0,00	318,77	318,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
200.34	5/172.1	RSD	Vodovodní řady - ulice: Dornych, Přizova	- 8 652,69	8 292,24	- 360,45	- 8 652,69	8 292,24	- 360,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
200.34	5/173.1	SMB	Vodovodní řady - ulice: Komárovská, Nová Agrozet, Plotní	- 4 164,62	29 929,12	25 764,50	- 4 164,62	29 929,12	25 764,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
200.34	5/174.3	SMB	Vodovodní přípojky - ulice: Plotní, Zvonarka	- 311 416,98	0,00	- 311 416,98	- 311 416,98	0,00	- 311 416,98	0,00	0,00	0,00	- 311 416,98	0,00	- 311 416,98	311 416,98			0,00	0,00			0,00%	0,00	
200.34	5/175.3	SMB	Vodovodní přípojky - ulice: Svatopetrská, Plotní, Dornych	- 148 827,85	28 699,11	- 120 128,74	- 148 827,85	28 699,11	- 120 128,74	0,00	0,00	0,00	- 148 827,85	28 699,11	- 120 128,74	177 526,96			0,00	0,00			0,00%	0,00	
200.44	5/176.1	RSD	Vodovodní řady - ulice: Zvonarka	0,00	5 983,46	5 983,46	0,00	5 983,46	5 983,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
200.44	5/177.3	SMB	Vodovodní přípojky - ulice: Dornych, Zvonarka	- 62 436,59	611,12	- 61 825,47	- 62 436,59	611,12	- 61 825,47	0,00	0,00	0,00	- 62 436,59	611,12	- 61 825,47	63 047,71			0,00	0,00			0,00%	0,00	
130.34	5/178.3	SMB	Demolice obj. Dornych 60	- 1 153 505,73	0,00	- 1 153 505,73	- 1 153 505,73	0,00	- 1 153 505,73	0,00	0,00	0,00	- 1 153 505,73	0,00	- 1 153 505,73	1 153 505,73			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.11	5/179.1	SMB	STL plynovod PE 63 - Kovářská	- 2 692,20	0,00	- 2 692,20	- 2 692,20	0,00	- 2 692,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.11	5/180.3	SMB	STL přípojky Kovářská	- 10 437,55	31 680,51	21 242,96	- 10 437,55	31 680,51	21 242,96	0,00	0,00	0,00	- 10 437,55	31 680,51	21 242,96	42 118,06			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.26	5/181.1	SMB	STL přípojky sleváren LUXA	- 4 465,98	0,00	- 4 465,98	- 4 465,98	0,00	- 4 465,98	0,00	0,00	0,00	- 4 465,98	0,00	- 4 465,98	4 465,98			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.26	5/182.1	SMB	STL přípojky obchodu LIDL	- 3 582,00	1 402,38	- 2 179,62	- 3 582,00	1 402,38	- 2 179,62	0,00	0,00	0,00	- 3 582,00	1 402,38	- 2 179,62	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.26	5/183.1	SMB	Dopojení domovních instalací Dornych, 2. a 3. část	- 3 600,00	0,00	- 3 600,00	- 3 600,00	0,00	- 3 600,00	0,00	0,00	0,00	- 3 600,00	0,00	- 3 600,00	3 600,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.26	5/184.3	SMB	STL plynovod PE 160 - Zvonarka	- 106 442,10	0,00	- 106 442,10	- 106 442,10	0,00	- 106 442,10	0,00	0,00	0,00	- 106 442,10	0,00	- 106 442,10	106 442,10			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.26	5/185.1	SMB	STL přípojky Zvonarka	- 3 007,90	0,00	- 3 007,90	- 3 007,90	0,00	- 3 007,90	0,00	0,00	0,00	- 3 007,90	0,00	- 3 007,90	3 007,90			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.33	5/186.3	SMB	STL přípojky Široká	- 38 332,80	0,00	- 38 332,80	- 38 332,80	0,00	- 38 332,80	0,00	0,00	0,00	- 38 332,80	0,00	- 38 332,80	38 332,80			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.33	5/187.3	SMB	Dopojení domovních instalací Široká	- 43 891,75	0,00	- 43 891,75	- 43 891,75	0,00	- 43 891,75	0,00	0,00	0,00	- 43 891,75	0,00	- 43 891,75	43 891,75			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.33	5/188.1	SMB	STL plynovod PE 63 - Svatopetrská	- 32 826,00	4 049,73	- 28 776,27	- 32 826,00	4 049,73	- 28 776,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.33	5/189.1	SMB	STL přípojky Svatopetrská	- 4 726,86	602,36	- 4 124,50	- 4 726,86	602,36	- 4 124,50	0,00	0,00	0,00	- 4 726,86	602,36	- 4 124,50	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.33	5/190.1	SMB	Dopojení domovních instalací Svatopetrská	- 900,00	0,00	- 900,00	- 900,00	0,00	- 900,00	0,00	0,00	0,00	- 900,00	0,00	- 900,00	900,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.34	5/191.3	SMB	STL plynovod PE 160 - Plotní, 1. část	- 74 838,96	26 274,40	- 48 564,56	- 74 838,96	26 274,40	- 48 564,56	0,00	0,00	0,00	- 74 838,96	26 274,40	- 48 564,56	101 113,36			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.34	5/192.1	SMB	STL přípojky Plotní, 1. část	- 23 939,15	5 771,00	- 18 168,15	- 23 939,15	5 771,00	- 18 168,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.34	5/193.1	SMB	Dopojení domovních instalací Plotní, 1. část	- 5 040,00	0,00	- 5 040,00	- 5 040,00	0,00	- 5 040,00	0,00	0,00	0,00	- 5 040,00	0,00	- 5 040,00	5 040,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.34	5/194.1	SMB	STL přípojky Plotní, 2. část	- 15 437,94	0,00	- 15 437,94	- 15 437,94	0,00	- 15 437,94	0,00	0,00	0,00	- 15 437,94	0,00	- 15 437,94	15 437,94			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.34	5/195.1	SMB	Dopojení domovních instalací Plotní, 2. část	- 1 440,00	0,00	- 1 440,00	- 1 440,00	0,00	- 1 440,00	0,00	0,00	0,00	- 1 440,00	0,00	- 1 440,00	1 440,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.35	5/196.1	SMB	STL přípojky Železniční	- 11 476,48	5 176,59	- 6 299,89	- 11 476,48																		

IMOS Brno, a.s. Rozbor ceny položky 999119


Název :	Přechodné dopravní značení na ul. Úzká	MJ	kpl
----------------	---	-----------	------------

1	Materiál	0,00 Kč	0,00% z celkové JC
2	Mzdy	0,00 Kč	0,00% z celkové JC
3	Odvody 34,00 % z mezd	0,00 Kč	0,00% z celkové JC
4	Stroje	0,00 Kč	0,00% z celkové JC
5	Ostatní přímé náklady	21 500,00 Kč	86,96% z celkové JC
6	Přímé náklady [1] až [5]	21 500,00 Kč	
7	Režie výrobní 5,00 % z [6]	1 075,00 Kč	4,35% z celkové JC
8	Režie správní 5,00 % z [6]	1 075,00 Kč	4,35% z celkové JC
9	Zisk 5,00 % z [6]	1 075,00 Kč	4,35% z celkové JC
10	Ostatní a nekalkulované náklady	0,00 Kč	0,00%
Celkem [6] až [10]		24 725,00 Kč	

T	Kód položky	Název položky	MJ	Množství spotřeba	Jednotková cena	Celkem
M						0,00 Kč
M						0,00 Kč
M						0,00 Kč
M						0,00 Kč
Materiály						0,00 Kč
P			Nh			0,00 Kč
P			Nh			0,00 Kč
P			Nh			0,00 Kč
P						0,00 Kč
Mzdy						0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
Stroje						0,00 Kč
O		Dle CN podzhotovitele na dodávku DZ	Kč	1,00000	21 500,00	21 500,00 Kč
O						0,00 Kč
Ostatní přímé náklady						21 500,00 Kč

Poznámka :

Tato položka se nevyskytuje v soupisech prací dle SOD ani v cenících OTSKP-SKP a RTS, proto předpokládáme vyčíslení přímých nákladů.

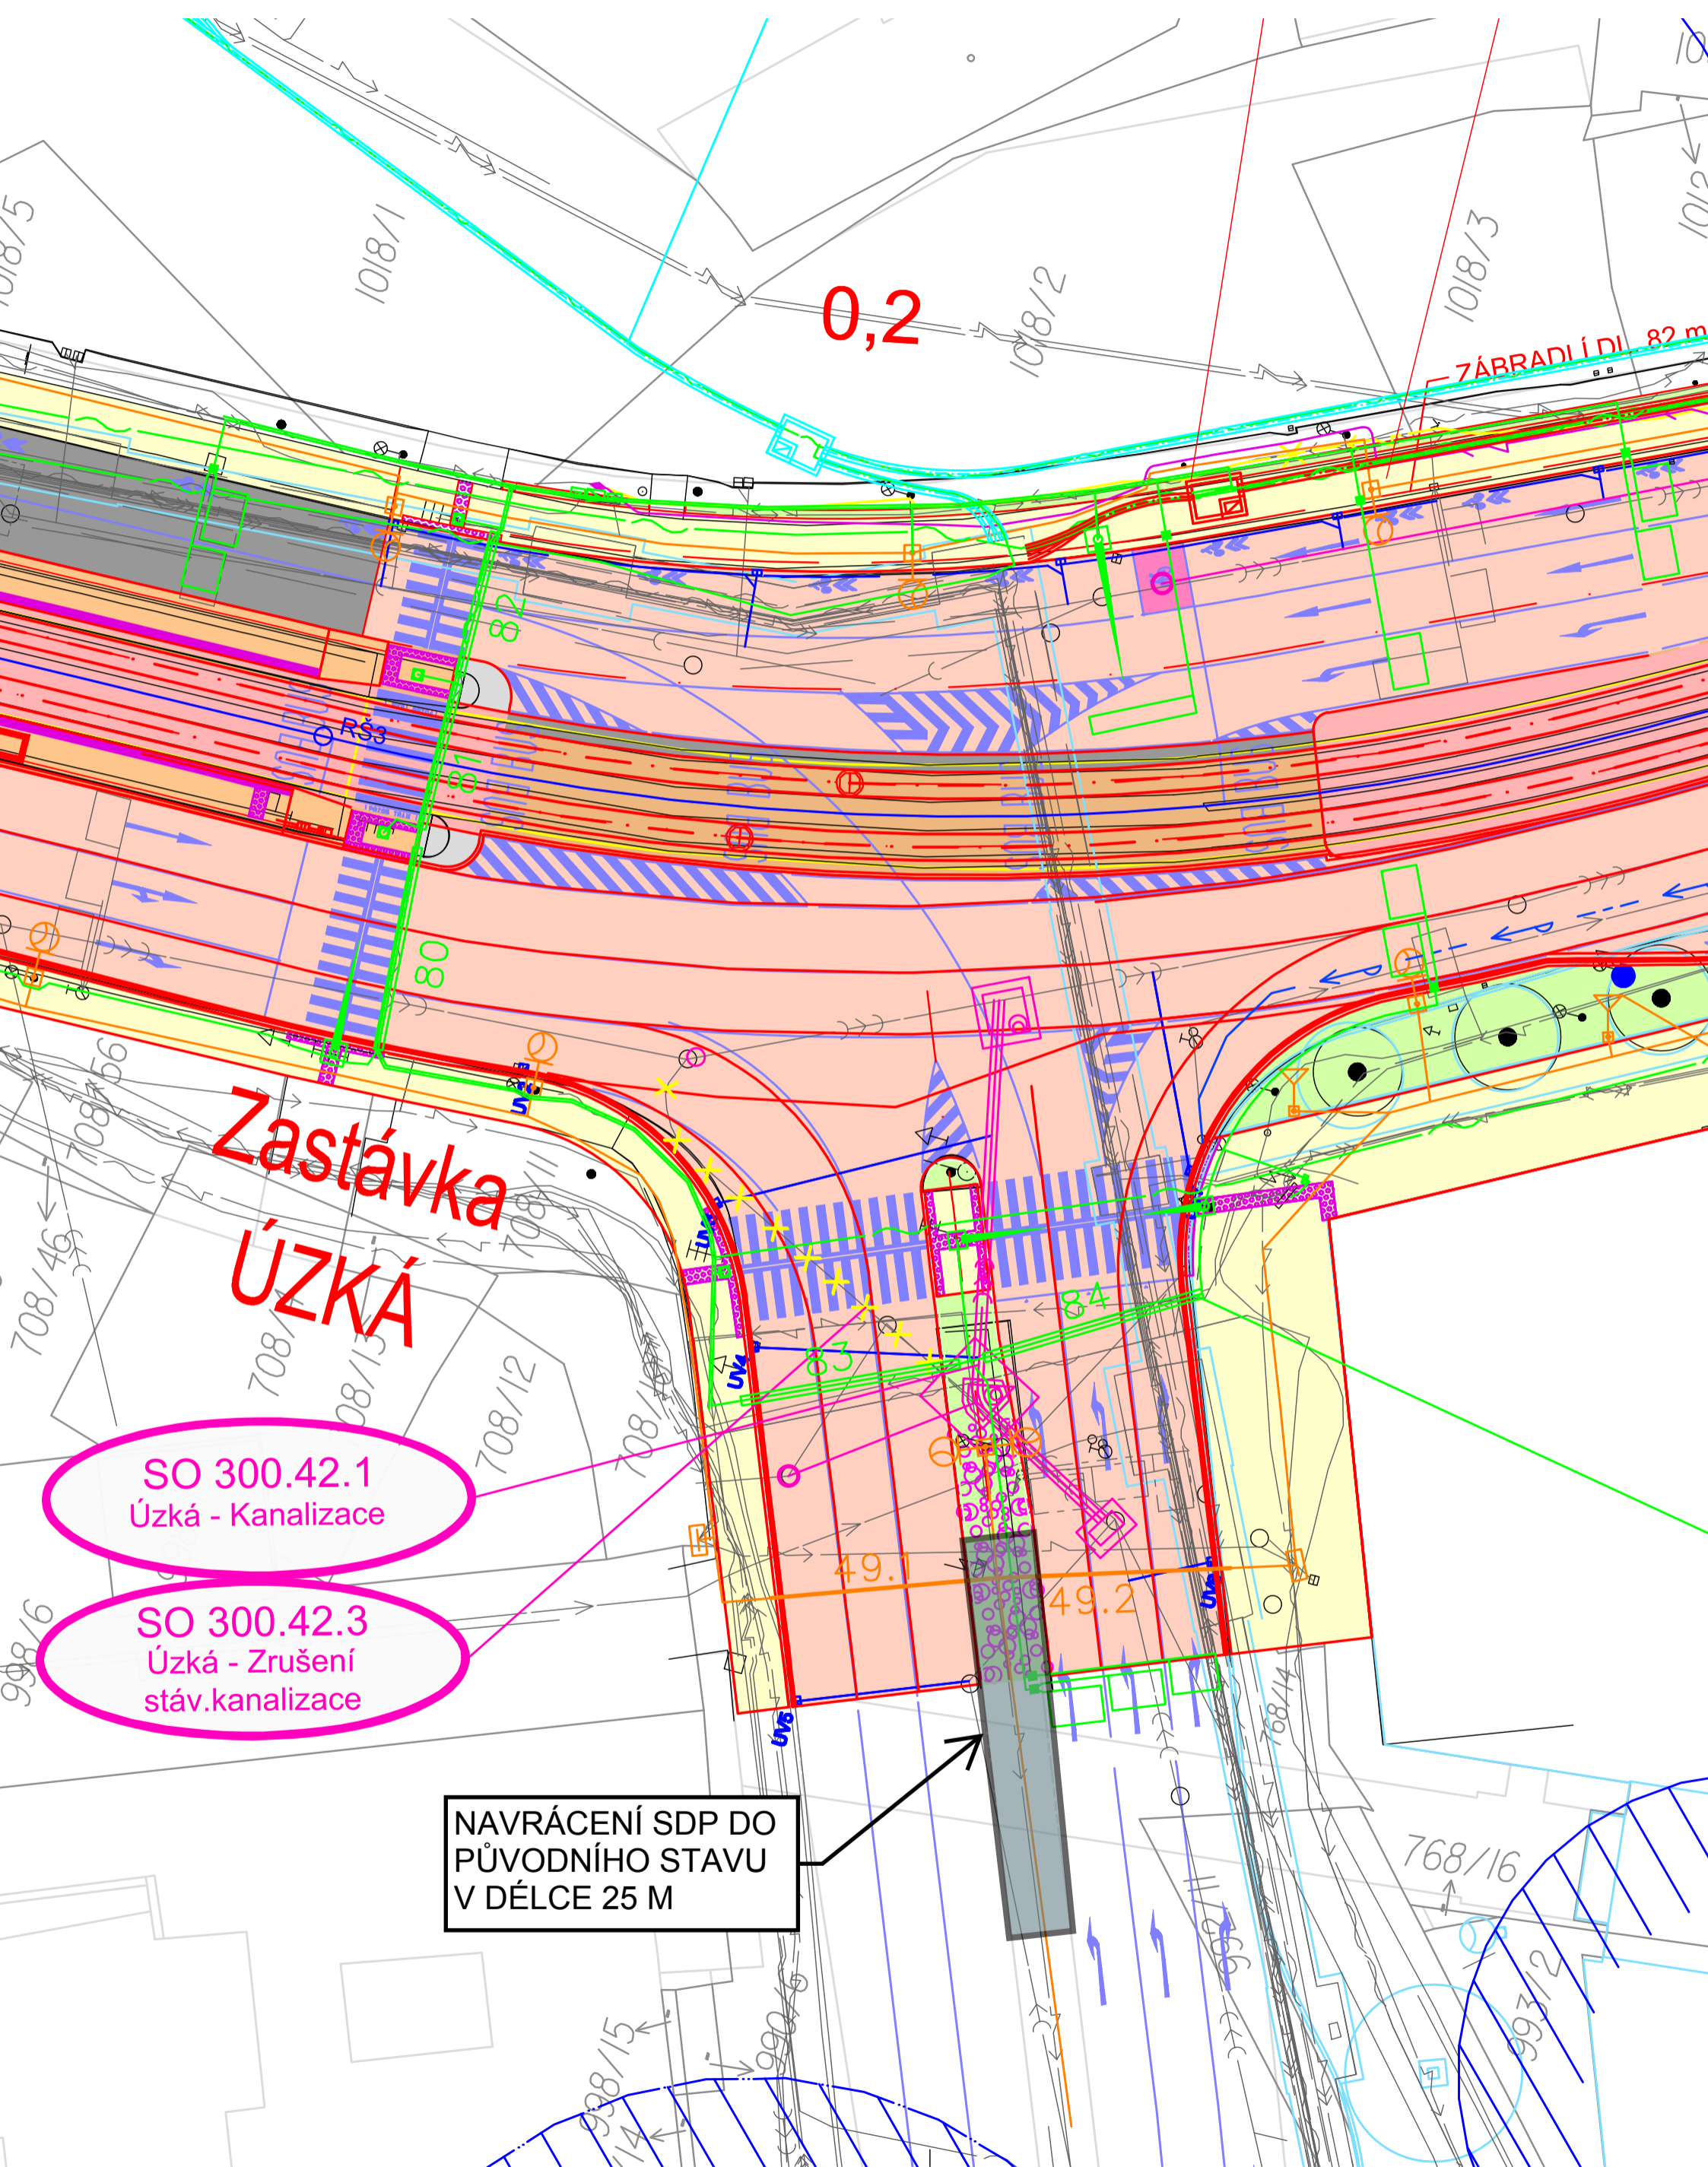

0,2

ZÁBRADÍ DÍL 82 m

Zastávka
ÚZKÁ

SO 300.42.1
Úzká - Kanalizace

SO 300.42.3
Úzká - Zrušení
stáv. kanalizace

NAVRÁCENÍ SDP DO
PŮVODNÍHO STAVU
V DÉLCE 25 M



SPOLEČNOST JE DRŽITELEM CERTIFIKÁTŮ ISO 9001, 14001 A 45001
 ZNAKOM s.r.o. ZENGROVA 4, 615 00 BRNO
 IČO: 26264641 DIČ: CZ26264641
 SPOLEČNOST JE ZAPISANA V OR. V K S V BRNE (000111 VLOŽKA 40924)



KOMPLETNÍ SLUŽBY V OBLASTI DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
NON STOP 602 718 310
 E MAIL: ZNAKOM@ZNAKOM.CZ WWW.ZNAKOM.CZ TEL./FAX: 548 226 375

Příjemce:

IMOS Brno, a.s.

CENOVÁ KALKULACE

STAVBA: Tramvaj Plotní – Zajištění DIO


Přechodné dopravní značení, umístěné na ul. Úzká mezi OD Vaňkovka a OD Tesco

NÁZEV	měrná jednotka	počet kusů	cena za kus	cena celkem
POMOCNÉ PRÁCE PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ DOPRAVNÍHO A INŽENÝRSKÉHO OPATŘENÍ	KPL	1	21 500	21 500
- zajištění projektové dokumentace k DIO - předprojednání DIO a zpracování připomínek kompetentních orgánů před realizací z důvodu koordinace s jinými stavbami. - inženýring do vydání Stanovení a Rozhodnutí (souhlasy dotčených orgánů, jednání uzavírkové komise a jednání s dalšími účastníky řízení a dotčenými orgány). - přechodná úprava dopravního značení a objízdných tras. Kompletní dopravně inženýrská opatření po dobu realizace stavby dle projektové dokumentace				

CENA CELKEM ZA PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	21 500
--	---------------

CENY JSOU UVEDENY BEZ DPH

Za Znakom s.r.o.



Termín realizace ZBV 5/225.3:

- zahájení prací 1. 10. 2022
- ukončení prací: 31. 12. 2022

Podmínkou realizace prací v uvedených termínech je uzavření dodatku ke smlouvě o dílo a potřebná součinnost objednatele.
