
Odborné vyjádření

Název a číslo stavby: **Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4**

Věc: Vyjádření k předložené ZBV č. 5/160.3 – SO 300.42.1/2 – Úzká – Kanalizace

V předložené změně dochází ke zvýšení ceny objektu ze 2 842 958,43 Kč na 2 876 952,43 Kč, tedy o + **33 994,00 Kč**.

Předložená druhá změna se týká podobjektu č. 42.1.04.4 Napojení uličních stok. Vyskytuje se zde jedna nová položka:

• Pol. č. 501 – 999114 – Dodávka, montáž a demontáž mobilního oplocení, navrhovaná jednotková cena 33 994,00 Kč/kpl.

Položka je subdodávka. Jednotková cena položky byla doložena nabídkou subdodavatele s dopočtem sazby režii a zisku. **Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky.**

Závěr:

Veškeré přílohy směrnice GR č. 18/2017 verze 1.2 byly doloženy.

Konzultant nemá z hlediska cenové kontroly připomínky.

V Brně dne 11. 1. 2022



Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Úzká - Kanalizace

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

SO 300.42.1/2

Číslo ZBV:

5/160.3

Objednatel: Statutární město Brno
 Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
 IČ: 449 927 85

Dopravní podnik města Brna, a.s.
 Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno
 IČ: 255 088 81

Ředitelství silnic a dálnic ČR
 Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
 IČ: 659 933 90

Teplárny Brno, a.s.
 Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno
 IČ: 463 475 34

Zhotovitel: Společnost "Výstavba Tramvajové tratě Plotní"
 Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
 IČ: 253 22 257

Rekapitulace ZBV č. 5/160.3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/160.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/160.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/160.3	0,00	33 994,00	33 994,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/160.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/160.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/160.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/160	0,00	33 994,00	33 994,00

**Průvodní list zařazení do skupiny
pro ZBV číslo: 5/160.3**

Věcně příslušný útvar:	Statutární město Brno
Název stavby:	Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 300.42.1/2
Název SO/PS:	Úzká - Kanalizace

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijátá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	1 197 447 545,43 Kč (bez DPH);
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	2 611 501,92 Kč (bez DPH)
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:	0,00 Kč, 0,00 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	33 994,00 Kč, 1,30 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	1 203 701 716,89 Kč, 100,52 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy):

V rámci provádění výstavby nového kanalizačního řádu na ul. Úzká byl uzavřen frekventovaný přechod pro chodce mezi budovami OC Vaňkovka a OD Tesco (příloha: Úzká – DIO). Místo pracoviště bylo vymezeno jak dopravním značením, tak univerzálním vysokým mobilním oplocením.

Vzhledem k příčině vzniku řešené změny lze říci, že Změna nevyvolá řetězení Změn a zároveň Změna nevyvolá vznik odpovědnostních závazků objednavatele, respektive vznik Smluvních kompenzačních nároků.

ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ: Z jakých důvodů Změny záporné vznikají, včetně posouzení možnosti vzniku podstatné Změny záporné, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla mít vliv na výběr dodavatele (pořadí nabídek jednotlivých uchazečů) (viz § 16 a § 17 této Směrnice):
Změny záporné nejsou vyvolány.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODS. (3) ZZVZ:
(NEHODÍCI SE ŠKRTNĚTE A HODÍCI SE PODTRHNĚTE)

ANO / NE

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 – Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ): Uveďte důvody pro zařazení do této Skupiny:

Tato ZBV řeší změny ve stavebním objektu SO 300.42.1.

V rámci provádění výstavby nového kanalizačního řádu na ul. Úzká byl uzavřen frekventovaný přechod pro chodce mezi budovami OC Vaňkovka a OD Tesco (příloha: Úzká – DIO). Místo pracoviště bylo vymezeno jak dopravním značením, tak univerzálním vysokým mobilním oplocením. Vyznačené a zabezpečené místo pracoviště však nebylo veřejností respektováno a ze strany pěších docházelo k nebezpečným situacím, kdy pěší přecházeli čtyřproudou silnici mimo stanovený náhradní přechod pro chodce, tj. Vstupovali přímo mezi projíždějící vozidla. Na popud koordinátora stavby (příloha 230. a 233 zápis BOZP), místním zhodnocení situace ze strany zástupců investora a následně dle pokynu správce stavby (příloha KD 59 bod 59.5) zhotovitel dodal a osadil nízké mobilní oplocení zamezující vstup do vozovky ul. Úzká a to, jak ze směru od OD Tesco, tak ze směru OC Vaňkovka.

Toto zabezpečení bylo osazeno dne 3.8.2020 a demontováno dne 11.12.2020.

Dále je plánováno osazení tohoto oplocení v následujícím roce pro dobudování kanalizace a vozovky na ul. Úzká, konkrétně severní část ul. Úzká a to v období od 1.2.2021 do 30.4.2021.

Změny množství položek dotčených Změnou v rozpočtu SO 300.42.1:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství rozdílu	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
501	999114	Dodávka, montáž a demontáž mobilního oplocení	kpl	1,000	33 994,00	100,00%

ZPRACOVATEL:

Správce stavby

Jméno: [REDACTED]

Podpis: [REDACTED]

24. 01. 2022

datum: [REDACTED]

SCHVALOVATEL – ŘEDITEL VĚCNÉ PRÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:

Statutární město Brno

Jméno: [REDACTED]

Podpis: [REDACTED]

datum: 20. 04. 2022

Evidenční list vyhrazené změny

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Úzká - Kanalizace	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 300.42.1/2	Číslo ZBV: 5/160.3
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.12.2017 (dále jen Smlouva): Objednatel: Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Dopravní podnik města Brna, a.s. se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno Teplárny Brno, a.s., se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno Zhotovitel: Společnost "Výstavba tramvajové tratě Plotní" se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno		
<u>Přílohy Změnového listu:</u> Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4-7	Objednatel
Iniciátor změny: Zhotovitel Popis Změny: Tato Změna řeší změny ve stavebním objektu SO 300.42.1. V rámci provádění výstavby nového kanalizačního řádu na ul. Úzká byl uzavřen frekventovaný přechod pro chodce mezi budovami OC Vaňkovka a OD Tesco (příloha: Úzká – DIO). Místo pracoviště bylo vymezeno jak dopravním značením, tak univerzálním vysokým mobilním oplocením. Vyznačené a zabezpečené místo pracoviště však nebylo veřejností respektováno a ze strany pěších docházelo k nebezpečným situacím, kdy pěší přecházeli čtyřproudou silnicí mimo stanovený náhradní přechod pro chodce, tzn. vstupovali přímo mezi projíždějící vozidla. Na popud koordinátora stavby (příloha 230. a 233 zápis BOZP), místním zhodnocení situace ze strany zástupců investora a následně dle pokynu správce stavby (příloha KD 59 bod 59.5) zhotovitel dodal a osadil nízké mobilní oplocení zamezující vstup do vozovky ul. Úzká a to, jak ze směru od OD Tesco, tak ze směru OC Vaňkovka. Toto zabezpečení bylo osazeno dne 3.8.2020 a demontováno dne 11.12.2020. Dále je plánováno osazení tohoto oplocení v následujícím roce pro dobudování kanalizace a vozovky na ul. Úzká, konkrétně severní část ul. Úzká a to v období od 1.2.2021 do 30.4.2021.		
Údaje v Kč bez DPH:		
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	33 994,00	33 994,00
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:		
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 4.2.2022 podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	datum podpis
Supervize	jméno	datum 24.01.2022 podpis
Správce stavby	jméno	datum podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.		
Statutární město Brno (Oprávněná osoba objednatel)	jméno	datum 20.04.2022 podpis
Zhotovitel	jméno	datum 20.01.2022 podpis
		Číslo paré: 1

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro celou ZBV číslo: 5/160.3

Název Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4	Skupina 3
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 300.42.1/2	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Úzká - Kanalizace	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
2 611 501,92

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	231 456,61	2 842 958,53	231 456,61

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	33 994,00	265 450,61	10,16%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	2 876 952,53	265 450,61	10,16%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

20. 01. 2022

SOUHLASÍM

Projektant (autorský dozor):

4. 2. 2022

SOUHLASÍM

Statutární město Brno

Správce stavby

24. 01. 2022

SOUHLASÍM

Souhlasím

20. 04. 2022

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5/160.3

Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Číslo a název SO/PS: SO 300.42.1 Úzká - Kanalizace

Číslo a název rozpočtu: SO 300.42.1 Rekapitulace

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. SO 300.42.1/2

Skupina Změn: 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Příloha č.	Číslo rozpočtu:	Název položky	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem dle dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
Příloha č. 9.1	42.1.04.4	Napojení uličních stok	560 749,46	560 749,46	0,00	33 994,00	594 743,46	33 994,00	6,06%
Příloha č. 9.2	42.1.07.11	šachta ŠD36	697 820,59	697 820,59	0,00	0,00	697 820,59	0,00	0,00%
Příloha č. 9.3	42.1.07.12	šachta ŠD37	801 310,29	1 032 766,90	0,00	0,00	1 032 766,90	0,00	0,00%
Příloha č. 9.4	42.1.07.13	šachta ŠD38	551 621,58	551 621,58	0,00	0,00	551 621,58	0,00	0,00%
		Celkem	2 611 501,92	2 842 958,53	0,00	33 994,00	2 876 952,53	33 994,00	1,20%

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5/160.3

ZMĚNA SOUPLISU PRACÍ (SO/PS)
č. SO 300.42.1/2

Skupina Změn: 3

Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Číslo a název SO/PS: SO 300.42.1 Úzká - Kanalizace

Číslo a název rozpočtu: 42.1.07.12 Napojení uličních stok

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	119001401	Zemní práce Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	2,020	2,020	0,000	310,00	626,20	0,00	0,00	626,20	0,00	0,00%
2	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	52,950	52,950	0,000	117,00	6 195,15	0,00	0,00	6 195,15	0,00	0,00%
3	130001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	4,545	4,545	0,000	322,00	1 463,49	0,00	0,00	1 463,49	0,00	0,00%
4	131101203	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 5000 m3	m3	44,461	44,461	0,000	182,00	8 091,90	0,00	0,00	8 091,90	0,00	0,00%
5	131201203	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	88,922	88,922	0,000	186,00	16 539,49	0,00	0,00	16 539,49	0,00	0,00%
6	131201209	Příplatek za lepvost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	26,677	26,677	0,000	31,00	826,99	0,00	0,00	826,99	0,00	0,00%
7	131301203	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	14,820	14,820	0,000	260,00	3 853,20	0,00	0,00	3 853,20	0,00	0,00%
8	131301209	Příplatek za lepvost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4	m3	4,446	4,446	0,000	45,00	200,07	0,00	0,00	200,07	0,00	0,00%
9	132101203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 5000 m3	m3	7,714	7,714	0,000	202,00	1 558,23	0,00	0,00	1 558,23	0,00	0,00%
10	132201203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	15,427	15,427	0,000	202,00	3 116,25	0,00	0,00	3 116,25	0,00	0,00%
11	132201209	Příplatek za lepvost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	4,628	4,628	0,000	41,00	189,75	0,00	0,00	189,75	0,00	0,00%
12	132301203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	2,571	2,571	0,000	279,00	717,31	0,00	0,00	717,31	0,00	0,00%
13	132301209	Příplatek za lepvost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	0,771	0,771	0,000	57,00	43,95	0,00	0,00	43,95	0,00	0,00%
14	151811112	Osazení a odstranění pažičího boxu těžkého hl výkopu do 4 m š do 2,5 m	m2	133,940	133,940	0,000	135,00	18 081,90	0,00	0,00	18 081,90	0,00	0,00%
15	151811122	Osazení a odstranění pažičího boxu těžkého hl výkopu do 6 m š do 2,5 m	m2	184,460	184,460	0,000	135,00	24 902,10	0,00	0,00	24 902,10	0,00	0,00%
16	151811212	Příplatek k pažičím boxu těžkému hl výkopu do 4 m š do 2,5 m za první a ZKD den zapažení	m2	401,820	401,820	0,000	22,00	8 840,04	0,00	0,00	8 840,04	0,00	0,00%
17	151811222	Příplatek k pažičím boxu těžkému hl výkopu do 6 m š do 2,5 m za první a ZKD den zapažení	m2	553,380	553,380	0,000	22,00	12 174,36	0,00	0,00	12 174,36	0,00	0,00%
18	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	25,438	25,438	0,000	88,00	2 238,54	0,00	0,00	2 238,54	0,00	0,00%
19	161101103	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m	m3	12,627	12,627	0,000	139,00	1 755,15	0,00	0,00	1 755,15	0,00	0,00%
20	162201102R	Vodorovné přemístění zásepů a obsypů na stavbě	m3	252,292	252,292	0,000	85,00	21 444,82	0,00	0,00	21 444,82	0,00	0,00%

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství ve rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	162701102R	Vodorovné přemístění materiálu z provizorní vozovky na skládku nebo meziskládku	m3	52,950	52,950	0,000	80,00	4 236,00	0,00	0,00	4 236,00	0,00	0,00%
22	162701105R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku	m3	173,915	173,915	0,000	152,00	26 435,08	0,00	0,00	26 435,08	0,00	0,00%
23	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	252,292	252,292	0,000	81,00	20 435,65	0,00	0,00	20 435,65	0,00	0,00%
24	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	226,865	226,865	0,000	19,00	4 310,44	0,00	0,00	4 310,44	0,00	0,00%
25	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	278,264	278,264	0,000	110,00	30 609,04	0,00	0,00	30 609,04	0,00	0,00%
26	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	158,532	158,532	0,000	103,00	16 328,80	0,00	0,00	16 328,80	0,00	0,00%
27	583441550	Štěrkodř frakce 0-22	t	211,164	211,164	0,000	180,00	38 009,52	0,00	0,00	38 009,52	0,00	0,00%
28	589811080	recyklat směsný frakce 0/32	t	101,220	101,220	0,000	60,00	6 073,20	0,00	0,00	6 073,20	0,00	0,00%
29	589811000	recyklat směsný frakce 0/16	t	4,680	4,680	0,000	49,00	229,32	0,00	0,00	229,32	0,00	0,00%
30	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	40,810	40,810	0,000	296,00	12 079,76	0,00	0,00	12 079,76	0,00	0,00%
31	583313450	kamenivo těžené drobné tříděné frakce 0-4	t	29,340	29,340	0,000	208,00	6 102,72	0,00	0,00	6 102,72	0,00	0,00%
32	583373440	Štěrkopísk frakce 0-32	t	52,280	52,280	0,000	242,00	12 651,76	0,00	0,00	12 651,76	0,00	0,00%
33	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	72,300	72,300	0,000	23,00	1 662,90	0,00	0,00	1 662,90	0,00	0,00%
1		Zemní práce						312 023,08	0,00	0,00	312 023,08	0,00	0,00%
2		Zakládání											
34	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	43,850	43,850	0,000	224,00	9 822,40	0,00	0,00	9 822,40	0,00	0,00%
2		Zakládání						9 822,40	0,00	0,00	9 822,40	0,00	0,00%
3		Svislé a kompletní konstrukce											
35	359901211	Monitoring stoky jakékoliv výšky na nové kanalizaci	m	43,850	43,850	0,000	48,00	2 104,80	0,00	0,00	2 104,80	0,00	0,00%
3		Svislé a kompletní konstrukce						2 104,80	0,00	0,00	2 104,80	0,00	0,00%
4		Vodorovné konstrukce											
36	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	11,596	11,596	0,000	766,00	8 882,54	0,00	0,00	8 882,54	0,00	0,00%
37	452111111	Osazení betonových pražců otevřený výkop pl do 25000 mm2	kus	9,000	9,000	0,000	65,00	585,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00%
38	592237R1	podkladek betonový pod hrdlové trouby IZ 12 / 60	kus	9,000	9,000	0,000	176,00	1 584,00	0,00	0,00	1 584,00	0,00	0,00%
39	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	1,300	1,300	0,000	3 254,00	4 230,20	0,00	0,00	4 230,20	0,00	0,00%
4		Vodorovné konstrukce						15 281,74	0,00	0,00	15 281,74	0,00	0,00%
8		Trubní vedení											
40	831392121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 400	m	10,500	10,500	0,000	717,00	7 528,50	0,00	0,00	7 528,50	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
poř. č.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
41	597107060	trouba kameninová glazovaná DN400mm L2,50m spojovací systém C. Třída 200	m	10,658	10,658	0,000	2 610,00	27 817,38	0,00	0,00	27 817,38	0,00	0,00%
42	871442111	Montáž kanalizačního potrubí z laminátových trub DN 600 se spojkami v otevřeném výkopu	m	28,050	28,050	0,000	1 037,00	29 087,85	0,00	0,00	29 087,85	0,00	0,00%
43	286412700	roury z odštěpivé litého laminátu PN 1 SN 10000 se spojkou DN 600	m	28,050	28,050	0,000	3 239,00	90 853,95	0,00	0,00	90 853,95	0,00	0,00%
44	8924211R1	Zkoušky těsnosti kanalizace DN 400 nebo 500	m	11,430	11,430	0,000	509,00	5 817,87	0,00	0,00	5 817,87	0,00	0,00%
45	8924411R1	Zkoušky těsnosti kanalizace DN 600	m	32,420	32,420	0,000	472,00	15 302,24	0,00	0,00	15 302,24	0,00	0,00%
46	8996231R1	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 30/37 v otevřeném výkopu	m3	6,118	6,118	0,000	4 539,00	27 769,60	0,00	0,00	27 769,60	0,00	0,00%
47	899722111	Krycí potrubí z plastů výstražnou fólii z PVC 20 cm	m	10,030	10,030	0,000	20,00	200,60	0,00	0,00	200,60	0,00	0,00%
48	899722114	Krycí potrubí z plastů výstražnou fólii z PVC 40 cm	m	26,290	26,290	0,000	34,00	893,86	0,00	0,00	893,86	0,00	0,00%
49	8999300R2	Napojení potrubí DN 400 na stávající šachtu včetně obetonování	kpl	1,000	1,000	0,000	4 616,00	4 616,00	0,00	0,00	4 616,00	0,00	0,00%
8		Trubní vedení						209 887,85	0,00	0,00	209 887,85	0,00	0,00%
997		Přesun sutě											
50	99722181R	Poplatek za uložení recyklatu	t	105,900	105,900	0,000	70,00	7 413,00	0,00	0,00	7 413,00	0,00	0,00%
997		Přesun sutě						7 413,00	0,00	0,00	7 413,00	0,00	0,00%
998		Přesun hmot											
51	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	13,386	13,386	0,000	315,00	4 216,59	0,00	0,00	4 216,59	0,00	0,00%
998		Přesun hmot						4 216,59	0,00	0,00	4 216,59	0,00	0,00%
VRN3		Zařízení staveniště											
52	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	1,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
VRN3		Zařízení staveniště						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
VRN7		Provozní vlivy											
53	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	1,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
VRN7		Provozní vlivy						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
999		Nové položky											
501	999114	Dodávka, montáž a demontáž mobilního oplocení	kpl	0,000	1,000	1,000	33 994,00	0,00	0,00	33 994,00	33 994,00	33 994,00	100,00%
999		Nové položky						0,00	0,00	0,00	33 994,00	33 994,00	100,00%
		Celkem						560 749,46	0,00	0,00	594 743,46	33 994,00	6,06%

Rozbor ceny položky 999114

cenová hladina:

kpl

999114: Dodávka, montáž a demontáž mobilního oplocení

Za Zhotovitele:

Datum:

20. 01. 2022

Za Objednatele:

Datum:

24. 01. 2022

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Summary table with 2 columns: Stavba (evidenční číslo) and Hodnota (Kč). Rows include: Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH, Aktuální smluvní částka (cena stavby), Procento změny Přijaté smluvní částky, and various monitoring limits.

Summary table with 2 columns: Stavba and Hodnota. Rows include: Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4, Sledování limitu 30% - součet Skupiny 3 a Skupiny 4, and Zákonný limit 30% pro Skupinu 3 a Skupinu 4.

Summary table with 2 columns: Stavba and Hodnota. Rows include: Sledování limitu 50% Skupina 3, Sledování limitu 50% Skupina 4, and Zákonný limit 50% pro Skupinu 3 a Skupinu 4.

Summary table with 2 columns: Stavba and Hodnota. Rows include: Sledování limitu 15%, Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč, and Zbývá do limitu.

Skupiny změn

Main data table with 40 columns. Columns 1-6 are grouped as -1- (Vyhrazené změna), -2- (Záměna položek), -3- (Nepředvídanost), -4- (Nezbytnost), -5- (Změny de minimis), and -6- (Smluvní kompenzační nároky). Each group contains sub-columns for Změny záporné, Změny kladné, and Suma Změn.

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: **Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4**

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	1 197 447 545,43
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	1 203 701 716,89
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	100,52%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	-0,26%
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	-0,01%
41=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 18, odst. (5), písm. b)	8,26% ABS

6=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	3 090 757,24	bez ABS
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,26%	
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	359 234 263,63 Kč	

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	13,05% ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00% ABS
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	598 723 772,72 Kč

12=(39/1)*100	Sledování limitu 15 %	2,57% ABS
13=30	Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč	30 809 800,96 Kč ABS
14=149224000-30	Zbývá do limitu	106 556 199,04

Skupiny změn

SO	ZBV č.	Investor	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 - Vyhrazená změna (Doměrky)						- 2 - Záměna položek (Započítávání)			- 3 - Nepředvídanost				- 4 - Nezbytnost				- 5 - Změny de minimis			- 6 - Smluvní kompenzační nároky
							Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	limit 15 %	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny kladné		
10	17		18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31= 28 +29	32	33	34=32+33	35= 32 +33	36	37	38=(38/1)*100	39=(36+37)	40		
				- 98 851 979,06	105 106 150,52	6 254 171,46	- 3 359 927,68	219 079,66	- 3 140 848,02	- 6 886 298,48	6 576 342,70	- 109 865,78	- 76 606 006,43	79 698 763,67	3 090 757,24	168 366 770,10	0,00	0,00	0,00	0,00	- 12 107 836,47	18 611 984,48	2,57%	30 809 800,96	0,00		
101.4	5/158.3	ŘSD	DZ - IV. etapa	- 112 440,00	194 884,00	82 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 112 440,00	194 884,00	82 415,00	307 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102.2	5/159.3	SMB	Portály dopravního značení	0,00	672 166,92	672 166,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 166,92	672 166,92	672 166,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
300.4	5.160.3	SMB	Úžák - Kanalizace	0,00	33 994,00	33 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 994,00	33 994,00	33 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.

IMOS Brno, a.s. Rozbor ceny položky 999114

Název : **Dodávka, montáž a demontáž mobilního oplocení** MJ kus

1	Materiál		0,00 Kč	0,00% z celkové JC
2	Mzdy		0,00 Kč	0,00% z celkové JC
3	Odvody	34,00 % z mezd	0,00 Kč	0,00% z celkové JC
4	Stroje		0,00 Kč	0,00% z celkové JC
5	Ostatní přímé náklady		29 560,00 Kč	86,96% z celkové JC
6	Přímé náklady [1] až [5]		29 560,00 Kč	
7	Režie výrobní	5,00 % z [6]	1 478,00 Kč	4,35% z celkové JC
8	Režie správní	5,00 % z [6]	1 478,00 Kč	4,35% z celkové JC
9	Zisk	5,00 % z [6]	1 478,00 Kč	4,35% z celkové JC
10	Ostatní a nekalkulované náklady		0,00 Kč	0,00%
Celkem [6] až [10]			33 994,00 Kč	

T	Kód položky	Název položky	MJ	Množství spotřeba	Jednotková cena	Celkem
M						0,00 Kč
M						0,00 Kč
M						0,00 Kč
M						0,00 Kč
Materiály						0,00 Kč
P			Nh			0,00 Kč
P			Nh			0,00 Kč
P			Nh			0,00 Kč
P						0,00 Kč
Mzdy						0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
Stroje						0,00 Kč
O		Objednávka na dodávku mobilního oplocení od generálního dodavatele	Ks	1,00000	29 560,00	29 560,00 Kč
O			Kč			0,00 Kč
Ostatní přímé náklady						29 560,00 Kč

Poznámka :

Tato položka se nevyskytuje v soupisech prací dle SOD ani v cenících OTSKP-SKP a RTS, proto předkládáme vyčíslení přímých nákladů.

OBJEDNÁVKA č: 2017066-020

Kupující:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno - Černovice

Prodávající:

IČ: 25322257
 DIČ: CZ25322257
 OR u KS Brno, oddíl B, vložka 2211
 Tel.: [redacted]

UNIPLOTY.cz
RM comp. s.r.o.
B.Němcové 1168
751 31 Lipník nad Bečvou
DIČ: CZ25823493

V Brně, dne: 23.7.2020

Předmět koupě:

 Objednáváme u Vás dodávku **MOBILNÍHO OPLOCENÍ** pro zařízení staveniště

plotové dílce Uni Mini 3450 x 1200mm 40 ks : 28 360,- BEZ DPH
 + spojky Zn + patka PVC 17kg

Doprava na stavbu: ul. Dornych, Brno 602 00 (buňkoviště naproti Lidlu) : 1200,- BEZ DPH
 Štěpčák Jan, 724 159 747 – volat předem

DODÁNÍ: 29-31.7. 2020

Celková cena: Kč bez DPH

Kontakt na prodávajícího: [redacted]

Stavební akce a místo dodání: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Kontakt na stavbu: [redacted]

Tel.: [redacted]

Prodávající dodá předmět koupě do: co nejdříve
Dílčí termíny dodávek: ---
Prodávající poskytne na předmět koupě záruku v trvání : 24 měsíců
Doklady ke zboží: prohlášení o vlastnostech, certifikát výrobku

Kupující se zavazuje zboží dodané v souladu s touto objednávkou, včas a bez vad, převzít a zaplatit za něj prodávajícímu sjednanou cenu v Kč plus DPH ve sjednané době po dodání zboží. Kupující není povinen převzít zboží s vadami, byť by nebránily ani neomezovaly jeho užití ke sjednanému účelu. Prodávající je oprávněn vystavit daňový doklad po převzetí zboží kupujícím, úhrada je splatná do 30 dnů od doručení daňového dokladu.

Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu předmět koupě a umožnit mu nabytí k němu vlastnické právo.

Konkrétní dobu dodání každé dodávky dohodne prodávající s kupujícím telefonicky vždy nejméně 1 pracovní den dopředu.

Bude-li prodávající v prodlení s plněním sjednaných termínů, je povinen bez ohledu na své zavinění uhradit kupujícímu vedle náhrady škody také smluvní pokutu ve výši 0,1% za každý započatý den prodlení. Při prodlení delším než 1 den je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit.

Nebezpečí škody na předmětu koupě přechází na kupujícího jeho převzetím.

Prodávající není oprávněn postoupit nebo zastavit svoje pohledávky či jiná práva vyplývající z této smlouvy vůči kupujícímu, ledaže by s tím kupující předem písemně souhlasil.

Prodávající se zavazuje, že on, jakož i osoby, které při plnění svých závazků využije, budou při plnění povinností dle této smlouvy jednat v souladu s právními předpisy a etickými pravidly, zejména pak v souladu s pravidly obsaženými v Etickém kodexu skupiny IMOS, který je dostupný na internetových stránkách IMOS Brno, a.s. <https://www.imosbrno.eu/eticky-kodex>.

Vyřizuje:
Za kupujícího:
Za prodávajícího:

Ing. [redacted]

razítko a podpis

razítko a podpis

Tel.: [redacted]

E-mail: [redacted]

Stavba: Tramvaj Plotní - soubor staveb, etapa 2 – 4

(ORG 4273)

Datum kontroly: **23.7.2020**

ZÁPIS KOORDINÁTORA BOZP NA STAVENIŠTI č. 230

Z KONTROLNÍ PROHLÍDKY K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI
(dle zákona 309/2006 Sb., č. 262/2006 Sb., NV č. 591/2006 Sb., NV č. 362/05 Sb., NV č. 101/2005 Sb.)

1) V souladu s ustanovením příslušných právních předpisů koordinátor BOZP na staveništi vydává

„Zápis z kontrolní prohlídky výše uvedené stavby.“

2) Dne 23.7.2020 byl koordinátorem BOZP [REDAKCE] provedena kontrola uplatňování požadavků na BOZP na pracovišti převzaté zhotovitelem stavby:

„Výstavba tramvajové tratě Plotní“, stavbyvedoucí IMOS Brno a.s. - [REDAKCE] Dopravní stavby Brno, s.r.o. - [REDAKCE] STRABAG a.s. - [REDAKCE], se zjištěním:

Koordinátor upozornil zhotovitele:

▪ **na riziko úrazu veřejnosti, pádem** a požaduje:

UZAVŘENÝ PŘECHOD NA ROHU VAŇKOVKY, chodci přebíhají mezi auty ul. Úzkou – **hrozí riziko úrazu sražením!**

- uzavření místa přebíhání a srozumitelné nasměrování chodců k přechodu naproti ul. Trnitá:

- osazení směrových šipek z obou stran ul. Úzká (1, 3)
- osazení nízkého oplocení na hranu chodníku a zevnitř zetek (2, 3)
- doplnění již umístěné informační značky o vzdálenost přechodu naproti Trnitá a označení přechodu
- označení informační značky o použití výtahu u hlavního vstupu do Vaňkovky
- provádění denní kontroly oplocení a směrového označení tohoto rizikového místa

- zajištění staveniště oplocením – před Vaňkovkou (14)

- zajištění staveniště nízkou oplocenkou v místě přejezdu koridoru před Dornem, nutno za sebou zavírat (12)

- zajištění všech výkopů na staveništi oplocením – **nutno zajistit výkopy vodovodu oplocením**

- zajištění bezpečných vstupů do domů ul. Komárovská – OSB desky jsou nestabilní, E.ON..... **splněno (8)**

- zajištění výkopů na ul. Komárovská, Plotní oplocením, E.ON..... **splněno (9, 10, 11)**

- označení obchůznych tras šipkami pro průchod stavbou po ul. Plotní

- rozmístění značek po staveništi „**Pozor procházíte stavbou!**“

- neparkovat, neskladovat materiál v místě koridoru (13)

▪ **na povinnost používání OOPP u všech pracovníků** a požaduje, aby pracovníci při práci na komunikaci používali reflexní označení, **UNICAB (4)**

▪ **na značný nepořádek na staveništi** a požaduje obratem provedení úklidu.....**splněno**

Kontrola odstranění nedostatků bude provedena 28.7.


▪ byl proveden zápis do stavebního deníku

Zaznamenal: [REDAKCE]

1



2

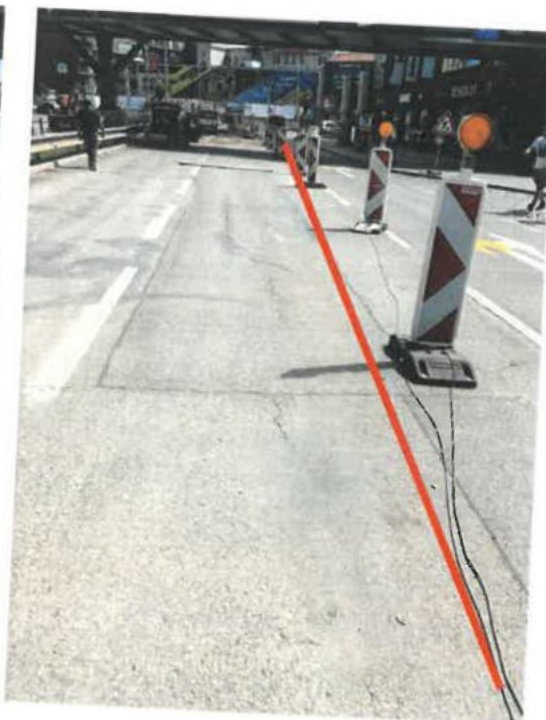

3



4



Stavba: Tramvaj Plotní - soubor staveb, etapa 2 – 4

(ORG 4273)

Datum kontroly: **4.8.2020**

Z Á P I S K O O R D I N Á T O R A B O Z P N A S T A V E N I Š T I č. 233

Z KONTROLNÍ PROHLÍDKY K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI
(dle zákona 309/2006 Sb., č. 262/2006 Sb., NV č. 591/2006 Sb., NV č. 362/05 Sb., NV č. 101/2005 Sb.)

1) V souladu s ustanovením příslušných právních předpisů koordinátor BOZP na staveništi vydává

“Zápis z kontrolní prohlídky výše uvedené stavby.”

2) Dne 4.8.2020 byl koordinátorem BOZP [redacted] provedena kontrola uplatňování požadavků na BOZP na pracovišti převzaté zhotovitelem stavby: „Výstavba tramvajové tratě Plotní“, stavbyvedoucí IMOS Brno a.s. - [redacted] Dopravní stavby Brno, s.r.o. – [redacted] STRABAG a.s. - [redacted], se zjištěním:

Koordinátor upozornil zhotovitele:

• na riziko úrazu veřejnosti, pádem a požaduje:

UZAVŘENÝ PŘECHOD NA ROHU VAŇKOVKY, chodci přebíhají mezi auty ul. Úzkou – **hrozí riziko úrazu sražením!**

- uzavření místa přebíhání a srozumitelné nasměrování chodců k přechodu naproti ul. Trnitá:
 - osazení nízkého oplocení na hranu chodníku a zevnitř zetek **splněno (26, 27)**
- zajištění výkopů, trčících kabelů u vstupů do domů ul. Plotní oplocením, E.ON..... **splněno (2, 4)**
- zajištění výkopů vedle chodníku Vaňkovky oplocením, UNICAB..... **nesplněno (28)**
- zajištění všech výkopů na staveništi a v koridorech oplocením nebo zakrytím (16)
- označení obchůznych tras šipkami pro průchod stavbou po ul. Plotní..... **nesplněno**
- rozmístění značek po staveništi „ **Pozor procházíte stavbou!**“ **nesplněno**
- vyštěrkování příčných koridorů tak, aby chodci neprocházeli bahnem, kalužemi (11, 17, 22)

Kontrola odstranění nedostatků bude provedena 6.8.

• byl proveden zápis do stavebního deníku

Zaznamenal: [redacted]

25



26



27



28



Evidenční číslo: **ORG 4276 TRAMVAJ PLOTNÍ**

Počet stran

Počet výtisků

Výtisk číslo

Klasifikace **PI**

Zápis z 59. kontrolního dne stavby „Tramvaj Plotní – soubor staveb, etapa 2-4“

Kontrolní denčíslo **59** konaný dne **30. 7. 2020** v zasedací místnosti zařízení staveniště zhotovitele Dornych**Účastníci**

Seznam účastníků je uveden v příloze č. 1 – Prezenční listina

Program kontrolního dne

1. Kontrola úkolů z jednání o předání staveniště a minulého KD
2. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby:
 - a) plnění věcného harmonogramu
 - b) popis provedených prací
3. Kontrola kvality:
4. Stav BOZP a PO
5. Různé – nové úkoly
6. Kontrola stavby
7. Závěr

Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu
1.3.2	Úseky stavby, na které bude postupně vydáváno zvláštní užívání komunikace (ZUK) budou správcem komunikace (BKOM a.s.) předávány na základě výzvy zhotovitele. DPMB upozorňuje, že úsek tramvajové trati (kabely, troleje) od zastávky Konopná až po smyčku Komárov zůstává pod napětím.	Trvá
1.5.7	Zhotovitel zajistí doplnění souřadnic a výšek kontrolních bodů v příčných profilech na všech konstrukčních vrstvách, dle platné TKP č.1, čl.4.4.6, včetně doplnění ZTKP str.17.	Trvá
1.5.13	Zástupce správy komunikací BKOM a.s. požaduje předkládat v jednom vyhotovení realizační dokumentace objektů řady 100.	Trvá průběžně
1.5.15	ÚOZI Objednatele požaduje trvale-po celou dobu výstavby dodržování ustanovení § 13, odst. 6 vyhlášky č.31/1995 o zaměřování podzemních částí stavby před zakrytím a dodržování „Náležitostí a způsobu vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě“ ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb., Příloha č. 16, Stavební deník, oddíl B, odst. 2., písmeno h).	Trvá průběžně
2.5.4	ÚOZI objednatele požaduje předávat protokoly geodetického vytyčení v souladu s TKP, a to včetně porovnání odchylek od projektové dokumentace.	Trvá
6.6	Geodet objednatele upozorňuje na ochranu stávajících měřických bodů vytyčovací sítě stavby, popřípadě náhradu zničených. Na doplněné body musí být geodetem zhotovitele vydán geodetický protokol. Zhotovitel bude bodové pole průběžně obnovovat. Zhotovitel doplní bodové pole v prostoru Zvonářka - Plotní.	Trvá průběžně
8.3	Geodet SpSt žádá zhotovitele o průběžné předávání zaměření, aktuálně tramvajové tratě a doplnění kontrolních bodů na Plotní.	Průběžně
29.4.1	Demolice objektu Plotní 37 AD předal zástupci IO SMB koncept dokumentace napojení ulice Plotní přes autobusové nádraží. Došlo k částečné dohodě s p. Koblížkem. Návrh smlouvy mezi [redacted] a SMB bude však projednán v zastupitelstvu SMB až 09/2020. Správce stavby proto uděluje zhotoviteli pokyn k zajištění realizační dokumentace provizorního propojení ulic Plotní a Trnitá přes autobusové nádraží. SpSt svolá výrobní výbor za účasti IO SMB, zhotovitele i AD ke stanovení dalšího postupu.	Termín 13.8.2020
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR	ZÁPIS Z 59. KONTROLNÍHO DNE STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO ORG 4276 TRAMVAJ PLOTNÍ	„TRAMVAJ PLOTNÍ – SOUBOR STAVEB, ETAPA 2-4“	
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 1/4

- 34.3 Investor DPMB upozorňuje na spolufinancování díla ze zdrojů EU - OPD, nejzazší termín realizace projektu je dle schvalovacího protokolu MD ČR stanoven na 31.12. 2020. Čerpání peněžních prostředků je k dnešnímu dni příjemci dotace garantováno do 12/2020. Proběhlo jednání na Ministerstvu dopravy, předána první informace o možném prodloužení termínu realizace stavby.
- 37.13 **TB – oprava odvodňovače a kanalizační přípojky**
Po opravě odvodňovače v šachtě u OD LIDL bylo zjištěno trvalé poškození kanalizační stoky v délce cca 30 m, včetně poškození kanalizační odbočky. S BVK předběžně domluveno, že oprava proběhne až po uplynutí záruční lhůty na komunikaci. Zhotovitel uplatní náhradu škody vůči TB. Zhotovitel zaslal vyčíslení nákladů na opravu, upozorňuje, že náklady jsou uvedeny v aktuálním čase. Zhotovitel dále informuje, že zahájí předávací řízení objektu kanalizace, správce stavby k němu přizve zástupce jak TB, tak BVK. Zhotovitel předal na BVK ke kontrole a odsouhlasení předávací dokumentaci. Zkontrolovaná dokumentace zpátky u zhotovitele, ten svolá předávací jednání, termín zhotovitel sdělí po 20. 7. 2020. Na dalším jednání s TB uplatněn požadavek pojišťovny na odborný posudek upřesňující rozsah poškození potrubí. **Zhotovitel zajistí doplnění posouzení od STAVEXIS.**
- 39.1 **Vjezd do Viněny**
IO SMB svolá jednání s CTP k vyřešení poškození části chodníku v prostoru před CTP. Zde domluveno, že [redacted] připraví, na objednávku IO SMB, návrh dohody. **V přípravě dodatek smlouvy mezi SMB a CTP o realizaci akce „Tramvaj Plotní“.**
- 41.1 **Požadavek DPMB, a.s.**
DPMB jako minoritní spoluinvestor a současně jako jeden ze spoluinvestorů, který na svoji část stavby čerpá dotaci EU, upozorňuje majoritního spoluinvestora, že pokud nebude z jeho strany dále umožněno provádět stavbu vlastní tramvajové trati a jejich součástí dle platné projektové dokumentace, tzn., že neumožní bezkolizní provádění prací na této části stavby, vznikne DPMB škoda. Škoda bude vyjádřena ztrátou celé nebo části dotace ze strany SFDI, která vznikne posunem termínu dokončení části stavby DPMB za datum 31. 12. 2020. K tomu dále DPMB uvádí, že v této věci bude postupovat v souladu s uzavřenou smlouvou o spolupráci a požadovat po majoritním spoluinvestorovi kompenzaci ve výši této ztráty.
- 43.3 **Kolaudace vodoprávní**
[redacted] OVLHZ MMB upozorňuje na včasné kolaudace dokončených stavebních objektů, popř. ucelených částí. Na kontrolní dohlídce stavby VDPR úřadu za účasti [redacted] byl dohodnut postup pro dílčí kolaudaci kanalizace na ulici Dornych.
- 49.3 **Navazující schůzka s p. Černou proběhne do konce příštího týdne.**
Park Plotní – socha
Restaurátor upozornil na prasklý podstavec sochy, zhotovitel opraví ochranné bednění okolo sochy. Zhotovitel opravil bednění okolo sochy a potvrdil, že z jeho strany pasportizace sochy neproběhla (v souladu se zadáním proběhla pasportizace dotčených nemovitostí). Zhotovitel žádá IO SMB o sdělení termínu odvezení sochy a žádá její odvezení, ve vazbě na postup prací, nejpozději do konce 05/2020. Restaurátor kontaktoval zhotovitele se záměrem odvézt sochu. **Socha odvezena. Splněno.**
- 55.1 **Široká 4**
Městská část Brno – Jih vyslovuje předběžný souhlas s potenciálním bouráním objektu. **Vedoucí IO SMB pro další projednání v orgánech Města žádá o předložení cenové kalkulace jak na demolici objektu, tak na jeho statické zabezpečení. Zhotovitel předloží obě kalkulace do konce 07/2020. Zhotovitel má kalkulace zpracovány, zašle elektronicky.**
- 55.4 **Teplárny Brno**
Požadují zhotovení části horkovodu v prostoru vnitrobloku (600.21) ve vazbě na podanou žádost o dodávce tepla [redacted]. Po projednání s SMB a TB konstatováno, že problematika bude řešena komplexně ve vazbě na celý vnitroblok.
- 56.3 **Billá Růže**
Brno – Jih žádá zhotovitele o dokončení zpevněných ploch v oblasti Billá Růže – Konopná do konce prázdnin.

Termín
13.8.2020

Termín
02/2020

Termín
7.8.2020

Splněno

Termín
13.8.2020

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR	ZÁPIS Z 59. KONTROLNÍHO DNE STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO ORG 4276 TRAMVAJ PLOTNÍ	„TRAMVAJ PLOTNÍ – SOUBOR STAVEB, ETAPA 2-4“	
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 2/4

56.4	<u>Vjezd na pozemek po Plotní 39</u> Brno – Jih žádá o zřízení vjezdu na pozemek přes stávající chodník na ulici Široké, podél Široké 4.	
56.5	<u>Řešení vnitrobloku, Nová – Rosická</u> Zhotovitel žádá, zvláště ve vazbě na objednávací termíny, o stanovení rozsahu prací na jednotlivých stavebních objektech ve vnitrobloku (prostoru stávajícího zařízení staveniště). Nedotažena jednotlivá stavební povolení. Správce stavby, po projednání na IO SMB, uděluje AD prostřednictvím zhotovitele pokyn k rozdělení dokumentace jednotlivých stavebních objektů na Nové – Rosické. Ta bude sloužit pro vyřízení stavebních povolení a současně upřesní rozsah zhotovitelových prací. Dle AD elektronická verze připravena včetně výkazů výměr, SpSt svolá výrobní výbor za účasti investorů, zhotovitele i AD ke stanovení dalšího postupu.	Termín 13.08.2020
56.6	<u>Zedř Vaňkovka</u> Na pokyn správce stavby upřesní AD provedení styku pozemků v prostoru po zbourané kamenné zdi u Vaňkovky. AD připravil, ve vazbě na nově projednávané umístění měřírny DPMB do tohoto prostoru bude oddělení pozemků vyjasněno ve vazbě na nutné přípojky a příjezdnou trasu.	Termín 08/2020
57.1	<u>Prostor u Dorných 126,128</u> Brno – Jih žádá zhotovitele o osazení cca 2 měřičských bodů.	Termín 08/2020
57.2	<u>Inženýrské sítě na Novou Kalovou</u> IO SMB informuje Zhotovitele o zájmu privátního investora na napojení vodovodu a osazení monolitické šachty pro odbočení na Novou Kalovou. Ve čtvrtek 16. 7. 2020 proběhne koordinační schůzka s KAM na místě samém. Splněno, schůzka za účasti IO SMB proběhla, s ohledem na úroveň projekční přípravy nebudou úpravy realizovány v rámci stavby Tramvaj Plotní.	Splněno
57.3	<u>Plotní 39, kanalizační přípojky</u> Zhotovitel připraví dokumentaci nově vybudovaných přípojek z Plotní i Široké – pro následné rozhodnutí, které zůstanou zachovány. Celkem osazeny 3 přípojky dle zadávací dokumentace, ponechány budou, po projednání na BVK, 1 ks splaškové a 1 ks dešťové přípojky se zaslepením, jedna přípojka bude zrušena.	Termín 08/2020
58.1	<u>Požadavek Brno – Jih, ul. Široká</u> Brno – Jih žádá o zajištění vyvedení dopravy z ulice Plotní nejen přes ÚAN, ale také přes ulici Širokou (nyní jednosměrná z Dornychu). SpSt žádá AD o vyjádření k uvedené problematice pro možnost stanovení dalšího postupu. AD zaslal již loni projednaný materiál. Širokou nelze zprovoznit jako obousměrnou, při přesměrování směrem k Dornychu není možné odbočení vlevo kvůli dělicímu pásu, s odbočením vpravo nesouhlasí Policie pro blízkost světelné křižovatky.	Splněno
58.2	<u>Úprava vodorovného značení na Železniční</u> Brno – jih žádá IO SMB o zajištění úpravy vodorovného značení parkování na ulici Železniční.	
58.3	<u>Kontejner na komunální odpad</u> Brno – jih žádá Zhotovitele o umístění kontejneru na KO na ul. Plotní.	Termín 07/2020
58.4	SpSt žádá zhotovitele o předložení plánu Strabag na pokládku jednotlivých vrstev komunikací. Zástupce STRABAG zašle do příštího KD.	Termín 13.8.2020
58.5	<u>Napojení z kabelovodu pro nově navrženou měřírnu</u> Zhotovitel společně s AD prověří statiku kabelovodní šachty pro umožnění dostatečného počtu výstupů. Zhotovitel požadavek odeslal na PREFU, výrobce atypické šachty k prověření.	Termín 13.8.2020
58.6	Zhotovitel TT žádá AD o prověření výkazu výměr ploch a kubatur železničního spodku a svršku. Svolán pracovní výbor na 3.8. ve 14:00 hod.	Termín 3.8.2020

2. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby

- a) plnění věcného harmonogramu SpSt vydal pokyn zhotoviteli zpracovat návrh aktualizace HMG ve vazbě na odsouhlasení dodatku smlouvy o dílo.
Zhotovitel připraví revizi HMG, včetně finančního.
- b) popis rozhodujících provedených prací **Viz příloha č. 1 zápisu z KD**
- c) předpoklad prací **Viz příloha č. 1 zápisu z KD**

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR	ZÁPIS Z 59. KONTROLNÍHO DNE STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO ORG 4276 TRAMVAJ PLOTNÍ	„TRAMVAJ PLOTNÍ – SOUBOR STAVEB, ETAPA 2-4“	
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 3/4

3. Kontrola kvality

a) zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období

V současné době probíhají práce v souladu s příslušnými TKP a v souladu s PDPS.
Kontrolní dny kvality probíhají průběžně se samostatnými zápisy.

4. Stav BOZP a PO

1.4.1	Koordinátor BOZP zpracoval Plán BOZP pro realizaci stavby a předal ho zhotoviteli. Všichni pracovníci budou s plánem BOZP prokazatelně seznámeni (doložit podpisem v prezenční listině plánu).	Trvá
1.4.2	Koordinátor BOZP provádí pravidelné kontroly plnění opatření podle Plánu BOZP na staveništi (zápis minimálně 1 x za týden je rozeslán určeným účastníkům výstavby). Při podstatných závadách a opakujících se závad přijme koordinátor BOZP okamžité opatření a upozorní objednatele	Trvá
1.4.3	Koordinátor požaduje plnění povinnosti zhotovitele a zasilání nejpozději 8 dnů před zahájením technologický postup prací (zákon č. 309/2006 Sb., §16).	Trvá
1.4.4	Při provádění prací budou pracovníci používat předepsané OOPP.	Trvá
1.4.5	Zhotovitel zajistí veřejnosti bezpečný průchod po stávajících chodnících. V případě nutnosti uzavření chodníku budou provedeny koridory pro chodce.	Trvá

5. Různé – nové úkoly:

59.1	SpSt uděluje Zhotoviteli pokyn k vybudování kanalizační a vodovodní přípojky do prostoru přemístěné měnirny.	
59.2	SpSt uděluje pokyn Zhotoviteli k likvidaci 1ks dešťové přípojky po bývalém objektu Plotní 39.	
59.3	Požadavek geodeta SpSt - bezprostředně po osazení obrubníků předá zhotovitel geodetické protokoly s vyhodnocením odchylek od projektové dokumentace. Práce na jednotlivých vrstvách komunikací budou pokračovat na základě vyhodnocení těchto protokolů.	
59.4	<u>Vjezd na ul. Komárovská k zámečnictví</u> Zhotovitel žádá AD o prověření provedení vjezdu pro kamionovou dopravu.	
59.5	SpSt uděluje Z pokyn k instalaci ochranných prvků oplocení na ulici Úzká, a to oboustranně.	

6. Kontrola stavby

6.1 Prohlídka staveniště proběhla individuálně.

7. Závěr

Datum konání příštího KD Dne 27. 8. 2020 od 9:00 hodin
Sraz účastníků KD v prostoru ZS zhotovitele na ulici Dorných.
Kontrolní den (KD) SpSt 13. 8. 2020 od 9:00 hod. na ZS Dorných.

Všichni podepsaní na prezenční listině se se zápisem seznámili a s jeho obsahem souhlasí.

Zapsal

Přílohy

Číslo	Název
1	Prezenční listina

Rozdělovník

Rozeslání bude provedeno elektronicky po schválení znění všemi zúčastněnými – zajistí SpSt (Správce stavby).

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR	ZÁPIS Z 59. KONTROLNÍHO DNE STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO	TRAMVAJ PLOTNÍ – SOUBOR STAVEB, ETAPA 2-4"	
ORG 4276 TRAMVAJ PLOTNÍ	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 4/4
