

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

na zhotovení stavby „Revitalizace trati Lovosice – Česká Lípa“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-3580/2021/FLO

ISPROFIN/ISPROFOND: 5003730012

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

„**Společnost pro revitalizace trati Lovosice – Česká Lípa**“

jejímiž účastníky jsou:

AŽD Praha s.r.o.

se sídlem: Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10

IČO: 480 29 483, DIČ: CZ48029483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka C 14616

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: Ing. Petrem Faltusem, obchodním ředitelem, na základě plné moci

a

EDIKT a.s.

se sídlem: Rudolfovská tř. 461/95, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice

IČO: 25172328 DIČ: CZ25172328

zaspaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. B 904
zastoupena: Ing. Pavlem Štindlem, předsedou představenstva a
Radimem Bláhou, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa:

AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 3146/2, Záběhlce, 106 00 Praha 10

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 353-PVO/2021

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 22. 10. 2021 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby, název zakázky: „Revitalizace trati Lovosice – Česká Lípa“, s účinností Smlouvy ke dni 26. 10. 2021 (dále jen „Smlouva“).

Smlouva doposud nebyla změněna žádným dodatkem.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

1. Deklaratorní úprava Smluvní ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **19 309 262,85 Kč bez DPH**.

Důvodem pro deklaratorní úpravu Smluvní ceny Díla jsou schválené změnové listy stavby (dále jen „ZL“): č. 1, 2, 5, 6, 7, 8 a 10 a v souladu s příslušnými ustanoveními **zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „ZZVZ“), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

Celkové ponížení hodnoty závazků ze Smlouvy dle ustanovení **§ 222 odst. 7 ZZVZ** je v celkové výši - 909 491,25 Kč. Upřesnění Smluvní Ceny Díla je stanoveno ke dni podpisu tohoto Dodatku.

Součet absolutních hodnot změn závazků dle ustanovení **§ 222 odst. 4 ZZVZ** je **0,97 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkový cenový nárůst hodnoty závazků ze Smlouvy dle ustanovení **§ 222 odst. 9 ZZVZ** je **1,61 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy upravené v souladu ustanoveními o změně ceny.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 1 Dodatku (č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky).

2. Úprava lhůt k provedení Díla a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Harmonogram postupu prací, přičemž dochází na základě *Pokynů správce stavby* k dílčím změnám v původním HMG:

- a. Změna termínů dílčích částí Díla do zkušebního provozu z důvodu dodatečného rozšíření předmětu Díla Objednatelem a to z 04. 08. 2022 na 31. 08. 2022. Změna je bez vlivu na celkové množství přidělených výluk Objednatelem, na termín dokončení Sekce č. 1 a termíny Dob pro uvedení do provozu a pro dokončení a týká se těchto Provozních souborů a Stavebních objektů:

- i. PS 06-01-01 Litoměřice hor.n. - Liběšice, TZZ
- ii. PS 07-01-01 ŽST Liběšice, úprava SZZ

- iii. PS 10-01-09 Žel. přejezd ev. km 67,487, PZZ
- iv. PS 06-02-02 Zast. Ploskovice, rozhlas pro cestující
- v. PS 06-02-03 Zast. Horní Řepčice, rozhlas pro cestující
- vi. SO 05-63-02 ŽST Litoměřice horní n., venkovní osvětlení
- vii. SO 05-63-03 ŽST Litoměřice horní n., úpravy osvětlení
- viii. SO 06-63-04 Litoměřice hor. n. - Liběšice, přípojka NN pro PZZ přejezdu ev. km 45,442
- ix. SO 06-63-05 Litoměřice hor. n. - Liběšice, přípojka NN pro PZZ přejezdu ev. km 46,827
- x. SO 06-63-07 Litoměřice hor. n. - Liběšice, přípojka NN pro PZZ přejezdu ev. km 47,949
- xi. SO 06-63-10 Litoměřice hor. n. - Liběšice, rekonstrukce přípojky NN pro PZZ přejezdu ev. km 54,358
- xii. SO 06-63-11 Litoměřice hor. n. - Liběšice, přípojka NN pro PZZ přejezdu ev. km 55,163
- xiii. SO 06-63-13 Litoměřice hor. n. - Liběšice, přípojka NN pro PZZ přejezdu ev. km 55,751
- xiv. SO 06-63-14 Litoměřice hor. n. - Liběšice, přípojka NN pro PZZ přejezdu ev. km 56,944
- xv. SO 06-63-15 Litoměřice hor. n. - Liběšice, přípojka NN pro PZZ přejezdu ev. km 57,226
- xvi. SO 06-63-17 Zast. Trnovany u Litoměřic, venkovní osvětlení
- xvii. SO 06-63-19 Zast. Ploskovice, venkovní osvětlení
- xviii. SO 06-63-21 Zast. Horní Řepčice, venkovní osvětlení
- xix. SO 10-63-08 Úštěk - Blíževedly, přípojka NN pro PZZ přejezdu ev. km 67,487

- b. Změna termínů provedení části prací a činností v níže uvedených dílčích částech Díla na základě požadavku Objednatele ve věci provedení následné úpravy směrového a výškového uspořádání kolejí a výhybek (následné podbití dle předpisu Objednatele – SŽ S3/1 čl. 59 odst. 2). Změna přesouvá dílčí stavební práce a činnosti s tím spojené dle návrhu ROV 73076 ze Sekce 1 do Sekce 2, je bez vlivu na termíny Dob pro uvedení do provozu a pro dokončení a týká se těchto provozních souborů a stavebních objektů:

- i. SO 03-10-01 ŽST Žalhostice, železniční svršek
- ii. SO 04-10-01 Žalhostice – Litoměřice hor. n., železniční svršek
- iii. SO 06-10-01 Litoměřice hor. n. - Liběšice, železniční svršek
- iv. SO 08-10-01 Liběšice - Úštěk, železniční svršek
- v. SO 10-10-01 Úštěk - Blíževedly, železniční svršek
- vi. SO 12-10-01 Blíževedly – Zahrádky u Č. Lípy, železniční svršek
- vii. SO 14-20-07 Demolice žel. mostu v ev. km 83,475

- c. Změna termínů dílčích částí Díla do zkušebního provozu z důvodů dodatečného požadavku *Armády České republiky* (odvolání souhlasu se stavbou rádiového systému GSM-R ze dne 07. 10. 2022) a nutnosti dodatečné úpravy sektorizace anténního systému. Změna přesouvá dílčí stavební práce a činnosti s tím spojené ze Sekce 1 do Sekce 2, je bez vlivu na termíny Dob pro uvedení do provozu a pro dokončení a týká se těchto Provozních souborů a Stavebních objektů:

- i. PS 05-02-08 ŽST Litoměřice h. n., BTS
- ii. PS 06-02-04 Zast. Trnovany, BTS

3. **Změna bankovního spojení zhotovitele.** Žádost zhotovitele o změnu bankovního spojení je přílohou č. 3 tohoto Dodatku a byla objednateli zaslána přes datovou schránku dne 22. 11. 2022. V souvislosti s touto skutečností se smluvní strany dohodly na úpravě záhlaví Smlouvy.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě záhlaví Smlouvy, přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky a přílohy č. 4 Smlouvy – Harmonogram postupu prací.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

I. Předmět Dodatku

1) Smluvní cena

a) U prací obsažených ve schválených ZL č. 1, 2 a 8 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)	██████████
Méněpráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ).....	██████████
Vícepráce dle ZL č. 2 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)	██████████
Méněpráce dle ZL č. 2 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ).....	██████████
Vícepráce dle ZL č. 8 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)	██████████
Méněpráce dle ZL č. 8 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ).....	██████████

Absolutní hodnota dle § 222 odst. 4 ZZVZ ██████████

Hodnota změny pro účely Dodatku Smlouvy celkem, bez DPH ██████████

b) U prací obsažených ve schválených ZL č. 7, 8 a 10 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 7 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	██████████
Méněpráce dle ZL č. 7 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ).....	██████████
Vícepráce dle ZL č. 8 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	██████████
Méněpráce dle ZL č. 8 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ).....	██████████
Vícepráce dle ZL č. 10 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	██████████
Méněpráce dle ZL č. 10 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ).....	██████████

Práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ dle Dodatku Smlouvy celkem, bez DPH ██████████

c) U prací obsažených ve schválených ZL č. 5 a 8 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 5 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	██████████
Méněpráce dle ZL č. 5 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ).....	██████████
Vícepráce dle ZL č. 8 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	██████████
Méněpráce dle ZL č. 8 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ).....	██████████

Práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ dle Dodatku Smlouvy celkem, bez DPH ██████████

d) U prací obsažených ve schválených ZL č. 6 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 7 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 6 (práce dle § 222 odst. 7 ZZVZ)
Méněpráce dle ZL č. 6 (práce dle § 222 odst. 7 ZZVZ).....
Práce dle § 222 odst. 7 ZZVZ dle Dodatku Smlouvy celkem, bez DPH.....

Úprava smluvní ceny Díla dle Dodatku:

Cena Díla dle Dopisu nabídky, bez DPH činila 981 928 275,55 Kč
Celková změna nákladů dle Dodatku, bez DPH činí..... + 19 309 262,85 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku, bez DPH činí..... 1 001 237 538,40 Kč

2) Na předmětu Díla dochází k těmto úpravám:

a) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 1 – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. Ruší se znění přílohy č. 1 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 Dodatku (současně příloha č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

b) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Harmonogram postupu prací

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Harmonogram postupu prací. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 2 Dodatku (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

3) Bankovní spojení

Ruší se stávající znění bankovního účtu uvedeného v záhlaví Smlouvy u Zhotovitele a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

bank. spojení:

4) Seznam příloh

Ruší se v čl. 21 Smlouvy uvedený seznam příloh a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

„21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1

Příloha č. 2 Oprávněné osoby

Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů

Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1

Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů

Příloha č. 6 Příloha k nabídce (pořadí závaznosti zůstává zachováno dle Pod-článku 1.5 Smluvních podmínek)

Příloha č. 7 Zmocnění Vedoucího zhotovitele; Rozsah participace na plnění předmětu Smlouvy o dílo (Pokud je vybráno více Zhotovitelů na základě společné nabídky)

Příloha č. 8 NEOBSAZENO

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

příloha č. 1 (příloha č. 1 Smlouvy): **Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky**

příloha č. 2 (příloha č. 4 Smlouvy): **Harmonogram postupu prací**

příloha č. 3: **Žádost Zhotovitele o změnu bankovního spojení**

Za objednatele:

V Praze



22.12.2022 13:14

Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb

Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace
(elektronicky podepsáno)

Za zhotovitele:

V Praze



Datum: 2022.12.16 13:37:39 +01'00'

.....
Ing. Petr Faltus

obchodní ředitel, na základě plné moci
AŽD Praha s.r.o.
(elektronicky podepsáno)

V Českých Buděj

Digitálně podepsal

Datum: 2022.12.19
15:48:55 +01'00'

.....
Ing. Pavel Štindl

předseda představenstva
EDIKT a.s.
(elektronicky podepsáno)

Datum: 2022.12.16
:53 +01'00'

.....
Radim Bláha

místopředseda představenstva
EDIKT a.s.
(elektronicky podepsáno)

Příloha č. 1 (příloha č. 1 Smlouvy)
Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky



Rekapitulace ceny

5003730012-zm05 Revitalizace trati Lovosice - Česká Lípa

ZR 2021/04/08

Celková cena bez DPH:

Cena SOD
981 928 275,55

vícepráce

méněpráce

Celkem dodatek č. 1

SOD + dodatek č. 1

Aspe

19 309 262,85 1 001 237 538,40


Objekt	Popis	Cena SOD	č. ZL	Dodatek č. 1			Celkem	SOD + dodatek č. 1
				vícepráce	méněpráce			
D.1	Železniční zabezpečovací zařízení							
PS 02-01-01	Lovosice - Zahlostice, TZZ							
PS 03-01-01	ZST Zahlostice, SZZ, ČAST A - DEFINITIVNÍ SZZ							
PS 03-01-01.2	ZST Zahlostice, SZZ, ČAST C - KLIMATIZACE							
PS 04-01-01	Zahlostice - Litoměřice hor.n., TZZ							
PS 05-01-01	ZST Litoměřice hor.n., úprava SZZ							
PS 06-01-01	Litoměřice hor.n. - Liběšice, TZZ							
PS 07-01-01	ZST Liběšice, úprava SZZ							
PS 08-01-04	Zel. přjezd v ev. km 59,896, PZZ							
PS 10-01-09	Zel. přjezd v ev. km 67,487, PZZ							
PS 12-01-08	Zel. přjezd v ev. km 74,557, PZZ							
PS 12-01-10	Zel. přjezd v ev. km 76,078, PZZ							
PS 12-01-11	Zel. přjezd v ev. km 76,540, PZZ							
PS 12-01-12	Zel. přjezd v ev. km 77,012, PZZ							
PS 20-01-01	Lovosice - Česká Lípa, DOK							
D.2	Železniční sdělovací zařízení							
PS 02-02-01	Zast. Lovosice závod, rozhlas pro cestující							
PS 03-02-02	Zahlostice-Liběšice, DOK							
PS 03-02-03	Zahlostice-Liběšice, přenosové zařízení							
PS 03-02-04	ZST Zahlostice, sdělovací zařízení							
PS 03-02-05	ZST Zahlostice, EZS							
PS 03-02-06	ZST Zahlostice, rozhlas pro cestující							
PS 03-02-07	ZST Zahlostice, informační zařízení							
PS 03-02-08	ZST Zahlostice, kamerový systém							
PS 03-02-09	Zahlostice - Liběšice, DOTS, ZDC							
PS 04-02-01	Zast. Litoměřice cihelna, rozhlas pro cestující							
PS 05-02-07	ZST Litoměřice hor. n., kamerový systém							
PS 05-02-08	ZST Litoměřice h.n., BTS							
PS 06-02-01	Zast. Třmovany, rozhlas pro cestující							
PS 06-02-02	Zast. Pšovovice, rozhlas pro cestující							
PS 06-02-03	Zast. Horní Rančice, rozhlas pro cestující							
PS 06-02-04	Zast. Třmovany, BTS							
PS 06-02-05	Zast. Horní Rančice, BTS							
PS 07-02-05	ZST Liběšice, rozhlas pro cestující							
D.4	Ostatní technologická zařízení							
SO 90-90	Likvidace odpadů							
SO 98-98	Všeobecný objekt							
E.1.1.1	Železniční svršek							
SO 03-10-01	ZST Zahlostice, železniční svršek							
SO 04-10-01	Zahlostice - Litoměřice hor.n., železniční svršek							
SO 06-10-01	Litoměřice hor.n. - Liběšice, železniční svršek							
SO 08-10-01	Liběšice - Ústí, železniční svršek							
SO 10-10-01	Ústí - Blíževodky, železniční svršek							
SO 12-10-01	Blíževodky - Zahradky u České Lípy, železniční svršek							
SO 20-13-01	Výstroj trati							
E.1.1.2	Železniční spodek							
SO 03-11-01	ZST Zahlostice, železniční spodek							
SO 04-11-01	Zahlostice - Litoměřice hor. n., železniční spodek							
SO 06-11-01	Litoměřice hor. n. - Liběšice, železniční spodek							
SO 08-11-01	Liběšice - Ústí, železniční spodek							
SO 10-11-01	Ústí - Blíževodky, železniční spodek							
SO 12-11-01	Blíževodky - Zahradky u České Lípy, železniční spodek							
E.1.2	Nástupišť							
SO 03-14-01	ZST Zahlostice, nástupíště							
SO 06-14-01	Zast. Třmovany u Litoměřic, nástupíště							
E.1.3	Železniční přejezdy							
SO 02-15-01	Zel. přjezd v ev. km 40,081, úprava zel. přjezdu							
SO 04-15-01	Zel. přjezd v ev. km 40,800, úprava zel. přjezdu							
SO 04-15-02	Zel. přjezd v ev. km 41,487, úprava zel. přjezdu							
SO 04-15-03	Zel. přjezd v ev. km 41,715, úprava zel. přjezdu							
SO 06-15-02	Zel. přjezd v ev. km 44,267, úprava zel. přjezdu							
SO 06-15-03	Zel. přjezd v ev. km 44,691, úprava zel. přjezdu							
SO 06-15-04	Zel. přjezd v ev. km 45,442, úprava zel. přjezdu							
SO 06-15-05	Zel. přjezd v ev. km 46,827, úprava zel. přjezdu							
SO 06-15-06	Zel. přjezd v ev. km 47,498, úprava zel. přjezdu							
SO 06-15-07	Zel. přjezd v ev. km 47,949, úprava zel. přjezdu							
SO 06-15-10	Zel. přjezd v ev. km 54,358, úprava zel. přjezdu							
SO 06-15-11	Zel. přjezd v ev. km 55,163, úprava zel. přjezdu							
SO 06-15-13	Zel. přjezd v ev. km 55,751, úprava zel. přjezdu							
SO 06-15-14	Zel. přjezd v ev. km 56,944, úprava zel. přjezdu							
SO 06-15-15	Zel. přjezd v ev. km 57,226, úprava zel. přjezdu							
E.1.4	Mosty, propustky, zdi							
SO 02-21-01	Železniční propustek v ev. km 40,085							
SO 03-21-01	Železniční propustek v ev. km 40,116							
SO 03-21-03	Železniční propustek v ev. km 40,589							
SO 04-20-01	Železniční most v ev. km 42,604 - přestavba na propustek							
SO 04-21-01	Železniční propustek v ev. km 40,903							
SO 04-21-03	Železniční propustek v ev. km 41,354							
SO 04-21-04	Železniční propustek v ev. km 41,527							
SO 04-21-05	Železniční propustek v ev. km 41,721							
SO 04-21-06	Železniční propustek v ev. km 42,128							
SO 04-21-07	Železniční propustek v ev. km 42,423							
SO 06-20-03	Železniční most v ev. km 50,058							
SO 06-20-04	Železniční most v ev. km 50,306 - přestavba na propustek							
SO 06-20-05	Železniční most v ev. km 51,311							
SO 06-21-04	Železniční propustek v ev. km 45,999							
SO 06-21-05	Železniční propustek v ev. km 46,058							
SO 06-21-07	Železniční propustek v ev. km 47,200							
SO 06-21-10	Železniční propustek v ev. km 47,836							
SO 06-21-11	Železniční propustek v ev. km 47,951							
SO 06-21-23	Železniční propustek v ev. km 54,427							
SO 06-21-28	Železniční propustek v ev. km 55,758							
SO 06-21-29	Železniční propustek v ev. km 55,978							
SO 06-21-34	Železniční propustek v ev. km 57,407							
SO 08-20-02	Železniční most v ev. km 61,051							
SO 10-21-28	Železniční propustek v ev. km 68,825							
SO 12-21-06	Železniční propustek v ev. km 70,579							
SO 12-21-09	Železniční propustek v ev. km 71,230							
SO 12-21-12	Železniční propustek v ev. km 71,970							
SO 12-21-35	Železniční propustek v ev. km 78,732							
SO 14-20-07	Demolice zel. mostu v ev. km 83,475							
E.1.5	Ostatní inženýrské objekty							
SO 20-70-01	Lovosice - Česká Lípa, úprava a ochrana sdělovacího vedení CETIN							
SO 20-70-02	Lovosice - Česká Lípa, úprava a ochrana sdělovacího vedení TUDC							
SO 20-70-03	Lovosice - Česká Lípa, úprava a ochrana zabezpečovacího vedení SSZT							
SO 20-71-01	Lovosice - Česká Lípa, úprava a ochrana sdělovacího vedení ČEZ Distribuce							
SO 20-71-02	Lovosice - Česká Lípa, úprava a ochrana sdělovacího vedení SCVK							
SO 20-71-03	Zahlostice - Litoměřice hor.n., úprava a ochrana sdělovacího vedení Lovochemie							
E.1.6	Potrubi vedení							
SO 05-75-01	ZST Litoměřice hor. n., úprava vpustí							
SO 20-73-01	Lovosice - Česká Lípa, úprava a ochrana vedení vodovodu SCVK							
SO 20-74-01.1	Lovosice - Česká Lípa, úprava a ochrana vedení plynovodu							
SO 20-74-01.2	Lovosice - Česká Lípa, úprava a ochrana vedení plynovodu - Dokumentace							
SO 20-75-01	Lovosice - Česká Lípa, úprava a ochrana vedení kanalizace SCVK							
SO 20-76-01	Lovosice - Česká Lípa, úprava a ochrana vedení teplovodu ENERGE Holding							
E.1.8	Pozemní komunikace							
SO 05-30-01	ZST Litoměřice h.n., přístupový chodník k VB							
SO 05-30-02	ZST Litoměřice h.n., úpravy komunikací							
E.2	Pozemní stavební objekty							
SO 01-40-01	ZST Lovosice, úprava dřevěného stáje							
SO 03-40-01	ZST Zahlostice, stavební úprava							
SO 03-41-01	ZST Zahlostice, přístup pro cestující							
SO 03-43-01	Zahlostice, orientační systém							
SO 05-44-02	ZST Litoměřice h.n., demolice							
SO 06-41-01	Zast. Třmovany u Litoměřic, přístup pro cestující							
SO 06-43-01	Zast. Třmovany u Litoměřic, orientační systém							
E.3.4	Ohřev výměn (elektrický - EO, plynový - POV)							

SO 03-61-01	ZST Zahlostice, ECOV						
SO 11-61-01	ZST Blíževodly, ECOV						
E.3.6							
SO 03-63-01	ZST Zahlostice, přípojka NN						
SO 03-63-02	ZST Zahlostice, venkovní osvětlení						
SO 04-63-02	Zahlostice - Litoměřice hor. n., rekonstrukce přípojky NN pro PZZ přejezdu ev. km 41,487						
SO 04-63-03	Zahlostice - Litoměřice hor. n., přípojka NN pro PZZ přejezdu ev. km 41,715						
SO 05-63-02	ZST Litoměřice horní n., venkovní osvětlení						
SO 05-63-03	ZST Litoměřice horní n., úpravy osvětlení						
SO 06-63-04	Litoměřice hor. n. - Liběšice, přípojka NN pro PZZ přejezdu ev. km 45,442						
SO 06-63-05	Litoměřice hor. n. - Liběšice, přípojka NN pro PZZ přejezdu ev. km 46,827						
SO 06-63-07	Litoměřice hor. n. - Liběšice, přípojka NN pro PZZ přejezdu ev. km 47,949						
SO 06-63-10	Litoměřice hor. n. - Liběšice, rekonstrukce přípojky NN pro PZZ přejezdu ev. km 54,358						
SO 06-63-11	Litoměřice hor. n. - Liběšice, přípojka NN pro PZZ přejezdu ev. km 55,163						
SO 06-63-13	Litoměřice hor. n. - Liběšice, přípojka NN pro PZZ přejezdu ev. km 55,751						
SO 06-63-14	Litoměřice hor. n. - Liběšice, přípojka NN pro PZZ přejezdu ev. km 56,944						
SO 06-63-15	Litoměřice hor. n. - Liběšice, přípojka NN pro PZZ přejezdu ev. km 57,226						
SO 06-63-17	Zast. Třemořany u Litoměřic, venkovní osvětlení						
SO 06-63-19	Zast. Pšovské, venkovní osvětlení						
SO 06-63-21	Zast. Horní Rapče, venkovní osvětlení						
SO 08-63-03	Liběšice - Ústě, přípojka NN pro PZZ přejezdu ev. km 59,696						
SO 10-63-08	Ústě - Blíževodly, přípojka NN pro PZZ přejezdu ev. km 67,487						
SO 12-63-07	Blíževodly - Zahradky u České Lípy, přípojka NN pro PZZ přejezdu ev. km 74,557						
SO 12-63-09	Blíževodly - Zahradky u České Lípy, přípojka NN pro PZZ přejezdu ev. km 76,078						
SO 12-63-10	Blíževodly - Zahradky u České Lípy, přípojka NN pro PZZ přejezdu ev. km 76,540						
SO 12-63-11	Blíževodly - Zahradky u České Lípy, přípojka NN pro PZZ přejezdu ev. km 77,012						

Příloha č. 2 (příloha č. 4 Smlouvy)
Harmonogram postupu prací

AKCE: REVITALIZACE TRATI LOVOSICE - ČESKÁ LIPA

[illegible]

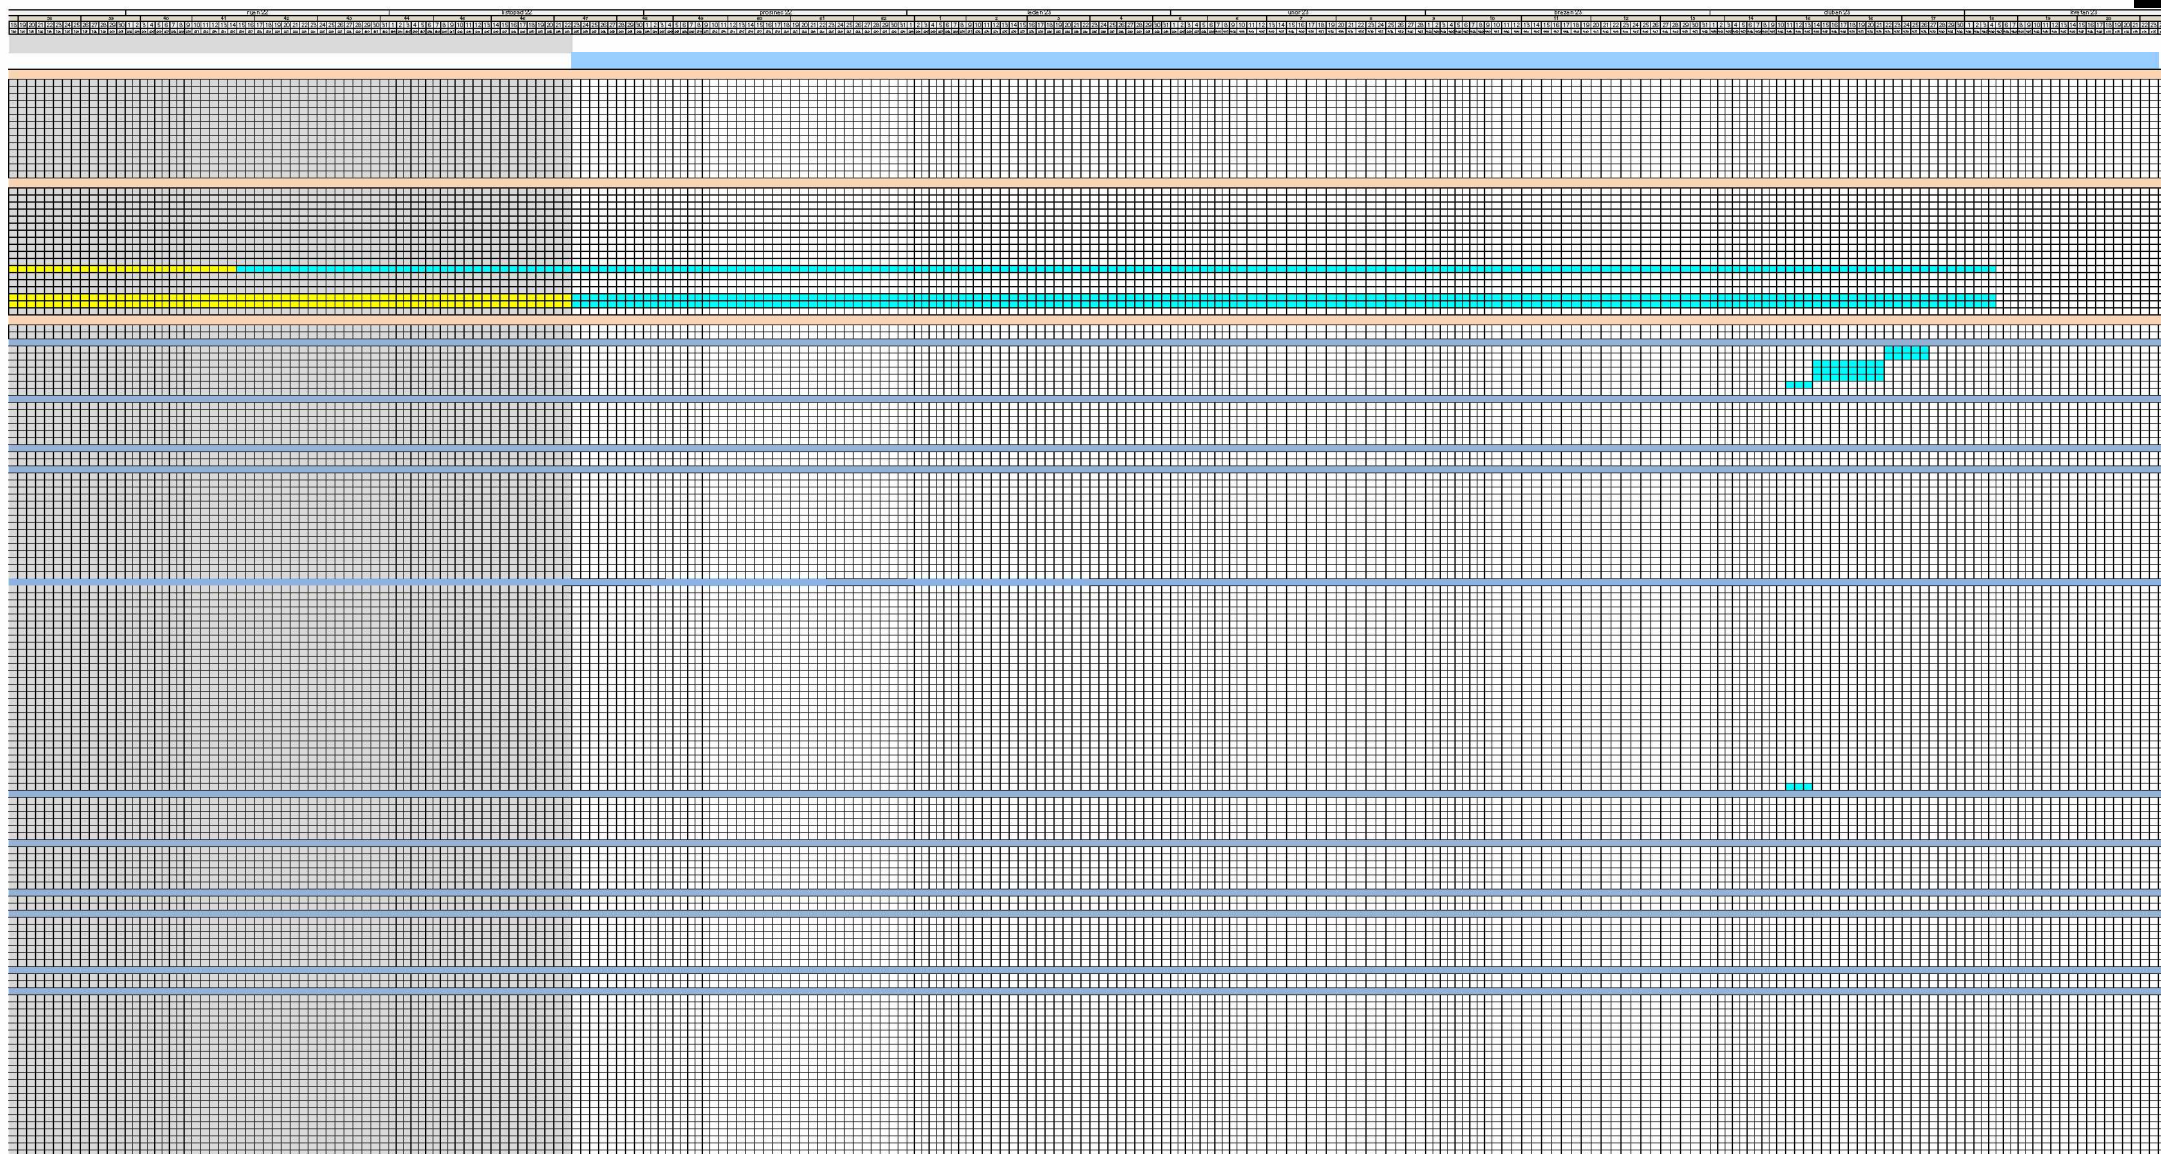

[illegible]

Příloha č. 3

Žádost Zhotovitele o změnu bankovního spojení



AŽD Praha s.r.o.
Ředitelství společnosti
Právní odbor
Žirovnická 3146/2
Záběhllice
106 00 Praha 10
Tel.: +420 267 287 111
E-mail: info@azd.cz

Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1 - Nové Město

K rukám: [REDACTED]

datovou schránkou

VÁŠ DOPIS ZNAČKY ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
[REDACTED]

VYŘIZUJE/TELEFON
[REDACTED]
[REDACTED]

DATUM
21. 11. 2022

Smlouva o dílo na zhotovení stavby „Revitalizace trati Lovosice – Česká Lípa“

Žádost o změnu bankovního spojení

Vážení,

v souladu s obchodními podmínkami smlouvy o dílo na zhotovení stavby „Revitalizace trati Lovosice – Česká Lípa“ Vás žádáme o změnu bankovního spojení uvedeného v záhlaví smlouvy o dílo.

Nové bankovní spojení je: [REDACTED]

Tento účet bude používán v platebním styku dle Smlouvy o dílo.

S pozdravem

[REDACTED]

[REDACTED]

právník
AŽD Praha s.r.o.

