

Česká televize

IČO: 00027383

a

ELVIA – PRO, spol. s r. o.

IČO: 45243042

Smlouva o dílo – Dodatek č. 7

č. 1082584/234

Předmět smlouvy: Prodloužení délky Fáze 2.1 a posunutí následných fází II. Etapy při zachování veškerého rozsahu Smlouvy a nezměněném předmětu plnění a ceny Díla

Cena, případně hodnota: 7.345.471,- EUR bez DPH

Datum uzavření: **10-04-2017**

Dodatek č. 7

**ke Smlouvě o dílo evidované objednatelem pod č. 1068356/234 a
zhotovitelem pod č. 12/30/0038, uzavřené dne 17. 3. 2015
ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30. 6. 2015, Dodatku č. 2 ze dne 10. 11. 2015,
Dodatku č. 3 ze dne 29. 1. 2016, Dodatku č. 4 ze dne 29. 3. 2016
a Dodatku č. 5 ze dne 17. 6. 2016 a Dodatku č. 6 ze dne 25. 11. 2016**

Smluvní strany**Česká televize**

se sídlem: Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4

IČ: 00027383, DIČ: CZ00027383

zřízená zákonem č. 483/1991 Sb., o České televizi

nezapisuje se do obchodního rejstříku

bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., Budějovická 1518/13b, 140 00 Praha 4, č. účtu: 1698682/0800

IBAN: CZ60 0800 0000 0000 0169 8682

SWIFT (BIC) kód: GIBACZPX

zastoupená: Petrem Dvořákem, generálním ředitelem

(dále jen „**Objednatel**“)

a

ELVIA – PRO, spol. s r. o.

se sídlem: U Elektry 203/8, 198 00 Praha 9

IČ: 45 24 30 42, DIČ: CZ 45 24 30 42

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. značka C 6666

bank. spojení: Sberbank CZ, a. s., č. účtu 1200281489/6800

zastoupená: Viktorem Novákem, jednatelem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(dále společně také „**Strany**“ či jednotlivě „**Strana**“),

uzavírají níže uvedeného dne měsíce a roku tento Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo evidované objednatelem pod č. 1068356/234 a zhotovitelem pod č. 12/30/0038, uzavřené dne 17. 3. 2015 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30. 6. 2015, Dodatku č. 2 ze dne 10. 11. 2015, Dodatku č. 3 ze dne 29. 1. 2016, Dodatku č. 4 ze dne 29. 3. 2016, Dodatku č. 5 ze dne 17. 6. 2016 a Dodatku č. 6 ze dne 25. 11. 2016 na základě veřejné zakázky pod názvem „Serverová technologie pro výrobu a vysílání zpravodajství, sportu a publicistiky“ (dále jen „**Smlouva**“).

I. Úvodní ustanovení

1. Vzhledem k tomu, že zadávací řízení „Serverová technologie pro výrobu a vysílání zpravodajství, sportu a publicistiky“, jehož výsledkem bylo uzavření Smlouvy, bylo zahájeno před 1. 1. 2014, tj. před účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a vzhledem k tomu, že v návaznosti na skutečnosti uvedené v předchozí části této věty, byla Smlouva uzavřena podle předchozích právních předpisů - zejména podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění platném

do 1. 1. 2014, v souladu se zákonným opatřením č. 341/2013 Sb., a zákonem č. 303/2013 Sb., v platném znění, je i tento Dodatek č. 7 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 7“) uzavřen podle předpisů účinných před nabytím účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník čili zejména podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění platném do 1. 1. 2014.

- Dodatek č. 7 je uzavírán na základě dohody smluvních stran ze závažných provozních a organizačních důvodů na straně Objednatele, kdy Objednatel vyhodnotil, že interní analýza a revize požadavků Objednatele, jejichž cílem je optimalizace resp. úprava a rozšíření řešení, realizovaného v rámci I. Etapy, a na to bezprostředně navazující analýza proveditelnosti těchto požadavků v rámci realizace II. Etapy, vyžaduje prodloužení délky Fáze 1 (Projektová příprava) a tím vyvolané posunutí následných fází II. Etapy.
- Účelem uzavření Dodatku č. 7 je při zachování veškerého rozsahu Smlouvy a nezměněném předmětu plnění a ceny Díla prodloužení Fáze 1 II. Etapy Projektu.

II. Předmět Dodatku č. 7

- V Příloze č. 4 Smlouvy – Rámcový harmonogram realizace se ruší tabulka „Členění II. Etapy na Fáze“ (strana 33 Smlouvy) a nahrazuje se novou verzí v následující podobě:

Fáze	Náplň fáze	Ukončení fáze – milník	Týden	Délka Fáze
2.1	Projektová příprava	Akceptace Prováděcího projektu II. Etapy	99 – 112 (1 - 14)	14 týdnů
2.2	Realizace II. Etapy	Akceptace řešení, dodaného ve II. Etapě	113 – 134 (15 - 36)	22 týdnů
2.3	Školení	Zaškolení školitelů a klíčových uživatelů Uvedení řešení, dodaného ve II. Etapě, do zkušebního provozu	135 – 137 (37 - 39)	3 týdny
2.4	Zkušební provoz	Ukončení zkušebního provozu řešení, dodaného ve II. Etapě	138 – 145 (40 - 47)	8 týdnů
2.5	Přechod do provozu	Uvedení řešení, dodaného ve II. Etapě, do produktivního provozu	146 – 148 (48 - 50)	3 týdny
2.6	Ukončení II. Etapy	Předání a převzetí řešení, dodaného ve II. Etapě		-
Celková doba trvání II. Etapy				50 týdnů

- V Příloze č. 4 Smlouvy – Rámcový harmonogram realizace se ruší tabulka „Rekapitulace realizace Díla“ (strana 35 Smlouvy) a nahrazuje se novou verzí tabulky v následující podobě:

Etapa	Orientační časové vymezení (*)	Týden	Délka
I. Etapa	březen 2015 – srpen 2016	1-72	72 týdnů
Přerušování mezi I. a II. Etapou	srpen 2016 – leden 2017	73-98	26 týdnů
II. Etapa	únor 2017 – leden 2018	99-148	50 týdnů
Celková doba trvání realizace Díla			148 týdnů

3. V Příloze č. 4 Smlouvy – Rámcový harmonogram realizace se ruší „Rámcový harmonogram realizace v grafické podobě“ v části týkající se II. Etapy (strana 36 Smlouvy) a nahrazuje se novou verzí, která tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 7.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění. Dodatek č. 7 je platný podpisem smluvních stran a účinný dnem uveřejnění v registru smluv. O dni uveřejnění bude Objednatel neprodleně informovat Zhotovitele.
2. Dodatek č. 7 je vypracován v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek č. 7 a Smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 7 je následující příloha:

Příloha č. 1 Dodatku č. 7 - Příloha č. 4 Smlouvy	Rámcový harmonogram realizace v grafické podobě
--	---

5. Strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 7 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Zhotovitel:

V Praze dne

10. 4. 2017


ELVIA – PRO, spol. s r. o.
Viktor Novák, jednatel

Objednatel:

V Praze dne

7 -04- 2017

Česká televize
Petr Dvořák, generální ředitel

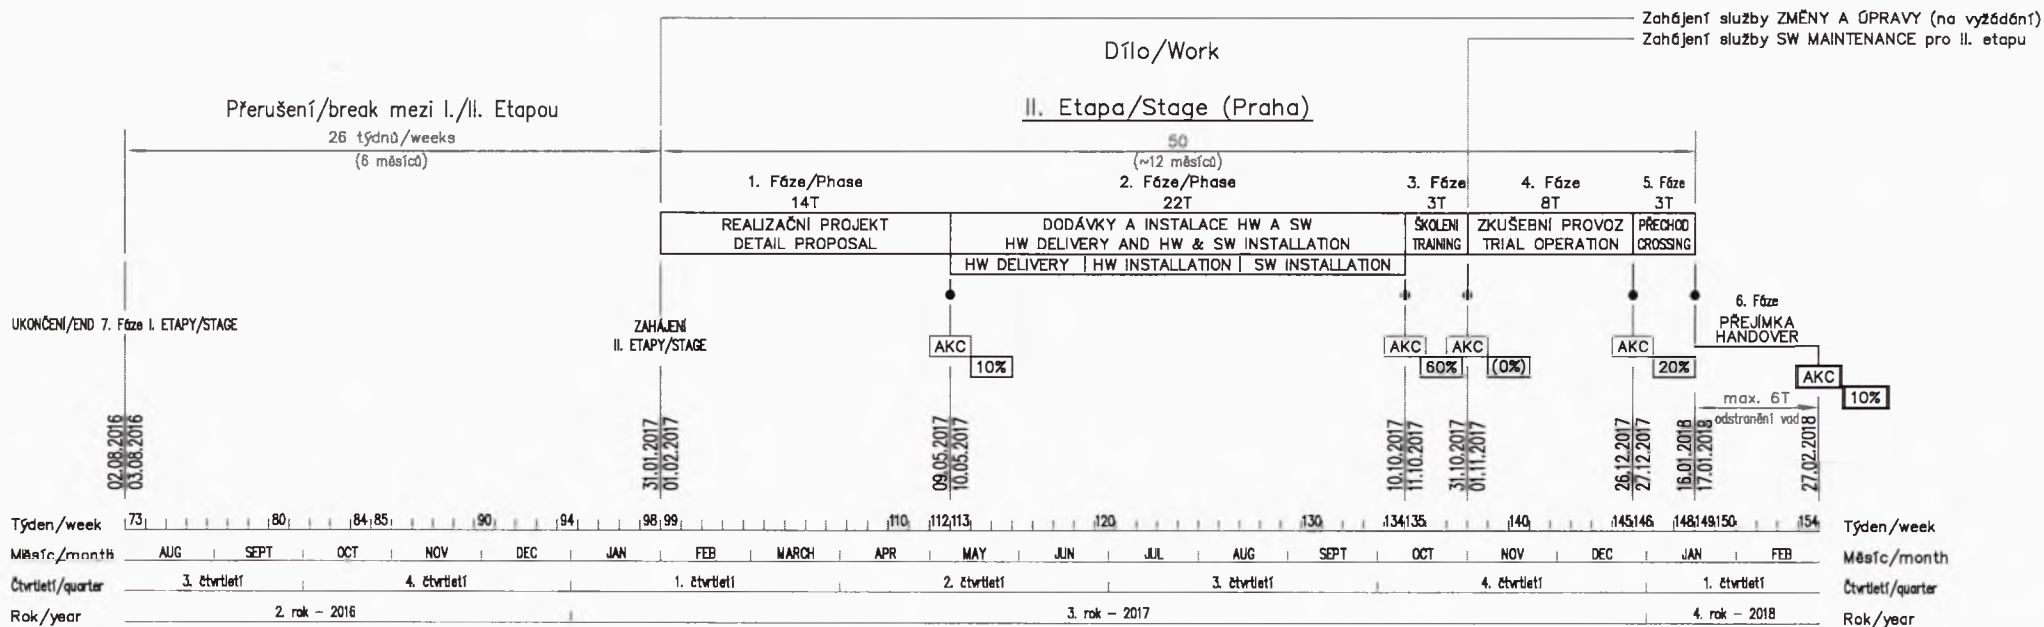

Poznámka/note:

Zjednodušeno/simplified - 1 rok/year = 12 měsíců/months = 52 týdnů/weeks
Měřítko/scale tisku: 1T = 4 mm

Legenda:

- AKC mlňtík (akceptace Fáze) x% díleč platba/partial payment
AKC mlňtík (akceptace Etapy) x% doplatek/final payment

ZAKÁZNIK: ČESKÁ TELEVIZE Praha	NÁZEV AKCE: Serverová technologie pro výrobu a vysílání zpravodajství, sportu a publicistiky (DNPS II)	ZAKÁZKA: 12/30/0038 STUPEŇ: RD DAT. VZHNIKU: březen 2015
DODAVATEL: ELVIA - PRO spol. s r. o. Praha	NÁZEV VÝKRESU: RAMCOVÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM ČT PRAHA II. ETAPA	DAT. REVIZE: 27.03.2017 ČÍSLO PROJEKTU: S288-104b
	MĚŘITKO: x	FORMÁT: 2x A4 (A3)
