

č.: 2023/4651/OŽP/3

## Dohoda o ukončení smlouvy o dílo

uzavřené dne 13.09.2022 podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
evidováno u objednatele pod č. 2022/4526/OŽP/14 a u zhotovitele pod č.2100-22000404

### Smluvní strany

#### Objednatel:

**Statutární město Brno, Městská část Brno-sever**

se sídlem Bratislavská 70, 601 47 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

bankovní spojení: [REDAKCE]

účet č.: [REDAKCE]

**zastoupen** Mgr. Martinem Malečkem, starostou

**kontakt:** [REDAKCE] tel.č. [REDAKCE]

ve věcech smluvních: [REDAKCE] místostarosta RMČ Brno-sever, tel.č. [REDAKCE]

e-mail: [REDAKCE]

ve věcech technických: [REDAKCE], vedoucí OŽP, tel.č. [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]

číslo smlouvy objednatele: 2022/4526/OŽP/14

a

#### Zhotovitel:

**Brněnské komunikace a.s.**

se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice

IČO: 60733098

DIČ: CZ60733098

bankovní spojení: [REDAKCE]

účet č.: [REDAKCE]

zapsán dne 1. 1. 1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479

**zastoupen** [REDAKCE] generálním ředitelem

ve věcech běžného plnění smlouvy

[REDAKCE], provozním ředitelem

[REDAKCE] vedoucím střediska zimní a letní údržby

[REDAKCE] mistrem

číslo smlouvy zhotovitele: 2100-22000404

*smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto dohodu o ukončení výše označené smlouvy o dílo na akci s názvem „Oprava chodníku při ulici Marie Majerové“:*

I.

Předmětem smlouvy o dílo uzavřené dne 13.09.2022 mezi smluvními stranami (dále jen smlouva) je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavební práce – opravu chodníku při ulici Marie Majerové spočívající v předlažbě chodníku včetně pokládky betonových obrub a zřízení vsakovací jímky, a to dle podmínek této smlouvy a v termínu do 31.10.2022.

II.

Smluvní strany shodně konstatují, že na pozemku p.č. 1290/3, k.ú Lesná byly zjištěny sítě, které neumožňují umístit vsakovací zařízení, nutné pro řádné odvodnění plochy.

III.

Vzhledem ke zjištění uvedenému v čl. II. této dohody, nemohlo být zhotoviteli předáno staveniště a zhotovitel nemohl započít stavební práce a plnit závazek ze smlouvy.

Z důvodu nemožnosti plnění závazků z uzavřené smlouvy na základě dosavadní dokumentace a podkladů, se smluvní strany dohodly na ukončení smlouvy dohodou ke dni zveřejnění této dohody v registru smluv.

Smluvní strany konstatují, že ke dni ukončení smlouvy nemají vůči sobě žádných závazků ani pohledávek z uzavřené smlouvy a nemají vůči sobě žádné finanční nároky.

IV.

Tato dohoda bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této dohody v registru smluv zajistí objednatel bezodkladně po podpisu této dohody oběma smluvními stranami.

Tato dohoda nabývá účinnosti dnem zveřejnění dohody v registru smluv.

Objednatel i zhotovitel jsou povinni dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.


Smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a prohlašují, že je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, a na důkaz svobodné a vážně projevené vůle níže připojují svoje podpisy.

Uzavření této dohody bylo schváleno na 9/5. schůzi Rady městské části Brno-sever konané dne 14.12.2022, usnesením č. 46 (2ah)


V Brně dne 27.01.2023

V Brně dne 27-01-2023

za objednatele:



místostarosta městské části Brno-sever

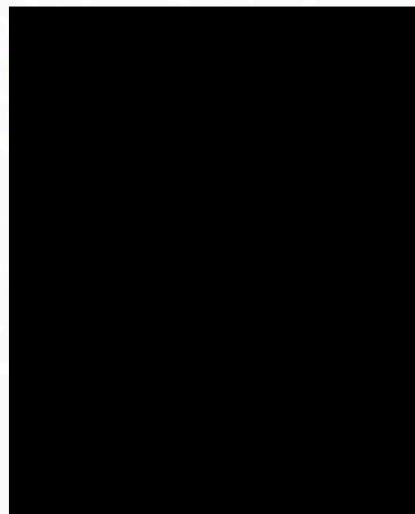

13  
A  
B
