

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení Projektové dokumentace a Stavby

Název projektu:

„GSM-R Pardubice – Hradec Králové – Jaroměř“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín

Adresa pro doručování faktur:

- v listinné podobě na adresu: Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm

číslo smlouvy: **E618-S-4277/2020/PH**

ISPROFOND: **500 352 0094**

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel:

Kontron Transportation s.r.o.

se sídlem: Praha 8, Ke Štvanici 656/3, PSČ 186 00

IČO: 45311005, DIČ: CZ45311005

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 8707
bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: **Ing. Petrem Vítkem**, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:

Kontron Transportation s.r.o., Praha 8, Ke Štvanici 656/3, PSČ 186 00

číslo smlouvy Zhotovitele: **2020/VIT/1311**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

společně dále jako „**smluvní strany**“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 jsou následující skutečnosti:

1. Úprava Definice sekcí a Postupných závazných milníků a s tím související úprava Přílohy č. 4 Smlouvy – Harmonogram postupu prací.

- 1) Dne 20. 12. 2020 Správce stavby stanovil v souladu s Pod-čl. 8.1 Smluvních podmínek pokynem č. 1 Zhotoviteli datum zahájení prací na Díle na 15. 1. 2021.
- 2) Zhotovitel dopisem ze dne 29. 1. 2021 vyrozuměl Správce stavby ve smyslu Pod-čl. 20.1 odst. 1 Smluvních podmínek o skutečnosti, že mu vzniká nárok na prodloužení Doby pro dokončení Sekce 1, a to z důvodu, že mu ke dni zahájení prací nebylo předáno vydané pravomocné územní rozhodnutí. Vzhledem k této skutečnosti nemohl Zhotovitel provádět Dílo v rozsahu a způsobem předpokládaným Smlouvou a Harmonogramem. Zhotovitel dále tvrdil, že s ohledem na absenci pravomocného územního rozhodnutí nemůže provádět Dílo v celém rozsahu, zejména s ohledem na skutečnost, že zhotovení projekčních a navazujících realizačních prací je podmíněno právě vydáním předmětného územního rozhodnutí.
- 3) Oznámením Správce stavby ze dne 14. 7. 2021 byl Zhotovitel vyrozuměn o skutečnosti, že územní rozhodnutí, č. j. KUKHK-21667/UP/2020 bylo dne 20. 5. 2021 vydáno a dne 22. 6. 2021 nabylo právní moci.
- 4) Dne 21. 7. 2021 předložil Zhotovitel Správci stavby na základě Pod-čl. 20.1 odst. 5 Smluvních podmínek detailní claim, ve kterém Zhotovitel specifikoval konečnou délku prodloužení Doby pro dokončení Sekce 1. Prodloužení Doby pro dokončení Sekce 1 činí dle Zhotovitele celkem 180 dní, tj. období mezi dnem zahájení prací na Díle stanoveným Pokynem č. 1 ke dni 15. 1. 2021 a dnem oznámení Správce stavby o právní moci předmětného územního rozhodnutí ze dne 14. 7. 2021.
- 5) Předmětné prodloužení Doby pro dokončení Sekce 1 bylo zapříčiněno nedodáním části Díla společností SUDOP PRAHA a.s. dle podepsané Smlouvy o Dílo na Záměr projektu a Dokumentace pro územní řízení: GSM-R Pardubice – Hradec Králové – Jaroměř, číslo Objednatele: E618-S-2435/2018. Část díla spočívající v „Zajištění územních rozhodnutí a předání celého Díla“ měla být odevzdána nejpozději k datu zahájení prací, tj. 15. 1. 2021, avšak k jejímu předání došlo až dne 1. 7. 2021.
- 6) Zpoždění Zhotovitele bylo tedy způsobeno nedodáním části díla (viz. bod 5) společností SUDOP PRAHA a.s. Příčina tohoto zpoždění je dle Smluvních podmínek rizikem Objednatele na základě Pod-čl. 1.13 Smluvních podmínek. Předmětné zpoždění nebylo pokryto časovými rezervami harmonogramu a rovněž se nenacházelo na kritické cestě provádění Díla.
- 7) Výše zmíněným došlo k nedodržení Pod-čl. 1.13 Smluvních podmínek, které stanovují Objednateli povinnost získat územní nebo podobná povolení pro Stavbu a jakákoli další povolení popsaná v Požadavcích objednatel jako povolení, která měl (nebo má) získat Objednatel; a Objednatel musí Zhotovitele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v důsledku toho, že se to Objednateli nepodařilo. S ohledem na zmíněné, je Zhotovitel na základě Pod-čl. 8.4 písm. (e) Smluvních podmínek oprávněn k prodloužení Doby pro dokončení Sekce 1 na základě jakéhokoliv zpoždění, překážky nebo omezení přičitatelným Objednateli. **Objednatel uznává Zhotovitelův nárok na prodloužení Doby pro dokončení Sekce 1 jako oprávněný, a to v celém rozsahu.**
- 8) Účelem tohoto dodatku č. 1 je úprava článku 18 Smlouvy, Přílohy č. 4 Smlouvy (Harmonogram postupu prací) a Pod-čl. 1.1.5.6 (Definice sekcí) a Pod-čl. 4.28 (Postupné závazné milníky) oproti údajům uvedeným v Příloze k nabídce.

- 9) Zhotovitel dále konstatuje, že nenárokuje a ani nebude nárokovat vůči Objednateli náhradu jakýchkoliv souvisejících nákladů Zhotovitele vyplývajících z prodloužení Doby pro dokončení Sekce 1, jež je předmětem tohoto dodatku č. 1, a to včetně daní, cel a jiných poplatků, ke kterým je Zhotovitel případně povinen, rovněž i veškerou případnou náhradu škody, které s tímto prodloužením Doby pro dokončení Sekce 1 věcně souvisí či jiných souvisejících plateb.

2. Úprava označení funkce Projekt manager (hlavní stavbyvedoucí – vedoucí prací).

Zhotovitel dále také požádal Objednatele o změnu označení funkce Projekt manager (hlavní stavbyvedoucí – vedoucí prací) uvedené v Příloze č. 2 Smlouvy tak, aby označení funkce odpovídalo skutečné náplni činnosti, kterou osoba v této funkci vykonává, tedy Projekt managera. Činnost a funkci Stavbyvedoucího zastává jiná oprávněná osoba Zhotovitele, která disponuje rovněž příslušnou autorizací.

3. Zhotovitel dále bere na vědomí, že u Objednatele došlo ke změně jeho korespondenční adresy a dále ke změně způsobu a adresy pro doručování faktur.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, v souladu s ustanovením článku 14 Smlouvy se smluvní strany dohodly na úpravě Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-4277/2020/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 2020/VIT/1311, uzavřené dne 14. 12. 2020, takto:

1) Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly na následující úpravě Pod-čl. 1.1.5.6 a Pod-čl. 4.28 oproti údajům uvedeným v Příloze k nabídce:

1.1.5.6 Definice sekcí

Specifikace jednotlivých Sekcí:

Popis	Doba pro dokončení
Sekce 1 – odevzdání odsouhlasené projektové dokumentace (PDPS) pro provedení výběrového řízení na stavební část ("základy a stožáry") včetně stavebního povolení, případně jiného souhlasného vyjádření Drážního úřadu pro celou stavbu (tedy jak pro technologickou část, tak i pro stavební část)	5 měsíců od Data zahájení prací + 180 dnů
Sekce 2 - ukončení realizace Stavby	13 měsíců od oznámení Objednatelem o dokončení stavební části ("základy a stožáry") realizované v rámci samostatné VZ
Sekce 3 – odevzdání dokumentace skutečného provedení, certifikátu interoperability a všech dalších ze smlouvy vyplývajících dokladů	do 3 měsíců od ukončení realizace Stavby, tj. od vydání Potvrzení o převzetí posledního PS nebo SO Stavby

4.28 Postupné závazné milníky

Pro provádění Díla jsou stanoveny následující milníky:

- odevzdání odsouhlasené projektové dokumentace (PDPS) pro provedení výběrového řízení na stavební část ("základy a stožáry") včetně stavebního povolení, případně jiného souhlasného vyjádření Drážního úřadu pro celou stavbu (tedy jak pro technologickou část, tak i pro stavební část) – **5 měsíce od Data zahájení prací + 180 dnů,**
- ukončení realizace Stavby – **13 měsíců od oznámení Objednatelům o dokončení stavební části ("základy a stožáry") realizované v rámci samostatné VZ,**
- odevzdání dokumentace skutečného provedení, certifikátu interoperability a všech dalších ze smlouvy vyplývajících dokladů – **do 3 měsíců od ukončení realizace Stavby,**

2) Článek 18 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo: - ruší se stávající znění odst. 18 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

18. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky
- Příloha č. 2 Oprávněné osoby
– *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1*
- Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací
– *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1*
- Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů

3) Příloha č. 2 Smlouvy o dílo – Oprávněné osoby

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 2 – Oprávněné osoby. Mění se znění Přílohy č. 2 platné k datu podpisu Smlouvy na znění uvedené v dodatku č. 1, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (současně Přílohou č. 2 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

4) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Harmonogram postupu prací

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 – Harmonogram postupu prací. Mění se znění Přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy na znění uvedené v dodatku č. 1, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 1 (současně Přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání dodatku č. 1 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento dodatek č. 1 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-4277/2020, číslo smlouvy Zhotovitele: 2020/VIT/1311, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky, přičemž každý elektronický obraz dodatku č. 1 má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 (*současně Příloha č. 2 Smlouvy*): Oprávněné osoby
– nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1
Příloha č. 2 (*současně Příloha č. 4 Smlouvy*): Harmonogram postupu prací
– nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1

Za Objednatele:

V Praze

Za Zhotovitele:

V Praze



17.02.2023 14:18
Podepsáno elektronicky

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace



Digitally signed
by I
Date: 2023.01.20
21:54:51 +01'00'

Ing. Petr Vitek
jednatel společnosti
Kontron Transportation s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 2

Oprávněné osoby

Oprávněné osoby Zhotovitele (Pod-článek 6.9 Smluvních podmínek, včetně ředitele stavby dle čl. 5, odst. (1) bod g. směrnice SŽDC SM105 Změny během výstavby)

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Ředitel stavby

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Projekt manager

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Odpovědný projektant

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Stavbyvedoucí

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Rádiový plánovač

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista (vedoucí prací pro systémové části GSM-R (NSS a BSS specialisté)

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista (vedoucí prací na) pro pokládku a montáž metalických optických kabelů

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista (vedoucí prací) na sdělovací zařízení

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista (vedoucí prací) na silnoproud

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Osoba odpovědná za kontrolu kvality

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██
Telefon	████████████████████

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██
Telefon	████████████████████


Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██
Telefon	████████████████████

PŘÍLOHA Č. 4

Harmonogram prací

Název stavby: GSM-R Pardubice - Hradec Králové - Jaroměř

Název práce / činnosti	Doba trvání (ve dnech)	Předpokládaný začátek	Předpokládaný konec
		(ve dnech)	(ve dnech)
Zahájení prací	0	1	1
Pravomocné územního rozhodnutí odevzdané objednatelem a tím zahájení sekce 1	0	180	180
Přípravné práce	29	180	209
Úvodní porada	0	7	7
Zpracování rádiového plánování	53	181	234
Zpracování projektu stavby, odsouhlasení, projednání	150	181	331
Předání staveniště a provedení stavební části (základy a stožáry)	425	620	1045
PS 101 - 109	614	557	1171
PS 111 Uvedení do provozu, úsek Pardubice – Hradec Králové – Jaroměř	457	958	1415
PS 121 Přenosové zařízení, úsek Pardubice – Hradec Králové – Jaroměř	554	557	1111
PS 201 - 202	614	557	1171
PS 211 Uvedení do provozu, úsek Praskačka – Hradec Králové	457	958	1415
PS 221 Přenosové zařízení, úsek Praskačka – Hradec Králové	554	557	1111
PS 301 ŽST Předměřice nad Labem, EZS	427	774	1201
PS 302 ŽST Smiřice, EZS	427	774	1201
PS 303 Doplnění DDTS v úseku Pardubice – Hradec Králové – Jaroměř	427	774	1201
PS 601 Doplnění centrálních částí sítě GSM-R	641	774	1415
PS 602 Vybavení hnacích vozidel a uživatelů terminály	641	774	1415
PS 603 Rádiovíky	612	774	1386
PS 611 Úpravy a doplnění zapojovačů v úseku Pardubice – Jaroměř	644	557	1201
PS 701 POK v úseku Praskačka – Hradec Králové	404	462	866
PS 702 Doplnění MK v ŽST Předměřice nad Labem	404	462	866
PS 703 Doplnění MK v ŽST Smiřice	404	462	866
SO 801 Přechody mostních objektů v úseku Praskačka – Hradec Králové	309	557	866
SO 811 Doplnění klimatizací v úseku Pardubice – Hradec Králové – Jaroměř	246	774	1020
SO 812 Úpravy rozvodů NN v ŽST	246	774	1020
SO 98-98 Všeobecný objekt	91	1415	1506
Provedení akceptačního měření	106	1294	1400
Autorský dozor + rezerva	953	462	1415
Dokončení projekční a stavební části	0	1415	1415
Vyhotovení a předání dokumentace projektu	91	1415	1506
Lhůta pro dokončení projektu	1532	0	1532

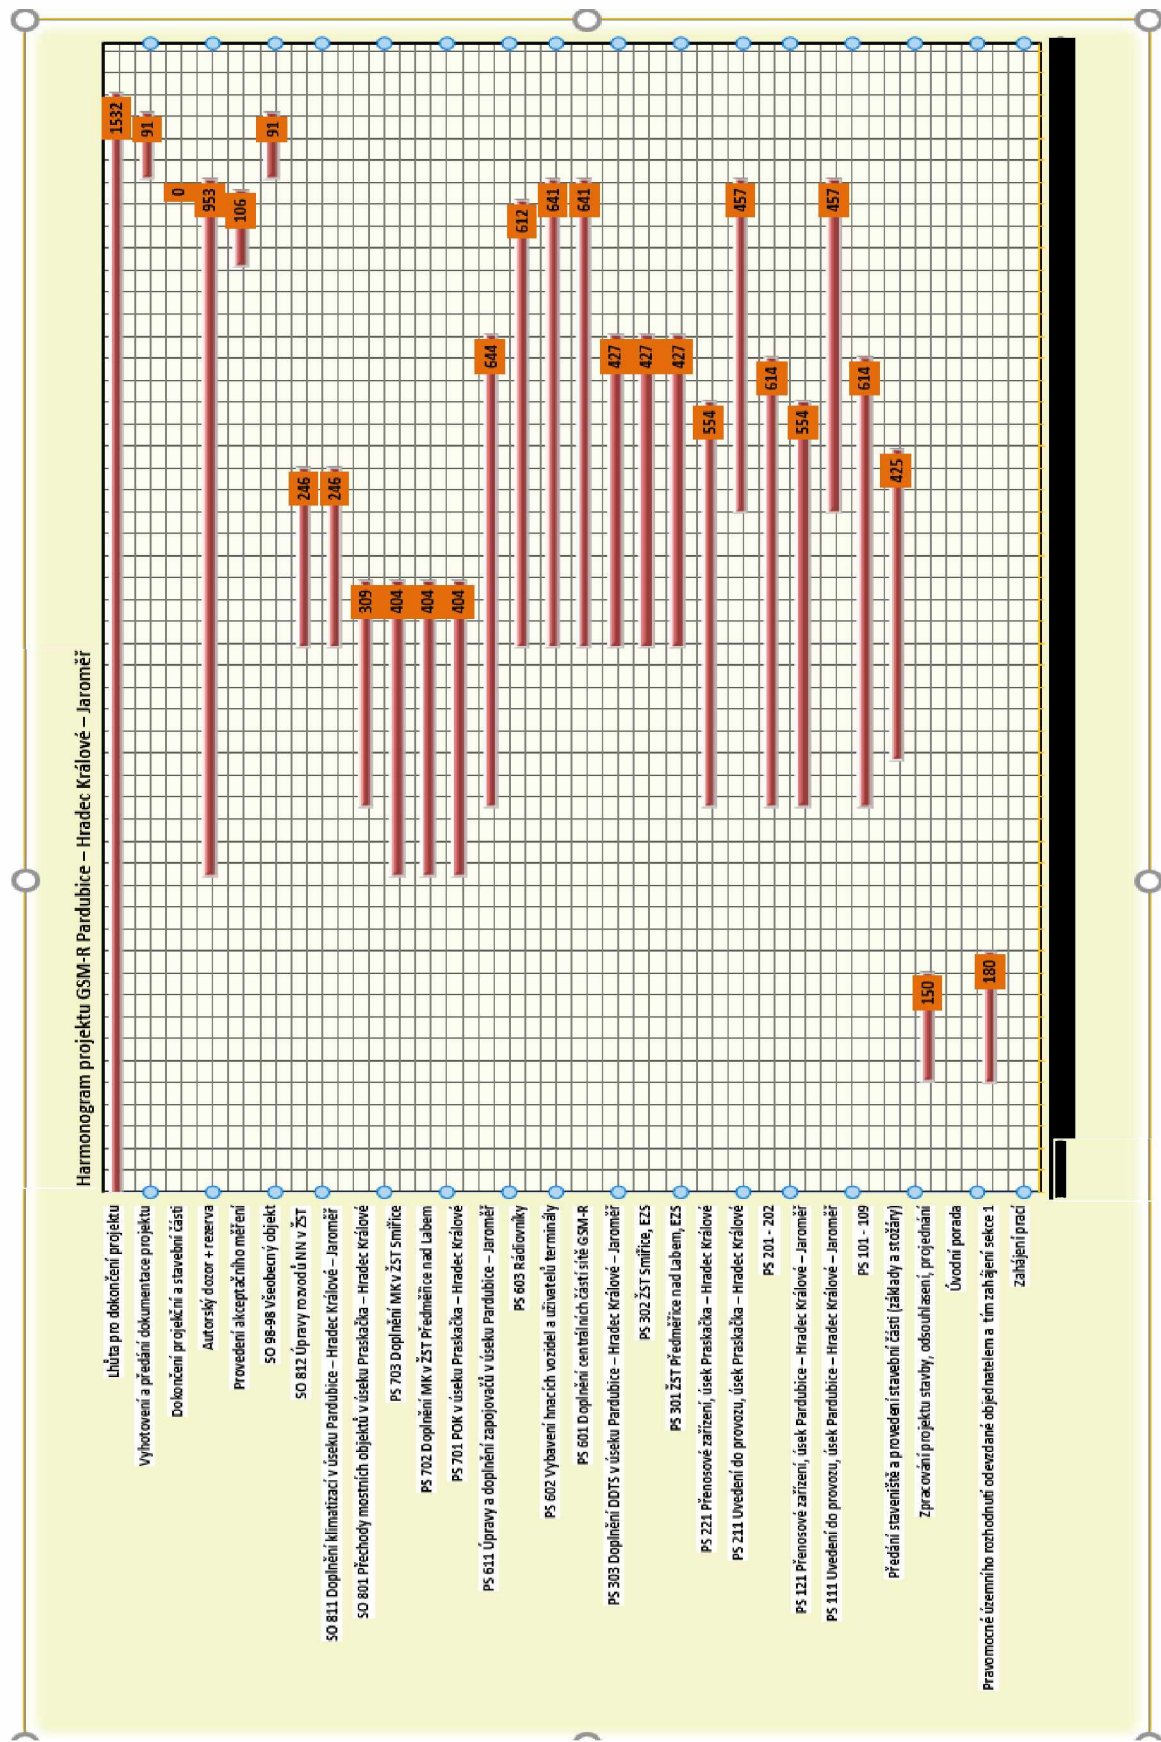

Harmonogram - finanční objemy po měsících

Měsíce	Procenta
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	

