


## Dodatek č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586  
a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění

### I.

#### **Objednatel:**

**Název:** **Krajská zdravotní, a. s.**  
**Sídlo:** Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem  
**Zastoupená:** MUDr. Petrem Malým, MBA, – generálním ředitelem  
**IČ:** 25488627  
**DIČ:** CZ25488627  
**Bankovní spojení:**   
**č. účtu:**  
**telefon, fax:**  
**E-mail:**  
**Zástupce ve věcech technických:**



Osoba oprávněná podepisovat změnové listy: 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550


(dále jen „*Objednatel*“)

a

#### **Zhotovitel:**


**Název:** **Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s.**  
**Vedoucí společník - VW WACHAL a.s.**  
**Sídlo:** Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž  
**Zastoupený:**   
**představenstva**  
**IČ:** 25567225  
**DIČ:** CZ25567225  
**Bankovní spojení:**   
**č. účtu:**

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2976

**Sídlo:** **Společník - Zlínstav a.s.**  
 Bartošova 5532, 760 01 Zlín  
**Zastoupený:**   
**IČ:** 28315669  
**DIČ:** CZ28315669

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5743  
 (dále jen „*Zhotovitel*“)

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“



## II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách ustanovení Smlouvy o dílo na akci „**Nový pavilon Emergency vč. operačních sálu, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a. s. - Nemocnice Děčín, o. z. - stavební práce II.**“ ze dne 22. 9. 2021, včetně znění dodatku č. 1 ze dne 24. 6. 2022 a dodatku č. 2 ze dne 4. 11. 2022 (dále jen smlouva“).

## III.

### Cena díla a platební podmínky

- 1) Smluvní strany se v souladu s výše uvedenou smlouvou dohodly na změně Díla v rozsahu, který je uveden v přílohách č. 1 až 13 tohoto dodatku. Jedná se o celkové navýšení ceny Díla o 8 031 421,44 Kč bez DPH, tj. 9 718 019,95 Kč vč. DPH.
- 2) Smluvní strany mají mezi sebou za nesporné, že při realizaci Díla vyvstala potřeba víceprací a méněprací podrobně specifikovaných v přílohách č. 1 až 13 (viz příslušné změnové listy) tohoto dodatku.
- 3) Strany konstatují, že tyto vícepráce a méněpráce byly Objednatelem odsouhlaseny dle příloh č. 1 až 13 (viz příslušné změnové listy) a Zhotovitelem byly realizovány jako změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 až 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
- 4) Ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ byly v rámci víceprací a méněprací realizovány stavební práce dle příloh č. 1, 6 a 13 tohoto dodatku, tj. změnových listů č. 8, 13 a 22. Celkový součet hodnot všech těchto změn (tj. všech hodnot víceprací a méněprací) činí 1 754 983,91 Kč bez DPH.
- 5) Ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ byly v rámci víceprací a méněprací realizovány stavební práce dle příloh č. 2 až 5 a 7 až 12 (změnové listy č. 9 až 12, 14 až 17, 20 a 21), neboť se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tato nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota změny nepřekročila 50 % původní hodnoty závazku.


Celková hodnota změn (tj. všech hodnot víceprací a méněprací) provedených dle § 222 odst. 6 ZZVZ činí 6 700 255,57 Kč bez DPH

## IV.

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
- 2) Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv.
- 3) Dodatek smlouvy byl podepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu.
- 4) Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sepsán bez jakékoliv tísně a nátlaku podle pravé a svobodné vůle smluvních stran.

Příloha č. 1: Oznámení změny č. 8 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu  
Příloha č. 2: Oznámení změny č. 9 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu  
Příloha č. 3: Oznámení změny č. 10 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu  
Příloha č. 4: Oznámení změny č. 11 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu

Příloha č. 5: Oznámení změny č. 12 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu  
Příloha č. 6: Oznámení změny č. 13 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu  
Příloha č. 7: Oznámení změny č. 14 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu  
Příloha č. 8: Oznámení změny č. 15 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu  
Příloha č. 9: Oznámení změny č. 16 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu  
Příloha č. 10: Oznámení změny č. 17 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu  
Příloha č. 11: Oznámení změny č. 20 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu  
Příloha č. 12: Oznámení změny č. 21 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu  
Příloha č. 13: Oznámení změny č. 22 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu



# Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka
<b>500 080</b>	<b>Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.</b>
Označení rozpočtu	Název rozpočtu
<b>ZL008</b>	<b>D2_03: Provizorní přeložka vodovodu pro zásobování areálu vodou</b>



Název stavby:	<b>Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice</b>
Objednatel:	<i>Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL, Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>ATELIER PENTA v.o.s. Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava</i>
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>	
Celkem (bez DPH)	180 925,85 Kč
DPH	37 994,43 Kč
DPH 21%	37 994,43 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
<b>Cena celkem (včetně DPH)</b>	<b>218 920,28 Kč</b>

**Poznámka:**

**Zakázka:** Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

**Rozpočet:** ZL008: D2\_03: Provizorní přeložka vodovodu pro zásobování areálu vodou

**Typ:** Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
74.	711491172	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně z textilní vrstvy ochranná	m <sup>2</sup>	110,0	52,03	5 723,30 SOD
		Výkaz výměr: 110		110,000		
102.	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	110,0	60,24	6 626,40 SOD
		Výkaz výměr: 110		110,000		
82.	877265218	Montáž elektrozábrany na potrubí z PE trub d 110	kus	2,0	274,49	548,98 SOD
		Výkaz výměr: 2		2,000		
84.	28614_R2	příruha DN 100/PE110	kus	2,0	4 552,12	9 104,24 SOD
		Výkaz výměr: 2		2,000		
25.	871161141	Montáž potrubí z PE SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm	m	79,0	49,57	3 916,03 SOD
		Výkaz výměr: 79		79,000		
26.	28613595	potrubí dvouvrstvé PE s 10% signalizační vrstvou SDR 11 32x3,0 dl 12m	m	86,9	36,36	3 159,68 SOD
		Výkaz výměr: 79*1,1: 'Přepočtené koeficientem množství		86,900		
29.	877161101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 32	kus	8,0	197,68	1 581,44 SOD
		Výkaz výměr: 8		8,000		
43.	891267211	Montáž hydrantů nadzemních do DN 100	kus	1,0	758,95	758,95 SOD
		Výkaz výměr: provizorní přeložka vodovodu		-		
		1		1,000		
58.	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	110,0	48,34	5 317,40 SOD
		Výkaz výměr: provizorní přeložka vodovodu z křižovatky k objektu prádelna, patologie		-		
		110		110,000		
10 068.	44981630	nástavec hydrantový	kus	1,0	6 590,00	6 590,00 ÚRS
		Výkaz výměr: provizorní přeložka vodovodu		-		
		1		1,000		

10 069.	871181141	Montáž potrubí z PE SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 50 x 4,6 mm	m	180,0	85,10	15 318,00	ÚRS
		Výkaz výměr: provizorní přeložka vodovodu z křižovatky k objektu prádelna, patologie 180		-			
10 070.	28613683	potrubí dvouvrstvé PE se signalizační vrstvou SDR11 50x4,6mm dl 12m	m	198,0	100,00	19 800,00	ÚRS
		Výkaz výměr: provizorní přeložka vodovodu z křižovatky k objektu prádelna, patologie 180*1,1		198,000			
10 071.	877181101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 50	kus	8,0	247,00	1 976,00	ÚRS
		Výkaz výměr: provizorní přeložka vodovodu z křižovatky k objektu prádelna, patologie 8		-			
10 072.	28615657	instalační objímka pevná dvoušroubová HTPO DN 50	kus	8,0	29,50	236,00	ÚRS
		Výkaz výměr: provizorní přeložka vodovodu z křižovatky k objektu prádelna, patologie 8		8,000			
10 073.	28616603	objímka z PE plastových trubek D 32mm	kus	8,0	23,30	186,40	ÚRS
		Výkaz výměr: provizorní přeložka vodovodu z křižovatky k objektu prádelna, patologie 8		-			
10 074.	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	259,0	19,40	5 024,60	ÚRS
		Výkaz výměr: natlakování, zkouška a spuštění provizorní vodovodní přípojky DN32; 79 DN50; 180		8,000			
10 075.	722181114	Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy DN 32 a DN 40 mm	m	79,0	120,00	9 480,00	ÚRS
		Výkaz výměr: ochrana přeložky vodovodu izolací proti mrazu 79		-			
10 076.	722181116	Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy DN 50 a DN 65 mm	m	180,0	170,00	30 600,00	ÚRS
		Výkaz výměr: ochrana přeložky vodovodu izolací proti mrazu 180		79,000			
10 078.	X114	Soubor tvarovek pro zapojení provizorního potrubí a ukončení stávajícího	kpl	3,0	2 300,00	6 900,00	R-pol
		Výkaz výměr: Soubor tvarovek pro zapojení provizorního potrubí - Ms, PPr tvarovky, uzavěry pro přepoj 3 ks objektů na provizorní vodovod ukončení stávajícího 3		-			
10 128.	877251213	Montáž T-kusů svařovaných na tupo na vodovodním potrubí z PE trub d 110	kus	2,0	780,00	1 560,00	ÚRS
		Výkaz výměr: zokruhování zásobování vodou; 2		3,000			
10 129.	28615178	T-kus SDR11 PE D 110mm	kus	2,0	1 080,00	2 160,00	ÚRS
		Výkaz výměr: zokruhování zásobování vodou; 2		2,000			



POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

9

Jméno

Podpis

Datum

Pokyn vydán (Správce stavby):

Pokyn obdržén (Zhotovitel):

Předmět změny:

Popis a lokalizace Změny:

Provizorní přeložka vodovodu v jižní a jihozápadní části zájmového území za účelem zachování zásobování areálu vodou.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.



## NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. : 9

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):

Předmět Změny:

D2\_03 Provizorní přeložka vodovodu pro zásobování areálu vodou

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Provizorní přeložka vodovodu za účelem zachování zásobování areálu vodou. Vedení vodovodního potrubí od křižovatky u objektu "D" k objektu prádelny vč. napojení na provizorní hydrant, vyhotovení prostupů do třech objektů a jejich napojení (zokruhování vodovodního vedení).

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem


Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

180 925,85 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P-12) pokrývající tyto položky.

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.		P11
<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<b>Změnový list č. : ZL008</b>
Obědnatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	[REDACTED]	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL	
Změnový list předkládá	[REDACTED]	
Charakter změny	Změny stavby vyplývající ze zjištění v průběhu stavebních prací	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z., stavební práce II. D2_03 Vodovod	
Specifikace změny	D2_03 Provizorní přeložka vodovodu pro zásobování areálu vodou	
Zdůvodnění změny	Úprava dočasného vedení vodovodu v jižní a jihozápadní části zájmového území. Tato změna vyplynula z nutnosti zachovat zásobování vodou všech částí areálu nemocnice, zejména pak objektu "E" a "D".	
Finanční dopad změny		180 925,85 Kč
Změny ceny po schválení		658 769 851,80 Kč
Stanovisko Správce stavby:		[REDACTED]
Stanovisko projektanta:		[REDACTED]
Přílohy	Příloha s fotodokumentací	
SCHVALOVACÍ PROCES		

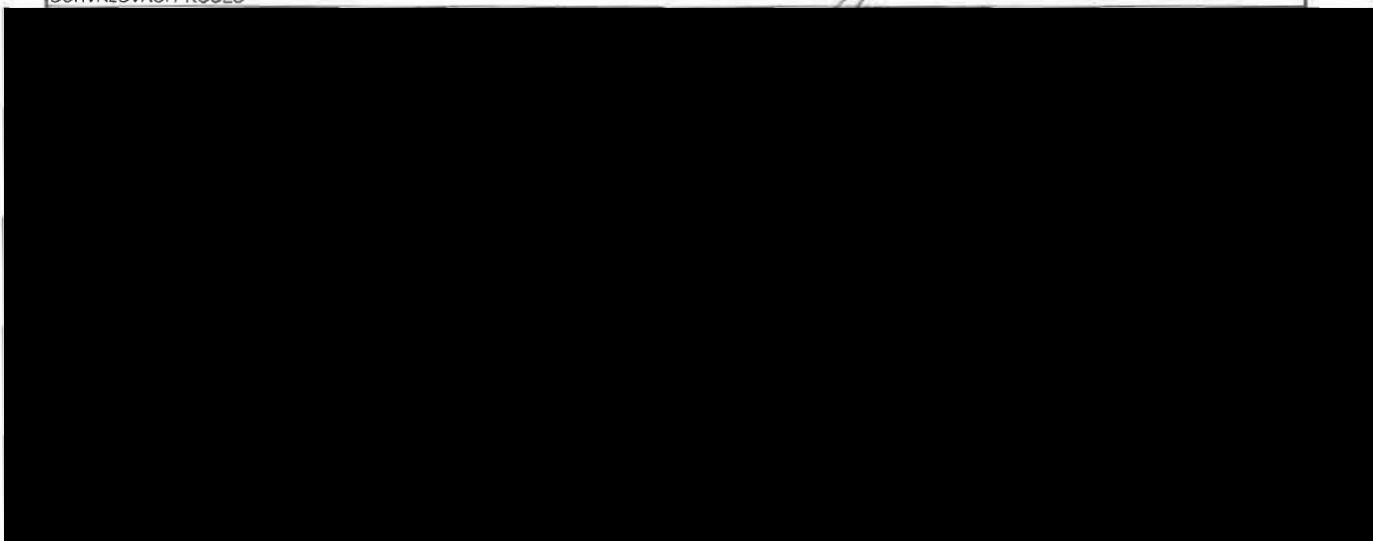

## PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. : 9

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

D2\_03 Provizorní přeložka vodovodu pro zásobování areálu vodou

Popis a lokalizace Změny:

Provizorní přeložka vodovodu za účelem zachování zásobování areálu vodou. Vedení vodovodního potrubí od křižovatky u objektu "D" k objektu prádelny vč. napojení na provizorní hydrant, vyhotovení prostupů do těch objektů a jejich napojení (zokruhování vodovodního vedení).

Vliv na specifikaci ceny:

180 925,85 Kč

Vliv na harmonogram:

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

# Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky

**500 080**

Zakázka

**Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.**

Označení rozpočtu

**ZL009**

Název rozpočtu

**D1\_01: Drenáž stavební jámy**

**WACHAL**

**ZLÍNŠTAV**

Název stavby:

**Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice**

Objednatel:

**Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa**

Zhotovitel:

**Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL, Tylova 220/17, 76701, Kroměříž**

Projektant:

**ATELIER PENTA v.o.s, Mrštilkova 1166/12, 58601, Jihlava**

Technický dozor:

Rozpočtoval:

## REKAPITULACE NÁKLADŮ

Celkem (bez DPH)	3 086 283,81 Kč
DPH	648 119,60 Kč
DPH 21%	648 119,60 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
<b>Cena celkem (včetně DPH)</b>	<b>3 734 403,41 Kč</b>

Poznámka:


**Zakázka:** Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

**Rozpočet:** ZL009: D1\_01: Drenáž stavební jámy

**Typ:** Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		<b>ZL009: D1_01: Drenáž stavební jámy</b>				<b>3 086 283,81</b>
		<b>A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP</b>				<b>3 086 283,81</b>
		<b>D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP</b>				<b>3 030 483,81</b>
		<b>D1_01_1-R5: Stavební - Revize 5</b>				<b>3 030 483,81</b>
		<b>HSV: Práce a dodávky HSV</b>				<b>3 030 483,81</b>
		<b>1: Zemní práce</b>				<b>1 241 211,87</b>
13.	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 Výkaz výměr: 90*2,5*4*0,6	m3	576,0	161,15	92 822,40
		odtok staveništní drenáže: 6*2,5*4*0,6		36,000		
14.	131201109	Příplatek za lepidlost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 Výkaz výměr: 90*2,5*4*0,6*0,5	m3	288,0	9,10	2 620,80
		odtok staveništní drenáže: 6*2,5*4*0,6*0,5		18,000		
18.	131301102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 Výkaz výměr: 90*2,5*4*0,35	m3	336,0	198,47	66 685,92
		odtok staveništní drenáže: 6*2,5*4*0,35		315,000		
19.	131301109	Příplatek za lepidlost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 Výkaz výměr: 90*2,5*4*0,35*0,5	m3	168,0	9,10	1 528,80
		odtok staveništní drenáže: 6*2,5*4*0,35*0,5		157,500		
24.	131401102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 5 objemu do 1000 m3 Výkaz výměr: 90*2,5*4*0,05	m3	48,0	528,96	25 390,08
		odtok staveništní drenáže: 6*2,5*4*0,05		45,000		
39.	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m Výkaz výměr: 90*2,5*4*0,95	m3	912,0	54,63	49 822,56
		odtok staveništní drenáže: 6*2,5*4*0,95		855,000		
40.	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m Výkaz výměr: 90*2,5*4*0,05	m3	48,0	54,63	2 622,24
		odtok staveništní drenáže: 6*2,5*4*0,05		45,000		
44.	162701103	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 Výkaz výměr: 90*2,5*4*0,95	m3	912,0	198,47	181 004,64
		odtok staveništní drenáže: 6*2,5*4*0,95		855,000		
45.	162701153	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypání z horniny tř. 5 až 7 Výkaz výměr: 90*2,5*4*0,05	m3	48,0	198,47	9 526,56
		odtok staveništní drenáže: 6*2,5*4*0,05		45,000		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
48.	171201211	odtok staveništní drenáže; 6*2,5*4*0,05 Příplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	3,000 1 833,6	113,80	208 663,68
		Výkaz výměr: 90*2,5*4*0,95*1,9 90*2,5*4*0,05*2,1		1 624,500 94,500		
9.	162701109	odtok staveništní drenáže; 6*2,5*4*0,95*1,9 odtok staveništní drenáže; 6*2,5*4*0,05*2,1 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	108,300 6,300 31 008,0	18,03	559 071,39
		Výkaz výměr: 29 070,000 1 938,000				
10 030.	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 632,0	25,40	41 452,80
		Výkaz výměr: 1 530,000 102,000				
<b>4: Vodorovné konstrukce</b>						
10 044.	211521111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 63 až 125 mm	m3	960,0	1 120,00	1 075 200,00
		Výkaz výměr: 912+48		960,000		1 075 200,00
<b>91: Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch</b>						
74.	711491172	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilní vrstva ochranná	m2	800,0	52,03	41 624,00
		Výkaz výměr: 80*10		800,000		
10 043.	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm do 200 g/m2	m2	880,0	56,00	49 280,00
		Výkaz výměr: 80*10*1,1		880,000		
<b>99: Přesuny hmot a suti</b>						
456.	998012104	Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným obvodovým pláštěm v do 36 m	t	1 564,53	398,31	623 167,94
		Výkaz výměr: 1564,53		1 564,530		623 167,94
<b>OVN.: Ostatní a vedlejší náklady</b>						
<b>OVN.: Ostatní a vedlejší náklady</b>						
<b>VRN: Vedlejší rozpočtové náklady</b>						
<b>VRN7: Provozní vlivy</b>						
10.	VRN7002-R09	Provozní vlivy	Kč	1.0	55 800,00	55 800,00



POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

10

Pokyn vydán (Správce stavby):

Pokyn obdržén (Zhotovitel):

Předmět změny:

D1\_01: Drenáž stavení jámy

Popis a lokalizace Změny:

Realizace štěrkových koryt v zájmovém území pro odvod podzemní vody. Drenáž je vedena příčně přes staveniště směrem k budově 20 a dále rovnoběžně s budoucím pavilonem emergency, vč. odtoku směrem k budově "E".

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

## NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. : 10

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):

Předmět Změny:

D1\_01: Drenáž stavení jámy

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Výkopové práce a odvoz zvodnělé zeminy ze zájmového území a následná realizace ochranné vrstvy z textílie a návoz vhodného kameniva pro odvod podzemní vody.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

3 086 283,81 Kč


Vliv na dobu trvání díla:

-

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.



Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.		P11
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : ZL009
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	[REDACTED]	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL	
Změnový list předkládá	[REDACTED]	
Charakter změny	Změny stavby vyplývající ze zjištění v průběhu stavebních prací	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z., stavební práce II. D1_01 Pavilon emergency, COS, CS a JIP	
Specifikace změny	D1_01: Drenáž stavení jámy	
Zdůvodnění změny	Realizace štěrkových koryt v zájmovém území pro odvod podzemní vody příčně přes staveniště směrem k budově 20 a rovnoběžně s budoucím pavilonem emergency.	
Finanční dopad změny	3 086 283,81 Kč	
Změny ceny po schválení	661 856 135,81 Kč	
Stanovisko Správce stavby:	[REDACTED]	
Stanovisko projektanta:	[REDACTED]	
Přílohy	Příloha 1 - Situace se zákresem vedení drenáže	
	Příloha 2 - Soubor s fotodokumentací	

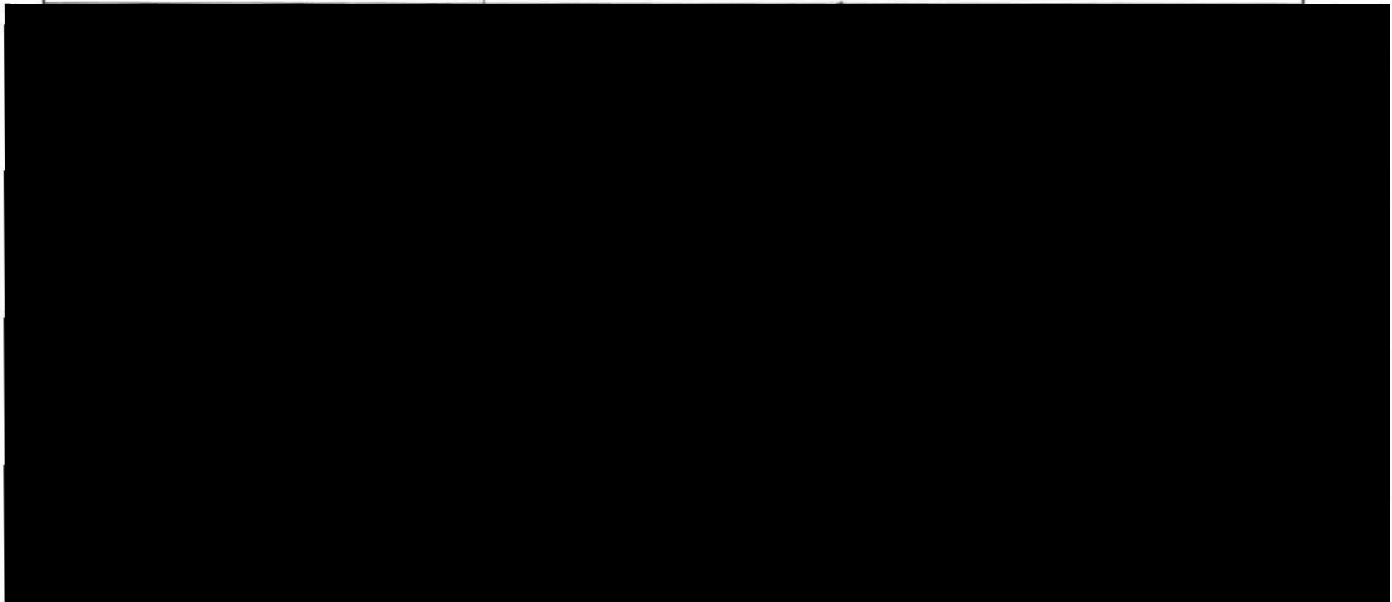

## PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. : 10

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

D1\_01: Drenáž stavení jámy

Popis a lokalizace Změny:

Realizace štěrkových koryt v zájmovém území pro odvod podzemní vody. Drenáž je vedena příčně přes staveniště směrem k budově 20 a dále rovnoběžně s budoucím pavilonem emergency, vč. odtoku směrem k budově "E".

Vliv na specifikaci ceny:

3 086 283,81 Kč

Vliv na harmonogram:

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

# Krycí list rozpočtu - Změnový list



Číslo zakázky  
**500 080**

Zakázka  
**Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.**

Označení rozpočtu  
**ZL010**

Název rozpočtu  
**D1\_01: Průzkumný vrt pro zjištění stávajícího podloží**

**Název stavby:** *Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice*

**Objednatel:** *Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa*


**Zhotovitel:** *Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL, Tylova 220/17, 76701, Kroměříž*

**Projektant:** *ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava*

**Technický dozor:** [REDACTED]

**Rozpočtoval:** [REDACTED]

REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Celkem (bez DPH)	104 597,75 Kč
DPH	21 965,53 Kč
DPH 21%	21 965,53 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
<b>Cena celkem (včetně DPH)</b>	<b>126 563,28 Kč</b>

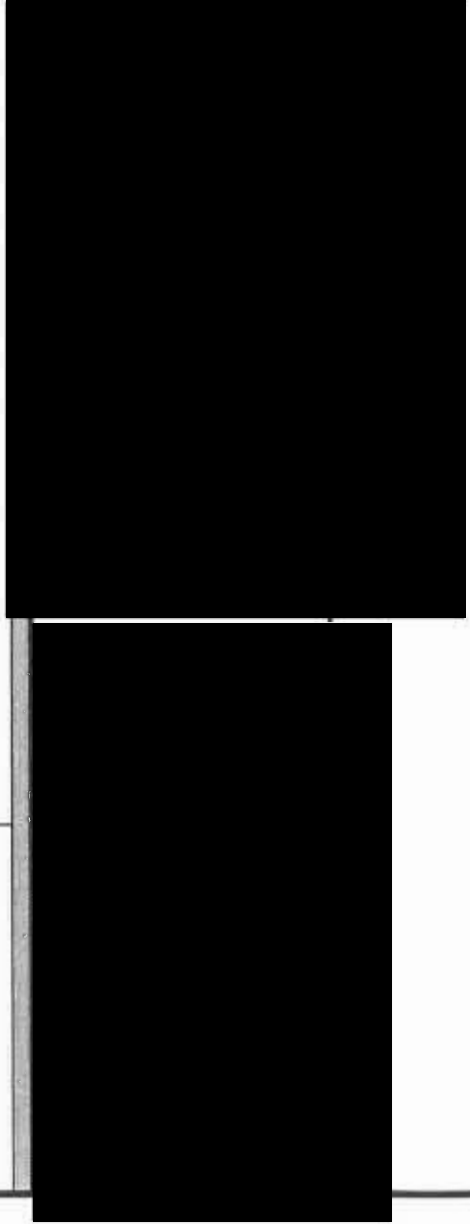

**Zakázka:** Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

**Rozpočet:** ZL010: D1\_01: Průzkumný vrt pro zjištění stávajícího podloží

**Typ:** Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
44.	162701103	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 Výkaz výměr: Vytěžená zemina z průzkumného vrtu (3,14*1,0*1,0*20)/4	m <sup>3</sup>	15,7	198,47	3 115,98
46.	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m <sup>3</sup> Výkaz výměr: Vytěžená zemina z průzkumného vrtu (3,14*1,0*1,0*20)/4	m <sup>3</sup>	15,7	56,45	886,27
47.	171201201	Uložení sypání na skládky Výkaz výměr: Vytěžená zemina z průzkumného vrtu (3,14*1,0*1,0*20)/4	m <sup>3</sup>	15,7	15,20	238,64
48.	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce Výkaz výměr: 15,7*1,9	t	29,83	113,80	3 394,65
9.	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m Výkaz výměr: 533,800	m <sup>3</sup>	533,8	18,03	9 624,36
58.	226213313	Zakládání - piloty Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl do 20 m hor. III Výkaz výměr: průzkumný vrt; 20	m	20,0	1 811,74	36 234,80
10 067.	275311127	Základové patky a bloky z betonu prostého C 25/30 Výkaz výměr: Uzavření průzkumného vrtu betonem (3,14*1,0*1,0*1,8)/4	m <sup>3</sup>	1,413	4 690,00	6 626,97
10 132.	231113113	Zakládání - základy Zřízení pilot svislých D přes 650 do 1250 mm hl od 0 do 30 m bez vytažení pažnic z kameniva Výkaz výměr: průzkumný vrt; 18,2	m	18,2	257,00	4 677,40
						21 088,88
						4 677,40

**ZL010: D1\_01: Průzkumný vrt pro zjištění stávajícího podloží**

**A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP**

D1\_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP

D1\_01\_1-R5: Stavební - Revize 5

HSV: Práce a dodávky HSV

1: Zemní práce

104 597,75

104 597,75

104 597,75


104 597,75

94 597,75

17 259,90



Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
10 133.	58343959	kamenívo drcené hrubé frakce 32/63 Výkaz výměr: průzkumný vrt; (3,14*1,0*1,0*18,2)/4*2,1	t	30,003 30,003	547,00	16 411,48
456.	998012104	99: Přesuny hmot a suti Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným obvodovým pláštěm v do 36 m Výkaz výměr: 33,61	t	33,61 33,610	398,31	13 387,20 13 387,20
10 064.	VRN7002-R10	VRN: Vedlejší rozpočtové náklady VRN7: Provozní vlivy Provozní vlivy Výkaz výměr: 1	kpl	1,0 1,000	10 000,00	10 000,00 10 000,00 10 000,00



## POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

11

Pokyn vydán (Správce stavby):

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

Předmět změny:

D1\_01: Průzkumný vrt pro zjištění stávajícího podloží

Popis a lokalizace Změny:

Vzhledem k výskytu vody v základové spáře bylo provedeno místní šetření hydrogeologem a zadán požadavek na provedení průzkumného vrtu pro zjištění stávajícího podloží pro efektivní řešení odvodnění základové spáry. Průzkumný vrt proveden v místech budoucího podzemního koridoru, přibližně v polovině zájmového území.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

## NÁVRH OCEŇENÍ ZMĚNY

NÁVRH č. : 11

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):

Předmět Změny:

D1\_01: Průzkumný vrt pro zjištění stávajícího podloží

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Vyvrtní průzkumného vrtu průměru do 1050 mm pro zjištění stávajícího podloží a následná výplň vrtu kamenivem a uzavření betonem.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:


104 597,76 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

-

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

<b>Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.</b>		<b>P11</b>
<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<b>Změnový list č. : ZL010</b>
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	[REDAKCE]	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL	
Změnový list překládá	[REDAKCE]	
Charakter změny	Změny stavby vyplývající ze zjištění v průběhu stavebních prací	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z., stavební práce II. D1_D1 Pavilon emergency, COS, CS a JIP	
Specifikace změny	D1_D1: Průzkumný vrt pro zjištění stávajícího podloží	
Zdůvodnění změny	Vzhledem k výskytu vody v základové spáře a masivnímu zvodnění štěrkopískových vrstev na pláni bylo provedeno místní šetření hydrogeologem. Na jeho doporučení byl zadán požadavek na provedení průzkumného vrtu pro zjištění stávajícího podloží pro efektivní řešení odvodnění základové spáry. Průzkumný vrt proveden v místech budoucího podzemního koridoru, přibližně v polovině zájmového úzami.	
Finanční dopad změny	104 597,75 Kč	
Změny ceny po schválení	661 960 733,36 Kč	
Stanovisko Správce stavby:	[REDAKCE]	
Stanovisko projektanta:	[REDAKCE]	
Přílohy	Příloha 1 - Situace se zákresem vedení drenáže	
	Příloha 2 - Soubor s fotodokumentací	

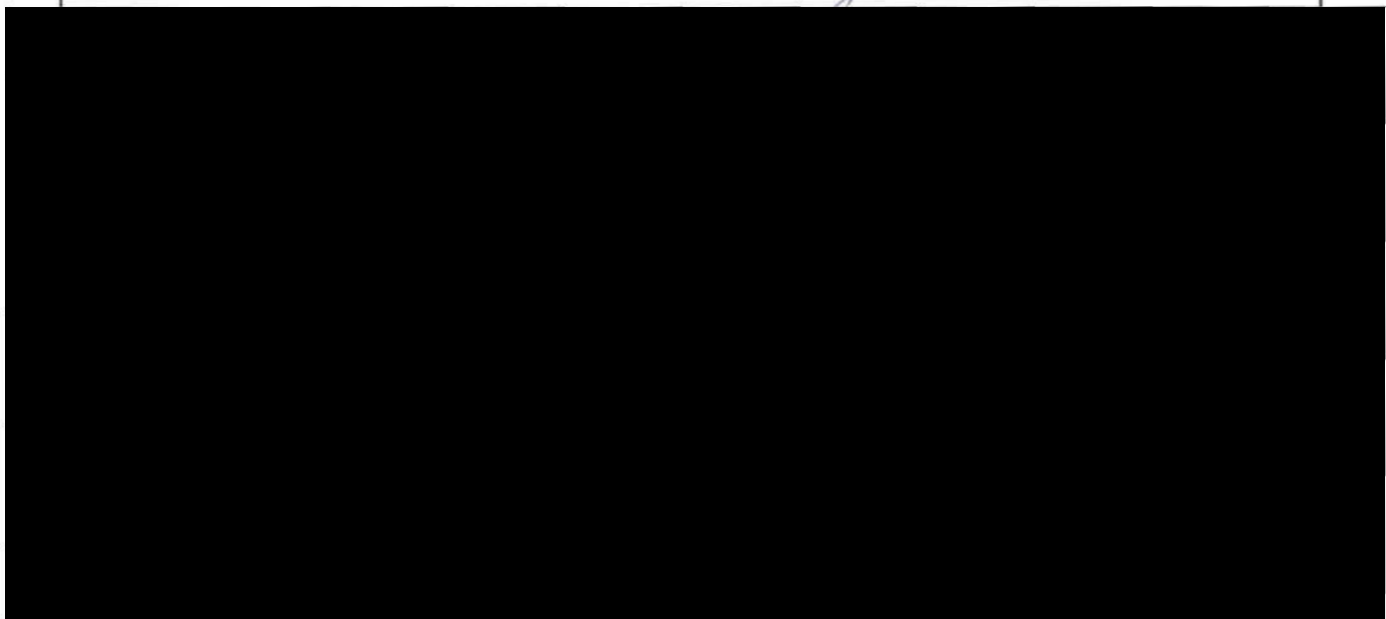



## PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

Příkaz č. 1/2014

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

D1\_01: Průzkumný vrt pro zjištění stávajícího podloží

Popis a lokalizace Změny:

Vzhledem k výskytu vody v základové spáře bylo provedeno místní šetření hydrogeologem a zadán požadavek na provedení průzkumného vrtu pro zjištění stávajícího podloží pro efektivní řešení odvodnění základové spáry. Průzkumný vrt proveden v místech budoucího podzemního koridoru, přibližně v polovině zájmového území.

Vliv na specifikaci ceny:

104 597,75 Kč

Vliv na harmonogram:

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

# Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka
<b>500 080</b>	<b>Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.</b>
Označení rozpočtu	Název rozpočtu
<b>ZL011</b>	<b>D2_02-R5: Provizorní odkanalizování budovy 20 a přečerpávání vody</b>



Název stavby:	<b>Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa</b>
Objednatel:	<b>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlinstav a.s. - S-VWZL, Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</b>
Zhotovitel:	<b>ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava</b>
Projektant:	
Technický dozor:	
Rozpočtovali:	

REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Celkem (bez DPH)	776 233,53 Kč
DPH	163 009,04 Kč
DPH 21%	163 009,04 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
<b>Cena celkem (včetně DPH)</b>	<b>939 242,57 Kč</b>

Poznámka:

**Zakázka:** Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

**Rozpočet:** ZL011: D2\_02-R5: Provizorní odkanalizování budovy 20 a přečerpávání vody

**Typ:** Změnový list

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
26.	162701103_01 Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	17,85	248,09	4 428,41 SOD
	Výkaz výměr: provizorní odkanalizování budovy 20 a údržby: 15*1,7*0,7		17,850		
28.	171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	33,915	113,80	3 859,53 SOD
	Výkaz výměr: provizorní odkanalizování budovy 20 a údržby: 15*1,7*0,7*1,9		33,915		
29.	167101102_01 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	17,85	70,56	1 259,50 SOD
	Výkaz výměr: provizorní odkanalizování budovy 20 a údržby: 15*1,7*0,7		17,850		
34.	181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	25,5	10,38	264,69 SOD
	Výkaz výměr: provizorní odkanalizování budovy 20 a údržby: 15*1,7		25,500		
16.	583373030_01 šterkopisek frakce 0-8	t	7,371	389,21	2 868,87 SOD
	Výkaz výměr: provizorní napojení kanalizace a zaustění do RŠ3 (1,7*1,7*2-1*1*2)*1,95		7,371		
9.	162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	606,9	18,03	10 942,35 SOD
	Výkaz výměr: 606,900		606,900		
12.	161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	17,85	54,63	975,15 SOD
	Výkaz výměr: provizorní odkanalizování budovy 20 a údržby: 15*1,7*0,7		17,850		
10 015.	132232202 Hloubení rýh do 10 m3 ručně šířky do 2 m v nesoudržné hornině tř. 3 při překopech inž sítí	m3	17,85	1 420,00	25 347,00 DOD1
	Výkaz výměr: provizorní odkanalizování budovy 20 a údržby: 15*1,7*0,7		17,850		
10 016.	132232209 Příplatek za lepitost, hloubení rýh do 10 m3 ručně šíře do 2 m v hornině tř. 3 při překopech sítí	m3	17,85	187,00	3 337,95 DOD1
	Výkaz výměr: provizorní odkanalizování budovy 20 a údržby: 15*1,7*0,7		17,850		
45.	919735114 Řezání stávajícího živého krytu hl do 200 mm	m	300	277,67	83 300,10 SOD
	11: Zemní práce - přípravné a přidružené práce				93 729,60
	11: Zemní práce - přípravné a přidružené práce				8 330,10 SOD

**ZL011: D2\_02-R5: Provizorní odkanalizování budovy 20 a přečerpávání vody**

**A 39-17-P:** Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP

**D2\_02-R5:** Kanalizace - Revize 5

**D2\_02-R5.:** Kanalizace - Revize 5

**HSV: Práce a dodávky HSV**

**1: Zemní práce**

776 233,53

776 233,53

776 233,53

776 233,53

714 233,53

53 283,43

4 428,41 SOD

3 859,53 SOD

1 259,50 SOD

264,69 SOD

2 868,87 SOD

10 942,35 SOD

975,15 SOD

25 347,00 DOD1

3 337,95 DOD1

83 300,10 SOD

10 008.	113107025	Výkaz výměr: provizorní odkanalizování budovy 20 a údržby; 15*2 30,000	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 400 do 500 mm při překopecch ručně	m <sup>2</sup>	25,5	1 400,00	35 700,00	DOD1
10 009.	113107036	Výkaz výměr: provizorní odkanalizování budovy 20 a údržby; 15*1,7	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 100 do 150 mm při překopecch ručně	m <sup>2</sup>	25,5	1 330,00	33 915,00	DOD1
10 010.	113107145	Výkaz výměr: provizorní odkanalizování budovy 20 a údržby; 15*1,7	Odstranění podkladu živичného tl přes 200 do 250 mm ručně	m <sup>2</sup>	25,5	619,00	15 784,50	DOD1
		Výkaz výměr: provizorní odkanalizování budovy 20 a údržby; 15*1,7			25,500			
52.	175111101	<b>45. 00: Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb</b>					<b>28 259,34</b>	
		Výkaz výměr: provizorní napojení kanalizace a zaústění do RŠ3	Obsypání potrubí ručně sypatinou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m <sup>3</sup>	3,78	442,47	1 672,54	SOD
			1,7*1,7*2-1*1*2		-			
					3,780			
70.	271532211		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm	m <sup>3</sup>	10,625	1 338,32	14 219,65	SOD
		Výkaz výměr: sanace kaverny u RŠ 2			-			
					10,625			
87.	631311125		Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m <sup>3</sup>	0,8	5 953,04	4 762,43	SOD
		Výkaz výměr: provizorní napojení kanalizace a zaústění do RŠ3						
					0,800			
55.	564861111		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m <sup>2</sup>	20,513	251,00	5 148,72	SOD
		Výkaz výměr: provizorní odkanalizování budovy 20 a údržby; 8/1,95/0,2			20,513			
10 053.	271532212		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m <sup>3</sup>	1,2	2 030,00	2 436,00	ÚRS
		Výkaz výměr: provizorní napojení kanalizace a zaústění do RŠ3						
					1,200			
67.	871355221	<b>8: Trubní vedení</b>	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 200	m	18,0	478,31	8 609,58	SOD
		Výkaz výměr: oprava kanalizačního potrubí před objektem "Matky"; 18			18,000			
68.	871365221		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 250	m	10,0	883,91	8 839,10	SOD
		Výkaz výměr: provizorní napojení kanalizace a zaústění do RŠ3			-			
					10,000			
88.	28611366		koleno kanalizační PVC 200x45°	kus	9,0	281,09	2 529,81	SOD
		Výkaz výměr: oprava kanalizačního potrubí před objektem "Matky"; 7			7,000			
			přepojování stávající kanalizace do RŠ4; 2		2,000			
91.	877365211		Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 250	kus	10,0	269,37	2 693,70	SOD
		Výkaz výměr: provizorní napojení kanalizace a zaústění do RŠ3			-			
					10,000			

99.	28611371	koleno kanalizační PVC 250x45°	kus	7,0	747,69	5 233,83	SOD
		Výkaz výměr: provizorní napojení kanalizace a zaústění do RŠ3		-			
				7,000			
19.	733-07_02	Výstražná fólie na šířku výkopu, délky	m	30,0	29,39	881,70	SOD
		Výkaz výměr: provizorní odkanalizování budovy 20		30,000			
10 080.	X116	Přečerpávání vody z provizorní šachty u objektu prádelny	den	171,0	1 625,00	277 875,00	R-pol.
		Výkaz výměr: měsíc 02/2022; 7		7,000			
		měsíc 03/2022; 31		31,000			
		měsíc 04/2022; 30		30,000			
		měsíc 05/2022; 31		31,000			
		měsíc 06/2022; 30		30,000			
		měsíc 07/2022; 31		31,000			
		měsíc 08/2022; 11		11,000			
10 081.	871445251	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN16 DN 600	m	7,0	13 500,00	94 500,00	ÚRS
		Výkaz výměr: provizorní odkanalizování budovy 20 a údržby		-			
		trubka DN600 délky 6m		-			
				7,000			
10 082.	X117	Očištění kabelů mezi křížovatkou a patologií	kpl	1,0	3 000,00	3 000,00	R-pol.
10 084.	X118	D+M vyvážení provizorní vodovodní přípojky vč. materiálu	kpl	1,0	15 000,00	15 000,00	R-pol.
10 085.	28611532	přechod kanalizační KG kamenina-plast DN 250	kus	3,0	3 010,00	9 030,00	ÚRS
		Výkaz výměr: provizorní napojení kanalizace a zaústění do RŠ3		-			
				3,000			
10 087.	87735221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 200	kus	9,0	452,00	4 068,00	ÚRS
		Výkaz výměr: přepojování stávající kanalizace do RŠ4;2		2,000			
		oprava kanalizačního potrubí před objektem "Matky"; 7		7,000			
10 093.	X121	D+M podvěsu kanalizačního potrubí	kpl	1,0	450,00	450,00	R-pol.
		96: Bourání konstrukcí				69 384,00	
130.	997013111_01	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	50,0	20,48	1 024,00	
		Výkaz výměr: provizorní odkanalizování budovy 20 a údržby; 20*2500/1000		50,000			
10 031.	139911121	Bourání kčl v hloubených vykopávkách ze zdíva z betonu prostého ručně	m3	10,0	6 680,00	66 800,00	DOD1
		Výkaz výměr: provizorní odkanalizování budovy 20 a údržby; 10		10,000			
10 083.	966008221	Bourání betonového nebo polymerbetonového odvodňovacího žlabu š do 200 mm	m	15,0	104,00	1 560,00	DOD1
		99: Přesuny hmot a suti				4 751,84	
456.	998012104	Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným obvodovým pláštěm v do 36 m	t	11,93	398,31	4 751,84	SOD

Výkaz výměr: 11,930

11,930

**99\_00: Přesun hmot**

116,08

139. 998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,68	170,70	116,08	SOD
----------------	--	---	------	--------	--------	-----

Výkaz výměr: 0,680

0,680

**997: Přesun sutě**

32 018,52

10. 997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	55,881	113,80	6 359,26	SOD
---------------	---	---	--------	--------	----------	-----

Výkaz výměr: provizorní odkanalizování budovy 20 a údržby

hmotnost sutí z odd. 11  
 "pol. 113107025:" ; 19,125  
 "pol. 113107036:" ; 8,415  
 "pol. 113107145:" ; 14,841  
 hmotnost sutí z odd. 96  
 "pol. 966008221:" ; 13,5

11. 997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 899,954	8,10	15 389,63	SOD
---------------	--	---	-----------	------	-----------	-----

Výkaz výměr: provizorní odkanalizování budovy 20 a údržby

hmotnost sutí z odd. 11  
 "pol. 113106036:" ; 8,415  
 hmotnost sutí z odd. 96  
 "pol. 966008221:" ; 13,5

12. 997013802	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kódu odpadu 170 101	t	21,915	250,37	5 486,86	SOD
---------------	--	---	--------	--------	----------	-----

Výkaz výměr: hmotnost sutí z odd. 11  
 "pol. 113106036:" ; 8,415  
 hmotnost sutí z odd. 96  
 "pol. 966008221:" ; 13,5

18. 997013-R3	Rozřídění stavebního odpadu na stavbě	t	55,881	22,76	1 271,85	SOD
---------------	---------------------------------------	---	--------	-------	----------	-----

Výkaz výměr: hmotnost sutí z odd. 11  
 "pol. 113107025:" ; 19,125  
 "pol. 113107036:" ; 8,415  
 "pol. 113107145:" ; 14,841  
 hmotnost sutí z odd. 96  
 "pol. 966008221:" ; 13,5

149. 997221-R1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kódu odpadu 170 302, - určeného k recyklaci	t	14,841	89,92	1 334,50	SOD
----------------	--	---	--------	-------	----------	-----

Výkaz výměr: hmotnost sutí z odd. 11  
 "pol. 113107145:" ; 14,841

150. 997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kódu odpadu 170 504	t	19,125	113,80	2 176,43	SOD
----------------	---	---	--------	--------	----------	-----

Výkaz výměr: hmotnost sutí z odd. 11  
 "pol. 113107025:" ; 19,125


**VRN: Vedlejší rozpočtové náklady**

**62 000,00**

**VRN7: Provozní vlivy**

**62 000,00**

19.	VRN7002-R11	Provozní vlivy		Kč		1,0	30 000,00	30 000,00	SOD
20.	VRN7003-R11	Zajištění provozu jednotlivých oddělení v pavilonu		Kč		1,0	32 000,00	32 000,00	SOD



POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

12

Pokyn vydán (Správce stavby):

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

Předmět změny:

D2\_02-R5: Provizorní odkanalizování budovy 20 a přečerpávání vody

Popis a lokalizace Změny:

Během provádění zemních prací byla zjištěna kanalizace z budovy 20 v hloubce o 1,5 m nižší než předpokládala DPS a docházelo k podmáčení a sesuvu zeminy do stavební jámy. Z důvodu ohrožení stavby a osob sesuvem celého svahu a stávající asfaltové komunikace bylo stanoveno provizorní řešení, a sice provizorní odkanalizování budovy 20 a zřízení přečerpávací šachty do RŠ 3.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.



## NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):

Předmět Změny:

D2\_02-R5: Provizorní odkanalizování budovy 20 a přečerpávání vody

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Realizace výkopových přípravných a přidružených prací pro umístění provizorního vedení kanalizace, provizorního napojení na stávající kanalizaci vč. zaústění do RŠ 3, dále vyhotovení provizorní šachty a její přečerpávání.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem


Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

776 233,53 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.		P11
<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		Změnový list č. : ZL011
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	[REDAKCE]	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlinstav a.s. - S-VWZL	
Změnový list předkládá	[REDAKCE]	
Charakter změny	Změny stavby vyplývající ze zjištění v průběhu stavebních prací	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z., stavební práce II. D2_02-R5: Kanalizace - Revize 5	
Specifikace změny	D2_02-R5: Provizorní odkanalizování budovy 20 a přečerpávání vody	
Zdůvodnění změny	Během provádění zemních prací byla zjištěna kanalizace z budovy 20 v hloubce o 1,5 m nižší než předpokládala DPS a docházelo k podmáčení a sesuvu zeminy do stavební jámy. Z důvodu ohrožení stavby a osob sesuvem celého svahu a stávající asfaltové komunikace bylo stanoveno provizorní řešení, a sice provizorní odkanalizování budovy 20 a zřízení přečerpávací šachty do RŠ 3.	
Finanční dopad změny	776 233,53 Kč	
Změny ceny po schválení	662 736 966,89 Kč	
Stanovisko Správce stavby:	[REDAKCE]	
Stanovisko projektanta:	[REDAKCE]	
Přílohy	Příloha - Soubor s fotodokumentací	

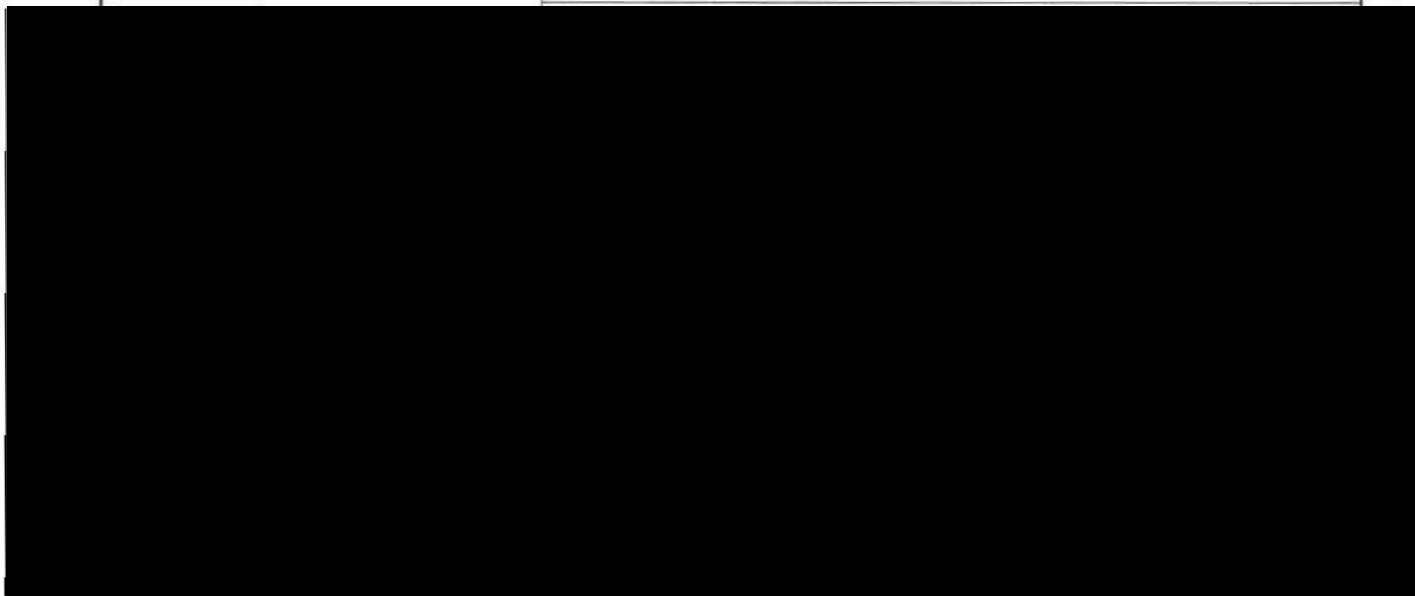

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. : 12

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

D2\_02-R5: Provizorní odkanalizování budovy 20 a přečerpávání vody

Popis a lokalizace Změny:

Během provádění zemních prací byla zjištěna kanalizace z budovy 20 v hloubce o 1,5 m nižší než předpokládala DPS a docházelo k podmáčení a sesuvu zeminy do stavební jámy. Z důvodu ohrožení stavby a osob sesuvem celého svahu a stávající asfaltové komunikace bylo stanoveno provizorní řešení, a sice provizorní odkanalizování budovy 20 a zřízení přečerpávací šachty do RŠ 3.

Vliv na specifikaci ceny:

776 233,53 Kč

Vliv na harmonogram:

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

# Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka
<b>500 080</b>	<b>Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.</b>
Označení rozpočtu	Název rozpočtu
<b>ZL012</b>	<b>D2_02-R5: Kanalizace - úprava větve A a RŠ1-RŠ5</b>



**Název stavby:** *Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa*

**Objednatel:** *Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL, Tylova 220/17, 76701, Kroměříž*

**Zhotovitel:** *ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava*

**Projektant:** [REDACTED]

**Technický dozor:** [REDACTED]

**Rozpočtoval:** [REDACTED]

<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>	
Celkem (bez DPH)	816 280,01 Kč
DPH	171 418,80 Kč
DPH 21%	171 418,80 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
<b>Cena celkem (včetně DPH)</b>	<b>987 698,82 Kč</b>

**Poznámka:**

**Zakázka:** Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

**Rozpočet:** ZL012: D2\_02-R5: Kanalizace - úprava větve A a RŠ1-RŠ5

**Typ:** Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		<b>ZL012: D2_02-R5: Kanalizace - úprava větve A a RŠ1-RŠ5</b>				<b>816 280,01</b>
		<b>A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP</b>				<b>816 280,01</b>
		<b>D2_02-R5: Kanalizace - Revize 5</b>				<b>816 280,01</b>
		<b>D2_02-R5.: Kanalizace - Revize 5</b>				<b>816 280,01</b>
		<b>HSV: Práce a dodávky HSV</b>				<b>769 280,01</b>
		<b>1: Zemní práce</b>				<b>523 393,93</b>
13.	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 Výkaz výměr: Roztřídění zeminy tř.3 - 60%, tř.4 - 35%, tř.5 - 5% zpětný zásyp (nad vodovodní a pod vodovodní potrubí): (35*5*1,5+38*2,56*1,5+24*2,56*1,5)*0,6	m3	300,348	161,15	48 401,08
14.	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 Výkaz výměr: zpětný zásyp (nad vodovodní a pod vodovodní potrubí): (35*5*1,5+38*2,56*1,5+24*2,56*1,5)*0,6*0,5	m3	150,174	9,10	1 366,58
18.	131301102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 Výkaz výměr: Roztřídění zeminy tř.3 - 60%, tř.4 - 35%, tř.5 - 5% zpětný zásyp (nad vodovodní a pod vodovodní potrubí): (35*5*1,5+38*2,56*1,5+24*2,56*1,5)*0,35	m3	175,203	198,47	34 772,54
19.	131301109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 Výkaz výměr: zpětný zásyp (nad vodovodní a pod vodovodní potrubí): (35*5*1,5+38*2,56*1,5+24*2,56*1,5)*0,35*0,5	m3	87,602	9,10	797,17
24.	131401102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 5 objemu do 1000 m3 Výkaz výměr: Roztřídění zeminy tř.3 - 60%, tř.4 - 35%, tř.5 - 5% zpětný zásyp (nad vodovodní a pod vodovodní potrubí): (35*5*1,5+38*2,56*1,5+24*2,56*1,5)*0,05	m3	25,029	528,96	13 239,34
30.	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 Výkaz výměr: změna vedení kanalizační větve "A": (5*1,5*3+2*3+1,7*2+1,5*1,5)*0,6	m3	68,49	601,47	41 194,68

snížení terénu u šachet RŠ3 a RŠ4; 16\*5\*1\*0,6

48,0

31. 132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	34,245	9,10	311,63	SOD
Výkaz výměr: změna vedení kanalizační větve "A": (5*1,5*3+2*3+1,7*2+1,5*1,5)*0,6*0,5 snížení terénu u šachet RŠ3 a RŠ4; 16*5*1*0,6*0,5						
34. 132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	39,953	851,25	34 009,57	SOD
Výkaz výměr: změna vedení kanalizační větve "A" (5*1,5*3+2*3+1,7*2+1,5*1,5)*0,35 snížení terénu u šachet RŠ3 a RŠ4; 16*5*1*0,35						
35. 132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	19,976	9,10	181,78	SOD
Výkaz výměr: změna vedení kanalizační větve "A" (5*1,5*3+2*3+1,7*2+1,5*1,5)*0,35*0,5 snížení terénu u šachet RŠ3 a RŠ4; 16*5*1*0,35*0,5						
38. 132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	5,708	1 392,95	7 950,26	SOD
Výkaz výměr: změna vedení kanalizační větve "A" (5*1,5*3+2*3+1,7*2+1,5*1,5)*0,05 snížení terénu u šachet RŠ3 a RŠ4; 16*5*1*0,05						
39. 161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	703,994	54,63	38 459,16	SOD
Výkaz výměr: změna vedení kanalizační větve "A" (5*1,5*3+2*3+1,7*2+1,5*1,5)*0,95 svahování mezi revizními šachtami; 120 snížení terénu u šachet RŠ3 a RŠ4; 16*5*1*0,95 zpětný zásyp (nad vodovodní a pod vodovodní potrubí); (35*5*1,5+38*2,56*1,5+24*2,56*1,5)*0,95						
40. 161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	30,737	54,63	1 679,13	SOD
Výkaz výměr: změna vedení kanalizační větve "A" (5*1,5*3+2*3+1,7*2+1,5*1,5)*0,05 snížení terénu u šachet RŠ3 a RŠ4; 16*5*1*0,05 zpětný zásyp (nad vodovodní a pod vodovodní potrubí); (35*5*1,5+38*2,56*1,5+24*2,56*1,5)*0,05						
42. 162201201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	10,18	209,40	2 131,69	SOD
Výkaz výměr: obnažení šachty a potrubí - ručně zrušení šachty (septikové jímky) 12*0,8*0,8 2,5*2*1-2,5						
43. 162201209	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	10,18	191,19	1 946,31	SOD
Výkaz výměr: obnažení šachty a potrubí - ručně zrušení šachty (septikové jímky) 12*0,8*0,8 2,5*2*1-2,5						

52.	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženo do 3 m	m3	442,47	13,6	6 017,59	SOD
Výkaz výměr: zvýšení šachty RŠ3, obsyp štěrskem, betonový základ							
1,5*1,5*2-1*1*2							
úprava stávajícího potrubí k RŠ4							
10*0,6*0,6							
šachta RŠ2, obsyp štěrskem, betonový základ							
1,5*1,5*2-1*1*2							
šachta RŠ4, obsyp štěrskem, betonový základ							
1,5*1,5*2-1*1*2							
šachta RŠ5, obsyp štěrskem, betonový základ							
1,5*1,5*2-1*1*2							
53.	583373030	šterkopisek frakce 0-8	t	389,21	25,84	10 057,19	SOD
Výkaz výměr: zvýšení šachty RŠ3, obsyp štěrskem, betonový základ							
(1,5*1,5*2-1*1*2)*1,9							
úprava stávajícího potrubí k RŠ4							
10*0,6*0,6*1,9							
šachta RŠ2, obsyp štěrskem, betonový základ							
(1,5*1,5*2-1*1*2)*1,9							
šachta RŠ4, obsyp štěrskem, betonový základ							
(1,5*1,5*2-1*1*2)*1,9							
šachta RŠ5, obsyp štěrskem, betonový základ							
(1,5*1,5*2-1*1*2)*1,9							
26.	162701103_01	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	248,09	15,18	3 766,01	SOD
Výkaz výměr: obmazení šachty a potrubí - ručně							
zrušení šachty (septikové jámky)							
12*0,8*0,8							
2,5*2*1-2,5							
2,5+2,5							
28.	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	113,80	28,842	3 282,22	SOD
Výkaz výměr: obmazení šachty a potrubí - ručně							
zrušení šachty (septikové jámky)							
12*0,8*0,8*1,9							
(2,5*2*1-2,5)*1,9							
(2,5+2,5)*1,9							
29.	167101102_01	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	70,56	705,58	49 785,72	SOD
Výkaz výměr: zpětný zásep (nad vodovodní a pod vodovodní potrubí):							
(35*5*1,5+38*2,56*1,5+24*2,56*1,5)*1							
snížení terénu u šachty RŠ3 a RŠ4; 16*5*1-2,5-2,5							
svahování mezi revizními šachtami; 130							
8.	132201203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	193,92	130,0	25 209,60	SOD
Výkaz výměr: svahování mezi revizními šachtami; 130							
130,000							
9.	132201209	Příplatek za lepilost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	9,10	65,0	591,50	SOD

23.	162301101	Výkaz výměr: svahování mezi revizními šachtami; 130*0,5	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	65,000	705,58	64,37	45 418,18	SOD
		Výkaz výměr: svahování mezi revizními šachtami; 130 zpětný zásyp (nad vodovodní a pod vodovodní potrubí); (35*5*1,5+38*2,56*1,5+24*2,56*1,5)*1 snížení terénu u šachet RŠ3 a RŠ4; 16*5*1-2,5-2,5				130,000 500,580 75,000			
24.	171201201	Výkaz výměr: svahování mezi revizními šachtami; 130	Uložení sypání na skládky	m3		705,58	15,20	10 724,82	SOD
		Výkaz výměr: svahování mezi revizními šachtami; 130 zpětný zásyp (nad vodovodní a pod vodovodní potrubí); (35*5*1,5+38*2,56*1,5+24*2,56*1,5)*1 snížení terénu u šachet RŠ3 a RŠ4; 16*5*1-2,5-2,5				130,000 500,580 75,000			
29.	174101101_01	Výkaz výměr: svahování mezi revizními šachtami; 130	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypání se zhuťněním	m3		705,58	88,22	62 246,27	SOD
		Výkaz výměr: svahování mezi revizními šachtami; 130 zpětný zásyp (nad vodovodní a pod vodovodní potrubí); (35*5*1,5+38*2,56*1,5+24*2,56*1,5)*1 snížení terénu u šachet RŠ3 a RŠ4; 16*5*1-2,5-2,5				130,000 500,580 75,000			
30.	174101-R2	Výkaz výměr: svahování mezi revizními šachtami; 130	Příplatek za vytřídění vhodné zeminy pro zásypy	m3		705,58	73,97	52 191,75	SOD
		Výkaz výměr: svahování mezi revizními šachtami; 130 zpětný zásyp (nad vodovodní a pod vodovodní potrubí); (35*5*1,5+38*2,56*1,5+24*2,56*1,5)*1 snížení terénu u šachet RŠ3 a RŠ4; 16*5*1-2,5-2,5				130,000 500,580 75,000			
120.	460620013	Výkaz výměr: úprava stávajícího potrubí k RŠ4	Provizorní úprava terénu se zhuťněním, v hornině tř 3	m2		9,0	221,92	1 997,28	SOD
						- 9,000			
9.	162701109	Výkaz výměr: obnažení šachty a potrubí - ručně zrušení šachty (septikové jámy)	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3		516,12	18,03	9 305,60	SOD
						516,120			
10 015.	132232202	Výkaz výměr: obnažení šachty a potrubí - ručně zrušení šachty (septikové jámy) 12*0,8*0,8 2,5*2*1-2,5	Hloubení rýh do 10 m3 ručně šířky do 2 m v nesoudržné hornině tř. 3 při překopech inž sítí	m3		10,18	1 420,00	14 455,60	DOD1
						- - 7,680 2,500			
10 016.	132232209	Výkaz výměr: obnažení šachty a potrubí - ručně zrušení šachty (septikové jámy) 12*0,8*0,8 2,5*2*1-2,5	Příplatek za lepiivost, hloubení rýh do 10 m3 ručně šíře do 2 m v hornině tř. 3 při překopech sítí	m3		10,18	187,00	1 903,66	DOD1
						- - 7,680 2,500			

45\_00: Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb

59 394,42



71.	451573111_01	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m <sup>3</sup>	22,2	1 217,69	27 032,70	SOD
		Výkaz výměr: lože pro připojování stávající kanalizace do RŠ3; 35*0,6*0,2		4,200			
		zapískování kaverny u RŠ4; 9		9,000			
		vytvoření spadiště; 9		9,000			
87.	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m <sup>3</sup>	3,2	5 953,04	19 049,73	SOD
		Výkaz výměr: šachta RŠ2, obsyp štěrskem, betonový základ		-			
		betonování pod šachtu RŠ2; 0,8		0,800			
		zvýšení šachty RŠ3, obsyp štěrskem, betonový základ		-			
		betonování pod šachtu RŠ3; 0,8		0,800			
		šachtu RŠ4, obsyp štěrskem, betonový základ		-			
		betonování pod šachtu RŠ4; 0,8		0,800			
		šachtu RŠ5, obsyp štěrskem, betonový základ		-			
		betonování pod šachtu RŠ5; 0,8		0,800			
10 086.	271532213	Podpisy pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm	m <sup>3</sup>	6,4	2 080,00	13 312,00	ÚRS
		Výkaz výměr: zvýšení šachty RŠ3, obsyp štěrskem, betonový základ		-			
		2*2*0,4		1,600			
		šachta RŠ2, obsyp štěrskem, betonový základ		-			
		2*2*0,4		1,600			
		šachta RŠ4, obsyp štěrskem, betonový základ		-			
		2*2*0,4		1,600			
		šachta RŠ5, obsyp štěrskem, betonový základ		-			
		2*2*0,4		1,600			
<b>8: Trubní vedení</b>							
66.	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tloušťky SN8 DN 160	m	35,0	381,01	13 335,35	SOD
		Výkaz výměr: připojování stávající kanalizace do RŠ3;24		24,000			
		šachta údržba;3		3,000			
		šachta R4;3		3,000			
		vytvoření spadiště;5		5,000			
90.	28611508	redukce kanalizační PVC 200/160	kus	2,0	196,88	393,76	SOD
		Výkaz výměr: připojování stávající kanalizace do RŠ3		-			
		2		2,000			
110.	59224161	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 50 x 12 cm	kus	7,0	2 253,30	15 773,10	SOD
		Výkaz výměr: zvýšení šachty RŠ3, obsyp štěrskem, betonový základ		-			
		2		2,000			
		zvýšení šachty RŠ4, obsyp štěrskem, betonový základ		-			
		2		2,000			
		zvýšení šachty RŠ5, obsyp štěrskem, betonový základ		-			
		3		3,000			
111.	59224162	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 100 x 12 cm	kus	7,0	2 980,50	20 863,50	SOD
		Výkaz výměr: zvýšení šachty RŠ3, obsyp štěrskem, betonový základ		-			

2	2,000								
2	zvýšení šachty RŠ4, obsyp štěrkem, betonový základ								
3	3,000								
2	zvýšení šachty RŠ5, obsyp štěrkem, betonový základ								
2	2,000								
<b>117. 59224348</b>	<b>těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000</b>		<b>kus</b>				<b>205,87</b>		<b>3 499,79</b>
	Výkaz výměr:								<b>SOD</b>
5	zvýšení šachty RŠ3, obsyp štěrkem, betonový základ								
5	5,000								
6	zvýšení šachty RŠ4, obsyp štěrkem, betonový základ								
6	6,000								
6	zvýšení šachty RŠ5, obsyp štěrkem, betonový základ								
6	6,000								
<b>10 087. 877355221</b>	<b>Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 200</b>		<b>kus</b>				<b>444,00</b>		<b>2 220,00</b>
	Výkaz výměr:								<b>URS</b>
	přepojování stávající kanalizace do RŠ3;2								
	šachta údržba;3	2,000							
		3,000							
<b>10 088. 28611392</b>	<b>odbočka kanalizační PVC s hrdlem 160/160/45°</b>		<b>kus</b>				<b>474,00</b>		<b>15 168,00</b>
	Výkaz výměr:								<b>URS</b>
	přepojování stávající kanalizace do RŠ3; 9	9,000							
	šachta údržba; 3	3,000							
	šachta R4; 5	5,000							
	vytvoření spadiště; 8+7	15,000							
<b>10 089. 877315221</b>	<b>Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 160</b>		<b>kus</b>				<b>420,00</b>		<b>14 700,00</b>
	Výkaz výměr:								<b>URS</b>
	šachta údržba; 3+2	5,000							
	šachta R4; 5	5,000							
	vytvoření spadiště; 8+7+1	16,000							
	přepojování stávající kanalizace do RŠ3; 9	9,000							
<b>10 090. 28611361</b>	<b>koleno kanalizační PVC KG 160x45°</b>		<b>kus</b>				<b>154,00</b>		<b>308,00</b>
	Výkaz výměr:								<b>URS</b>
	šachta údržba	2,0							
		-							
<b>10 091. 28611530</b>	<b>přechod kanalizační KG kamenina-plast DN 200</b>		<b>kus</b>				<b>1 440,00</b>		<b>4 320,00</b>
	Výkaz výměr:								<b>URS</b>
	šachta údržba	3,000							
<b>10 092. 892383122_R00</b>	<b>Proplach a dezinfekce kanalizačního potrubí</b>		<b>m</b>				<b>86,50</b>		<b>1 297,50</b>
	Výkaz výměr:								<b>URS</b>
	změna vedení kanalizační větve "A"	15,0							
		15,000							
<b>10 094. X123</b>	<b>Sanace kanalizačního prostupu do šachty RŠ4</b>		<b>kpl</b>				<b>3 550,00</b>		<b>3 550,00</b>
	R-pol.	1,0							
<b>10 095. 28611528</b>	<b>přechod kanalizační KG kamenina-plast DN 160</b>		<b>kus</b>				<b>444,00</b>		<b>444,00</b>
	Výkaz výměr:								<b>URS</b>
	vytvoření spadiště; 1	1,000							
<b>10 096. X125</b>	<b>Napojení na stávající potrubí a výstup ze šachty</b>		<b>kpl</b>				<b>5 850,00</b>		<b>5 850,00</b>
	R-pol.	1,0							
<b>10 134. 894410212</b>	<b>Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruží rovná výšky 500 mm</b>		<b>kus</b>				<b>1 720,00</b>		<b>12 040,00</b>
	URS	7,0							



Výkaz výměr: změna vedení kanalizační větve "A"  
15

15,000

99. 998012021	99: Přesuny hmot a sutí	t	90,791	266,30	24 177,64
	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m		90,791		24 177,64 SOD
	Výkaz výměr: 101,748-10,957		90,791		

138. 998142251	99_00: Přesun hmot	t	10,957	669,84	7 339,44
	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m		10,957		7 339,44 SOD
	Výkaz výměr: 10,957		10,957		

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

47 000,00

VRN7: Provozní vlivy

47 000,00

19. VRN7002-R12	Provozní vlivy	KČ	1,0	47 000,00	47 000,00 SOD
-----------------	----------------	----	-----	-----------	---------------



POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

13

Pokyn vydán (Správce stavby):

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

Předmět změny:

D2\_02-R5: Kanalizace - úprava větve A a RŠ1-RŠ5

Popis a lokalizace Změny:

Změna vedení kanalizační větve "A", dále vzhledem ke stavu podloží být zadán požadavek na provedení betonového lože pod dna revizních šachet RŠ1-RŠ5.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

## NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. : 13

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):

Předmět Změny:

D2\_02-R5: Kanalizace - úprava větve A a RŠ1-RŠ5

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Výkopové práce před umístěním upravené kanalizační větve "A", následné zásypání a svahování mezi jednotlivými revizními šachtami. Vzhledem ke stavu podloží byl zadán požadavek na provedení betonového lože pod dna revizních šachet RŠ1-RŠ5 a šachty založeny ve větší hloubce než bylo předpokladem DPS. Součástí úpravy kanalizace na větví A je také vytvoření spadiště.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:


816 280,01 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

-

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příklad ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

<b>Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.</b>		<b>P11</b>
<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<b>Změnový list č. : ZL012</b>
Obědnatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	[REDAKCE]	
Zhotovitel	Sdružení firem VV WACHAL a.s. a ZIInstav a.s. - S-VWZL	
Změnový list předkládá	[REDAKCE]	
Charakter změny	Změny stavby vyplývající ze zjištění v průběhu stavebních prací	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z., stavební práce II. D2_02-R5: Kanalizace - Revize 5	
Specifikace změny	D2_02-R5: Kanalizace - úprava větve A a RŠ1-RŠ5	
Zdůvodnění změny	Vzhledem ke zjištění stavu a hloubky stávající kanalizační sítě a stavu podloží byl zadán požadavek na provedení úpravy kanalizační větve A, přesun šachty RŠ 3 a 4, dále požadavek na provedení betonového lože pod dna revizních šachet RŠ1-RŠ5. Šachty založeny ve větší hloubce než bylo předpokládáno DPS, proto je nutné šachty zvýšit. Součástí úpravy kanalizace na větvi A je také vytvoření spadiště.	
Finanční dopad změn	816 280,01 Kč	
Změna cen po schválení	663 553 246,90 Kč	
Stanovisko Správce stavby:	[REDAKCE]	
Stanovisko projektanta:	[REDAKCE]	
Přílohy	Příloha 1 - Soubor s fotodokumentací	
	Příloha 2 - Situace se zákresem změny	
SCHVALOVACÍ PROCES		

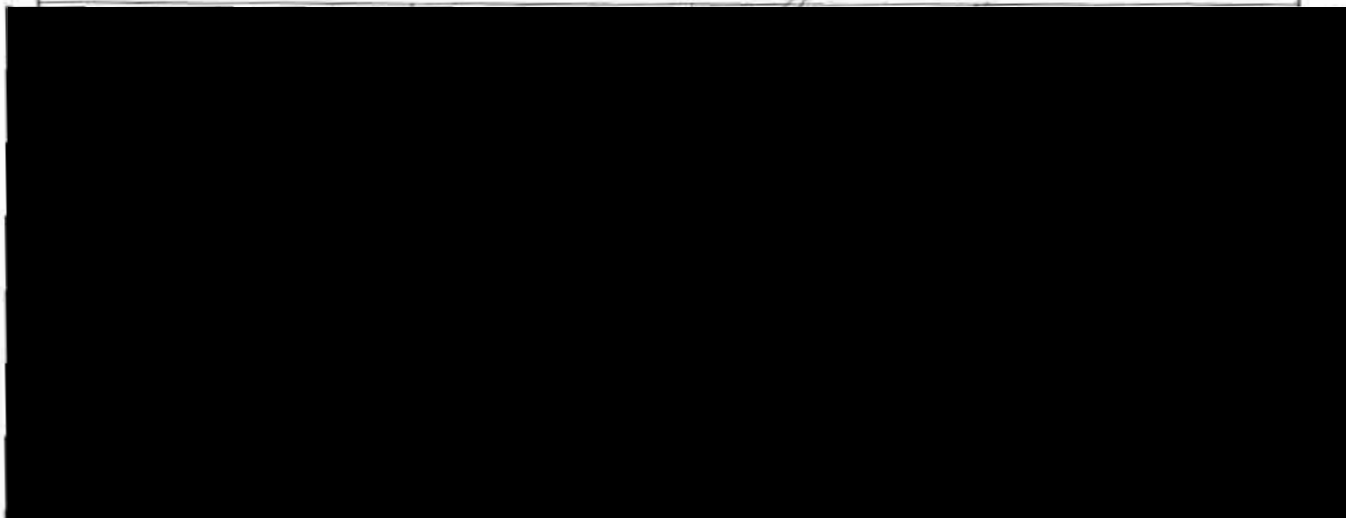

## PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. : 13

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

D2\_02-R5: Kanalizace - úprava větve A a RŠ1-RŠ5

Popis a lokalizace Změny:

Změna vedení kanalizační větve "A", dále vzhledem ke stavu podloží byl zadán požadavek na provedení betonového lože pod dna revizních šachet RŠ1-RŠ5.

Vliv na specifikaci ceny:


816 280,01 Kč

Vliv na harmonogram:

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.



# Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
500 080	Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL013	D2_06 Přeložka VDO a DO kabeláže s přípojkou NN u budovy 20	
Název stavby:	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice	
Objednatel:	Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa	
Zhotovitel:	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL, Tylova 220/17, 76701, Kroměříž	
Projektant:	ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava	
Technický dozor:		
Rozpočtoval:		
<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>		
Celkem (bez DPH)		377 878,65 Kč
DPH		79 354,52 Kč
DPH 21%		79 354,52 Kč
DPH 15%		0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)		457 233,17 Kč

Poznámka:

**Zakázka:** Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

**Rospočet:** ZL013: D2\_06 Příloška VDO a DO kabeláže s přípojkou NN u budovy 20

**Typ:** Změnový list

Poř.č.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
307.	6.1	Revizní práce, měření	hod	55,0	658,13	36 197,15 SOD
		Výkaz výměr: 55		55,000		
1.	34571350	trubka elektroinstalací ohebná dvojitá D 32/40 mm, HDPE+LDPE	m	435,0	24,58	10 692,30 SOD
		Výkaz výměr: doplnění kabelů pro přepojení WL17, KG: 410 stálé propojení mezi rozvaděči R11.1 - R11.2; 25		410,000 25,000		
32.	741123232	Montáž kabel Al plný nebo laněný kuličatý žíla 3x95+70 až 120+70 mm2 uložený volně (AYKY)	m	250,0	88,77	22 192,50 SOD
		Výkaz výměr: doplnění kabelů pro přepojení WL17, KG: 225 stálé propojení mezi rozvaděči R11.1 - R11.2; 25		225,000 25,000		
33.	34113223	kabel silový s Al jádrem 1 kv 3x120+70mm2	m	250,0	190,26	47 565,00 SOD
		Výkaz výměr: doplnění kabelů pro přepojení WL17, KG: 225 stálé propojení mezi rozvaděči R11.1 - R11.2; 25		225,000 25,000		
58.	210102310	Propojení kabelů silových celoplastových spojkou do 1 kv Raychem EPKI 0263	kus	28,0	739,72	20 712,16 SOD
		Výkaz výměr: doplnění kabelů pro přepojení WL17, KG: 3 stálé propojení mezi rozvaděči R11.1 - R11.2; 25		3,000 25,000		
59.	35436026	spojka kabelová smršťovaná průměr do 1kv 91ah-25s 4x95-300mm	kus	6,0	768,17	4 609,02 SOD
		Výkaz výměr: doplnění kabelů pro přepojení WL17, KG: 3 stálé propojení mezi rozvaděči R11.1 - R11.2; 3		3,000 3,000		
65.	741130014	Ukončení vodičů izolovaných do 120mm2 v rozvaděči nebo na přístroji	kus	9,0	118,36	1 065,24 SOD
		Výkaz výměr: doplnění kabelů pro přepojení WL17, KG: 6 stálé propojení mezi rozvaděči R11.1 - R11.2; 3		6,000 3,000		
89.	HZS-1	Kompletace	hod	6,0	455,21	2 731,26 SOD
		Výkaz výměr: doplnění kabelů pro přepojení WL17, KG: 3 stálé propojení mezi rozvaděči R11.1 - R11.2; 3		3,000 3,000		
90.	HZS-2	Vyhledání místa připojení	hod	2,0	512,11	1 024,22 SOD

Výkaz výměr: doplnění kabelů pro připojení WL17, KG; 1  
 stálé propojení mezi rozvaděči R11.1 - R11.2; 1

91.	HZS-3	Koordinace	hod	2,0	512,11	1 024,22	SOD
		Výkaz výměr: doplnění kabelů pro připojení WL17, KG; 1 stálé propojení mezi rozvaděči R11.1 - R11.2; 1		1,000 1,000			
10.099.	X126	Trasování kabelů MDO	m	435,0	80,00	34 800,00	R-pol.
		Výkaz výměr: trasování kabelů MDO pro objekt "I"; 435		435,000			

**ZP: Zemní práce**

112.	460510054	Kabelové prostory z trub plastových do rýhy bez obsahu, průměru do 10 cm	m	435,0	36,99	16 090,65	SOD
		Výkaz výměr: doplnění kabelů pro připojení WL17, KG; 410 stálé propojení mezi rozvaděči R11.1 - R11.2; 25		410,000 25,000			

**HSV: Práce a dodávky HSV**

<b>1: Zemní práce</b>							
42.	162201201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	20,0	209,40	4 188,00	SOD
		Výkaz výměr: přípojka NN u budovy 20; 20*1*1		20,000			

43.	162201209	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	20,0	191,19	3 823,80	SOD
		Výkaz výměr: přípojka NN u budovy 20; 20*1*1		20,000			

47.	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	12,8	15,20	194,56	SOD
		Výkaz výměr: Pro zásyp 16*0,8		12,800			

49.	174101101_01	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	16,0	88,22	1 411,52	SOD
		Výkaz výměr: přípojka NN u budovy 20; 20*1*0,8		16,000			

50.	583373680	šetrkopisek frakce netříděná zásyp	t	6,72	225,79	1 517,31	SOD
		Výkaz výměr: 10% zásypu		6,720			

26.	162701103_01	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	20,0	248,09	4 961,80	SOD
		Výkaz výměr: přípojka NN u budovy 20; 20*1*1		20,000			

28.	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	38,0	113,80	4 324,40	SOD
		Výkaz výměr: přípojka NN u budovy 20; 20*1*1*1,9		38,000			

29.	167101102_01	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	20,0	70,56	1 411,20	SOD
		Výkaz výměr: přípojka NN u budovy 20; 20*1*1		20,000			

9.	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	680,0	18,03	12 260,34	SOD
		Výkaz výměr:		680,000			

12.	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	20,0	54,63	1 092,60	SOD
		Výkaz výměr: přípojka NN u budovy 20; 20*1*1		20,000			

10.015.	132232202	Hloubení rýh do 10 m3 ručně šířky do 2 m v nesoudržné hornině tř. 3 při překopech inž sítí	m3	20,0	1 420,00	28 400,00	DOD1
---------	-----------	--	----	------	----------	-----------	------

10 016.	132232209	Výkaz výměr: přípojka NN u budovy 20; 20*1*1 Příplatek za lepvost, hloubení rýh do 10 m3 ručně šíře do 2 m v hornině tř. 3 při překopech sítí	m3	20,000	187,00	3 740,00	DOD1
		Výkaz výměr: přípojka NN u budovy 20; 20*1*1					
45.	919735114	<b>11: Zemní práce - přípravné a přidružené práce</b> Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm	m	40,0	277,67	11 086,80	SOD
		Výkaz výměr: přípojka NN u budovy 20; 20*2					
10 008.	113107025	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 400 do 500 mm při překopech ručně	m2	20,0	1 400,00	28 000,00	DOD1
		Výkaz výměr: přípojka NN u budovy 20; 20*1					
10 009.	113107036	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 100 do 150 mm při překopech ručně	m2	20,0	1 330,00	26 600,00	DOD1
		Výkaz výměr: přípojka NN u budovy 20; 20*1					
10 010.	113107145	Odstranění podkladu živičného tl přes 200 do 250 mm ručně	m2	20,0	619,00	12 380,00	DOD1
		Výkaz výměr: přípojka NN u budovy 20; 20*1					
71.	451573111_01	<b>45_00: Vodovorné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb</b> Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	5,0	1 217,69	6 088,45	SOD
		Výkaz výměr: lože pod chráničky kabeláže přípojky NN u budovy 20; 20*1*0,25					
453.	997013-R3	<b>99: Přesuny hmot a suti</b> Roztřídění stavebního odpadu na stavbě	t	33,2	22,76	755,63	SOD
		Výkaz výměr: hmotnost suti z odd. 11 "pol. 113107025:" ; 15 "pol. 113107036:" ; 6,6 "pol. 113107145:" ; 11,6					
99.	998012021	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m	t	10,11	266,30	2 692,29	SOD
		Výkaz výměr: 10,11					
142.	997221551	Vodovorná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	33,2	17,06	566,39	SOD
		Výkaz výměr: hmotnost suti z odd. 11 "pol. 113107025:" ; 15 "pol. 113107036:" ; 6,6 "pol. 113107145:" ; 11,6					
143.	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodovorné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 128,8	17,06	19 257,33	SOD
		Výkaz výměr: 1 128,800					
148.	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	6,6	250,37	1 652,44	SOD
		Výkaz výměr: hmotnost suti z odd. 11 "pol. 113106036:" ; 6,6					
149.	997221-R1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 302, - určeného k recyklaci	t	11,6	89,92	1 043,07	SOD

Výkaz výměr: hmotnost suti z odd. 11  
"pol. 113107145;" ; 11,6


11,600

150. 997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	15,0	113,80	1 707,00
----------------	--	---	------	--------	----------

SOD

Výkaz výměr: hmotnost suti z odd. 11  
"pol. 113107025;" ; 15

15,000



POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

14

Pokyn vydán (Správce stavby):

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

Předmět změny:

D2\_06 Přeložka VDO a DO kabeláže s přípojkou NN u budovy 20

Popis a lokalizace Změny:

Realizace přeložky VDO a DO kabeláže, doplnění kabelů pro přepojení WL17, KG a dále propojení mezi rozvaděči R11.1 a R11.2. Součástí přeložky je i přípojka NN u budovy 20 vč. zemních prací s ní spojených.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

## NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):

Předmět Změny:

D2\_06 Přeložka VDO a DO kabeláže s přípojkou NN u budovy 20

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Doplnění kabelů pro přepojení WL17, KG, propojení mezi rozvaděči R11.1 a R11.2, trasování kabelů MDO. Zemní práce hlavní, přípravné i příložené k realizaci přípojky NN u budovy 20, včetně revizních prací a měření.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

377 878,66 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

-

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

## ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : ZL013

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	[REDACTED]
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zínstav a.s. - S-VWZL
Změnový list překládá	[REDACTED]
Charakter změny	Změny stavby vyplývající ze zjištění v průběhu stavebních prací
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z., stavební práce II. D2_06: Rozvody NN
Specifikace změny	D2_06 Přeložka VDO a DO kabeláže s přípojkou NN u budovy 20
Zdůvodnění změny	Realizace přeložky VDO a DO kabeláže, doplnění kabelů pro přepojení WL17, KG a dále propojení mezi rozvaděči R11.1 a R11.2. Součástí přeložky je i přípojka NN u budovy 20 vč. zemních prací s ní spojených. Změna je realizována z důvodu zachování provozu nemocnice a pro eliminaci případné havárie na elektrorozvodech.
Finanční dopad změny	377 878,65 Kč
Změny ceny po schválení	663 931 125,55 Kč
Stanovisko Správce stavby:	[REDACTED]
Stanovisko projektanta:	[REDACTED]
Přílohy	Příloha - Soubor s fotodokumentací



## PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. : 14

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

D2\_06 Přeložka VDO a DO kabeláže s přípojkou NN u budovy 20

Popis a lokalizace Změny:

Realizace přeložky VDO a DO kabeláže, doplnění kabelů pro přepojení WL17, KG a dále propojení mezi rozvaděči R11.1 a R11.2. Součástí přeložky je i přípojka NN u budovy 20 vč. zemních prací s ní spojených.

Vliv na specifikaci ceny:

377 878,65 Kč

Vliv na harmonogram:

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

# Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky

**500 080**

Zakázka

**Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.**

Označení rozpočtu

**ZL014**

Název rozpočtu

**D2\_06: Ruční výkopy pro zastížení kabeláže - II. etapa**



**Název stavby:**

**Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice**

**Objednatel:**

*Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa*

**Zhotovitel:**

*Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL, Tylova 220/17, 76701, Kroměříž*

**Projektant:**

*ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava*

**Technický dozor:**

[Redacted]

**Rozpočtoval:**

[Redacted]

[Redacted]

## REKAPITULACE NÁKLADŮ

Celkem (bez DPH)	206 941,22 Kč
DPH	43 457,66 Kč
DPH 21%	43 457,66 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
<b>Cena celkem (včetně DPH)</b>	<b>250 398,88 Kč</b>

**Poznámka:**

[Redacted]

**Zakázka:** Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

**Rozpočet:** ZL014: D2\_06: Ruční výkopy pro zastížení kabeláže – II. etapa

**Typ:** Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
42.	162201201	<b>Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4</b>	m3	37,4	209,40	7 831,56 SOD
		Výkaz výměr: sondy pro zastížení kabeláže		-		
		sondy pro zastížení kabeláže vycházející spojovacíště; 3*2*1		6,000		
		odkrytí kabeláže u kotelny ; 10*1*1		10,000		
		odpočet bourání ve výkopech;-0,6		- 0,600		
		sondy pro odkop kabeláže v místech energocentra; 11*2*1		22,000		
43.	162201209	<b>Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny tř. 1 až 4</b>	m3	37,4	191,19	7 150,51 SOD
		Výkaz výměr: sondy pro zastížení kabeláže		-		
		sondy pro zastížení kabeláže vycházející spojovacíště; 3*2*1		6,000		
		odkrytí kabeláže u kotelny ; 10*1*1		10,000		
		odpočet bourání ve výkopech;-0,6		- 0,600		
		sondy pro odkop kabeláže v místech energocentra; 11*2*1		22,000		
26.	162701103_01	<b>Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4</b>	m3	37,4	248,09	9 278,57 SOD
		Výkaz výměr: sondy pro zastížení kabeláže		-		
		sondy pro zastížení kabeláže vycházející spojovacíště; 3*2*1		6,000		
		odkrytí kabeláže u kotelny ; 10*1*1		10,000		
		odpočet bourání ve výkopech;-0,6		- 0,600		
		sondy pro odkop kabeláže v místech energocentra; 11*2*1		22,000		
28.	171201211	<b>Poplatek za uložení stavebního odpadu - zemlny a kameniva na skládce</b>	t	51,26	113,80	5 833,39 SOD
		Výkaz výměr: sondy pro zastížení kabeláže		-		
		sondy pro zastížení kabeláže vycházející spojovacíště; (3*2*1)*1,9		11,400		
		odkrytí kabeláže u kotelny ; (10*1*1)*1,9		19,000		

**ZL014: D2\_06: Ruční výkopy pro zastížení kabeláže**

**A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP**

**D2\_06: Rozvody NN**

**D2\_06.: Rozvody NN**

**HSV: Práce a dodávky HSV**

**1: Zemní práce**

206 941,22

206 941,22

206 941,22

206 941,22

186 541,22

163 986,77



29. 167101102_01	odpočet bourání ve výkopech; -0,6*1,9 sondy pro odkop kabeláže v místech energocentra; 11*2*1	m3	37,4	70,56	2 638,94	SOD
	Výkaz výměr: Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 sondy pro zastížení kabeláže sondy pro zastížení kabeláže vycházející spojkovistiště; 3*2*1		6,000			
32. 174101101	odkrytí kabeláže u kotelny ; 10*1*1 odpočet bourání ve výkopech; -0,6 sondy pro odkop kabeláže v místech energocentra; 11*2*1	m3	38,0	110,28	4 190,64	SOD
	Výkaz výměr: Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním sondy pro zastížení kabeláže sondy pro zastížení kabeláže vycházející spojkovistiště; 3*2*1					
6. 583312000	odkrytí kabeláže u kotelny ; 10*1*1 sondy pro odkop kabeláže v místech energocentra; 11*2*1	t	79,8	398,31	31 785,14	SOD
	Výkaz výměr: šterkopisek netříděný zásypový materiál sondy pro zastížení kabeláže sondy pro zastížení kabeláže vycházející spojkovistiště; (3*2*1)*2,1					
120. 460620013	odkrytí kabeláže u kotelny ; (10*1*1)*2,1 sondy pro odkop kabeláže v místech energocentra; 11*2*1*2,1	m2	38,0	221,92	8 432,96	SOD
	Výkaz výměr: Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3 sondy pro zastížení kabeláže sondy pro zastížení kabeláže vycházející spojkovistiště; 3*2					
9. 162701109	odkrytí kabeláže u kotelny ; 10*1 sondy pro odkop kabeláže v místech energocentra; 11*2	m3	1 009,8	18,03	18 206,60	SOD
	Výkaz výměr: Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m		1 009,800			
12. 161101101	odkrytí kabeláže u kotelny ; 10*1*1 odpočet bourání ve výkopech; -0,6 sondy pro odkop kabeláže v místech energocentra; 11*2*1	m3	37,4	54,63	2 043,16	SOD
	Výkaz výměr: Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m sondy pro zastížení kabeláže sondy pro zastížení kabeláže vycházející spojkovistiště; 3*2*1					
10 015. 132232202	odkrytí kabeláže u kotelny ; 10*1*1 odpočet bourání ve výkopech; -0,6 sondy pro odkop kabeláže v místech energocentra; 11*2*1	m3	37,4	1 420,00	53 108,00	DOD1
	Výkaz výměr: Hloubení rýh do 10 m3 ručně šířky do 2 m v nesoudržné hornině tř. 3 při překopech inž sítí sondy pro zastížení kabeláže sondy pro zastížení kabeláže vycházející spojkovistiště; 3*2*1					
	odkrytí kabeláže u kotelny ; 10*1*1		10,000			

odpočet bourání ve výkopech;-0,6  
 sondy pro odkop kabeláže v místech energocentra; 11\*2\*1  
 Příplatek za leplivost, hloubení rýh do 10 m3 ručně šíře do 2 m v hornině tř. 3 při překopecích  
 sítí

10 016.	132232209	m3	37,4	187,00	6 993,80	DOD1
---------	-----------	----	------	--------	----------	------

Výkaz výměr: sondy pro zastižení kabeláže  
 sondy pro zastižení kabeláže vycházející spojovacíště; 3\*2\*1

odkrytí kabeláže u kotelny ; 10\*1\*1  
 odpočet bourání ve výkopech;-0,6  
 sondy pro odkop kabeláže v místech energocentra; 11\*2\*1

10 028.	139951121	m3	1,35	4 810,00	6 493,50	DOD1
---------	-----------	----	------	----------	----------	------

**Bourání kčf v hloubených vykopávkách ze zděiva z betonu prostého strojně**  
 výkaz výměr: Bourání betonových konstrukcí ve výkopu  
 spojovacíště; 0,6\*0,4\*1  
 odkrytí kabeláže; 3\*0,2\*0,6\*1  
 betonový základ zastižený ve výkopu u energocentra; 0,5\*1\*1,5

**99: Přesuny hmot a suti**

456.	998012104	t	39,371	398,31	15 681,84	SOD
------	-----------	---	--------	--------	-----------	-----

Výkaz výměr: 79,8

Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným obvodovým pláštěm v do 36 m

**997: Přesun sutě**

442.	997013217_01	t	2,97	1 650,14	4 900,92	SOD
------	--------------	---	------	----------	----------	-----

Výkaz výměr: beton  
 1,35\*2,2

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24m

443.	997013501	t	2,97	113,80	337,99	SOD
------	-----------	---	------	--------	--------	-----

Výkaz výměr: beton  
 1,35\*2,2

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením

444.	997013509	t	109,89	8,10	890,11	SOD
------	-----------	---	--------	------	--------	-----

Výkaz výměr:

109,890

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km

445.	997013801	t	2,97	250,37	743,60	SOD
------	-----------	---	------	--------	--------	-----

Výkaz výměr: beton  
 1,35\*2,2

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu  
 170 101

**VRN: Vedlejší rozpočtové náklady**

**20 400,00**

**VRN7: Provozní vlivy**

**20 400,00**

6 359.	VRN7002-R2_01	Kč	1,0	13 600,00	13 600,00	SOD
6 360.	VRN7003-R2_01	Kč	1,0	6 800,00	6 800,00	SOD

Provozní vlivy

Zajištění provozu jednotlivých oddělení v pavilonu

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

15

Pokyn vydán (Správce stavby):

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

Předmět změny:

D2\_06 Ruční výkopy pro zastižení kabeláže - II. etapa

Popis a lokalizace Změny:

Provedení sond pro lepší zmapování stávajících kabeláží a rozvodů v zájmovém území staveniště, které nejsou zohledněné v projektové dokumentaci. Sondy budou prováděné ručním výkopem.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

## NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. : 15

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):

Předmět Změny:

D2\_06 Ruční výkopy pro zastížení kabeláže - II. etapa

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Provedení sond pro lepší zmapování stávajících kabeláží a rozvodů v zájmovém území staveniště, které nejsou zohledněné v projektové dokumentaci. Sondy budou prováděné ručním výkopem.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

206 941,22 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

## ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : ZL014

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	[REDACTED]
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL
Změnový list překládá	[REDACTED]
Charakter změny	Změny stavby vyplývající ze zjištění v průběhu stavebních prací
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z., stavební práce II. D2_06: Rozvody NN
Specifikace změny	D2_06 Ruční výkopy pro zastížení kabeláže - II. etapa
Zdůvodnění změny	Během zemních prací bylo zjištěno, že v zájmovém území se nachází několik rozvodů neznámého původu, které nebyly zastíženy v projektové dokumentaci a zhotovitel tak o nich nemohl vědět. Byly provedeny další sondy na severní i jižní části výkopové jámy formou ručních výkopů pro lepší zmapování. Změna vyplývá ze zjištění učiněných v průběhu zemních prací a nebylo možné ji zohlednit při zpracování projektové dokumentace.
Finanční dopad změny	206 941,22 Kč
Změny ceny po schválení	664 138 086,77 Kč
Stanovisko Správce stavby:	[REDACTED]
Stanovisko projektanta:	[REDACTED]
Přílohy	Příloha - Soubor s fotodokumentací



## PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. : 15

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

D2\_06 Ruční výkopy pro zastižení kabeláže - II. etapa

Popis a lokalizace Změny:

Provedení sond pro lepší zmapování stávajících kabeláží a rozvodů v zájmovém území staveniště, které nejsou zohledněné v projektové dokumentaci. Sondy budou prováděné ručním výkopem.

Vliv na specifikaci ceny:

206 941,22 Kč

Vliv na harmonogram:

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

# Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
500 080	Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL015	D1_01: Přeložky datových kabelů v místech budoucích pilot	

Název stavby:	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice
Objednatel:	Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa
Zhotovitel:	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL, Tylova 220/17, 76701, Kroměříž
Projektant:	ATELIER PENTA v.o.s., Mříštkova 1166/12, 58601, Jihlava
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>	
Celkem (bez DPH)	189 754,51 Kč
DPH	39 848,45 Kč
DPH 21%	39 848,45 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
<b>Cena celkem (včetně DPH)</b>	<b>229 602,95 Kč</b>

**Poznámka:**

**Zakázka:** Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.  
**Rozpočet:** ZL015: D1\_01: Přeložky datových kabelů v místech budoucích pilot  
**Typ:** Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>ZL015: D1_01: Přeložky datových kabelů v místech budoucích pilot</b> <b>A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP</b> <b>D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP</b> <b>D1_01_1-RS: Stavební - Revize 5</b> <b>HSV: Práce a dodávky HSV</b> <b>1: Zemní práce</b>						
98.	162201201	Výkaz výměr: Přeložky kabelů za budovou E (28,2*1,15*1)-0,888 Součet	m3	31,542	209,40	6 604,89 SOD
99.	162211209	31,542; výměra položky Příplatek k vodovodnému přemístění nošení ZKD 10 m nošení výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	31,542	191,19	6 030,51 SOD
5 377.	162701103_01	Výkaz výměr: Přeložky kabelů za budovou E (28,2*1,15*1)-0,888 Součet	m3	31,542	248,09	7 825,25 SOD
5 379.	171201211	31,542; výměra položky Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	59,93	113,80	6 820,03 SOD
5 380.	167101102_01	Výkaz výměr: Přeložky kabelů za budovou E (28,2*1,15*1)-0,888 Součet	m3	31,542	70,56	2 225,60 SOD
32.	174101101	31,542; výměra položky Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	32,43	110,78	3 576,38 SOD

28,2*1,15*1 Součet	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32,43; výměra položky	32,430								
<b>6. 583312000</b>	<b>štrkopiesek netříděný zásypový materiál</b>	<b>t</b>	<b>68,103</b>	<b>398,31</b>	<b>27 126,11</b>	<b>SOD</b>			
Výkaz výměr: Přeložky kabelů za budovou E (28,2*1,15*1)*2,1 Součet									
68,103; výměra položky	68,103								
<b>5 981. 460620013_01</b>	<b>Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř.3</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>28,2</b>	<b>221,92</b>	<b>6 258,14</b>	<b>SOD</b>			
Výkaz výměr: Přeložky kabelů za budovou E 28,2*1 Součet									
28,2; výměra položky	28,200								
<b>6 380. 162701109</b>	<b>Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>851,634</b>	<b>18,03</b>	<b>15 354,96</b>	<b>SOD</b>			
Výkaz výměr: Součet									
851,634; výměra položky	851,634								
<b>6 897. 161101101_02</b>	<b>Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5m</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>31,542</b>	<b>54,63</b>	<b>1 723,14</b>	<b>SOD</b>			
Výkaz výměr: Přeložky kabelů za budovou E (28,2*1,15*1)-0,888 Součet									
31,542; výměra položky	31,542								
<b>10 015. 132212221</b>	<b>Hloubení rýh do 10m<sup>3</sup> ručně šířky do 2 m v nesoudržné hornině tř. 3 při výkopu překopech inž. sítí</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>31,542</b>	<b>1 420,00</b>	<b>44 789,64</b>	<b>DOD1</b>			
Výkaz výměr: Přeložky kabelů za budovou E (28,2*1,15*1)-0,888 Součet									
31,542; výměra položky	31,542								
<b>10 016. 132232209_01</b>	<b>Příplatek za lepitost, hloubení rýh do 10 m<sup>3</sup> ručně šíře do 2m v hornině tř.3 při překopech sítí</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>31,542</b>	<b>187,00</b>	<b>5 898,35</b>	<b>DOD1</b>			
Výkaz výměr: Přeložky kabelů za budovou E (28,2*1,15*1)-0,888 Součet									
31,542; výměra položky	31,542								
<b>10 028. 139951121</b>	<b>Bourání kcl v hloubených výkopávkách ze zdiva z betonu prostého strojně</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>0,888</b>	<b>4 810,00</b>	<b>4 271,28</b>	<b>DOD1</b>			
Výkaz výměr: Přeložky kabelů za budovou E 0,75*0,6*0,8 1,1*0,6*0,8 Součet									
0,888; výměra položky	0,888								

**99: Přesuny hmot a suti**

**27 126,11**

456.	998012104	Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným obvodovým pláštěm v do 36 m	t	68,103	398,31	27 126,11	SOD
		Výkaz výměr: 68,103					
		<b>997: Přesun sutě</b>				<b>4 474,09</b>	
442.	997013217_01	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24m	t	1,954	1 650,14	3 224,37	SOD
		Výkaz výměr: 1,954					
443.	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,954	113,80	222,37	SOD
		Výkaz výměr: 1,954					
444.	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	66,436	8,10	538,13	SOD
		Výkaz výměr: 66,436					
445.	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	1,954	250,37	489,22	SOD
		Výkaz výměr: 1,954					

**VRN: Vedlejší rozpočtové náklady**

**19 650,00**

**VRN7: Provozní vlivy**

**19 650,00**

6 359.	VRN7002-R2_01	Provozní vlivy	Kč	1,0	13 100,00	13 100,00	SOD
6 360.	VRN7003-R2_01	Zajištění provozu jednotlivých oddělení v pavilonu	Kč	1,0	6 550,00	6 550,00	SOD



POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

16

Pokyn vydán (Správce stavby):

Pokyn obdržén (Zhotovitel):

Předmět změny:

D1\_01 Přeložky datových kabelů v místech budoucích pilot

Popis a lokalizace Změny:

V rámci ručních sond pro zastižení kabeláže byly objeveny datové kabely v místech budoucích pilot, které byly ověřeny jako funkční a bylo potřeba je přeložit pro zachování funkčnosti. Přeložka je realizována u budovy E.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

## NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. : 16

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):

Předmět Změny:

D1\_01 Přeložky datových kabelů v místech budoucích pilot

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Přeložky jsou realizovány u budovy E hloubením rýh, vykopaná zemina bude odvezena na skládku a po přeložení datových kabelů budou rýhy zasypány a provizorně upraven terén.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

189 754,51 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

## ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : ZL015

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	[REDACTED]
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Žilinstav a.s. - S-VWZL
Změnový list předkládá	[REDACTED]
Charakter změny	Změny stavby vyplývající ze zjištění v průběhu stavebních prací
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z., stavební práce II. D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP
Specifikace změny	D1_01 Přeložky datových kabelů v místech budoucích pilot
Zdůvodnění změny	Během ručních sond pro zastžení kabeláže byly objeveny datové kabely v místech budoucích pilot, které byly ověřeny jako funkční. Tyto datové kabely je potřeba přeložit pro zachování funkčnosti.
Finanční dopad změny	189 754,51 Kč
Změny ceny po schválení	664 327 821,28 Kč
Stanovisko Správce stavby:	[REDACTED]
Stanovisko projektanta:	[REDACTED]
Přílohy	Příloha - Situace s vyznačením vedení přeložky



## PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. : 16

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

D1\_01 Přeložky datových kabelů v místech budoucích pilot

Popis a lokalizace Změny:

Během ručních sond pro zastižení kabeláže byly objeveny datové kabely v místech budoucích pilot, které byly ověřeny jako funkční a bylo potřeba je přeložit pro zachování funkčnosti. Přeložka je realizována u budovy E.

Vliv na specifikaci ceny:

189 754,51 Kč

Vliv na harmonogram:

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

# Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky

500 080

Zakázka

Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

Označení rozpočtu

ZL016

Název rozpočtu

D2\_02-R5: Zjištění litinového potrubí DN100, zaslepení, ruční výkopy



Název stavby:

Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice

Objednatel:

Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa

Zhotovitel:

Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL, Tylova 220/17, 76701, Kroměříž

Projektant:

ATELIER PENTA v.o.s, Mříštkova 1166/12, 58601, Jihlava

Technický dozor:

Rozpočtoval:



## REKAPITULACE NÁKLADŮ

Celkem (bez DPH)	76 049,10 Kč
DPH	15 970,31 Kč
DPH 21%	15 970,31 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
<b>Cena celkem (včetně DPH)</b>	<b>92 019,42 Kč</b>


**Zakázka:** Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

**Rozpočet:** ZL016: D2\_02-R5: Zjištění litinového potrubí DN100, zaslepení, ruční výkopy

**Typ:** Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
1.	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	36,0	66,37	2 389,32 SOD
		Výkaz výměr: 36,0		36,000		
42.	162201201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	11,25	209,40	2 355,75 SOD
		Výkaz výměr: Ruční odkopání pro zajištění potrubí; 5*1,5*1,5		11,250		
43.	162201209	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	11,25	191,19	2 150,89 SOD
		Výkaz výměr: Ruční odkopání pro zajištění potrubí; 5*1,5*1,5		11,250		
26.	162701103_01	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	11,25	248,09	2 791,01 SOD
		Výkaz výměr: Ruční odkopání pro zajištění potrubí; 5*1,5*1,5		11,250		
28.	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	21,375	113,80	2 432,48 SOD
		Výkaz výměr: Ruční odkopání pro zajištění potrubí; 5*1,5*1,9		21,375		
29.	167101102_01	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	11,25	70,56	793,80 SOD
		Výkaz výměr: Ruční odkopání pro zajištění potrubí; 5*1,5*1,5		11,250		
6.	583312000	štěrkopisec netříděný záspový materiál	t	23,625	398,31	9 410,07 SOD
		Výkaz výměr: Ruční odkopání pro zajištění potrubí; 5*1,5*1,5		23,625		
29.	174101101_01	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m3	11,25	88,22	992,48 SOD
		Výkaz výměr: Ruční odkopání pro zajištění potrubí; 5*1,5*1,5		11,250		
120.	460620013	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3	m2	7,5	221,92	1 664,40 SOD
		Výkaz výměr: Ruční odkopání pro zajištění potrubí; 5*1,5		7,500		
9.	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	382,5	18,03	6 896,44 SOD
		Výkaz výměr: 382,500		382,500		
12.	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	11,25	54,63	614,59 SOD
		Výkaz výměr: Ruční odkopání pro zajištění potrubí; 5*1,5*1,5		11,250		

10 015.	132232202	Hloubení rýh do 10 m3 ručně šířky do 2 m v nesoudržné hornině tř. 3 při překopech lnž sítí	m3	11,25	1 420,00	15 975,00	DOD1
		Výkaz výměr: Ruční odkopání pro zajištění potrubí; 5*1,5*1,5		11,250			
10 016.	132232209	Příplatek za lepitost, hloubení rýh do 10 m3 ručně šíře do 2 m v hornině tř. 3 při překopech sítí	m3	11,25	187,00	2 103,75	DOD1
		Výkaz výměr: Ruční odkopání pro zajištění potrubí; 5*1,5*1,5		11,250			
10 020.	87000-R01	11: Zemní práce - přípravné a přidružené práce Zaslepení požární vody na litinovém potrubí DN100	kpl	1,0	7 100,00	7 100,00	R-pol.
130.	997013111_01	96: Bourání konstrukcí Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,24	20,48	4,92	SOD
		Výkaz výměr: Demontáž stávajícího litinového potrubí DN100 hmotnost suti z oddílu 96		-			
		0,24		0,240			
131.	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	0,24	113,80	27,31	SOD
		Výkaz výměr: Demontáž stávajícího litinového potrubí DN100 hmotnost suti z oddílu 96		-			
		0,24		0,240			
132.	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8,16	8,10	66,10	SOD
		Výkaz výměr: Demontáž stávajícího litinového potrubí DN100 hmotnost suti z oddílu 96		-			
		8,160		8,160			
135.	997013831_01	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 170 904	t	0,24	307,27	73,74	SOD
		Výkaz výměr: Demontáž stávajícího litinového potrubí DN100 hmotnost suti z oddílu 96		-			
		0,24		0,240			
10 045.	722110815	Demontáž potrubí litinové přírubové DN přes 80 do 125	m	5,0	599,00	2 995,00	ÚRS
		Výkaz výměr: Demontáž stávajícího litinového potrubí DN100 svislé potrubí: 2 ležaté potrubí: 3		-			
		2,000		2,000			
		3,000		3,000			
456.	998012104	99: Přesuny hmot a suti Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným obvodovým pláštěm v do 36 m	t	23,63	398,31	9 412,07	SOD
		Výkaz výměr: 23,63		23,630			
6 359.	VRN7002-R2_01	Provozní vlivy	Kč	1,0	3 800,00	3 800,00	SOD
6 360.	VRN7003-R2_01	Zajištění provozu jednotlivých oddělení v pavilonu	Kč	1,0	2 000,00	2 000,00	SOD
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				5 800,00	
		VRN7: Provozní vlivy				5 800,00	



POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

17

Pokyn vydán (Správce stavby):

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

Předmět změny:

D2\_02-R5: Zjištění litinového potrubí DN100, zaslepení, ruční výkopy

Popis a lokalizace Změny:

Během zemních prací bylo zjištěno litinové potrubí pod budovou bývalého dětského oddělení neuvedené v DPS, které bude ručně odkopáno, odkopaná zeminy odvezena, stávající litinové potrubí demontováno a zaslepeno.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

## NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. : 17

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):

Předmět Změny:

D2\_02-R5: Zjištění litinového potrubí DN100, zaslepení, ruční výkopy

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Realizace ručních odkopů zjištěného litinového potrubí DN100 v místech pod budovou bývalého dětského oddělení. Odkopaná zemina bude odvezena, stávající litinové potrubí demontováno a zaslepeno.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

76 049,10 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

-

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

## ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : ZL016

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	[REDACTED]
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL
Změnový list překládá	[REDACTED]
Charakter změny	Změny stavby vyplývající ze zjištění v průběhu stavebních prací
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z., stavební práce II. D2_02-R5: Kanalizace - Revize 5
Specifikace změny	D2_02-R5: Zjištění litinového potrubí DN100, zaslepení, ruční výkopy
Zdůvodnění změny	Během zemních prací bylo zastiženo litinové potrubí pod budovou bývalého dětského oddělení neuvedené v DPS. Z důvodu vyvěrající netlakové vody z potrubí bude potrubí ručně odkopáno, odkopaná zemina odvezena, stávající litinové potrubí demontováno a provizorně zaslepeno.
Finanční dopad změny	76 049,10 Kč
Změny ceny po schválení	664 403 870,38 Kč
Stanovisko Správce stavby:	[REDACTED]
Stanovisko projektanta:	[REDACTED]
Přílohy	Příloha - Situace se zakreslením umístění zastiženého litinového potrubí

## PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. : 17

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

D2\_02-R5: Zjištění litinového potrubí DN100, zaslepení, ruční výkopy

Popis a lokalizace Změny:

Během zemních prací bylo zjištěno litinové potrubí pod budovou bývalého dětského oddělení neuvedené v DPS, které bude ručně odkopáno, odkopaná zeminy odvezena, stávající litinové potrubí demontováno a zaslepeno.

Vliv na specifikaci ceny:


76 049,10 Kč

Vliv na harmonogram:

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.



# Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
500 080	Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL017	D1_01: Zajištění příjezdových cest na zvodnělé pláni	

Název stavby:	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice
Objednatel:	Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa
Zhotovitel:	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL, Tylova 220/17, 76701, Kroměříž
Projektant:	ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>	
Celkem (bez DPH)	1 143 139,64 Kč
DPH	240 059,32 Kč
DPH 21%	240 059,32 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	1 383 198,96 Kč

Poznamka:

Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

Rozpočet: ZL017: D1\_01: Zajištění příjezdových cest na zvodnělé pláni

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		<b>ZL017: D1_01: Zajištění příjezdových cest na zvodnělé pláni</b>				<b>1 143 139,64</b>
		<b>A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP</b>				<b>1 143 139,64</b>
		<b>D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP</b>				<b>1 143 139,64</b>
		<b>D1_01_1-R5: Stavební - Revize 5</b>				<b>1 143 139,64</b>
		<b>HSV: Práce a dodávky HSV</b>				<b>1 143 139,64</b>
		<b>1: Zemní práce</b>				<b>624 642,27</b>
18.	131301102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	336,0	198,47	66 685,92
		Výkaz výměr: vnitrostaveništní komunikace: 35*12*0,8		336,000		
19.	131301109	Příplatek za lepitost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m3	168,0	9,10	1 528,80
		Výkaz výměr: vnitrostaveništní komunikace: 35*12*0,8*0,5		168,000		
24.	131401102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 5 objemu do 1000 m3	m3	84,0	528,96	44 432,64
		Výkaz výměr: vnitrostaveništní komunikace: 35*12*0,2		84,000		
39.	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	336,0	54,63	18 355,68
		Výkaz výměr: vnitrostaveništní komunikace: 35*12*0,8		336,000		
40.	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	84,0	54,63	4 588,92
		Výkaz výměr: vnitrostaveništní komunikace: 35*12*0,2		84,000		
44.	162701103	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	336,0	198,47	66 685,92
		Výkaz výměr: vnitrostaveništní komunikace: 35*12*0,8		336,000		
45.	162701153	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypání z horniny tř. 5 až 7	m3	84,0	198,47	16 671,48
		Výkaz výměr: vnitrostaveništní komunikace: 35*12*0,2		84,000		
46.	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	420,0	56,45	23 709,00
		Výkaz výměr: vnitrostaveništní komunikace: 336+84		420,000		
47.	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	420,0	15,20	6 384,00
		Výkaz výměr: vnitrostaveništní komunikace: 35*12		420,000		
48.	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	814,8	113,80	92 774,24
		Výkaz výměr: "viz pol.č.162701103 ; 336*1,9		638,400		
		"viz pol.č.162701153; 84*2,1		176,400		
54.	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	420,0	10,38	4 359,60
		Výkaz výměr: vnitrostaveništní komunikace: 35*12		420,000		
9.	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	11 424,0	18,03	205 973,67
		Výkaz výměr: 11 424,000				

10 030.	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 856,0	25,40	72 542,40	DOD1	
		Výkaz výměr:	2 856,000					
<b>2: Zakládání</b>								
10 049.	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy přes 100 m2 tl 300 mm	m2	420,0	355,00	149 100,00	ÚRS	
		Výkaz výměr: vnitrostaveništní komunikace; 35*12	420,000					
		Výkaz výměr: výhledové zábradlí; 1000 mm přes 100 m2 tl 100 mm	420,000					
<b>99: Přesuny hmot a suti</b>								
456.	998012104	Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným obvodovým pláštěm v do 36 m	t	534,1	398,31	212 737,37	SOD	
		Výkaz výměr: 357,090+177,01	534,100					

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

18

Pokyn vydán (Správce stavby):

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

Předmět změny:

D1\_01: Zajištění příjezdových cest na zvodnělé pláni

Popis a lokalizace Změny:

Realizace příjezdových cest na zvodnělé pláni na základě návrhu geotechnika pro lepší zásobování stavby materiálem a všeobecnou vnitrostaveništní dopravu.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

## NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. : 18

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):

Předmět Změny:

D1\_01: Zajištění příjezdových cest na zvodňené pláni

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Výkop stavební jámy s odvozem zvodnělé zeminy na skládku (nevhodná pro zásypy) a návoz vhodného kameniva pro zpevnění vnitrostaveništní komunikace.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

1 143 139,64 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

-

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

## ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : ZL017

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	[REDACTED]
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL
Změnový list překládá	[REDACTED]
Charakter změny	Změny stavby vyplývající ze zjištění v průběhu stavebních prací
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z., stavební práce II. D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP
Specifikace změny	D1_01: Zajištění příjezdových cest na zvodnělé pláni
Zdůvodnění změny	Realizace příjezdových cest na zvodnělé pláni na základě návrhu geotechnika pro lepší zásobování stavby materiálem a všeobecnou vnitrostaveništní dopravu. Změna byla vyvolána stavem podloží a masivním zvodněním stavební jámy.
Finanční dopad změny	1 143 139,84 Kč
Změny ceny po schválení	665 547 010,02 Kč
Stanovisko Správce stavby:	[REDACTED]
Stanovisko projektanta:	[REDACTED]
Přílohy	Příloha 1 - Situace se zakreslením příjezdové cesty
	Příloha 2 - Soubor s fotodokumentací

## PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. : 18

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

D1\_01: Zajištění příjezdových cest na zvodnělé pláni

Popis a lokalizace Změny:

Realizace příjezdových cest na zvodnělé pláni na základě návrhu geotechnika pro lepší zásobování stavby materiálem a všeobecnou vnitrostaveništní dopravu.

Vliv na specifikaci ceny:

1 143 139,64 Kč

Vliv na harmonogram:

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

# Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka
<b>500 080</b>	<b>Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.</b>
Označení rozpočtu	Název rozpočtu
<b>Z1020</b>	<b>D1_01: Oprava betonu (betonpumpa) pro betonáž pilot z důvodu stavu zavodnění stavební jámy</b>



Název stavby:	<b>Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice</b>
Objednatel:	<b>Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa</b>
Zhotovitel:	<b>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL, Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</b>
Projektant:	<b>ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava</b>
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Celkem (bez DPH)	201 590,70 Kč
DPH	42 334,05 Kč
DPH 21%	42 334,05 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
<b>Cena celkem (včetně DPH)</b>	<b>243 924,75 Kč</b>



**Zakázka:**

Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.  
**Rozpočet:** ZL020: D1\_01: Doprava betonu (betonpumpa) pro betonáž pilot z důvodu stavu zavodnění stavební jámy  
**Typ:** Změnový list

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
10 065. X109	<b>ZL020: D1_01: Doprava betonu (betonpumpa) pro betonáž pilot z důvodu stavu zavodnění stavební jámy</b> <b>A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP</b> <b>D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP</b> <b>D1_01_1-R5: Stavební - Revize 5</b> <b>HSV: Práce a dodávky HSV</b> <b>23: Zakládání - piloty</b> <b>Příplatek za čerpání betonu</b> Výkaz výměr: Čerpání betonu pro piloty 547,402	m3	547,402	350,00	201 590,70 201 590,70 201 590,70 201 590,70 201 590,70 201 590,70 191 590,70
10 066. X1001	<b>Úprava území pro vjezd a manipulaci betonpumpy</b> 547,402	kpl	1,0	10 000,00	10 000,00 R-pol.



POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

19

Pokyn vydán (Správce stavby):

Pokyn obdržén (Zhotovitel):

Předmět změny:

D1\_01 Doprava betonu pro betonáž pilot z důvodu stavu zavodnění stavební jámy

Popis a lokalizace Změny:

Vzhledem ke zvodněnému stavu stavební jámy a nevyhovující únostnosti zeminy pro příjezd autodomichávače při betonáži pilot je vynuceno použití betonpumpy pro dopravu betonu na místo.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

## NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. : 19

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):

Předmět Změny:

D1\_01 Doprava betonu pro betonáž pilot z důvodu stavu zavodnění stavební jámy

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Vzhledem ke zvodněnému stavu stavební jámy a nevyhovující únosnosti zemin pro příjezd autodomíchávače při betonáži pilot je vynuceno použít betonpumpy pro dopravu betonu na místo.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

201 590,70 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

-

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

## ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : ZL020

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	[REDACTED]
Zhotovitel	Sdružení firem VV WACHAL a.s. a Zínstav a.s. - S-VWZL
Změnový list překládá	[REDACTED]
Charakter změny	Změny stavby vyplývající ze zjištění v průběhu stavebních prací
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z., stavební práce II. D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP
Specifikace změny	D1_01 Doprava betonu pro betonáž pilot z důvodu stavu zavodnění stavební jámy
Zdůvodnění změny	Vzhledem ke zvodněnému stavu stavební jámy a nevyhovující únosnosti zeminy pro příjezd autodorního čerpadla při betonáži pilot je vynuceno použití betonpumpy pro dopravu betonu na místo.
Finanční dopad změny	201 590,70 Kč
Změny ceny po schválení	665 748 600,72 Kč
Stanovisko Správce stavby:	[REDACTED]
Stanovisko projektanta:	[REDACTED]
Přílohy	Příloha - Soubor s fotodokumentací
	[REDACTED]
	[REDACTED]

## PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. : 19

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

D1\_01 Doprava betonu pro betonáž pilot z důvodu stavu zavedení stavební jámy

Popis a lokalizace Změny:

Vzhledem ke zvodněnému stavu stavební jámy a nevyhovující únosnosti zeminy pro příjezd autodomíchávače při betonáži pilot je vynuceno použití betonpumpy pro dopravu betonu na místo.


Vliv na specifikaci ceny:

201 590,70 Kč

Vliv na harmonogram:

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

# Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
<b>500 080</b>	<b>Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.</b>	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
<b>ZL021</b>	<b>D1_01: Zjištění a zajištění kaverny objevené během pilotování (piloty P20, P31)</b>	

Název stavby:	<b>Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice</b>
Objednatel:	<i>Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL, Týlova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava</i>

Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>	
Celkem (bez DPH)	99 385,30 Kč
DPH	20 870,91 Kč
DPH 21%	20 870,91 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
<b>Cena celkem (včetně DPH)</b>	<b>120 256,21 Kč</b>

**Zakázka:** Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.  
**Rozpočet:** ZL021: D1\_01: Zjištění a zajištění kaverny objevené během pilotování (piloty P20, P31)  
**Typ:** Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
10 065.	X109	ZL021: D1_01: Zjištění a zajištění kaverny objevené během pilotování (piloty P20, P31) A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP D1_01_1-R5: Stavební - Revize 5 HSV: Práce a dodávky HSV 23: Zakládání - piloty Příplatek za čerpání betonu	m3	17,1	350,00	99 385,30
		Výkaz výměr: Čerpání betonu pro vyplnění kaverny		17,100		5 985,00 R-pol.
10 067.	27531127	Základové patky a bloky z betonu prostého C 25/30	m3	17,1	4 300,00	73 530,00 ÚRS
		Výkaz výměr: Sanace kaverny □ piloty P30 Rozměr kaverny: 3,0*3,0*1,9		17,100		
456.	998012104	99: Přesuny hmot a sutí Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným obvodovým pláštěm v do 36 m	t	43,61	398,31	17 370,30
		Výkaz výměr: 43,61		43,610		17 370,30 SOD
10.	VRN700Z-R21	OVN.: Ostatní a vedlejší náklady OVN.: Ostatní a vedlejší náklady VRN: Vedlejší rozpočtové náklady VRN7: Provozní vlivy Provozní vlivy	Kč	1,0	2 500,00	2 500,00 SOD



POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

20

Pokyn vydán (Správce stavby):

Pokyn obdržén (Zhotovitel):

Předmět změny:

D1\_01 Zjištění a zajištění kaverny objevené během pilotování

Popis a lokalizace Změny:

Během pilotování byla u piloty P20, P31 zjištěna kaverna, kterou je nutno zajistit.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.



## NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. : 20

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):

Předmět Změny:

D1\_01 Zjištění a zajištění kaverny objevené během pilotování

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Během pilotování byla u piloty P20, P31 zjištěna kaverna, kterou je nutno zajišťt. Sanace kaverny je provedena vyplněním betonovou směsí.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

99 385,30 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

-

Tento Návrh ocenění změny nemá být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

## ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : ZL021

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	[REDACTED]
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zinstav a.s. - S-VWZL
Změnový list předkládá	[REDACTED]
Charakter změny	Změny stavby vyplývající ze zjištění v průběhu stavebních prací
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z., stavební práce II. D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP
Specifikace změny	D1_01 Zjištění a zajištění kaverny objevené během pilotování
Zdůvodnění změny	Během pilotování byla u piloty P20, P31 zjištěna kaverna, kterou je nutno zajistit. Sanace kaverny je provedena vyplněním betonovou směsí. Změna byla vyvolána situací zjištěnou během realizace a nebylo možné ji předpokládat.
Finanční dopad změn	99 385,30 Kč
Změny cen po schválení	665 847 986,02 Kč
Stanovisko Správce stavby:	[REDACTED]
Stanovisko projektanta:	[REDACTED]
Přílohy	Příloha 1 - Situace s vyznačeným místem objevené kaverny Příloha 2 - Soubor s fotodokumentací

## PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. : 20

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

D1\_01 Zjištění a zajištění kaverny objevené během pilotování

Popis a lokalizace Změny:

Během pilotování byla u piloty P20, P31 zjištěna kaverna, kterou je nutno zajistit.

Vliv na specifikaci ceny:

99 385,30 Kč

Vliv na harmonogram:

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

# Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka
<b>500 080</b>	<b>Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.</b>
Označení rozpočtu	Název rozpočtu
<b>ZL022</b>	<b>D1_01_4g - Dodávka a montáž UPS 40kW, odpočet původních UPS</b>



<b>Název stavby:</b>	<b>Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice</b>
<b>Objednatel:</b>	<b>Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa</b>
<b>Zhotovitel:</b>	<b>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlinstav a.s. - S-VWZL, Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</b>
<b>Projektant:</b>	<b>ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava</b>
<b>Technický dozor:</b>	
<b>Rozpočtoval:</b>	

REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Celkem (bez DPH)	772 361,37 Kč
DPH	162 195,89 Kč
DPH 21%	162 195,89 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
<b>Cena celkem (včetně DPH)</b>	<b>934 557,26 Kč</b>

**Zakázka:** Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

**Rozpočet:** ZL022: D1\_01\_4g - Dodávka a montáž UPS 40kW, odpočet původních UPS

**Typ:** Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
------	-----	-------	----	--------	------------	------

**ZL022: D1\_01\_4g - Dodávka a montáž UPS 40kW, odpočet původních UPS**

**A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP**

**D1\_01:** Pavilon emergency, COS, CS a JIP

**D1\_01\_4g:** Silnoproudá elektrotechnika

**P:** Odděly prací PSV

10 175.	741122223	741: Elektromontáže Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	20,0	34,40	688,00
10 176.	X239	PRAFlaDur-J 4x16 RE	m	20,0	308,10	6 162,00
10 177.	741122644	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x16 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	30,0	53,60	1 608,00
10 178.	34113035	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť (CYKY) 5x16mm2	m	20,0	326,00	6 520,00
10 179.	X240	H07RN-F 5G16	m	10,0	357,51	3 575,10
10 180.	X241	OPV22, odpínač válcových pojistek	ks	2,0	2 602,86	5 205,72
10 191.	X292	Sestavení a oživení UPS	ks	1,0	87 563,00	87 563,00
10 192.	X293	Doprava a stěhování UPS v úrovni po bezbarierové trase	ks	1,0	39 220,00	39 220,00
10 193.	X296	Podružný montážní materiál	kpl	1,0	18 035,14	18 035,14

**SIL01: 1. Dodávky**


**SIL01.: 1. Dodávky**

31.	1.33	Náhradní zdroj pro operační svítidlo 0,7 kVA, doba zálohy 3 hodiny, kompletní, včetně signalizačního - panelu, dopravy, oživení a motáže	ks	- 6,0	35 318,17	- 211 909,02
216.	3.177	Vodič(CYA) H07V-K 16 zz, včetně montáže	m	40,0	86,19	3 447,60

Výkaz výměr: černý / 10+10  
modrý / 5+5  
zelenožlutý / 5+5

10 173.	X236	Náhradní zdroj UPS Legrand Forte 40kVA / 40kW	ks	1,0	299 516,00	299 516,00
10 174.	X238	Rozvaděč RUPS , projekce vč, výroby	ks	1,0	93 416,21	93 416,21
10 190.	X291	Bateriový modul s bateriemi včetně kabeláže	ks	1,0	229 771,00	229 771,00

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>SIL23: 3. Materiál</b>					
<b>SIL30: Ostatní práce a materiály</b>					
305. 5.9	Autorský dozor projektanta	hod	20,0	1 234,01	24 680,20
10 172. X235	Koordinace prováděných prací	hod	8,0	1 138,03	9 104,24
10 181. X242	Revize	kpl	1,0	7 200,00	7 200,00
10 182. X243	Úprava schématu rozvaděče RH	hod	10,0	1 234,01	12 340,10
10 183. X244	Osazení motorického odpínače-Místní šetření-předpoklad	hod	14,0	1 138,03	15 932,42
10 184. X245	Osazení motorického odpínače-Realizace osazení mimo pracovní dobu-předpoklad	hod	18,0	1 707,05	30 726,90
10 185. X246	Osazení motorického odpínače-Podružný materiál-předpoklad	kpl	1,0	7 360,76	7 360,76
10 188. X289	Doprava	kpl	3,0	9 066,00	27 198,00
10 206. X310	Příplatek za prodloužení záruky UPS na 60 měsíců	kpl	1,0	55 000,00	55 000,00
					<b>189 542,62</b>
					<b>189 542,62</b>



POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

21

Pokyn vydán (Správce stavby):

Pokyn obdržén (Zhotovitel):

Předmět změny:

D1\_01\_4g: Dodávka a montáž UPS 40kW, odpočet původních UPS

Popis a lokalizace Změny:

Změna na dodávce UPS. Vzhledem k nemožnosti zrealizovat původní projekční požadavek na přesun stávající UPS do 2.NP energocentra a její následné využití, byla přijata změna na dodávce UPS. Stávající UPS již není provozuschopná a není možné po přesunu vydat revizi na přístroj. Původní požadavek též nevyhovuje z důvodu změny energokoncepce ČEZ.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

## NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. : 21

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):

Předmět Změny:

D1\_01\_4g: Dodávka a montáž UPS 40kW, odpočet původních UPS

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Změna na dodávce UPS. Vzhledem k nemožnosti zrealizovat původní projekční požadavek na přesun stávající UPS do 2.NP energocentra a její následné využití, byla přijata změna na dodávce UPS. Stávající UPS již není provozuschopná a není možné po přesunu vydat revizi na přístroj. Původní požadavek též nevyhovuje z důvodu změny energokoncepce ČEZ.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

772 381,37 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.



## ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : ZL022

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlinstav a.s. - S-VWZL
Změnový list překládá	
Charakter změny	Změny stavby vyplývající ze zjištění v průběhu stavebních prací
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z., stavební práce II. D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP
Specifikace změny	D1_01_4g: Dodávka a montáž UPS 40kW, odpočet původních UPS
Zdůvodnění změny	Změna na dodávce UPS. Vzhledem k nemožnosti zrealizovat původní projekční požadavek na přesun stávající UPS do 2.NP energocentra a její následné využití, byla přijata změna na dodávce UPS. Stávající UPS již není provozuschopná a není možné po přesunu vydat revizi na přístroj. Původní požadavek též nevyhovuje z důvodu změny energokoncepce ČEZ.
Finanční dopad změny	772 361,37 Kč
Změny ceny po schválení	666 620 347,39 Kč
Stanovisko Správce stavby:	
Stanovisko projektanta:	
Přílohy	Příloha - Soubor s fotodokumentací

## PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. : 21

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

D1\_01\_4g: Dodávka a montáž UPS 40kW, odpočet původních UPS

Popis a lokalizace Změny:

Změna na dodávce UPS. Vzhledem k nemožnosti zrealizovat původní projekční požadavek na přesun stávající UPS do 2.NP energocentra a její následné využití, byla přijata změna na dodávce UPS. Stávající UPS již není provozuschopná a není možné po přesunu vydat revizi na přístroj. Původní požadavek též nevyhovuje z důvodu změny energokoncepce ČEZ.

Vliv na specifikaci ceny:

772 361,37 Kč

Vliv na harmonogram:

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.
