

Dodatek č. 5

Smlouvy o dílo, na akci: Sektor VIII – etapa III

č. NŘZ/Ně/040/2020

Smluvní strany v souladu s čl. IV. odst. 3 a čl. XVIII. odst. 8 Smlouvy o dílo na akci „Sektor VIII – etapa III“, uzavřené dne 19. 3. 2020 pod č. Objednatele NŘZ/Ně/040/2020, ve znění Dodatku č. 1 účinného ode dne 26. 2. 2021, Dodatku č. 2 účinného ode dne 9. 9. 2021, Dodatku č. 3 účinného ode dne 17. 12. 2021 a Dodatku č. 4 účinného ode dne 22. 3. 2022 (dále jen „Smlouva“), upravují a mění níže uvedeného dne, měsíce a roku citovanou Smlouvu a uzavírají k ní tento Dodatek č. 5.

Smluvní strany

Objednatel:

DIAMO, státní podnik

Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem

zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn.: AXVIII 520

Zastoupený: [redacted] ředitelem státního podniku

Týká se:

DIAMO, státní podnik

odštěpný závod PKÚ

Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39 Chlumeč

IČO: 00002739, DIČ: CZ00002739, plátce DPH

Bankovní spojení: [redacted]

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických

[redacted]

Osoby oprávněné k jednání ve věcech obchodních

[redacted]

Fakturační a korespondenční adresa:

DIAMO, státní podnik

odštěpný závod PKÚ

Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39 Chlumeč

Zhotovitel:

Členové společnosti „Společnost GG-MND-REK“

vzniklé na základě Společenské smlouvy č. A1402/2019/SOS/46 ze dne 14. 11. 2019, s adresou pro doručování písemností: GEOSAN GROUP a.s. – Závod ekologických a energetických staveb, U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7

„Vedoucí společník“

GEOSAN GROUP a.s.

U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

Zapsaný v OR: u Městského soudu v Praze, sp. zn.: B 12459

IČO: 281 69 522, **DIČ:** CZ28169522

Bankovní spojení:

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Zastoupen: [redacted] předsedou představenstva

[redacted] členem představenstva

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických

„Společník 1“
MND Drilling & Services a.s.
Velkomoravská 900/405, 696 18 Lužice

Zapsaný v OR: u Krajského soudu v Brně, sp. zn. B 2843

IČO: 255 47 631, **DIČ:** CZ25547631

Bankovní spojení:

č. ú.

Zastoupen:

„Společník 2“

REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.
Drážďanská 856/74b, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem

Zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. C 14364

IČO: 250 41 738, **DIČ:** CZ25041738

Bankovní spojení:

č. ú.

Zastoupena: [redacted] jednatelem společnosti

Dle dodatku č. 1 ke Společenské smlouvě ze dne 14. 11. 2019 jsou oprávněni k podpisu smlouvy o dílo, včetně případných dodatků Vedoucí společník – společnost GEOSAN GROUP a.s. společně se Společníkem 2 – společností REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.

Bankovní spojení členů Společnosti GG-MND-REK pro platební styk související s realizací díla dle smlouvy o dílo:

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo společného účtu členů Společnosti GG-MND-REK: [redacted]

(dále
společně jen
„Smluvní
strany“)

I. Důvod uzavření Dodatku

Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 5 je:

1. aktualizace přílohy č. 2 Smlouvy – Časový a finanční harmonogram, a to dle upřesnění a návrhu Zhotovitele;
2. změna postupu prací a ceny díla, kterou Objednatel nemohl předvídat.

Během realizace sanačních prací došlo k upřesnění rozsahu kontaminovaných zemín a vod. Celkové množství odtěžených kontaminovaných zemín bylo oproti předpokládanému množství dle projektové dokumentace dosud vysanovaných sond větší. Sensoricky i vizuálně byla zjištěna zřejmá kontaminace zasahující i mimo projektové kontury sanačních jam.

Celkové množství kontaminovaných vod, které bylo při sanačních pracích zastiženo, odčerpáno a odvezeno k přečištění, bylo oproti předpokládanému množství dle projektové dokumentace dosud vysanovaných sond naopak podstatně menší. Rozsah sanačních prací tak bude třeba v rámci odtěžování kontaminovaných zemin zvýšit (dále jen „vícepráce“) a v rámci odčerpávání kontaminovaných vod snížit (dále jen „méněpráce“).

V souvislosti se začleněním víceprací nebudou vytvořeny žádné nové položky v rozpočtu dle Smlouvy. Výše uvedená změna Smlouvy byla odsouhlasena účastníky kontrolního dne 12. 1. 2023, zástupci Objednatele, Zhotovitele, supervize a autorského dozoru. Na jeho základě byla vytvořena příloha č. 2 Dodatku č. 5 - Protokol změny č. A6078/2023/04 včetně přílohy č. 1 - Položkový rozpočet stavby s vyčíslením změny a přílohy č. 2 – Zápis z kontrolního dne 12. 1. 2023. Dále byla zpracována příloha č. 1 Dodatku č. 5 - Časový a finanční harmonogram, která představuje aktualizaci přílohy č. 2 Smlouvy, a příloha č. 3 Dodatku č. 5 – Celkový soupis prací.

Uvedená změna ceny díla (hodnota víceprací a méněprací podle Dodatku č. 5) představuje ve smyslu ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nepodstatnou změnu závazku ve výši 0,54 % hodnoty závazku. Celková změna ceny díla po uzavření Dodatku č. 5 činí 6,17 % původní hodnoty závazku.

II. Změna Smlouvy

1. Smluvní strany upřesňují a aktualizují původní znění přílohy č. 2 Smlouvy – Časový a finanční harmonogram v těchto částech:

- finanční harmonogram za rok 2022;
- předpokládaný finanční harmonogram pro rok 2023.

Původní znění přílohy č. 2 Smlouvy – Časový a finanční harmonogram se ruší a nahrazuje novým zněním, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 5.

2. Dohodou Smluvních stran se ruší stávající znění čl. VI. odst. 1 Smlouvy a zcela se nahrazuje tímto novým zněním:

Cena díla je stanovena dle aktuální situace a činí:

Původní cena díla dle Smlouvy	569 896 598,03 Kč
Cena díla dle Smlouvy, ve znění Dodatku č. 2 v Kč bez DPH	572 417 873,03 Kč
Cena díla dle Smlouvy, ve znění Dodatku č. 3 v Kč bez DPH	578 177 399,83 Kč
Cena díla dle Smlouvy, ve znění Dodatku č. 4 v Kč bez DPH	579 785 836,83 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 5 v Kč bez DPH	+ 572 124,00 Kč
<u>Cena méněprací dle Dodatku č. 5 v Kč bez DPH</u>	<u>- 2 561 351,40 Kč</u>
Cena díla po provedení změn – cena celkem v Kč bez DPH	577 796 609,43 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 5 nezměněna.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
3. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tento Dodatek č. 5 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 5. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tento Dodatek č. 5 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Dodatek č. 5 po jeho podpisu bez zbytečného odkladu.
4. Tento Dodatek č. 5 je vyhotoven v jediném elektronickém vyhotovení, které Smluvní strany opatří kvalifikovaným elektronickým podpisem osob oprávněných zastupovat Smluvní stranu dle úvodních ustanovení tohoto Dodatku č. 5.

5. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 5, že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jej nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek a v tisni, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou Smluvních stran své podpisy.
6. Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle uvedeného zákona zajistí Objednatel. Případná plnění Smluvních stran v rámci předmětu Smlouvy o dílo před nabytím účinnosti tohoto Dodatku č. 5 se považují za plnění dle Smlouvy o dílo, včetně práv a povinností z toho vyplývajících.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 5 je:
 - Příloha č. 1: Časový a finanční harmonogram (příloha č. 2 Smlouvy)
 - Příloha č. 2: Protokol změny č. A6078/2023/04 včetně přílohy č. 1: Položkový rozpočet stavby s vyčíslením změny, přílohy č. 2: Zápis z kontrolního dne 12. 1. 2023
 - Příloha č. 3: Celkový soupis prací

Ve Stráži pod Ralskem dne



Digitální podpis:
27.03.2023 13:27

ředitel státního podniku
DIAMO, státní podnik
(Objednatel)

V Praze dne




Digitálně podepsal

Datum: 2023.02.28
12:59:33 +01'00'

předseda představenstva
GEOSAN GROUP a.s.
vedoucí společník Společnosti GG-MND-REK
(Zhotovitel)

V Praze dne




Digitálně podepsal

Datum: 2023.02.28
12:58:13 +01'00'

člen představenstva
GEOSAN GROUP a.s.
vedoucí společník Společnosti GG-MND-REK
(Zhotovitel)

V Ústí nad Labem dne



Digitálně podepsal

Datum: 2023.02.24
08:16:39 +01'00'

jednatel
REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.
společník 2 Společnosti GG-MND-REK
(Zhotovitel)

Příloha č. 1

Časový a finanční harmonogram

Příloha č. 1 Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo na akci: "Sektor VIII etapa III"

kód akce: A6078

č. NŘZ/Ně/040/2020

č. akce Zhotovitele: AV 200004.1.140

Časový a finanční harmonogram

rok	počet SEZ (ks)	cenový objem (Kč)
2020	11	147 510 299,56 Kč
2021	14	204 188 354,70 Kč
2022	12	92 217 442,14 Kč
2023	12	125 948 224,09 Kč
2024	0	7 932 288,94 Kč
CELKEM	49	577 796 609,43 Kč

Příloha č. 2

**Protokol změny č. A6078/2023/04 vč.
přílohy č. 1 – Položkový rozpočet stavby s vyčíslením změny
přílohy č. 2 - Zápis z kontrolního dne 12. 1. 2023**

Protokol změny stavby	č.: A6078/2023/04
Zhotovitel: Společnost GG-MND-REK vzniklá na základě Společenské smlouvy č. A1402/2019/SOS/46 ze dne 14. 11. 2019 <i>Vedoucí společník:</i> GEOSAN GROUP a.s. U Nemocnice 430 280 02 Kolín III IČO: 28169522 DIČ: CZ28169522	Objednatel: DIAMO, státní podnik odštěpný závod PKÚ Hrbovická 2, Hrbovice 403 39 Chlumeč IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739
Název akce: Sektor VIII – etapa III (kód akce A6078)	Datum změny: 13. 1. 2023
Projektová dokumentace: Dokumentace pro provádění stavby zpracovaná 02/2019 [REDAKCE], IČO 45162948	Smlouva o dílo: č. objednatele: NŘZ/Ně/040/2020 č. zhotovitele: AV.200004.1.140 ve znění dodatku č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4
Stavební objekt: Sanace zemin a podzemních vod Nepředvídatelná změna prací: 1. Změna rozsahu sanačních prací – Sanace zemin 2. Změna rozsahu sanačních prací – Sanace podzemních vod <i>Změna dle § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek</i> Důvod provedení změny: Během realizace sanačních prací v období od zahájení Díla, kdy byly zrealizovány sanační práce u 11 sond (z celkových 12), došlo k upřesnění množství kontaminovaných zemin a vod. Skutečné celkové množství odtěžených kontaminovaných zemin bylo o 8,27% větší (tj. 1494,70 m ³) oproti celkovému množství dle Projektové dokumentace dosud vysanovaných sond (tj. 1380,50 m ³). Senzoricky i vizuálně byla zjištěna zřejmá kontaminace zasahující i mimo projektované kontury sanačních jam. Skutečné množství kontaminovaných vod, které bylo při sanačních pracích zastiženo, odčerpáno a odvezeno k přečištění, činí pouze 26,98% (tj. 431,00 m ³) oproti celkovému množství dle Projektové dokumentace dosud vysanovaných sond (tj. 1597,50 m ³). Tato skutečnost nebyla před zahájením prací známa a objednatel ji nemohl předvídat. U kontaminovaných zemin dojde k navýšení celkového množství (o 114,00 m ³). U kontaminovaných vod dojde ke snížení celkového množství (o 1167,00 m ³). Tímto Protokolem změny dojde ke snížení celkové ceny díla dle SoD.	

Tento Protokol změny stavby řeší tuto skutečnost z toho důvodu, aby bylo možné dokončit sanační práce i u poslední sondy **P54**, a to v projektovaném rozsahu.

Rozsah položek v kompletu sanací, u kterých bude upraveno množství jednotek a jejich finanční vyčíslení, je přílohou (Příloha č. 1) tohoto Protokolu změny a bude obsaženo v Dodatku č. 5 ke SoD.

Tato změna byla odsouhlasena účastníky kontrolního dne 12. 1. 2023 - zástupci objednatele, zhotovitele, supervize a autorského dozoru. Zápis z kontrolního dne 12. 1. 2023 je přílohou č. 2 tohoto Protokolu změny.

Nejsou vloženy žádné nové položky, jsou použity pouze a jen zasmělněné jednotkové ceny.

Hodnota změny:

Na základě výše uvedeného byl vyhotoven položkový rozpočet stavby s vyčíslením změny, který je přílohou č. 1 tohoto Protokolu změny.

Vícepráce (sanace zemin) ...	+ 572.124,00 Kč
Méněpráce (sanace vod) ...	- 2,561.351,40 Kč
Změna celkem ...	- 1,989.227,40 Kč

Rekapitulace finančních dopadů změn *:


Původní hodnota závazku dle smlouvy o dílo vč. Dodatků 1 - 4	579,785.836,83 Kč
Změny celkem.....	-1,989.227,40 Kč
Hodnota závazku po provedení změny	577,796.609,43 Kč

**Uvedené hodnoty v Kč jsou bez DPH*

Přílohy:

1. Položkový rozpočet stavby s vyčíslením změny
2. Zápis z kontrolního dne 12. 1. 2023

Za zhotovitele:
Za supervizi:
Za projektanta:
Za objednatele:

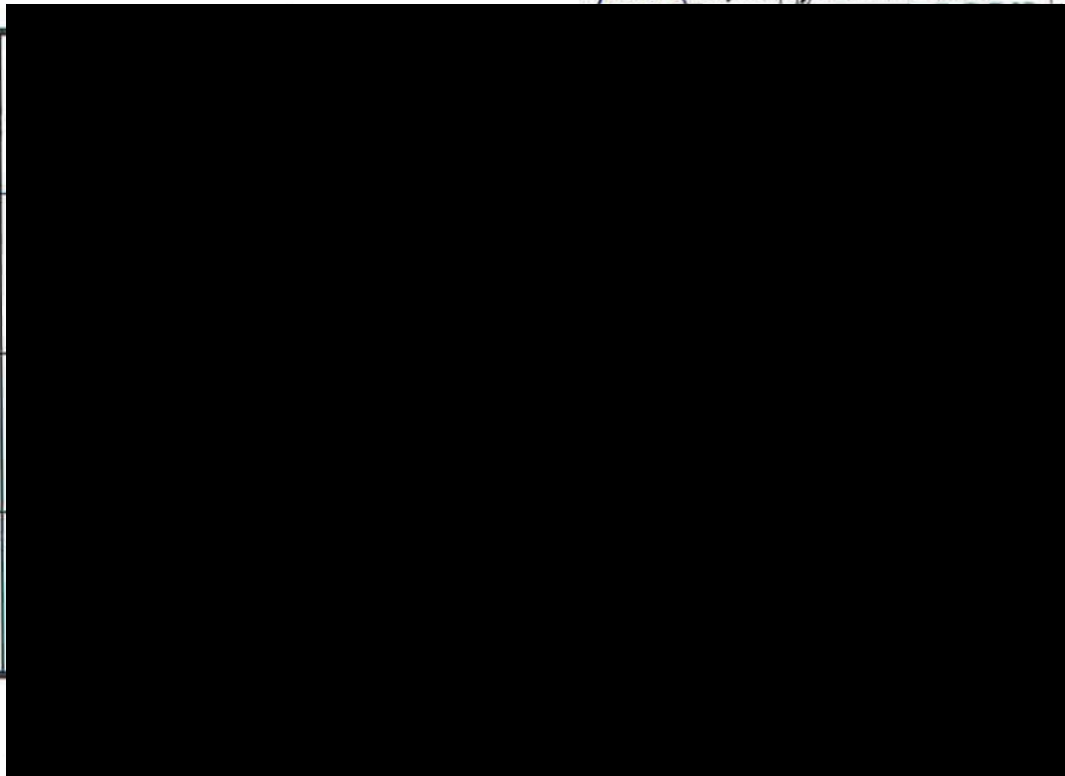

Úkon	KCP	jednotka	jednotek	Rožpočet dle SoD vč Dodatků č 1 - 4		Změna (vícepráce) dle PZ č. A6078/2023/04		Změna (méněpráce) dle PZ č. A6078/2023/04		Celkem SoD dle PZ č. A6078/2023/04	
				cena/cena	cena celkem	jednotek	cena celkem vícepráce	jednotek	Kč	jednotek	Kč
zásyp sanační jámy se zhutněním											
zpětné přemístění nekontaminované zeminy z mezideponie zpět se zhutněním do 20 m											
zpětné přemístění původně skryté ornice z mezideponie zpět do 25 m											
sled a řízení sanačních prací											
doprava vzorků do laboratoře											
čerpání kontaminované vody ze stavební jámy do S l/s. na výšku 10 m do ČAŠ											
odvoz kontaminované vody na očišťovací stanici											
likvidace kontaminovaných vod											
závěrečná zpráva											
mapové podklady a přílohy											
doplnění databáze SEKM											
průběžné zprávy pro KD kvartál											
Cena celkem				579 785 836,83 Kč		572 124,00 Kč	-2 561 351,40 Kč		577 796 609,43 Kč		

Datum vyhotovení: 13.1.2023

Zhotovitel:

Objednatel:

Celkem méněpráce a vícepráce



Zápis ze 43. kontrolního dne realizace akce „Sektor VIII etapa III“

Den konání: 12. 1. 2023

Místo konání: DIAMO, s.p., o.z. PKÚ, středisko Hodonín

Účast dle prezenční listiny:

PKÚ –

GEOSAN GROUP a.s. –

MND Drilling & Services a.s. –

HGG, spol. s r.o. (supervize) –

Autorský dozor –

Omluveni:

Program:

1. Zahájení
2. Zpráva zhotovitele o postupu prací ve sledovaném období prosinec 2023
3. Zpráva supervize
4. Diskuze

1. Zahájení

Jednání zahájil

2. Zpráva zhotovitele

Zprávu zhotovitele o postupu prací ve sledovaném období přednesl písemná zpráva je přílohou tohoto zápisu.

a) Inženýrská činnost

Ve sledovaném období neprobíhala žádná inženýrská činnost.

b) Příprava panelových ploch pro relikvidaci sond

Ve sledovaném období byla po ukončení relikvidačních prací u sondy B36 provedena demontáž panelové pracovní plochy a panelové komunikace. Pozemky v okolí sondy byly následně dorovnány orníci do nivelety okolního terénu. Dotčené pozemky pak byly protokolárně vráceny vlastníkům či uživatelům zpět k užívání.

c) Dohledání ústí starých sond

Ve sledovaném období nebylo dohledáno žádné ústí sondy.

Od začátku prací byla dohledána a odkopána ústí celkem 33 sond: B5, B7, B8, B10, B12A, B19, B20, B23, B24, B25, B30, B34, B36, B37, B40, B48, B52, HR22, HR56, HR79, LU94A, LU180, KOB1, NEM6, P2, SN1, ZI3, ZI4, ZI5, ZI9, ZI10, ZI14 a ZI21.

d) Relikvidace sond

Ve sledovaném období byly dokončeny relikvidační práce na sondě B36. Relikvidace sondy B36 byla provedena v termínu od 30.11. – 19.12.2022 dle schváleného projektu. Detailní průběh relikvidačních prací je obsažen v měsíční zprávě zhotovitele.

Od počátku prací bylo zrelikvidováno celkem 32 sond: B5, B8, B10, B12A, B19, B20, B23, B24, B25, B34, B36, B37, B40, B48, B52, B7, HR22, HR56, HR79, KOB1, LU94A, LU180, NEM6, P2, SN1, ZI3, ZI4, ZI5, ZI9, ZI10, ZI14 a ZI21.

e) Sanace zemin a vod

Ve sledovaném období neprobíhaly žádné sanační práce.

f) Monitoring účinnosti sanace

Ve sledovaném období neprobíhal žádný monitoring účinnosti sanace.

g) Ukončené sanační práce

Od začátku prací byly ukončeny sanační práce v okolí 9 SEZ a 2 kališť. Sanace proběhly v okolí sond – B10, B20, B43, HR34, HR186, KOB1, LU126, LU162 a SN1. Dále sanace proběhly u kališť LU162 a SN1.

h) Výhled prací

V následujícím období (leden 2023) nebudou probíhat žádné práce.

Závěr

Dosavadní průběh prací je v souladu s prováděcí dokumentací.

3. Zpráva supervize

Zprávu supervize přednesl [REDAKCE]. Ve sledovaném období supervize vydala stanovisko k fakturaci za období 11/2022. Supervize zajistila účast na čtvrtletním a měsíčním kontrolním dni.

Supervize může konstatovat, že práce probíhají v souladu s projektovou dokumentací a v souladu s dodatky smlouvy o dílo. Supervize nemá k průběhu prací žádné připomínky.

4. Diskuze

- a) Ze strany objednatele – [REDAKCE] seznámil účastníky dnešního kontrolního dne se skutečností, že během realizace sanačních prací od zahájení Díla došlo k upřesnění využití množství měrných jednotek u sanací zemin a sanací podzemních vod.

K dnešnímu dni je skutečné množství měrných jednotek odtěžených zemin vyšší oproti předpokladům v projektových dokumentacích. Důvodem navýšení je senzoricke i vizuálně potvrzená kontaminace zemin zasahující i mimo projektované kontury již realizovaných sanačních jam.

Dále je k dnešnímu dni čerpání množství měrných jednotek na sanaci podzemních vod výrazně nižší, než byly projektové předpoklady.

Je zřejmé, že se jedná o skutečnosti, které nebyly před zahájením prací známy a objednatel prací je nemohl předvídat.

Aby bylo možné, dokončit sanační práce i u poslední sondy P54 v projektovaném rozsahu, bude navýšeno celkové množství měrných jednotek u položky sanace zemin a sníženo celkové množství měrných jednotek u položky sanace podzemních vod. V důsledku těchto změn dojde ke snížení celkové ceny díla dle SoD.

- b) Současně [REDACTED] požádal zástupce supervize a autorského dozoru o vyjádření k tomuto řešení.
- c) Zástupce supervize s navrženým řešením souhlasí.
- d) Zástupce autorského dozoru s navrženým řešením souhlasí.
- e) Zástupce objednatele [REDACTED] uvedl, že v souvislosti s uvedenými změnami bude uzavřen Dodatek č. 5 ke SoD.
- f) Předmětem Dodatku č. 5 ke SoD bude rovněž aktualizace harmonogramu prací zhotovitele v souladu s čl. IV odst. 3 a čl. XVIII odst. 8 SoD. Dodatek bude uzavřen do konce měsíce února 2023.

Na dnešním kontrolním dni nebyly vzneseny žádné další náměty do diskuze.

Termín příštího řádného kontrolního dne nebyl stanoven.

Zapsala:



Příloha č. 3

Celkový soupis prací

Příloha č.3 Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo na akci: "Sektor VIII etapa III"

kód akce: A6078

č. NŘZ/Ně/040/2020

č. akce Zhotovitele: AV 200004.1.140

Celkový soupis prací dle Dodatku č. 5

Úkon	CPV		KCP	jednotka	jednotek	cena/j	cena celkem
relikvidace a přístupové komunikace	45255110-3	Relikvidace 44 sond včetně vybudování přístupových komunikací a panelových ploch					
sanace zemina	71315300-2	geodetické vytyčení sanačního výkopu u SEZ					
	71315300-2	geodetické zaměření sanačního výkopu u SEZ					
	45112000-5	skrývka ornice a přemístění na mezideponii do 20 m					
	45112000-5	odtěžba nekontaminované zeminy z nezapažené stavební jámy do 4 m p.t.					
	45112000-5	přemístění nekontaminované zeminy na mezideponii do 20 m					
	45112000-5	odtěžba kontaminované zeminy z nezapažené stavební jámy do 4 m p.t.					
	90733700-1	odběr vzorků zeminy					
	71900000-7	rozbor NEL (C10-C40) zemina					
	45112000-5	naložení kontaminované zeminy					
	90522100-3	odvoz kontaminované zeminy do vzdálenosti 6 km					
	90522100-3	příplatek za každý další km nad 6km					
	45112360-6	složení kontaminované zeminy na zabezpečené biodegradační ploše					
	45112360-6	Uložení odpadu na biodegradační plochu					
	45112320-4	návoz čisté zeminy z jiného zdroje do vytěžené sanační jámy					
	45112320-4	zásyp sanační jámy se zhutněním					
	45112320-4	zpětné přemístění nekontaminované zeminy z mezideponie zpět se zhutněním do 20 m					
	45112320-4	zpětné přemístění původně skryté ornice z mezideponie zpět do 25 m					
	90715000-2	sled a řízení sanačních prací					
	60140000-1	doprava vzorků do laboratoře					
	sanace podzemní voda	76532000-1	čerpání kontaminované vody ze stavební jámy do 5 l/s na výšku 10 m do CAS				
90741000-3		odvoz kontaminované vody na očišťovací stanici					
90733900-3		likvidace kontaminovaných vod					
vyhodnocení prací	90715000-2	závěrečná zpráva					
	90715000-2	mapové podklady a přílohy					
	90715000-2	doplnění databáze SEKM					
	90715000-2	průběžné zprávy pro KD kvartál					
Cena celkem						577 796 609,43 Kč	
