



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje				
EVIDENCE SMLUV				
HMSK	SML	poř. číslo	rok	dobu plnění



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

I. Smluvní strany

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Zastoupený: plk. Ing. Radimem Kuchařem, ředitelem HZS Moravskoslezského kraje

IČO: 70884561

DIČ: CZ70884561 (není plátcem DPH)

Bankovní spojení: ČNB Ostrava, číslo účtu: 1933881/0710

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

mail:

(dále jen „objednatel“)

a

VW WACHAL a.s.

Sídlo: Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

IČO: 25567225

DIČ: CZ 25567225

Zastoupená:

Bankovní spojení:

ČS a.s. Kroměříž, č. účtu: 1481817349/0800

ČSOB a.s. Kroměříž, č. účtu: 174042489/0300

KB a.s. Kroměříž, č. účtu: 27-1499300217/0100

Raiffeisenbank a.s. Kroměříž, č. účtu: 5024502091/5500

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. B, vl. 2976

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 03.06.2022 smlouvu o dílo, (ev. č. objednatele HMSK/SML/170/2022) ve znění dodatku č. 1 ze dne 03.11.2022 a dodatku č. 2 ze dne 31.03.2023, jejímž předmětem je provedení dalších stavebních prací v rámci realizace stavby Centrální hasičské stanice Nový Jičín (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Z důvodu nevhodných klimatických podmínek, které prokazatelně bránily provádění díla, nebylo možné provádět zemní práce pro hřiště a cvičnou věž a také základy cvičné věže, a proto se smluvní strany dohodly v souladu s čl. VI. odst. 5 smlouvy o dílo na prodloužení termínu plnění za toto období celkem o 24 dnů. V této souvislosti se smluvní strany dohodly na změně odst. 3 v bodě V. smlouvy o dílo, který nově zní takto:

Zhotovitel je povinen realizovat dílo nejpozději do 10 měsíců a 54 dnů od uzavření této smlouvy, tj. do 27.05.2023.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

3. V souvislosti se změnou termínu plnění se smluvní strany dohodly na změně harmonogramu stavebních prací, jehož aktuální podoba je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.


III. Ostatní ujednání


1. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující tento dodatek jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsaný dodatek druhé smluvní straně.
2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jeho uveřejněním v plném rozsahu. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany uzavírají tento dodatek v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou použity pouze pro účely plnění tohoto dodatku a při uveřejnění dodatku budou anonymizovány.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – harmonogram stavebních prací.

Podpisy smluvních stran:



za objednatele
plk. Ing. Radim Kuchař
ředitel
HZS Moravskoslezského kraje

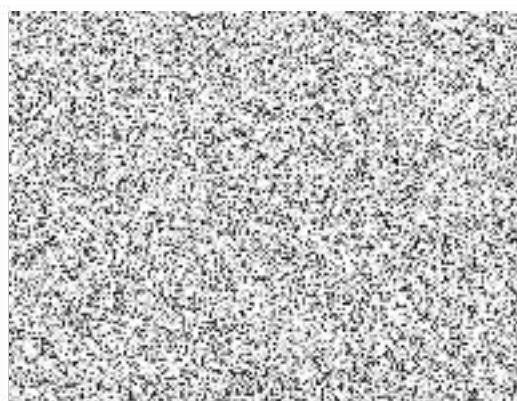

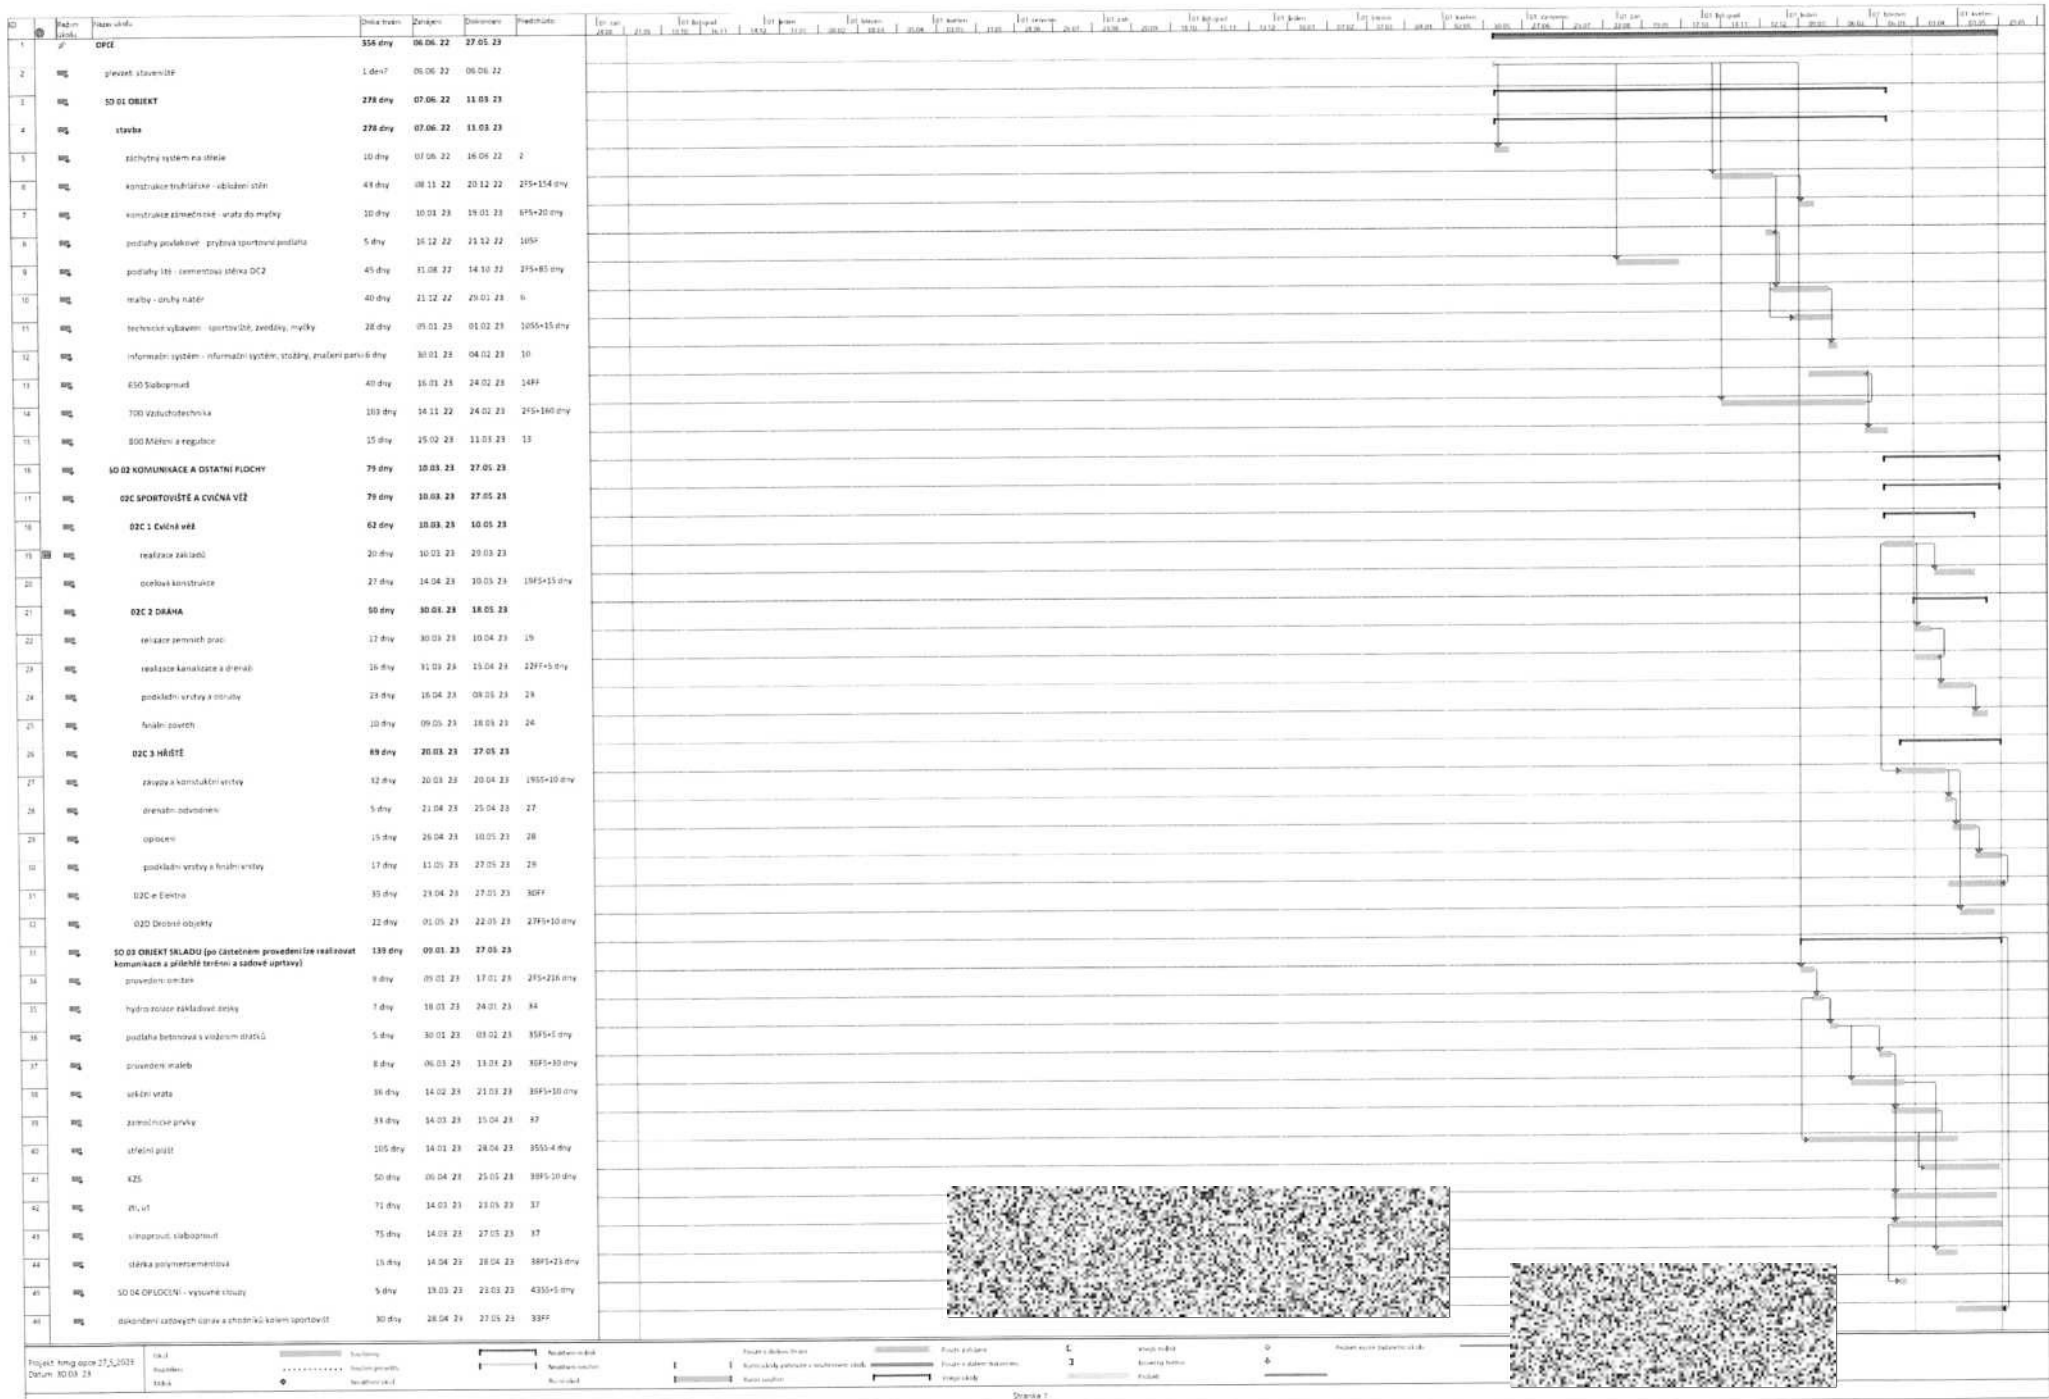

Projekt: tmg opor 27_5_2023
Datum: 30.03.23

■ Úkol
 ■ Realizace úkolu
 ■ Neúspěšná realizace úkolu
 ■ Neúspěšná realizace úkolu

■ Úkol
 ■ Realizace úkolu
 ■ Neúspěšná realizace úkolu

■ Úkol
 ■ Realizace úkolu
 ■ Neúspěšná realizace úkolu

■ Úkol
 ■ Realizace úkolu
 ■ Neúspěšná realizace úkolu

■ Úkol
 ■ Realizace úkolu
 ■ Neúspěšná realizace úkolu

■ Úkol
 ■ Realizace úkolu
 ■ Neúspěšná realizace úkolu

■ Úkol
 ■ Realizace úkolu
 ■ Neúspěšná realizace úkolu

■ Úkol
 ■ Realizace úkolu
 ■ Neúspěšná realizace úkolu
