

Dodatek č. 1

smlouvě o dílo uzavřené dle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „Zákon“), na veřejnou zakázku „Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč V. etapa, skladové haly“ ze dne 01. 02. 2023

Objednatel:

Správa služeb hlavního města Prahy

příspěvková organizace

se sídlem Kunderatka 19, 180 00 Praha 8 – Libeň

IČ: 70 88 96 60

zastoupená Mgr. Tomášem Stařeckým, ředitelem

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel:

Bursík holding a.s.

se sídlem Belgická 196/38, 120 00 Praha 2

IČ: 28 22 30 63

DIČ: CZ28223063

zastoupená JUDr. Jaroslav Bursík, členem představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 13770

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel společně jen „smluvní strany, nebo jednotlivě „smluvní strana“)

uzavřely dodatek v tomto znění:

I.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 čl. 4) odst. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na zdůvodnění dodatečně požadovaných prací ve zhotovitelem předloženém „Ohlášení změn stavby 1“ dohodly na změnách smlouvy uvedených v tomto dodatku.

II.

- 1) Předmět smlouvy (rozsah prací) se mění podle přílohy č. 1 (Ohlášení změn stavby 1), přílohy č. 2 (Soupis prací) a přílohy č. 3 (Nákres) tohoto dodatku.
- 2) Cena díla se mění podle přílohy č. 2 tohoto dodatku (Soupis prací). Celková cena díla tak odpovídá součtu původní ceny díla (51 724 703,66 Kč bez DPH) a ceny dodatečně požadovaných prací (113 214,92 Kč bez DPH) a činí 51 837 918,58 Kč bez DPH.

III.


- 1) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách a předmětu dodatku.

- 2) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona a udělují svolení k jejich zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3) Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopísech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Praze dne*28.4.?*..... 2023



V Praze dne 2023

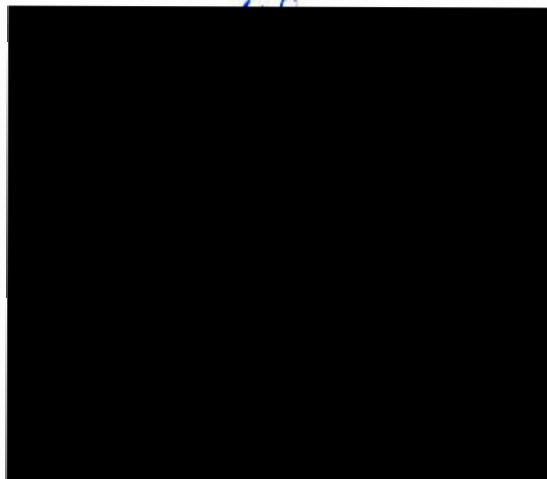

Přílohy :

1. Ohlášení změn stavby 1
2. Soupis prací
3. Nákres
4. Foto

OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY 1
„Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč V.etapa, skladové haly“
ZBV 1
(Změna během výstavby)

Určeno: Správa služeb hlavního města Prahy, příspěvková organizace
Kundratka 19, 180 00 Praha 8 - Libeň

Číslo SoD: SoD ze dne 01. 02. 2023

Termín plnění	: 02. 08. 2024
Aktualizovaný termín plnění	: 02. 08. 2024
Cena díla dle základní SOD	: 51 724 703,66 Kč bez DPH
Cena víceprací dle ZBV1	: 113 214,92 Kč bez DPH
Celková cena díla vč. ZBV1	: 51 837 918,58 Kč bez DPH

Zhotovitel:

Bursík Holding, a.s.

IČ: 28223063

Oprávněná osoba: 

Popis předmětu změny:

Na základě smlouvy o dílo jsou prováděny stavebně montážní práce na stavbě **Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč V.etapa, skladové haly**. Práce jsou prováděny podle projektové dokumentace stavby zpracované společností Gaudia Design s.r.o. a výkazu výměr, který byl součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky.

Zjištění:

Při provádění zemních prací byly ve stavební jámě skladové haly SO 02 objeveny staré základové pasy z prostého betonu a piloty. Zhotovitel provedl pasportizaci zjištěného stavu. Základy a piloty budou odstraněny, vybouraný materiál zlikvidován.

Popis problému:

Jedná se o nové skutečnosti, kde nutnost jejich řešení vyvstala až po zahájení stavebních prací. Zhotoviteli tyto skutečnosti v době zadávací lhůty soutěže o tuto veřejnou zakázku nebyly a ani nemohly být známy. Jedná se o nezbytné změny a neoddělitelné práce potřebné pro provedení

tohoto díla.

Čeho se zhotovitel domáhá:

S odvoláním na článek IV - Práva a povinnosti zhotovitele

se zhotovitel domáhá:

změny rozsahu předmětu plnění stavby v souladu s předloženým ZBV

Datum a podpis oprávněné osoby dodavatele: Kamil Štěpnička ...

Datum a potvrzení

Objednatele:

GP:

TDI:

Přílohy:

1. Soupis prací
2. Náskres
3. Foto

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

"Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MC Dubeč V etapa skladové haly"

Objekt:

Vybourání starých základových pasů, ŽB pilot + likvidace

KSO

Místo

CC-CZ

Datum

21. 3. 2023

Zadavatel

Správa služeb hlavního města Prahy

IČ

70889660

DIČ

CZ70889660

Zhotovitel:

Bursík Holding, a.s.

IČ

28223063

DIČ

CZ28223063

Projektant

Gaudia design s.r.o., Keždice

IČ

6142591

DIČ

CZ06142591

Zpracovatel

IČ

DIČ

Poznámka

Cena bez DPH**113 214,92**


	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	113 214,92	21,00%	23 775,13
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****136 990,05**

Projektant




Zpracovatel



Datum

Objednavatel



Zhotovitel



Razítko

D

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

"Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MC Dubeč V etapa skladové haly"

Objekt:

Vybourání starých základových pasu, ŽB pilot + likvidace

Místo:

Datum:

21. 3. 2023

Zadavatel

Správa služeb hlavního města Prahy

Projektant

Gaudia design s.r.o.,

Zhotovitel

Bursík Holding, a.s.

Zpracovatel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**113 214,92**

1 - Zemní práce

-33 350,47

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

100 947,00

99 - Přesuny hmot a suti

45 618,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč V. etapa: skladové haly

Objekt

Vybourání starých základových pasů, ŽB pilot + likvidace

Místo

Datum

21. 3. 2023

Zadavatel

Správa služeb hlavního města Prahy

Projektant

Gaudia design s.r.o., Keždice

Zhotovitel

Bursík Holding, a.s.


Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							113 214,92	
D	1		Zemní práce				-33 350,47	
3	K	131251105	Hloubení jam nezapažených v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 1000 m3 strojně <small>$(49 \cdot 0,9 \cdot 0,5) + (1,5 \cdot 2 \cdot 0,5) + (1,6 \cdot 2 \cdot 0,5) / 2 = 12,65 \text{ m}^3$</small>	m3	-12,650	130,20	-1 647,03	
5	K	131351105	Hloubení jam nezapažených v homině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně <small>$(49 \cdot 0,9 \cdot 0,5) + (1,5 \cdot 2 \cdot 0,5) + (1,6 \cdot 2 \cdot 0,5) / 2 = 12,65 \text{ m}^3$</small>	m3	-12,650	182,70	-2 311,16	
13	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 <small>$(49 \cdot 0,9 \cdot 0,5) + (1,5 \cdot 2 \cdot 0,5) + (1,6 \cdot 2 \cdot 0,5) / 2 = 12,65 \text{ m}^3$</small>	m3	-12,650	172,00	-2 175,80	
14	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m <small>$(49 \cdot 0,9 \cdot 0,5) + (1,5 \cdot 2 \cdot 0,5) + (1,6 \cdot 2 \cdot 0,5) / 2 = 12,65 \cdot 20 = 253 \text{ m}^3$</small>	m3	-253,000	13,50	-3 415,50	
15	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z hominy třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 <small>$(49 \cdot 0,9 \cdot 0,5) + (1,5 \cdot 2 \cdot 0,5) + (1,6 \cdot 2 \cdot 0,5) / 2 = 12,65 \text{ m}^3$</small>	m3	-12,650	199,50	-2 523,68	
16	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z hominy třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m <small>$(49 \cdot 0,9 \cdot 0,5) + (1,5 \cdot 2 \cdot 0,5) + (1,6 \cdot 2 \cdot 0,5) / 2 = 12,65 \cdot 20 = 253 \text{ m}^3$</small>	m3	-253,000	15,85	-4 010,05	
20	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 <small>viz pol.č. 162751117 * 12,65 * 1,9 = 24,035t viz pol.č. 162751137 * 12,65 * 2,0 = 25,3t</small>	t	-49,335	350,00	-17 267,25	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				100 947,00	
0	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého <small>$(49 \cdot 0,9 \cdot 0,5) + (1,5 \cdot 2 \cdot 0,5) + (1,6 \cdot 2 \cdot 0,5) = 25,3 \text{ m}^3$</small>	m3	25,300	3 990,00	100 947,00	
D	99		Přesuny hmot a suti				45 618,39	
60	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením <small>$(25,3 \cdot 2,2) = 55,66 \text{ t}$</small>	t	55,660	114,25	6 359,16	
61	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km <small>$(25,3 \cdot 2,2) = 55,66 \text{ m}^3 \cdot 24 \text{ km} = 1 335,84 \text{ t}$</small>	t	1 335,840	4,26	5 690,68	
62	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu <small>$(25,3 \cdot 2,2) = 55,66 \text{ t}$</small>	t	55,660	95,10	5 293,27	
63	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	55,660	508,00	28 275,28	

S	
1:1	1:1
1:1	1:1
1:1	1:1
1:1	1:1


CCÚA LINTA (LEZOA)

- POCĚSITĚNÝ ZÁKL. MASO, PdT

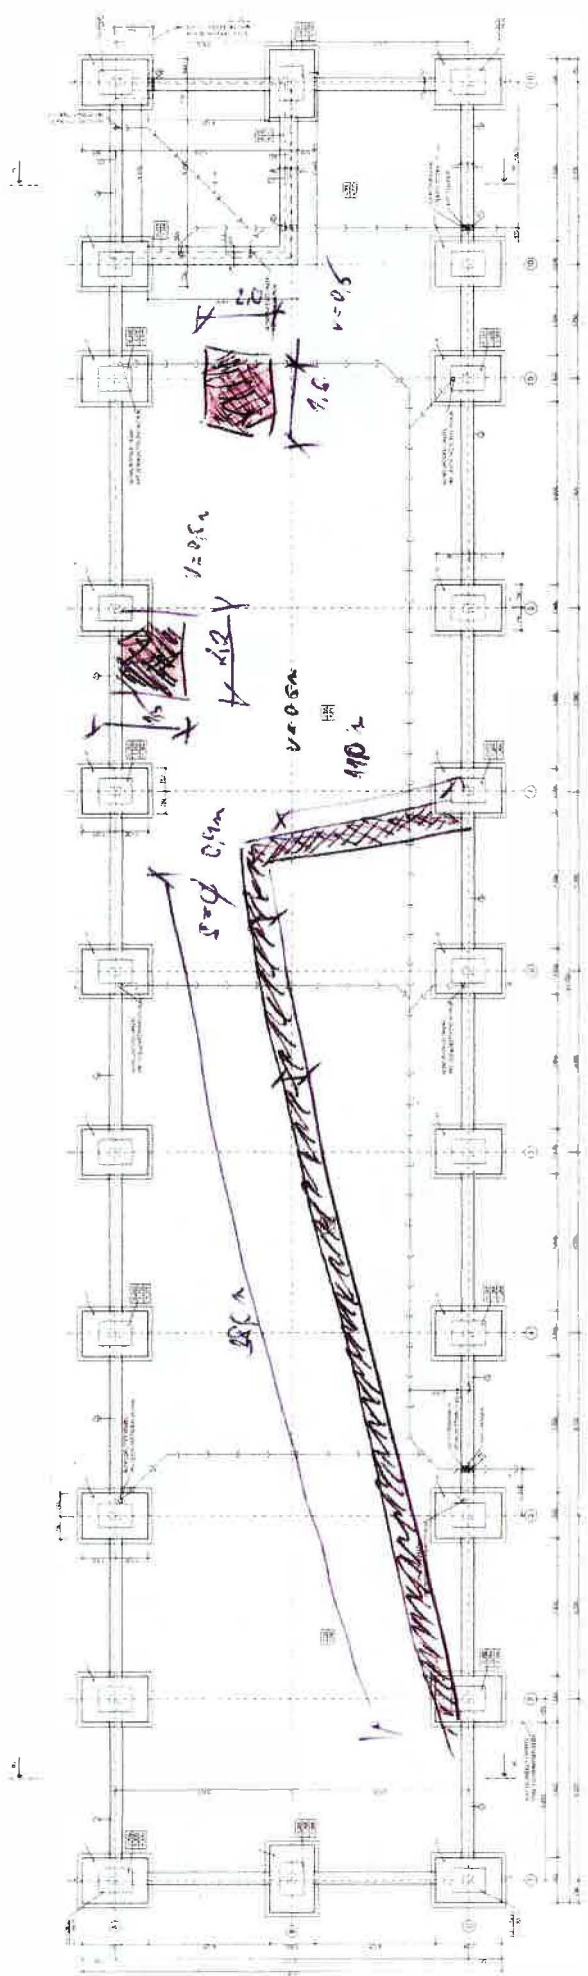

REKONSTRUKCE STAVBY
 ZÁKLADY
 POCĚSITĚNÝ ZÁKL. MASO
 PdT

- 120 L
- 400 L
- 1000
- 1200
- 1600
- 2000



NAKKAFES
 (P. 120 120 120 120)

