

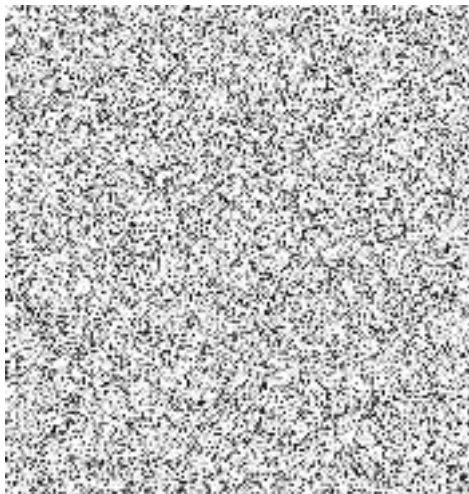


<b>Stavba:</b> Vypracování projektové dokumentace na energetická opatření v areálu MŠMT_SO 01	č. SOD objednatele:	MSMT-3762/2019-107
	č. SOD zhotovitele:	21-28
<b>Objednatel stavby:</b> Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 529/5, Praha 1 - Malá Strana, PSČ 118 12		
<b>TDI:</b> 		
<b>Projektant a AD:</b> 		
<b>Zhotovitel stavby:</b> HILL Systems s.r.o., Davídkova 675/76, 182 00 Praha 8		
<b>Předmět změny:</b>	Navýšení cen doposud nefakturovaného a nerealizovaného díla a současně redukce nadbytečných položek ve výkaze výměr (VV) proti projektové dokumentaci (PD).	
<b>Zdůvodnění změny:</b>	Veřejná zakázka „provedení stavebních prací nutných k realizaci akce Energetická opatření v areálu MŠMT – Výměna a repase oken a zateplení půd“, byla ukončena Oznámením o výběru nejvýhodnější nabídky dne 25.6.2021. Následně byla dne 23.2.2022 uzavřena Smlouva o dílo č.j. MSMT-3762/2019-107. Po uzavření smlouvy došlo k projednání stanoviska NPÚ na práce a výrobky, které jsou součástí smlouvy. Během tohoto projednávání došlo k razantnímu navýšení cen vstupních materiálů, PHM a veškerých energií spojených s výrobou. Ve VV byly odstraněny položky žaluzií v serverovně a rozvodně, kdy v těchto místnostech nebudou měněny. Dále došlo k redukcí nabytých položek mříží, které nejsou obsaženy v PD	
<b>Zadavatelem (objednatelem) jsou tyto změny zařazeny pod §222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.</b>		
<b>Dotčené místo:</b>		
<b>Odkaz na výkresy:</b>		
<b>Odkaz na soupis prací:</b>	viz.příloha, soupis prací ZL03	
<b>CENA ZMĚNY:</b>		
<b>Méněpráce:</b>	-37 270,00 Kč	
<b>Vícepráce:</b>	4 913 482,62 Kč	
<b>Výsledná cena změny (bez DPH):</b>	4 876 212,62 Kč	
Datum:		
<b>Zhotovitel :</b>	<i>razítko a podpis:</i>	
<b>Projektant a AD :</b>	<i>razítko a podpis:</i>	
<b>TDI:</b>	<i>razítko a podpis:</i>	
<b>Objednatel:</b>	<i>razítko a podpis:</i>	
<b>Přílohy:</b> soupis prací ZL03, MŠMT - příloha k změnovému listu 03.pdf		
