

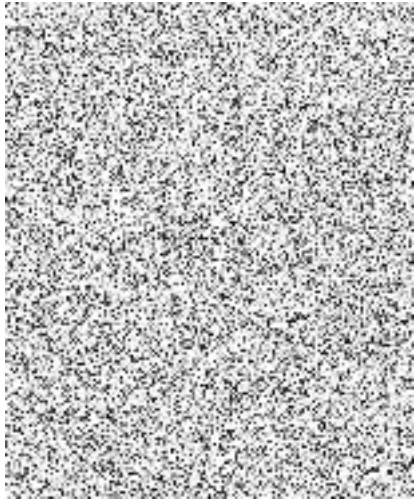


Stavba: Vypracování projektové dokumentace na energetická opatření v areálu MŠMT_SO 01	č. SOD objednatele:	MSMT-3762/2019-107
	č. SOD zhotovitele:	21-28
Objednatel stavby: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 529/5, Praha 1 - Malá Strana, PSČ 118 12		
TDI: 		
Projektant a AD: 		
Zhotovitel stavby: HILL Systems s.r.o., Davídkova 675/76, 182 00 Praha 8		
Předmět změny: Nové technické řešení tepelné izolace a dřevěné podlahy na půdách budov A, B, C, E.		
Zdůvodnění změny: Po důkladném šetření prostoru půd za účasti zhotovitele, projektanta, TDI a objednatele před zahájením prací bylo rozhodnuto, že nebude odstraněna stávající tepelná izolace, která je nedostatečná, ale stále funkční a tím nebudou demontovány ani dřevěné záklopy podlah. V rámci další investice objednatele (instalace VZT jednotek na půdu) je nutné upravit polohy obslužných lávek a tyto rovněž rozšířit a doplnit o manipulační plochy, které budou také sloužit pro obsluhu těchto nových prostor.		
Zadavatelem (objednatelem) jsou tyto změny zařazeny pod §222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.		
Dotčené místo:		
Odkaz na výkresy:		
Odkaz na soupis prací: viz.příloha, soupis prací ZL04		
CENA ZMĚNY:		
Méněpráce: -547 624,32 Kč		
Vícepráce: 408 715,04 Kč		
Výsledná cena změny (bez DPH): -138 909,28 Kč		
Datum:		
Zhotovitel :	<i>razítko a podpis:</i>	
Projektant a AD :	<i>razítko a podpis:</i>	
TDI:	<i>razítko a podpis:</i>	
Objednatel:	<i>razítko a podpis:</i>	
Přílohy: soupis prací ZL04		
