

DODATEK Č. 1

Ke smlouvě o dílo č. 2022/0370

„Stání pro kontejnery KO – Makovského, Praha 17“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění

Čl. I

Smluvní strany

Městská část Praha 17

se sídlem: Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 6

zástupce oprávněný jednat ve věcech smluvních: Mgr. Alena Kopejtková, starostka

tel.: +420 234 683 111

IČO: 00231223

DIČ: CZ00231223

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.

číslo účtu: 27-2000700399/0800

osoby určené ke kontaktu se zhotovitelem jsou:

Mgr. David Zlatý, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 17

Tel: 235 300 634, e-mail: David.Zlaty@praha17.cz

(dále jen „objednatel“)

a

Firma: Sadovnický a zahradnický servis s.r.o.

se sídlem: Ruzyňská 209/8, 161 00 Praha 6

zastoupená: Bc. Martinem Chládkem, jednatelem

kontaktní telefon: 724 555 323

IČO: 27404862

DIČ: CZ27404862

bankovní spojení:

číslo účtu:

zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze, sp. Zn. C 111035

osoba určená ke kontaktu s objednatel: Bc. Martin Chládek

tel.:

e-mail:

(dále jen zhotovitel)

Čl. 2

Preambule

- 2.1. Oprávnění zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou způsobilí k právním úkonům a po vzájemném projednání a shodě uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2022/0370 ze dne 30.11.2022.

Čl. 3

Předmět dodatku

- 3.1. Předmětem tohoto dodatku je změna doby plnění předmětu smlouvy.
- 3.2. Doba plnění sjednaná dle smlouvy o dílo č. 2022/0370 činí 10 týdnů od účinnosti smlouvy (viz čl. 5 odst. 5.1. smlouvy). K přerušení akce došlo po 6 týdnech od zahájení provádění prací. S odkazem na článek 10.1. smlouvy, ve kterém je uvedeno, že pokud dojde k přerušení prací z důvodu výskytu skrytých překážek bránících výstavbě, odsouhlasených objednatelem, má zhotovitel právo sjednat dodatkem ke smlouvě o dílo přiměřené prodloužení lhůty výstavby o dobu přerušení nebo nezbytně nutnou dobu související s přerušením prací.
- 3.3. Přerušení prací v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky nevzniklo ze strany zhotovitele, ale v konsekvenci neposkytnutí součinnosti nezbytné k provedení díla ze strany TSK hl. m. Prahy a.s., tj. absence smlouvy o výpůjčce, která je pro provádění díla nutná, a to i přes včasné podání žádosti objednatelem
- 3.4. S ohledem na výše uvedené skutečnosti dochází ke změně doby plnění předmětu díla, a to následovně:
Zahájení prací + částečná realizace: do doby přerušení díla činila 6 týdnů od účinnosti smlouvy
Dokončení celého díla: nejpozději do 4 týdnů od podpisu smlouvy o výpůjčce pozemku oběma smluvními stranami (MČ Praha 17 a TSK a.s.)
- 3.5. Doba realizace celé akce po odečtení výše specifikovaného přerušení díla **se nemění a bude činit celkovou maximální přípustnou výši, a to 10 týdnů**, což je v souladu s vysoutěženou nabídkou a uzavřenou smlouvou o dílo č. 2022//0370 ze dne 30.11.2022.

Čl. 4

Závěrečná ustanovení



- 4.1. Smluvní strany prohlašují, že ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněna.
- 4.2. Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo č. 2022/0370 ze dne 30.11.2022.
- 4.3. Práva a povinnosti vyplývající z tohoto dodatku se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění.
- 4.4. Tento dodatek bude uveřejněn na profilu zadavatele v souladu s § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů. Dále bude uveřejněn na internetových stránkách objednatele a dále v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění zajistí objednatel.
- 4.5. Podle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, se konstatuje, že uzavření tohoto dodatku schválila Rada městské části Praha 17 na svém 13. zasedání dne 11.04.2023, usnesením č. Us RMČ 000120/2023.
- 4.6. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž jeden 1 výtisk obdrží zhotovitel a 2 výtisky objednatel.

Čl. 5
Podpisy dodatku

- 5.1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany se dohodly na celém obsahu dodatku a jeho autentičnost potvrzují svým podpisem.
- 5.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 5.3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

V Praze dne 27.4.2023

V Praze dne 20. 04. 2023

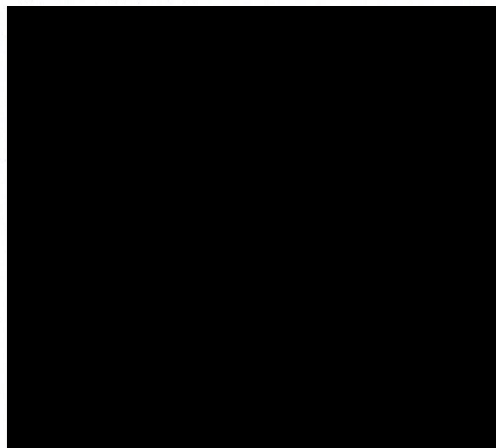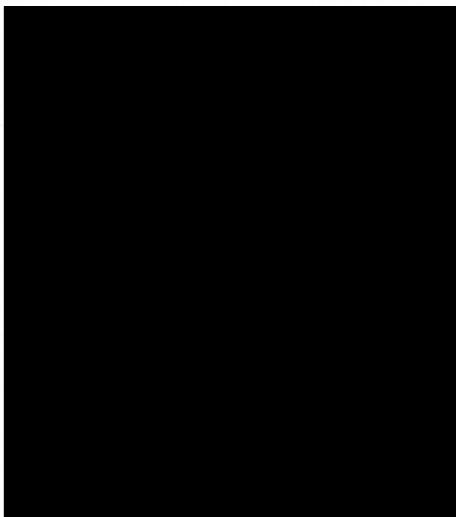

DOLOŽKA

Na základě díkce § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. městě Praze v platném znění a v souladu s usnesením RMČ č. Us RMČ 000120/2023 ze dne 11.04.2023 se osvědčuje právní úkon spočívající v uzavření dodatku mezi MČ Praha 17 a společností Sadovnický a zahradnický servis s.r.o., Ruzyňská 209/8, 161 00 Praha 6, IČO: 27404862, a potvrzuje se splnění podmínek daných výše uvedeným ustanovením.

V Praze dne: 19. 04. 2023

