

DODATEK č. 5

Smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smluvní strany

Objednatel:

Adresa:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP: Ing. Štěpán Illich

Tel.:

E-mail:

Technický dozor stavebníka:

Tel.:

E-mail:

Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

70889546

CZ 70889546

Bc. Lubomírem Francem, hejtmanem

Ing. Jana Jiráňová

/

Rostislav Křeček DiS.

/

!

Ing. Václav Slama

dále také jako „objednatel“ a

Zhotovitel:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Jednající:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

Stavbyvedoucí:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

Bankovní spojení:

SDS EXMOST spol. s r. o.

Údolní 413/66, 602 00 Brno

u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 13045

49454501

CZ49454501

Ing. Pavlem Jankůjem, jednatelem

Ing. Roman Daniel

/

Ing. Michal Janíček

/

/

dále také jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 12. 2014 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura – I/14 Vrchlabí, Nerudova – Nádražní, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek 488442, smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Z důvodu narovnání rozsahu díla o vícepráce dochází ke změně smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 4.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku II. a III. smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce v souladu se změnovými listy č. 18-21, které tvoří přílohu tohoto dodatku č. 5.
2. Cena za dílo dle článku VI. odst. 1 smlouvy o dílo se mění v souladu s následující tabulkou:

Cena dle SOD bez DPH celkem:	67 398 900,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH:	67 644 705,50 Kč
Cena dle dodatku č. 2 bez DPH:	68 452 008,74 Kč
Cena dle dodatku č. 3 bez DPH:	68 182 770,28 Kč
Cena dle dodatku č. 4 bez DPH:	69 283 610,99 Kč
Cena víceprací dle ZL 18 – 21 bez DPH:	1 501 823,80 Kč
Cena dle dodatku č. 5 bez DPH celkem:	70 785 434,79 Kč
DPH 21%:	14 864 941,31 Kč
Celkový stavební náklad:	85 650 376,10 Kč


3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 4 zůstávají nedotčena.
4. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po podpisu dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, čtyři objednatel.
5. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
6. O uzavření tohoto dodatku č. 5 rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě Usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/30/1457/2015 ze dne 19. 10. 2015.

V Brně, dne 03. 08. 2016

V Hradci Králové, dne 9 -08- 2016

Ing. Pavel Janků
jednatel

SDS EXMOST spol. s r.o.



Bc. Lubomír Franc
hejtman

Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
20

SMLOUVA O DÍLO

na provedení díla – stavební práce na stavbě

"Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura – I/14 Vrchlabí, Nerudova – Nádražní"

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:

Adresa:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

Technický dozor stavebníka koordinátor BOZP:

Tel.:

E-mail:

Technický dozor stavebníka:

Tel.:

Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

70889546

CZ 70889546

Bc. Lubomírem Francem, hejtmanem

Ing. Roman Kosař

Ing. Jana Jiráňová

Rostislav Křeček DiS.

Ing. Štěpán Illich

Ing. Lubomír Kryške

(dále jako **objednatel**)

Zhotovitel:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Jednající:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

Stavbyvedoucí:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

Bankovní spojení:

SDS EXMOST spol. s r. o.

Údolní 413/66, 602 00 Brno

u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 13045

49454501

CZ49454501

Ing. Pavlem Jankůjem, jednatelem

Ing. Roman Daniel

Zdeněk Argaláš

(dále jako **zhotovitel**)

Článek II.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje k provedení stavebních prací na stavbě:

„Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura – I/14 Vrchlabí, Nerudova – Nádražní“

včetně provedení všech dalších činností specifikovaných v čl. III. Rozsah a obsah díla.

Dílo bude provedeno dle příslušné zadávací dokumentace veřejné zakázky, která je tvořena následujícími podklady:

- projektová dokumentace zpracovaná společností AF-CITYPLAN s.r.o., IČ: 47307218, se sídlem Jindřišská 17, Praha 1, 110 00, v podrobnostech vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle vyhlášky č. 230/2012 Sb. ve stupni PDPS,
- nabídky zhotovitele ze dne 7. 10. 2014.

Při podpisu této smlouvy o dílo předal objednatel zhotoviteli současně výše specifikovanou příslušnou dokumentaci. Objednatel poskytuje zhotoviteli právo projektovou dokumentaci jako dílo užít, a to výhradně k účelu provádění díla dle této smlouvy. Za správnost a úplnost příslušné dokumentace odpovídá objednatel. Podpisem této smlouvy stvrzuje zhotovitel fyzické převzetí příslušné dokumentace v celém rozsahu.

2. Zhotovitel je jako odborně způsobilá osoba povinen nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla. Tímto není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace.
3. Závazek zhotovitele je splněn objednatelovým převzetím řádně zhotoveného díla bez vad a nedodělků. Řádně zhotoveným dílem se rozumí splnění veškerých stavebních prací a dalších činností vč. předání příslušných dokladů. (viz níže dle čl. III.).
4. O předání a převzetí dokončeného díla bude pořízen písemný předávací protokol, který podepíše zhotovitel i objednatel.

Článek III.

Rozsah a obsah díla

1. STAVEBNÍ ČÁST STAVBY

Stavbou je rekonstrukce silnice **I/14 na území Královéhradeckého kraje, město Vrchlabí.**

Stavba bude provedena tak, aby byla způsobilá k obvyklému užívání v souladu se zadáním stavby, čímž je v řazení dle závaznosti:

- Nabídka zhotovitele ze dne 7. 10. 2014;
- Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr;
- Projektová dokumentace pro provedení stavby (vše dále jen projektová dokumentace);
- Všeobecné obchodní podmínky staveb pozemních komunikací (schválené MD-OI, čj. 321/08-910-IPK/1 ze dne 9. 4. 2008 s účinností od 1. 5. 2008);
- Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, vydané Ministerstvem dopravy ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy;
- Písemné pokyny objednatele.

2. REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY

Zhotovitel dopracuje realizační dokumentaci stavby (dále jen „RDS“).

RDS bude předána 4 x v tištěné podobě. RDS bude rovněž předána elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude RDS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (doc., dwg, atd.).

Zhotovitel je povinen předat objednateli návrh RDS 1x v tištěné podobě a 1x elektronicky, a to do 30 dnů od podpisu této smlouvy; část RDS k pracím, které mají být provedeny před předáním návrhu RDS budou předány vždy před zahájením těchto prací.

Objednatel do 5 pracovních dnů od převzetí návrhu RDS buď písemně vyjádří souhlas s návrhem RDS nebo svolá jednání se zhotovitelem, na němž zhotovitele seznámí se svými výhradami k RDS a smluvní strany se domluví na tom, jakým způsobem má být RDS změněna či dopracována; z jednání bude učiněn zápis, podepsaný zástupci smluvních stran; zhotovitel má v takovém případě povinnost upravit či dopracovat RDS v souladu se zápisem. Součástí zadání stavby se stává RDS, ke které objednatel písemně vyjádřil svůj souhlas, a případně podmínky zapsané v zápisu.

Všechna vyhotovení RDS, případně zbylá vyhotovení RDS budou předána do 5 pracovních dnů od obdržení souhlasu s RDS, případně do 5 pracovních dnů od uskutečnění jednání se zhotovitelem o výhradách k RDS.

Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití RDS ke zhotovení stavby případně dalšímu zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

3. DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

Zhotovitel vyhotoví dokumentaci skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) v souladu s právními předpisy a s aktuálně účinnou Směrnicí Ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb pozemních komunikací.

DSPS bude předána 3 x v tištěné podobě. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena osobou autorizovanou pro obor dopravní stavby nebo mosty a inženýrské konstrukce; takovou osobou může být zejména osoba vykonávající na stavbě autorský dozor.

DSPS bude rovněž předána elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude DSPS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu.

Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS k dalšímu zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

4. MOSTNÍ LISTY

Zhotovitel zpracuje mostní listy včetně 1. mostní prohlídky dle ČSN 73 6220 a dle ČSN 73 6221 a zpracuje evidenci propustků dle TP 232. Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě v 5 paré, předání v elektronické podobě v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLSX, DOCX, atd.). 1. Hlavní mostní prohlídka zhotovitel uloží i do systému hospodaření s mosty BMS na stránkách <http://bms.vars.cz/>.

5. GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ STAVBY A GEOMETRICKÝ PLÁN

Geodeticky bude zaměřeno skutečné provedení stavby a veškeré dotčené inženýrské sítě. Výsledek geodetického zaměření bude ověřen osobou oprávněnou k ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.

Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán nejpozději při dokončení stavby, a to 4 x v listinné podobě a 2 x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD.

Zhotovitel je povinen vyhotovit geometrický plán stavby, který bude určen jak pro účely rozdělení pozemků, tak i pro vymezení rozsahu věcných břemen.

Geometrický plán bude předán 12x v listinné podobě. Geometrický plán bude zároveň předán 1 x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD. Předávaný geometrický plán bude v souladu s příslušnými předpisy potvrzen katastrálním úřadem.

Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci ke hmotně zachycenému výsledku geodetického zaměření stavby a ke geometrickým plánům. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

Geodetické zaměření stavby bude zpracováno dle Technické směrnice č.1/2009 pro tvorbu digitální technické mapy města Vrchlabí. Bude dále předáno v 6-ti provedeních v grafické i digitální podobě (CD/DVD), Zhotovitel předloží doklad o uložení dat u zpracovatele digitální mapy města – Geodézie Krkonoše.

6. PUBLICITA - označení stavby dle grafického návrhu objednatele

Zhotovitel je povinen v místě realizace stavby umístit 2 velkoplošné reklamní panely v obou směrech provozu, resp. viditelnou a dostatečně velkou stálou informační tabuli (rozměr min. 2,1 výška x 1,0 šířka), na níž bude vyhrazena plocha pro informaci o finanční spoluúčasti MPO a Czechinvest. Tato část musí zabírat nejméně 25 % celkové plochy panelu a musí zobrazovat symbol Czechinvest, symbol MPO a logo Královéhradeckého kraje a standardní text, přičemž symbol musí být viditelný a text čitelný. Na panelu musí být uveden i název stavby. Panel musí být zachován po celou dobu realizace díla. Grafická podoba panelu bude v předstihu schválena objednatelem.

Článek IV. Staveniště

1. Objednatel předá a zhotovitel na základě písemné Výzvy objednatele převezme prostor staveniště ve lhůtách uvedených ve Výzvě. Při předání prostoru staveniště je zhotovitel povinen předat objednateli:
 - Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, dopravu)
 - návrh technologického postupu prací.Předané materiály budou zhotoveny dle příslušných právních předpisů.
2. Zhotovitel je oprávněn po předání a převzetí prostoru staveniště zahájit stavební práce na základě písemného pokynu objednatele. Stavební práce budou prováděny v souladu s harmonogramem prací, který je součástí této smlouvy. V harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé stavební práce, jejich pořadí a termíny, do kdy nejpozději mají být tyto práce zhotovitelem provedeny.
3. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven písemný protokol podepsaný oběma účastníky smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením nebo vzniklé jeho činností. Zhotovitel je povinen se před zahájením stavebních prací seznámit s rozemístěním a trasou všech stávajících inženýrských sítí vedoucích přes staveniště a zajistit si jejich vytýčení v terénu. Následně tyto buď vhodným způsobem přeložit anebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
5. Zhotovitel odpovídá za provoz na staveništi v plném rozsahu a zavazuje se udržívat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad a na svou odpovědnost odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Vše v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými, a dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb. Odstraňování odpadů bude zhotovitelem dokladováno.
6. Způsob zabezpečení staveniště:
Stavba, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny zhotovitelem proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad:
 - a. u liniových staveb nebo u stavenišť, popřípadě pracovišť, na kterých se provádějí pouze krátkodobé práce, provést ohrazení zábradlím skládajícím se alespoň z horní tyče upevněné ve výši 1,1 m na stabilních sloupcích a jedné mezilehlé střední tyče (s ohledem na místní a provozní podmínky může toto ohrazení být nahrazeno zábranou), náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit,
 - b. nelze-li u prací prováděných na pozemních komunikacích z provozních nebo technologických důvodů ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpečnost provozu a osob zajištěna jiným způsobem, například řízením provozu nebo střežením,
 - c. nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny nebo zasypány.
7. Zhotovitel zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech a na přístupových komunikacích, které k nim vedou.
8. Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené obsaženy v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a oplocení, popřípadě ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích umožňovalo bezpečný pohyb fyzických osob s pohybovým postižením, jakož i se zrakovým postižením.
9. Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech a na přístupových komunikacích, které k nim vedou.
10. Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění díla; k tomuto účelu je zhotovitel zejména povinen zajistit:
 - povolení k uzavírkám;
 - stanovení dočasného dopravního značení;
 - umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení;
 - povolení zvláštního užívání komunikací;
 - užívání veřejného prostranství;
 - po dohodě s vlastníky přístupy a příjezdy k sousedním nemovitostem.
11. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je stanovena do data termínu dokončení stavebních prací.

Článek V. Čas a místo plnění díla

1. Termín zahájení stavebních prací: ihned na základě výzvy objednatele
2. Termín pro dokončení prací: nejpozději do **30. 9. 2016**
3. Termín dokončení stavby do **6 týdnů** po termínu dokončení prací
4. Doba realizace stavby: 92 týdnů + 6 týdnů
5. Místem plnění je silnice I/14 na území Královéhradeckého kraje.
6. Místo předání dokladů pro předání díla: sídlo objednatele

Zimní přestávka je předpokládána v měsících prosinec – únor. Provádění stavebních prací zhotovitelem v tomto období je možné pouze v omezeném rozsahu závislém zejména na klimatických podmínkách a na základě dohody s technickým dozorem investora. Zhotovitel zajistí v období zimní přestávky průjezdnost silničních úseků včetně zajištění potřebného dopravního značení a případného provizorního napojení realizovaných úseků silnice na stávající stav.

7. Způsob předání a převzetí díla

Pro účely této smlouvy je stavba dokončena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba drobné vady, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání jejímu obvyklému užívání. Do dokončení stavby je zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.

Při předání dokončeného díla objednateli předá zhotovitel následující:

- RDS dle čl. III,
- DSPS dle čl. III,
- mostní listy a 1. hlavní mostní prohlídky vč. evidence propustků dle čl. IV.
- zaměření skutečného provedení stavby včetně přeložek
- geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem,
- doklad o vytýčení stavby osobou oprávněnou k provádění zeměměřických a geodetických prací,
- fotodokumentace stavby,
- atesty materiálů použitých při stavebních pracích dle příslušné projektové dokumentace zpracované odborným zařízením
- výsledky provedených zkoušek (dle TKP) stavebních pracích dle příslušné projektové dokumentace,
- prokazatelný písemný doklad o likvidaci odpadů (stavební suť, zemina, živice apod.),
- další doklady, které jsou nezbytné k vydání kolaudačního souhlasu v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.
- práce a dodávky k odstranění případných vad a nedodělků stavby nebránících užívání stavby k jejímu účelu;
- vyčištěný prostor staveniště;

Předání a převzetí díla nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dílo dle této smlouvy řádně předáno.

Předání a převzetí prostoru staveniště, dokončení stavby a předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončení stavby či předání a převzetí díla.

Alespoň 5 pracovních dní předem předá zhotovitel objednateli veškeré pro dokončení stavby potřebné podklady s výjimkou těch podkladů, u kterých zhotovitel prokáže, že je nebylo možné nejpozději 5 pracovních dní před dokončením stavby obstarat. Podklady, které nebylo možné obstarat před dokončením stavby, předá zhotovitel objednateli do 6 týdnů po termínu dokončení stavebních prací.

O předání a převzetí prostoru staveniště, době zahájení stavebních prací, dokončení stavby a předání a převzetí díla je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy.

Článek VI. Cena za dílo

1. Cena za zhotovení díla podle čl. III. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši:

Cena bez DPH celkem Kč	67 398 900,00
DPH	14 153 769,00
Cena včetně DPH celkem Kč	81 552 669,00
2. K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v zákonem stanovené výši dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, v době uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Cena díla je stanovena na základě projektové dokumentace pro provedení stavby předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah ceny díla je rozhodující soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr.
4. Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena díla je sjednána jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy.
5. Cena díla obsahuje mimo vlastní provedení díla také náklady zejména:
 - vybudování, provoz, udržování a odstranění zařízení staveniště,
 - zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
 - opatření k ochraně životního prostředí,
 - náklady na sjednaná pojištění,
 - zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru,
 - koordinační a kompletační činnost,
 - poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství, odvozem a uložením odpadu,
 - zajištění nezbytných dopravních opatření,
 - zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby,
 - součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby a při vydání kolaudačního souhlasu,
 - zajištění podmínek správců sítí nebo vlastníků sítí, pokud nejsou obsažena v předané projektové dokumentaci, nebo pokud jsou již propadlé nebo neúplné.

Článek VII. Platební podmínky

1. Zálohy na platby nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona a dle této smlouvy (dále jen „faktura“).

3. V souladu s ustanovením § 21 odst. 10 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem v soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolu, včetně dohody o ocenění, se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den měsíce. Zhotovitel vystaví na měsíční zdanitelné plnění fakturu po odsouhlasení soupisu provedených prací a zjišťovacího protokolu, oba dokumenty musí být podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonávající technický dozor stavebníka. Soupis provedených prací a činností s vyčíslením ceny prací a činností předloží zhotovitel objednateli vždy nejpozději druhý pracovní den následujícího měsíce po termínu zdanitelného plnění fakturovaných prací a činností k odsouhlasení v listinné podobě a v elektronické podobě ve výměnném formátu ASPE a ve formátu *.xls. Lhůta pro odsouhlasení se stanovuje na 7 kalendářních dnů. Faktura bude vystavena do 15 dnů od uskutečnění zdanitelného plnění.
 4. Objednatel je oprávněn pozastavit 10% z celkové ceny díla do doby odstranění kolaudačních závad.
 5. Lhůta splatnosti dílčích faktur je dohodou stanovena na 60 kalendářních dnů po jejich doručení objednateli. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.).
 6. Po splnění díla zhotovitel provede a objednateli předá závěrečné vyúčtování, které doloží rekapitulací vystavených faktur a rekapitulací veškerých provedených prací, jež bude vystavena v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem.
 7. Pozastávky dle odstavce 4 tohoto článku smlouvy budou zhotoviteli uvolněny na základě jeho písemné žádosti, a to do 45 dnů od doručení žádosti objednateli. Zhotovitel je oprávněn požádat o uvolnění pozastávek až poté, co bude dílo splněno, řádně předáno a zároveň bude možno v souladu se stavebním zákonem započít s užíváním stavby.
 8. Doručení faktury popřípadě žádosti o uvolnění pozastávky se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby objednatele nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
 9. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
 - a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena za dílo,
 - b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem objednatele,
 - c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.
- Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
10. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
 11. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele.
 12. Pohledávky zhotovitele vzniklé z uzavřené smlouvy nelze bez předchozí písemné dohody s objednatelem postoupit platně jinému právnímu subjektu ani je zatížit právy třetích osob.
 13. Finanční krytí ceny díla objednatelem je závislé na rozhodnutí Meziresortní hodnotitelské komise v rámci Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury (dále MHK). Smluvní strany se proto dohodly na odkládací podmínce, podle které nabývá tato smlouva účinnosti dnem, kdy je objednatelem doručena zhotoviteli výzva k provedení díla

podle této smlouvy, tedy pokud MHK závazně schválí poskytnutí finančních prostředků na krytí celkové ceny díla, která není kryta z rozpočtu objednatele dle této smlouvy.

14. Pokud výzva podle odst. 13 nebude učiněna do 1 roku od podpisu této smlouvy, marným uplynutím této lhůty platnost této smlouvy zaniká. Pro takový případ obě smluvní strany prohlašují, že nebudou mít vůči sobě žádných závazků z této smlouvy.
15. Pokud MHK ve lhůtě dle odst. 14. rozhodne o neposkytnutí finančních prostředků na krytí ceny díla, je objednatel povinen zhotovitele o této skutečnosti bezodkladně informovat, nejpozději však do 30 - ti dnů ode dne, kdy se o výsledku jednání MHK dozvěděl.
16. V případě, že objednateli s ohledem na financování díla z veřejných prostředků nebudou poskytnuty tyto prostředky v rozsahu sjednané ceny, má objednatel právo jednostranně odstoupit od smlouvy o dílo.
17. Platební i dodací podmínky se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami staveb pozemních komunikací (schválené MD-OI, čj. 321/08-910-IPK/1 ze dne 9. 4. 2008 s účinností od 1. 5. 2008). V případě rozporů mezi zmíněnými Všeobecnými obchodními podmínkami a touto smlouvou platí ustanovení této smlouvy.

Článek VIII. Provádění díla

1. Veškeré věci potřebné k provedení díla zajišťuje zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí.
2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru. Technický dozor stavebníka je prováděn na základě uzavřené smlouvy mezi objednatelem a technickým dozorem investora. V případě jeho provádění jiným právním subjektem nesmí provádět technický dozor stavebníka ani osoba s ním propojená. Zhotovitel je povinen umožnit výkon autorského dozoru projektanta i výkon činnosti koordinátora BOZP, je-li to vyžadováno právními předpisy.
3. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty:
 - Technický dozor stavebníka za součinnosti s objednatelem je povinen písemně svolávat minimálně 1x za 14 kalendářních dní kontrolní dny za účasti zhotovitele a subdodavatelů a pořizovat z nich zápisy. Do zápisu budou uvedeny všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zápisy bude technický dozor objednateli zasílat emailovou poštou. Objednatel je povinen sledovat jejich obsah.
 - V případě zjištění vady v dosavadním postupu zhotovitele při plnění předmětu smlouvy uplatní objednatel u zhotovitele nárok na okamžité odstranění vady.
 - Zhotovitel odpovídá za to, že pro uskutečnění předmětu smlouvy budou vždy a zásadně použity pouze výrobky řádné a objednavatelem požadované kvality.
 - Zhotovitel je povinen průběžně před zabudováním materiálu prokazatelně předkládat objednateli příslušné atesty na materiály a zařízení (i za své subdodavatele).
 - Zhotovitel ručí za kvalitu a termín prací prováděných subdodavateli.
 - Při kontrole konstrukcí, které budou zakryty, vyzve zhotovitel objednatele písemně prokazatelně 3 pracovní dny před zakrytím konstrukcí k fyzické prohlídce provedených prací. Po prohlídce těchto konstrukcí a po písemném odsouhlasení jejich řádného provedení objednatel mohou být konstrukce zakryty.
4. Zhotovitel je při realizaci stavby povinen řídit se pokyny koordinátora BOZP stanoveného

objednatelům v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

5. V období zimní sezóny, tj. vždy od 1. 12. do 28. 2. následujícího kalendářního roku, je provádění stavebních prací zhotovitelem možné pouze v omezeném rozsahu závislém zejména na klimatických podmínkách a na základě dohody se stavebním dozorem objednatele a v souladu s vydanými povoleními o uzavírce silnice.
6. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle uzavřené smlouvy a že po dobu záruky bude mít vlastnosti dojednané v této smlouvě. Odpovědnost za vady díla bude řešena dle občanského zákoníku.
7. Zhotovitel bude při zhotovení díla postupovat s náležitou odbornou péčí. Při realizaci bude zhotovitel postupovat v souladu s „Všeobecnými TKP staveb pozemních komunikací, kapitola 1“, v platném znění, schválenými MD-OI č. j. 653/07-910-IPK/1 ze dne 6. 8. 2007 v platném znění s účinností od 1. 9. 2007, se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP schváleného MDS-OPK, č.j. 23299/98-120 ze dne 30. 6. 1998 a její přílohy č. 9 schválené MDS-OPK č.j. 17236/00-120 ze dne 21. 2. 2000 MDS-OPK č.j. 23299/98-120 ze dne 30.6.1998 včetně pozdějších novel. Dále dle všech TKP kapitola 2-31 staveb pozemních komunikací, TP a ČSN majících vazbu na realizaci předmětu díla a které odpovídají jednotlivým navrženým technologiím stavebních prací.
8. Zhotovitel je povinen zajistit vydání stanovení přechodné i místní úpravy provozu na pozemní komunikaci a vydání rozhodnutí o uzavírce předmětné silnice.
9. Na základě vydaného stanovení přechodné i místní úpravy provozu na pozemní komunikaci provede zhotovitel na svůj náklad, nebezpečí a zodpovědnost osazení přechodného i trvalého dopravního značení, odpovídá za instalované DZ a SSZ.
10. Po dokončení stavby je zhotovitel povinen zajistit odstranění provizorního dopravního značení, uvedení místa dočasně zabraného prováděním prací do původního stavu.
11. Zhotovitel je povinen zajistit odstranění případného znečištění vozovky a škody vzniklé vlivem stavby.
12. Zhotovitel je povinen zajistit splnění všech podmínek a požadavků dle vyjádření dotčených orgánů, organizací, správců inženýrských sítí a vlastníků dotčených nemovitostí zapracovaných do PD, v případě dodatečných požadavků budou tyto předem písemně odsouhlaseny objednatelem, příp. povolujícím úřadem.
13. Zhotovitel si zajistí na svůj náklad odběr a úhradu elektrické energie, vodného, stočného a dalších odebraných médií přímo u jejich dodavatelů. Zhotovitel zabezpečí na své náklady a na svou odpovědnost řádné měření jejich odběru.
14. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště a bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště.

15. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla.

Zapisuje údaje o:

- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků, nasazení strojů a dopravních prostředků;
- časovém postupu prací;
- kontrole jakosti provedených prací;
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy o bezpečnosti a ochrany zdraví;
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí;
- událostech majících vliv na provádění díla.

Všechny listy deníku musí být očíslovány, ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci stavby, která se stane součástí stavebního deníku.

Stavební deník bude zhotovitel minimálně jedenkrát týdně předkládat objednateli k písemnému odsouhlasení. Žádný zápis ve stavebním deníku však není dohodou o změně podmínek sjednaných ve smlouvě o dílo.

16. Během provádění díla je zhotovitel povinen pořizovat fotodokumentaci jednotlivých činností na základě domluvy se stavebním dozorem objednatele v počtu min. 10 ks fotografií měsíčně. Po úplném dokončení stavby pořídí zhotovitel 10 ks fotografií hotového díla, z nichž bude patrný vzhled zejména hlavních stavebních objektů. Veškerou provedenou fotodokumentaci předloží zhotovitel objednateli 1x v digitální podobě na CD-RW při předání dokončeného díla.

17. Zhotovitel je povinen pořizovat a průběžně objednateli předávat dokumentaci stavby.

Dokumentaci stavby tvoří originály následujících dokumentů:

- stavební deník;
- protokoly o průběhu a výsledku veškerých zkoušek a revizích;
- certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;
- doklady o likvidaci odpadu;
- fotodokumentace provádění stavby, vč. fotodokumentace stavu blízkých nemovitostí před zahájením a po dokončení stavby- elektronicky na nosiči dat CD či DVD.

Dokumentace bude odpovídat požadavkům stanoveným právním řádem a požadavkům, které jsou dány účelem pořizování dokumentace daného druhu.

18. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti se zadávacím řízením veřejné zakázky, a je povinen objednateli poskytnout veškeré podklady, o něž bude objednatelem požádán, pro zpracování monitorovací zprávy.
19. Zhotovitel je povinen umožnit přístup kontrolním orgánům ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů (poskytovateli dotace, MPO ČR, MF ČR, auditnímu orgánu, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému finančnímu úřadu a dalším kontrolním orgánům) do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a provést kontrolu dokladů souvisejících s projektem.

20. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady, které souvisejí s realizací díla a jeho financováním po dobu 10 let od proplacení závěrečné platby objednateli, nejméně však do 31. 12. 2026.
21. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu plnění veřejné zakázky, tj. až do doby protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, sjednáno pojištění proti škodám způsobeným třetím osobám jeho činností, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to do výše 10 mil. Kč. Kopii pojistné smlouvy předloží zhotovitel objednateli při podpisu smlouvy. Zhotovitel je povinen udržovat pojistnou smlouvu v platnosti po celou dobu realizace díla. V případě, že v průběhu realizace zakázky skončí platnost pojistné smlouvy, předloží zhotovitel objednateli doklady o pojištění vč. potvrzení o řádném zaplacení pojistného na základě navazující pojistné smlouvy nejpozději do 15 kalendářních dnů po jejím uzavření.

Článek IX. Subdodavatelé zhotovitele

1. Subdodavatel je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout určité věci či práva. Náplň činnosti stavbyvedoucího nelze plnit pomocí subdodavatele.

Zhotovitel ve své nabídce prokazoval kvalifikaci pomocí následujících subdodavatelů.

Název	IČ	Rozsah prací
MDS projekt s. r. o.	27487938	Projektová dokumentace stavby 1,319 mil. Kč bez DPH
DYWIDAG-Systems Internacional GmbH, organizační složka	02250535	Předpínání 1,505 mil. Kč bez DPH
RAISA, spol. s r. o.	43005071	Veřejné osvětlení 1,509 mil. Kč bez DPH
STAVGAZ Jihlava, s. r. o.	60753765	Vodovod, plynovod a kanalizace 3,9 mil. Kč bez DPH
GEOBET DS s. r. o.	28494571	Speciální zakládání 1,008 mil. Kč bez DPH

2. Podmínky pro změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci:

Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, v případě, že po uzavření smlouvy

- subdodavatel přestane splňovat kvalifikaci, jejímž prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení;
- vůči subdodavateli bylo zahájeno insolvenční řízení;
- subdodavatel přerušil nebo ukončil svou činnost.

V případě zjištění výše popsaných skutečností je zhotovitel povinen objednatele prokazatelně písemně uvědomit do 5 pracovních dnů po jejich zjištění. Současně je zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů od zjištění některé z výše popsaných skutečností předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace jiným subdodavatelem.

3. Zhotovitel předloží objednateli seznam subdodavatelů podle § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % nebo v případě významné veřejné zakázky více než 5 %
 - z celkové ceny veřejné zakázky, nebo
 - z části ceny veřejné zakázky uhrazené veřejným zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok.
4. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel neprokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci pouze se souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen objednatel o této skutečnosti prokazatelně písemně uvědomit do 5 pracovních dnů po jejich zjištění.

Článek X. Dodatečné práce

1. Zhotovitel je povinen bezodkladně objednatel informovat o zjištění nutnosti změny zadání stavby.
 2. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, sepíše se o tom záznam do stavebního deníku.
 3. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatel závaznými.
 4. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Součástí nabídky bude oceněný soupis prací, zpracovaný ve výměnném formátu ASPE a ve formátu *.xls.
 5. Nabídková cena bude určena následovně:
 - 5.1 Zhotovitel ocení jednotkové ceny výši odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu, který je přílohou této smlouvy.
 - 5.2 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, zhotovitel ocení jednotkové ceny následovně:

Cena prací či dodávek Cena uvedená v sazebníku OTSKP (poslední platná cenová úroveň)	=	Cena obdobných prací, případně cena příslušného stavebního objektu, případně cena stavby Cena uvedená v sazebníku OTSKP (poslední platná cenová úroveň)
--	---	---
 - 5.3 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně obvyklé.
- Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatel výhodnější.
6. K dodatečným pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Dodatečné práce lze provádět pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě sjednány, platí, že je provádí na svůj náklad.
 7. Do stavebního deníku se zapisují veškeré prováděné a plánované odchylky od zadání stavby,

důvody nedodržení zadání stavby a důvod volby daného řešení. Zhotovitel je povinen popsat práce a dodávky na odchylkách od zadání stavby přesně a určitě. Zhotovitel je povinen k pracím a dodávkám na odchylkách od zadání stavby uvést výkaz výměr a, je-li to možné, označení dotčených položek rozpočtu.

Článek XI. Zajištění řádného plnění

1. Zhotovitel v případě pozdního předání daňového dokladu objednateli uhradí jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč. Za pozdní předání daňového dokladu se považuje předání daňového dokladu později než 15. den po uskutečnění zdanitelného plnění. Ujednání o smluvní pokutě nemají vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování a vymáhání.
2. Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele zhotovit dílo, či jeho dílčí části, v době sjednané v čl. V. smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny díla za každý den prodlení. Ujednání o smluvní pokutě nemají vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování a vymáhání.
3. Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele vyklidit staveniště a uvést ho do původního stavu nejpozději do data převzetí řádně zhotoveného díla objednatelem zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500 Kč za každý i započatý den prodlení. Ujednání o smluvní pokutě nemají vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování a vymáhání.
4. Za porušení smluvní povinnosti objednatele zaplatit zhotoviteli fakturu ve lhůtě splatnosti zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za dobu prodlení.
5. Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele předložit seznam subdodavatelů podle výše uvedeného odstavce a v rozsahu dle vyhl. č. 133/2012 Sb. nejpozději do
 - a) 60 dnů od splnění smlouvy, nebo
 - b) 28. února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rokzaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení. Ujednání o smluvní pokutě nemají vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování a vymáhání.
6. Smluvní strany se tímto dohodly, že celková výše smluvních pokut uvedených v článku XII. bod 1 - 5 nepřesáhne celkem 10 % z ceny díla uvedené v bodě 6.2 této smlouvy.

Článek XII. Bankovní záruka

1. Zhotovitel poskytne objednateli nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy o dílo bankovní záruku ve vztahu k předmětu plnění této smlouvy na dodržení smluvních podmínek, kvality a termínu provedení díla ve výši 10 % z celkové ceny díla dle čl. VI. odst. 1 této smlouvy. Bankovní záruka bude záruka tuzemského peněžního ústavu (banky). Bankovní záruka nabude účinnosti nejpozději v den jejího předání objednateli. Neposkytne-li zhotovitel objednateli bankovní záruku za provedení díla v uvedené lhůtě, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý započatý den prodlení a objednatel je navíc oprávněn odstoupit od smlouvy. Zhotovitel zajistí, že záruka za provedení díla bude platná, dokud neprovede a nedokončí stavbu a nepředá objednateli záruku za odstranění vad dle odst. 2 tohoto článku

2. Zhotovitel poskytne objednateli nejpozději do 30 dnů ode dne sepsání protokolu dle čl. V odst. 7 bankovní záruku za odstranění vad díla po dobu záruční doby ve výši 3 % z celkové ceny díla dle čl. VI. odst. 1 této smlouvy. Bankovní záruka bude záruka tuzemského peněžního ústavu (banky). Bankovní záruka nabude účinnosti nejpozději v den jejího předání objednateli. Neposkytne-li zhotovitel objednateli bankovní záruku za odstranění vad díla po dobu záruční doby v uvedené lhůtě, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý započatý den prodlení.

Článek XIII. Odpovědnost a záruka

1. Zhotovitel je odpovědný za případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě.
2. Odpovědnost za vady díla

Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění účelu této smlouvy.

Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání a převzetí.

Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu po té, co tyto zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.

3. Záruka za jakost

3.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku

Záruka za veškerá plnění, není-li stanoveno jinak	72 měsíců
Záruka za vodorovné dopravní značení plastem	72 měsíců
Záruka na práce a dodávky na objektech objízdných tras	36 měsíců

3.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání díla.

3.3 Zhotovitel odpovídá za vady – tedy za odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.

3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději do 30 dnů po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.

Článek XIV. Ukončení smlouvy

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.
2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se mj. považuje

- Vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele neodstraní v době přiměřené;
 - Zhotovování stavby v rozporu se zadáním stavby;
 - Provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé;
 - Neúčast zhotovitele na kontrolním dnu;
 - Prodlení s převzetím prostoru staveniště o více než 15 dní;
 - Zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak;
 - Provádění díla s pomocí subdodavatele, kterým nebyla prokazována kvalifikace místo subdodavatele, který prokazoval splnění kvalifikace zhotovitele v průběhu zadávacího řízení předcházejícího uzavření této smlouvy, bez souhlasu objednatele;
 - Skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou;
 - Porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření;
 - Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka;
 - Zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje.
3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
- Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka;
 - Prodlení objednatele s úhradou faktur o více než půl roku;
 - Prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 90 dní.
4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně.
5. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.

Článek XV. Závěrečná ustanovení

1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel v zadávacím řízení uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.
2. Při splnění výše uvedené podmínky je zrušení části sjednaného závazku dohodnuto účastníky smlouvy v rozsahu řádně provedených prací, a to ke dni zrušení závazku. Rozsah prací bude potvrzen objednatelem a zhotovitelem v písemném protokolu. Účinnost zrušení části závazku nastane vždy dnem doručení písemného přípisu zhotoviteli.
3. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit jen písemnými dodatky, které budou podepsány objednatelem a zhotovitelem, jinak jsou neplatné.
4. V ostatním se právní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění.
5. Tato smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, z toho čtyři pro objednatele a dva pro zhotovitele.
6. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svými podpisy. Zároveň smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu projednaly a že nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

7. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
8. Součástí této smlouvy je projektová dokumentace. Nedílné součástí této smlouvy jsou přílohy:
1. Položkový rozpočet (oceněný soupis prací);
 2. Harmonogram časový a finanční postupu výstavby;
 3. Seznam subdodavatelů
 4. Kontrolní a zkušební plán stavby
 5. Plán jakosti pro stavbu
9. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Královéhradeckého kraje č.RK/35/1481/2014 dne 14. 11. 2014.

V Hradci Králové, dne 11. 11. 2014

V Brně, dne 10. 12. 2014

Královéhradecký kraj
Bc. Lubomír Franc
hejtman

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
20

SDS EXMOST spol. s r.o.
Ing. Pavel Janků
jednatel

SDS EXMOST spol. s r.o.
Údolní 413 66, 602 00 BRNO
TEL.: 543 432 311, FAX: 543 432 301 (25)
IČO: 49454501, DIČ: CZ49454501

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 11. 12. 2014

na provedení díla – stavební práce na stavbě
Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura
– I/14 Vrchlabí, Nerudova – Nádražní
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany**Objednatel:**

Adresa:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

Email:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP: Ing. Štěpán Illich

Tel.:

E-mail:

Technický dozor stavebníka:

Tel.:

E-mail:

Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

70889546

CZ 70889546

Bc. Lubomírem Francem, hejtnanem

Ing. Roman Kosař

Ing. Jana Jiráňová

Rostislav Křeček DiS.

Ing. Václav Sláma

(dále jako **objednatel**)**Zhotovitel:**

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Jednatel:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

Stavbyvedoucí:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

Bankovní spojení:

SDS EXMOST spol. s r. o.

Údolní 413/66, 602 00 Brno

u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 13045

49454501

CZ49454501

Ing. Pavlem Jankůjem, jednatelem

Ing. Roman Daniel

Ing. Michal Janíček

CZ

30

(dále jako **zhotovitel**)

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a upravuje výše uvedená smlouva o dílo takto:

Článek II. Předmět smlouvy

Rozsah předmětu díla se upravuje o vícepráce a méně práce na základě změnového listu č. 1, který tvoří přílohu tohoto dodatku č. 1.

Článek VI. Cena za dílo

Cena za zhotovení díla podle čl. III. tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši:

Cena dle SOD bez DPH celkem:	67 398 900,00 Kč
Cena méně prací dle změn. listu č. 1 bez DPH	- 159 900,00 Kč
Cena víceprací dle změn. listu č. 1 bez DPH:	405 705,50 Kč
Cena dle Dodatku č. 1 bez DPH Celkem	67 644 705,50 Kč
DPH 21%:	14 205 388,16 Kč
Celkový stavební náklad:	81 850 093,66 Kč

DPH bude účtována v souladu se zákonem.


Ostatní ustanovení Smlouvy ze dne 11. 12. 2014 nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.

Tento Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po podpisu smlouvy dva stejnopisy obdrží zhotovitel, čtyři objednatel.


Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady Královéhradeckého kraje ze dne 29. 6. 2015, číslo usnesení RK/19/913/2015.

V Brně, dne 08. 07. 2015

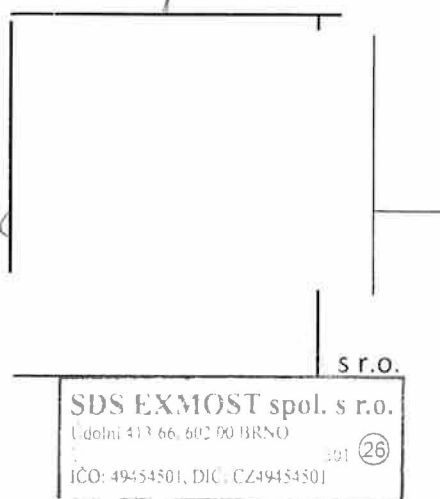

V Hradci Králové, dne 13. 07. 2015

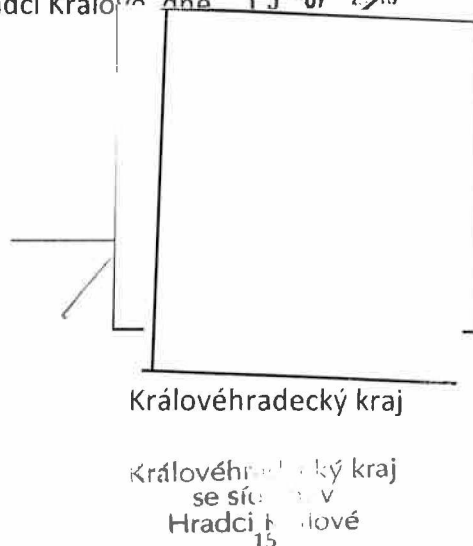

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 11. 12. 2014

na provedení díla – stavební práce na stavbě
Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura
– I/14 Vrchlabí, Nerudova – Nádražní
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Objednatel:

Adresa:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

Email:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP: Ing. Štěpán Illich

Tel.:

E-mail:

Technický dozor stavebníka:

Tel.:

E-mail:

Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

70889546

CZ 70889546

Bc. Lubomírem Francem, hejtnanem

Ing. Roman Kosař

Ing. Jana Jiráňová

Rostislav Křeček DiS.

Ing. Václav Sláma

(dále jako **objednatel**)

Zhotovitel:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Jednající:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

Stavbyvedoucí:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

Bankovní spojení:

SDS EXMOST spol. s r. o.

Údolní 413/66, 602 00 Brno

u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 13045

49454501

CZ49454501

Ing. Pavlem Jankůjem, jednatelem

Ing. Roman Daniel

Ing. Michal Janíček

(dále jako **zhotovitel**)

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a upravuje výše uvedená smlouva o dílo takto:

Článek II. Předmět smlouvy

Rozsah předmětu díla se upravuje o vícepráce a méněpráce na základě změnových listů č. 2 - 6, které tvoří přílohu tohoto dodatku č. 2.

Článek VI. Cena za dílo

Cena za zhotovení díla podle čl. III. tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši:

Cena dle SOD bez DPH celkem:	67 398 900,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH:	67 644 705,50 Kč
Cena víceprací dle ZL 2 - 6 bez DPH:	2 995 711,38 Kč
Cena méněprací dle ZL 2 - 6 bez DPH:	- 2 188 408,14 Kč
Cena dle Dodatku č. 2 bez DPH celkem	68 452 008,74 Kč
DPH 21%:	14 374 921,84 Kč
Celkový stavební náklad:	82 826 930,58 Kč

DPH bude účtována v souladu se zákonem.

Ostatní ustanovení Smlouvy ze dne 11. 12. 2014 a dodatkem č. 1 ze dne 13. 7. 2015 nedotčená tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti beze změny.

Tento Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po podpisu smlouvy dva stejnopisy obdrží zhotovitel, čtyři objednatel.

Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady Královéhradeckého kraje ze dne 25.9.2015, číslo usnesení RK/28/1271/2015.

V Brně, dne 14. 10. 2015

V Hradci Králové, dne 14. 10. 2015

SDS EXMOST spol. s r.o.

hejtman

Královéhradecký kraj

SDS EXMOST spol. s r.o.
Údelní 413 66, 602 00 BRNO
TEL.: 543 432 311, FAX: 543 432 301
ICO: 49454501, DIČ: CZ49454501

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo ze dne 11. 12. 2014

na provedení díla – stavební práce na stavbě
Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura
– I/14 Vrchlabí, Nerudova – Nádražní
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Objednatel:

Adresa:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

Email:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP: Ing. Štěpán Illich

Tel.:

E-mail:

Technický dozor stavebníka:

Tel.:

E-mail:

Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

70889546

CZ 70889546

Bc. Lubomírem Francem, hejtmánem

Ing. Roman Kosař

Ing. Jana Jiráňová

Rostislav Křeček DiS.

Ing. Václav Sláma

(dále jako **objednatel**)

Zhotovitel:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Jednající:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

Stavbyvedoucí:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

Bankovní spojení:

SDS EXMOST spol. s r. o.

Údolní 413/66, 602 00 Brno

u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 13045

49454501

CZ49454501

Ing. Pavlem Jankůjem, jednatelem

Ing. Roman Daniel

Ing. Michal Janíček

(dále jako **zhotovitel**)

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a upravuje výše uvedená smlouva o dílo takto:

Článek II. Předmět smlouvy

Rozsah předmětu díla se upravuje o vícepráce a méněpráce na základě změnových listů č. 7 - 12 , které tvoří přílohu tohoto dodatku č. 3.

Článek VI. Cena za dílo

Cena za zhotovení díla podle čl. III. tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši:

Cena dle SOD bez DPH celkem:	67 398 900,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH:	67 644 705,50 Kč
Cena dle Dodatku č. 2 bez DPH:	68 452 008,74 Kč
Cena víceprací dle ZL 7 – 12 bez DPH:	845 540,75 Kč
Cena méněprací dle ZL 7 – 12 bez DPH:	1 114 779,21 Kč
Cena dle Dodatku č. 3 bez DPH celkem:	68 182 770,28 Kč
DPH 21%:	14 318 381,76 Kč
Celkový stavební náklad:	82 501 152,04 Kč

DPH bude účtována v souladu se zákonem.

Ostatní ustanovení Smlouvy ze dne 11. 12. 2014, dodatkem č. 1 ze dne 13. 7. 2015 a dodatkem č. 2 ze dne 14. 10. 2015 nedotčená tímto dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti beze změny.

Tento Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po podpisu dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, čtyři objednatel.

Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

O uzavření tohoto dodatku č. 3 rozhodl hejtmán Královéhradeckého kraje na základě Usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/30/1457/2015 ze dne 19. 10. 2015.

V Brně, dne

28. 01. 2016

V Hradci Králové, dne - R - 02. 2016

Ing. Pavel Jankůj

jednatel

SDS EXMOST spol. s r.o.

SDS EXMOST spol. s r.o.
Účelna 413/66, 602 00 BRNO
TEL.: 543 432 311, FAX: 543 432 301 (26)
IČO: 49454501, DIČ: CZ49454501

Bc. Lubomír Franc

hejtmán

Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové

3

DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo ze dne 11. 12. 2014

na provedení díla – stavební práce na stavbě
Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura
– I/14 Vrchlabí, Nerudova – Nádražní
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Objednatel:

Adresa:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

Email:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP: Ing. Štěpán Illich

Tel.:

E-mail:

Technický dozor stavebníka:

Tel.:

E-mail:

Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

70889546

CZ 70889546

Bc. Lubomírem Francem, hejtmánem

Ing. Roman Kosař

Ing. Jana Jiráňová

Rostislav Křeček DiS.

Ing. Václav Sláma

(dále jako **objednatel**)

Zhotovitel:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Jednající:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

Stavbyvedoucí:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

Bankovní spojení:

SDS EXMOST spol. s r. o.

Údolní 413/66, 602 00 Brno

u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 13045

49454501

CZ49454501

Ing. Pavlem Jankůjem, jednatelem

Ing. Roman Daniel

Ing. Michal Janíček

(dále jako **zhotovitel**)

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a upravuje výše uvedená smlouva o dílo takto:

Článek II. Předmět smlouvy

Rozsah předmětu díla se upravuje o vícepráce a méněpráce na základě změnových listů č. 13 - 17 , které tvoří přílohu tohoto dodatku č. 4.

Článek VI. Cena za dílo

Cena za zhotovení díla podle čl. III. tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši:

Cena dle SOD bez DPH celkem:	67 398 900,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH:	67 644 705,50 Kč
Cena dle dodatku č. 2 bez DPH:	68 452 008,74 Kč
Cena dle dodatku č. 3 bez DPH:	68 182 770,28 Kč
Cena víceprací dle ZL 13 – 17 bez DPH:	1 969 872,86 Kč
Cena méněprací dle ZL 13 – 17 bez DPH:	- 869 032,15 Kč
Cena dle dodatku č. 4 bez DPH celkem:	69 283 610,99 Kč
DPH 21%:	14 549 558,31 Kč
Celkový stavební náklad:	83 833 169,30 Kč

DPH bude účtována v souladu se zákonem.

Ostatní ustanovení Smlouvy ze dne 11. 12. 2014, dodatkem č. 1 ze dne 13. 7. 2015, dodatkem č. 2 ze dne 14. 10. 2015 a dodatkem č. 3 ze dne 8. 2. 2016 nedotčená tímto dodatkem č. 4 zůstávají v platnosti beze změny.

Tento Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po podpisu smlouvy dva stejnopisy obdrží zhotovitel, čtyři objednatel.

Dodatek č. 4 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

O uzavření tohoto dodatku č. 4 rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě Usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/30/1457/2015 ze dne 19. 10. 2015.

V Brně, dne 21. 06. 2016

V Hradci Králové, dne 30. 06. 2016

Ing. Pavel Jankůj

jednatel

SDS EXMOST spol. s r.o.

SDS EXMOST spol. s r.o.

Číslo účtu 413 66 602 00 BRNO

SDS EXMOST spol. s r.o.

Královéhradecký kraj Lubomír Franc

se sídlem v
Hradci Králové hejtman

Královéhradecký kraj
