

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 24. 1. 2022

(dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

I. Smluvní strany

Fakultní nemocnice Ostrava

se sídlem: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava

IČ: 00843989

DIČ: CZ00843989

jednající: MUDr. Jiří Havrlant, MHA, ředitel Fakultní nemocnice Ostrava
zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990, č. j. OP-054-25.11.90
(dále jen „**Objednatel**“)

a

„Společnost FN-JIP KPMRCH“

Vedoucí společník: **HOCHTIEF CZ a. s.**

se sídlem: Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 15000

IČ: 46678468

DIČ: CZ46678468

jednající: [REDACTED]

a

Druhý společník: **BAK stavební společnost, a.s.**

se sídlem: Žitenická 871/1, Prosek, 190 00 Praha 9

IČ: 28402758

DIČ: CZ28402758

jednající: Ing. Radek Mrázek, MBA, místopředseda představenstva
(dále jen „**Zhotovitel**“)
(společně jako „**Smluvní strany**“)

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají výše uvedené Smluvní strany tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 24. 1. 2022, ev. č. 001/OVZ/22/010-OD, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 26. 4. 2023 (dále jen „**Dodatek č. 2**“).

II. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly k dnešnímu dni na této změně Smlouvy o dílo ze dne 24. 1. 2022, ev. č. 001/OVZ/22/010-OD (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je provést stavební práce na akci pod názvem „**FN Ostrava - Klinika popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie - JIP**“.

1. V důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba dodatečných prací, které nebyly obsaženy ve Smlouvě (dále jen „**vícepráce**“) a tyto dodatečné práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních prací podle Smlouvy. Zároveň se Smluvní strany dohodly na neprovedení některých původně sjednaných prací (dále jen „**méněpráce**“). Předmětem tohoto dodatku je tedy úprava předmětu Smlouvy o vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla.

2. V návaznosti na provedení víceprací a méněprací se dosavadní ustanovení článku V. **Cena a platební podmínky, odstavce I**, Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1, ruší a nahrazuje textem:

1. V souladu se zněním zákona č. 526/1990 Sb., o cenách se smluvní strany dohodly na ceně:

<i>aa.</i>	<i>Celková cena bez DPH</i>	<i>83.644.445,38 Kč</i>
<i>ab.</i>	<i>DPH ve výši</i>	<i>17.565.333,53 Kč</i>
<i>ac.</i>	<i>Celková cena celkem vč. DPH</i>	<i>101.209.778,91 Kč</i>

3. Přesná specifikace víceprací a méněprací, navýšení ceny o 3.412.672,74 Kč bez DPH a s tím související snížení ceny o 2.757.060,98 Kč bez DPH je zaznamenáno v Oznámení o změně akce č. 23 – č. 52, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „**Příloha č. 1**“).
4. Ostatní ujednání této Smlouvy zůstávají beze změny.

III. Závěrečná ustanovení


1. Smluvní strany souhlasí, že Dodatek č. 2 bude zveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „**Registr smluv**“).
2. Dodatek č. 2 se stává platným podpisem obou Smluvních stran a účinným nejdříve dnem zveřejnění v Registru smluv. Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy.
3. Ostatní ujednání Smlouvy Dodatkem č. 2 nedotčená, zůstávají v platnosti a účinnosti.
4. Dodatek č. 2 je vyhotoven v jednom elektronickém stejnopise s platností originálu.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je Příloha č. 1 – Oznámení o změně akce č. 23 – č. 52.
6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Oznámení o změnách akce č. 23

Identifikační údaje akce	
Název	FN Ostrava – Klinika popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie – JIP
SOD ev. č. 001/OVZ/22/100D	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	HOCHTIEF CZ a. s.
Adresa	Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
Oznámení vystavil:	
Lukáš Jambor	
Navrhované změny akce	
Změna kabelové trasy z rozvodny pod heliportem k objektu popálenin, D.1.01.4c	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
<p>Na základě požadavku zástupce objednatele (specialista elektro) bylo nutno změnit trasu kabelového vedení z rozvodny pod heliportem k objektu popálenin. Původní navržená trasa nebyla v době realizace již kapacitně průchodná. Změna řešení zároveň znamená finanční úsporu oproti v PD navrženému řešení.</p>	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
-280 874,36 Kč	195 800,00 Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	
	-85 074,36 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	-17 865,62 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	-102 939,98 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>	

Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava


Datum: 29.5.23

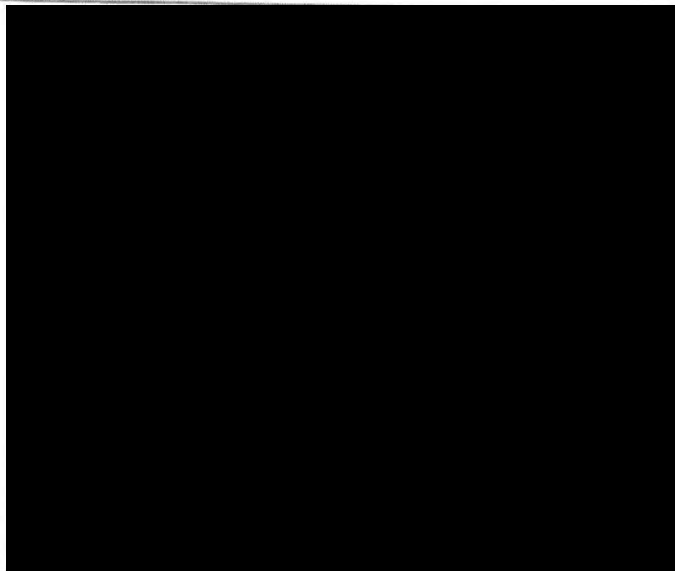

Ing. Marek Veselý
náměstek ředitele pro techniku a provoz

Datum: 29.5.23


Podpis zmocněnce zhotovitele:



Stanovisko TDI:

Datum: 29.5.23


Podpis TDI:



Stanovisko projektanta stavby:

Datum: 29.5.23

Podpis projektanta stavby:



Seznam příložených dokladů:

1. Příloha č. 1 - rozpočet ZL 23

Oznámení o změnách akce č. 24

Identifikační údaje akce

Název: FN Ostrava – Klinika popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie – JIP

SOD ev. č. 001/OVZ/22/10/OD

Objednatel:

Název: Fakultní nemocnice Ostrava

Adresa: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba

Zhotovitel

Název: HOCHTIEF CZ a. s.

Adresa: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

Oznámení vystavil:

Lukáš Jambor

Navrhované změny akce

Změny u kovového nábytku do čistých prostor.

Zdůvodnění navrhovaných změn

Dle požadavku objednatele a uživatele byly provedeny změny v zadání u kovového nábytku do čistých prostor. Změny se týkají této části: D.1.01.1 Stavebně konstrukční část.

Změny se týkaly zejména:

- Materiálové řešení obkladu za linkou (sklo za lakovaný plech)
- Záměna skříněk s policemi za skřínky se zásobníky rukavic a ručníků

Cena méněprací bez DPH:

-236 288,00 Kč

Cena víceprací bez DPH:

268 070,40 Kč

Výsledná cena změn bez DPH:

31 782,40 Kč

Výsledná celková cena změny DPH

6 674,30 Kč

Výsledná celková cena změny vč. DPH


38 456,70 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum: 29.5.23

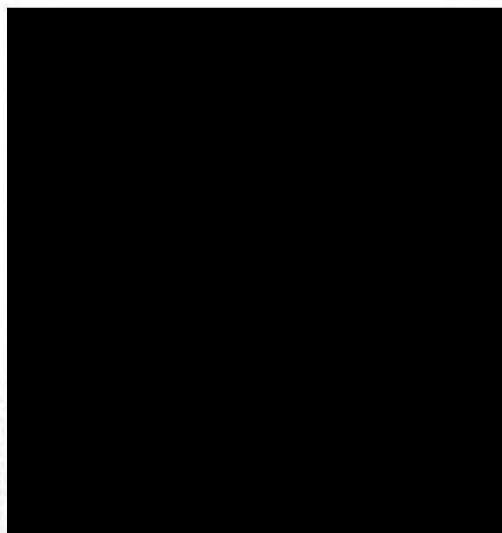

Ing. Marek Veselý
náměstek ředitele pro techniku a provoz

Datum: 29.5.23


Podpis zmocněnce zhotovitele:



Stanovisko TDI:

Datum: 29.5.23

Podpis TDI:



Stanovisko projektanta stavby:

Datum: 29.5.23

Podpis projektanta stavby:



Seznam příložených dokladů:


1. Příloha č. 1 - rozpočet ZL 24

Oznámení o změnách akce č. 25

Identifikační údaje akce	
Název	FN Ostrava – Klinika popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie – JIP
SOD ev. č. 001/OVZ/22/10/OD	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	HOCHTIEF CZ a. s.
Adresa	Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
Oznámení vystavil:	
Lukáš Jambor	
Navrhované změny akce	
Dodávka a montáž šachetních dvířek.	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
<p>S ohledem na omezenou kapacitu stávající stoupačky SLP bylo po dohodě se zástupcem objednatele (specialista IT) přistoupeno ke změně trasy stoupačičho vedení. Délky kabeláže zůstaly stejné, nicméně bylo nutno doplnit požární šachetní dveře do nové stoupačky. Změny se týkají této části: D.1.01.1 Stavebně konstrukční část.</p>	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,- Kč	28 359,00 Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	
	28 359,00 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	5 955,39 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	34 314,39 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>	

Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum: 29.5.23

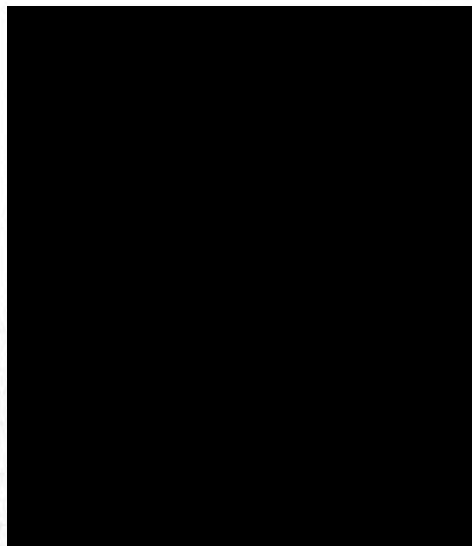

Ing. Marek Veselý /
náměstek ředitele pro techniku a provoz

Datum: 29.5.23

Podpis zmocněnce zhotovitele:



Stanovisko TDI:

Datum: 29.5.23


Podpis TDI:



Stanovisko projektanta stavby:

Datum: 29.5.23

Podpis projektanta stavby:



Seznam příložených dokladů:


1. Příloha č. 1a - rozpočet ZL 25

Oznámení o změnách akce č. 26

Identifikační údaje akce	
Název	FN Ostrava – Klinika popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie – JIP
SOD ev. č. 001/OVZ/22/10/OD	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	HOCHTIEF CZ a. s.
Adresa	Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
Oznámení vystavil:	
Lukáš Jambor	
Navrhované změny akce	
Změny u systému Cisco.	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
Dle požadavku objednatele (zástupce IT) byly provedeny změny aktivních prvků u systému Cisco pro sjednocení s aktuálními požadavky na realizované systémy v rámci areálu FNO. Změny se týkají této části: D.1.01.4d SLP.	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
-290 027,00 Kč	301 320,00 Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	
	11 293,00 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	2 371,53 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	13 664,53 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	

Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava


Datum: 29.5.23

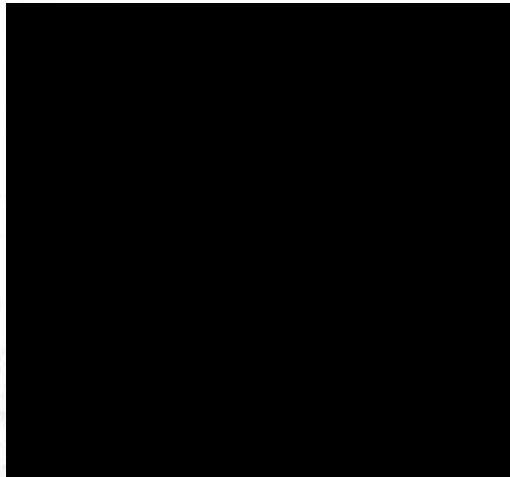

Ing. Marek Veselý
náměstek ředitele pro techniku a provoz

Datum: 29.5.23

Podpis zmocněnce zhotovitele:



Stanovisko TDI:

Datum: 29.5.23


Podpis TDI:



Stanovisko projektanta stavby:

Datum: 29.5.23

Podpis projektanta stavby:



Seznam příložených dokladů:

1. Příloha č. 1 - rozpočet ZL 26

Oznámení o změnách akce č. 27

Identifikační údaje akce

Název: FN Ostrava – Klinika popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie – JIP

SOD ev. č. 001/OVZ/22/10/OD

Objednatel:

Název: Fakultní nemocnice Ostrava

Adresa: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba

Zhotovitel

Název: HOCHTIEF CZ a. s.

Adresa: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

Oznámení vystavil:

Lukáš Jambor

Navrhované změny akce

Změny v rámci revize PD R09.

Zdůvodnění navrhovaných změn

Doplnění rozvaděče HR-N2.4 v rámci revize projektové dokumentace části silnoproudu - R09, doplnění chybějících prvků dle požadavku objednatele (specialista elektro). Změny se týkají této části: D.1.01.4c Silnoproudé elektroinstalace.

Cena méněprací bez DPH:

0,- Kč

Cena víceprací bez DPH:

197 092,00 Kč

Výsledná cena změn bez DPH:

197 092,00 Kč

Výsledná celková cena změny DPH

41 389,32 Kč

Výsledná celková cena změny vč. DPH


238 481,32 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava


Datum: 29.5.23

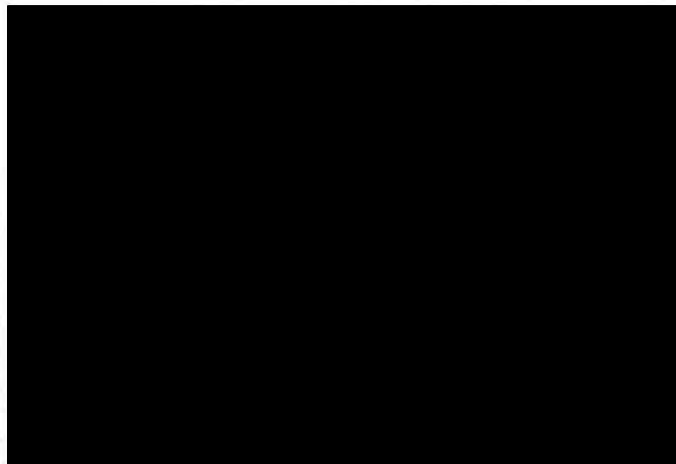

Ing. Marek Veselý /
náměstek ředitele pro techniku a provoz

Datum: 29.5.23


Podpis zmocněnce zhotovitele:



Stanovisko TDI:

Datum: 29.5.23


Podpis TD



Stanovisko projektanta stavby:

Datum: 29.5.23

Podpis projektanta stavby:



Seznam příložených dokladů:

1. Příloha č. 1 - rozpočet ZL 27

Oznámení o změnách akce č. 28

Identifikační údaje akce	
Název	FN Ostrava – Klinika popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie – JIP
SOD ev. č. 001/OVZ/22/10/OD	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	HOCHTIEF CZ a. s.
Adresa	Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
Oznámení vystavil:	
Lukáš Jambor	
Navrhované změny akce	
Osazování vybavení nemocnice	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
Dle požadavku objednatele bylo nutno provést osazování drobného vybavení a zařízení - nástěnky, wc šetky, háčky, atd., jejichž dodávku si zajišťoval objednatel samostatně. Změny se týkají této části: D.1.01.1 ARCH-STAV.	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,- Kč	50 220,00 Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	
	50 220,00 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	10 546,20 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	60 766,20 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	

Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum: 29.5.23



Ing. Marek Veselý
náměstek ředitele pro techniku a provoz

Datum: 29.5.23

Podpis zmocněnce zhotovitele:



Stanovisko TDI:

Datum: 29.5.23


Podpis TDI:



Stanovisko projektanta stavby:

Datum: 29.5.23

Podpis projektanta stavby:



Seznam příložených dokladů:

1. Příloha č. 1 – rozpočet ZL 28

Oznámení o změnách akce č. 29

Identifikační údaje akce	
Název	FN Ostrava – Klinika popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie – JIP
SOD ev. č. 001/OVZ/22/100D	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	HOCHTIEF CZ a. s.
Adresa	Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
Oznámení vystavil:	
Lukáš Jambor	
Navrhované změny akce	
Oprava ZL8, ZL10, ZL18.	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
<p>Odečet sprchovacího panelu ze ZL18 – toto si zajistil objednatel samostatně. Oprava ZL8 – v celkové sumě nebyly započtené pol. 203N, 204N. Oprava ZL10 – v celkové sumě nebyla započtená položka 71.</p>	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
-133 800,00 Kč	50 828,40 Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	
	-82 971,60 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	-17 424,04 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	-100 395,64 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	

Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum: 29.5.23



náměstek ředitele pro techniku a provoz

Datum: 29.5.23

Podpis zmocněnce zhotovitele:



Stanovisko TDI:

Datum: 29.5.23

Podpis TDI:



Stanovisko projektanta stavby:

Datum: 29.5.23

Podpis projektanta stavby:



Seznam příložených dokladů:


1. Příloha č. 1, 2, 3 rozpočet ZL 29

Oznámení o změnách akce č. 30

Identifikační údaje akce	
Název	FN Ostrava – Klinika popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie – JIP
SOD ev. č. 001/OVZ/22/10/OD	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	HOCHTIEF CZ a. s.
Adresa	Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
Oznámení vystavil:	
Lukáš Jambor	
Navrhované změny akce	
Drobné práce na ZTI a ÚT	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
<p>ZL30 Drobné práce na ZTI a ÚT, které vyplynuly v průběhu stavebních prací na základě požadavků objednatele a uživatele. Jedná se zejména o následující práce:</p> <p>ZL30.1 Úprava dispozice A0205 s ohledem na kolizi se stávající VZT, ZTI</p> <p>ZL30.2 Výměna výlevek v m.č.B0157c,A0138,A0139 ZTI</p> <p>ZL30.3 Oprava stávající stoupačky ÚT v m.č.A0145</p> <p>ZL30.4 Vsazení KK pro VZT1 v 2PP m.č.B0205 ÚT</p> <p>ZL30.5 Demontáž potrubí strojovna 2PP m.č.B0205 ÚT</p> <p>ZL30.6 m.č.A0109 změna pozic ZP a rozvodů potrubí dle nové PD ZTI</p> <p>ZL30.7.1 Rozvody potrubí pro dřež 1.PP m.č.B0140 a propojení do 2.PP ZTI</p> <p>ZL30.7.2 Rozvody potrubí pro dřež 1.PP m.č.B0140 a propojení do 2.PP stavební</p> <p>ZL30.8 1.PP osazení dialyzačních jednotek ZTI</p> <p>ZL30.9 úprava potrubí pro dřež m.č. A0113 ZTI</p> <p>ZL30.10 m.č. A0111, ST.S14 posunutí vývodů pro dřež ZTI</p> <p>ZL30.11 Úprava potrubí pro umyvadlo m.č.A0113 (změna trasy VZT pot.)</p> <p>Změny se týkají této části: D.1.01.1-S ARCH-STAV, D.1.01.4a ZTI a D.1.01.4b ÚT.</p>	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
-32 554,25 Kč	193 676,38 Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	
	161 122,13 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	33 835,65 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	194 957,78 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>	

Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum: 29.5.23

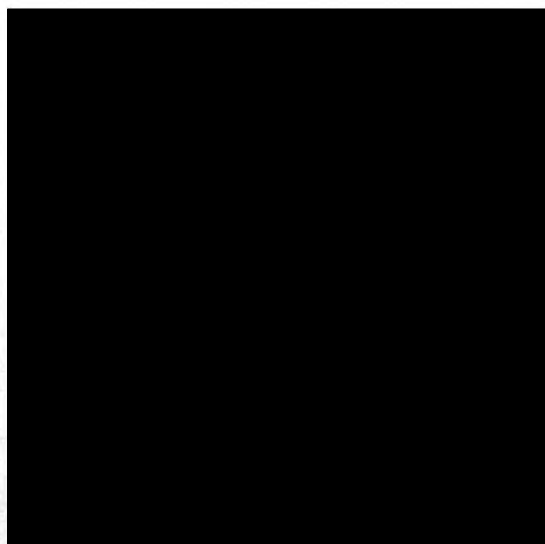

Ing. Marek Veselý
náměstek ředitele pro techniku a provoz

Datum: 29.5.23


Podpis zmocněnce zhotovitele:



Stanovisko TDI:

Datum: 29.5.23

Podpis TDI:



Stanovisko projektanta stavby:

Datum: 29.5.23

Podpis projektanta stavby:



Seznam příložených dokladů:

1. Příloha č. 1 – 11 rozpočty ZL 30

Oznámení o změnách akce č. 31

Identifikační údaje akce

Název FN Ostrava – Klinika popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie – JIP

SOD ev. č. 001/OVZ/22/10/OD

Objednatel:

Název Fakultní nemocnice Ostrava

Adresa 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba

Zhotovitel

Název HOCHTIEF CZ a. s.

Adresa Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

Oznámení vystavil:

Lukáš Jambor

Navrhované změny akce

Drobné práce na silnoproudu a SLP

Zdůvodnění navrhovaných změn

ZL31 doplnění požadavků ze strany objednatele a uživatele v části silnoproudu a SLP. Jedná se zejména o:

- Doplnění zásuvek v m.č. A0108
- Doplnění vývodu EDEKV-106
- Doplnění koaxiálního kabelu SLP (chybějící výměra z výkazu výměr)

Změny se týkají této části: D.1.01.4c-S EL a D.1.01.4d-S SLP.

Cena méněprací bez DPH:

0,- Kč

Cena víceprací bez DPH:

38 428,20 Kč

Výsledná cena změn bez DPH:

38 428,20 Kč

Výsledná celková cena změny DPH

8 069,92 Kč

Výsledná celková cena změny vč. DPH

46 498,12 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum: 29.5.23



Ing. Marek Veselý
náměstek ředitele pro techniku a provoz

Datum: 29.5.23

Podpis zmocněnce zhotovitele:



Stanovisko TDI:

Datum: 29.5.23

Podpis TDI:



Stanovisko projektanta stavby:

Datum: 29.5.23

Podpis projektanta stavby:



Seznam příložených dokladů:

1. Příloha č. 1 – 3 rozpočty ZL 31

Oznámení o změnách akce č. 32

Identifikační údaje akce

Název FN Ostrava – Klinika popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie – JIP
SOD ev. č. 001/OVZ/22/10/OD

Objednatel:

Název Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba

Zhotovitel

Název HOCHTIEF CZ a. s.
Adresa Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

Oznámení vystavil:

Lukáš Jambor

Navrhované změny akce

Změny u nábytku ve zdravotnických technologiích volně stojících.

Zdůvodnění navrhovaných změn

Dle požadavku objednatele a uživatele byly provedeny změny u nábytku ve zdravotnických technologiích volně stojících. Jedná se o dodatečné požadavky na provedení výrobků, které byly specifikované v zadávací dokumentaci. Tyto změny se týkají upraveného řešení na noční stolky, pracovní vozíky, nádoby na odpad, dávkovače mýdla a desinfekce, podstavec na matrace, skříňky policové a skříně šatní.

D.1.01.5 Zdravotnická technologie volně stojící.

Cena méněprací bez DPH:

-477 312,- Kč

Cena víceprací bez DPH:

862 940,70 Kč

Výsledná cena změn bez DPH:

385 628,70 Kč

Výsledná celková cena změny DPH

80 982,03 Kč

Výsledná celková cena změny vč. DPH

466 610,73 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava


Datum: 29.5.23



Ing. Marek Veselý
náměstek ředitele pro techniku a provoz

Datum: 29.5.23


Podpis zmocněnce zhotovitele:



Stanovisko TDI:

Datum: 29.5.23


Podpis TDI:



Stanovisko projektanta stavby:

Datum: 29.5.23

Podpis projektanta stavby:



Seznam příložených dokladů:


1. Příloha č. 1 - rozpočet ZL 32

Oznámení o změnách akce č. 33

Identifikační údaje akce	
Název	FN Ostrava – Klinika popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie – JIP
SOD ev. č. 001/OVZ/22/100D	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	HOCHTIEF CZ a. s.
Adresa	Pižeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
Oznámení vystavil:	
Lukáš Jambor	
Navrhované změny akce	
Úprava VZT trasy požárního větrání v 1.PP dle změny PBŘ.	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
<p>S ohledem na koordinaci se samostatně realizovanou stavbou „Lůžkového bloku“ bylo nutno provést úpravy v řešení VZT , tak aby byly splněné požadavky z PBŘ této stavby. Změny se týkají této části: D.1.01.4f VZT.</p>	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
-3 679,00 Kč	45 102,00 Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	
	41 423,00 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	8 698,83 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	50 121,83 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>	

Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava


Datum: 29.5.23



Ing. Marek Veselý
náměstek ředitele pro techniku a provoz

Datum: 29.5.23

Podpis zmocněnce zhotovitele:




Ing. Petr Slezáček

Stanovisko TDI:

Datum: 29.5.23

Podpis TDI:




Ing. Pavel Hynčica
ATS International Projects s.r.o.

Stanovisko projektanta stavby:

Datum: 29.5.23

Podpis projektanta stavby:



Ing. Filip Spáčil
LT Projekt, a.s.

Seznam příložených dokladů:


1. Příloha č. 1 - rozpočet ZL 33

Oznámení o změnách akce č. 34

Identifikační údaje akce	
Název	FN Ostrava – Klinika popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie – JIP
SOD ev. č. 001/OVZ/22/100D	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	HOCHTIEF CZ a. s.
Adresa	Pižeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
Oznámení vystavil:	
Lukáš Jambor	
Navrhované změny akce	
Přeložka HOP v místnosti č. B0129.	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
Přeložka HOP v místnosti č. B0129 – změna v požadavku provedení krabice. Změny byly provedeny na žádost uživatele a objednatele a týkají se této části: D.1.01.4c ELE.	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,00 Kč	1 052,00 Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	1 052,00 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	220,92 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	1 272,92 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	

Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum: 29.5.23

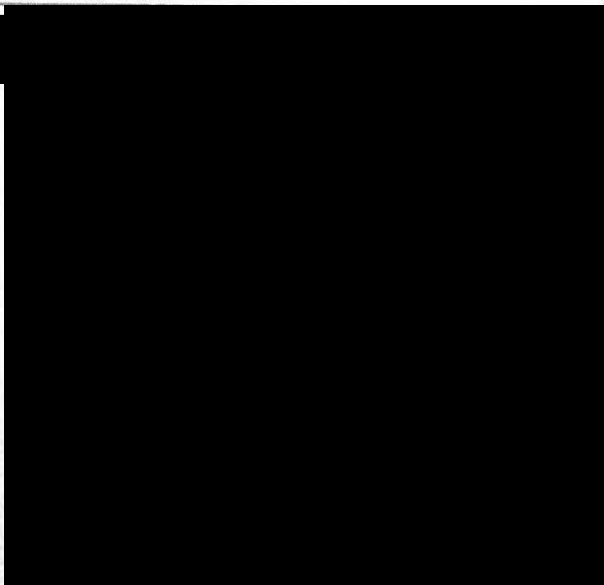
Ing. Marek Veselý
náměstek ředitele pro techniku a provoz

Datum: 29.5.23

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Stanovisko TDI:

Datum: 29.5.23

Podpis TDI:

Stanovisko projektanta stavby:

Datum: 29.5.23

Podpis projektanta stavby:

Seznam příložených dokladů:

1. Příloha č. 1 - rozpočet ZL 34

Oznámení o změnách akce č. 35

Identifikační údaje akce	
Název	FN Ostrava – Klinika popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie – JIP
SOD ev. č. 001/OVZ/22/100D	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	HOCHTIEF CZ a. s.
Adresa	Pížeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
Oznámení vystavil:	
Lukáš Jambor	
Navrhované změny akce	
Doplnění ochranných rohů.	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
<p>Oproti zadávací projektové dokumentaci došlo na základě požadavku objednatele a uživatele k doplnění ochranných prvků. Změny se týkají této části: D.1.01.1 Architektonicko-stavební řešení.</p>	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,00 Kč	13 499,20 Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	
	13 499,20 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	2 834,83 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	16 334,03 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>	

Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum: 29.5.23



Sylva Trojková
referent odd. přípravy a realizace investic



Ing. Martina Cermáková
vedoucí oddělení investic



Ing. Marek Veselý
náměstek ředitele pro techniku a provoz

Datum: 29.5.23


Podpis zmocněnce zhotovitele:



Stanovisko TDI:

Datum: 29.5.23


Podpis TDI:



Stanovisko projektanta stavby:

Datum: 29.5.23

Podpis projektanta stavby:



Seznam příložených dokladů:

1. Příloha č. 1 - rozpočet ZL 35

Oznámení o změnách akce č. 36

Identifikační údaje akce

Název FN Ostrava – Klinika popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie – JIP

SOD ev. č. 001/OVZ/22/100D

Objednatel:

Název Fakultní nemocnice Ostrava

Adresa 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba

Zhotovitel

Název HOCHTIEF CZ a. s.

Adresa Pízeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

Oznámení vystavil:

Lukáš Jambor

Navrhované změny akce

Nové umístění a nová mřížka pro větrání CBS.

Zdůvodnění navrhovaných změn

Pro zajištění bezproblémového provozu CBS bylo oproti zadávací PD doplněné větrání této místnosti, dopojení na EPS a drobné stavební práce – oprava stěn po montáži. Změny se týkají této části: D.1.01.4f VZT a D.1.01.4h EPS.

Cena méněprací bez DPH:

0,00 Kč

Cena víceprací bez DPH:

48 577,00 Kč

Výsledná cena změn bez DPH:

48 577,00 Kč

Výsledná celková cena změny DPH

10 201,17 Kč

Výsledná celková cena změny vč. DPH

58 778,17 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum: 29.5.23



Ing. Marek Veselý
náměstek ředitele pro techniku a provoz

Datum: 29.5.23

Podpis zmocněnce zhotovitele:



Stanovisko TDI:

Datum: 29.5.23

Podpis TDI:



Stanovisko projektanta stavby:

Datum: 29.5.23

Podpis projektanta stavby:



Seznam příložených dokladů:

1. Příloha č. 1a, Příloha č. 1b - rozpočet ZL 36

Oznámení o změnách akce č. 37**Identifikační údaje akce**

Název	FN Ostrava – Klinika popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie – JIP
-------	--

SOD ev. č. 001/OVZ/22/100D

Objednatel:

Název	Fakultní nemocnice Ostrava
-------	----------------------------

Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
--------	---

Zhotovitel

Název	HOCHTIEF CZ a. s.
-------	-------------------

Adresa	Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
--------	----------------------------------

Oznámení vystavil:

Lukáš Jambor

Navrhované změny akce

SLP a EPS - doplnění komponentů SK, RD 9.4, KPS, Monitoring tlaku.

Zdůvodnění navrhovaných změn

Oproti zadávací dokumentaci došlo na základě požadavku objednatele a uživatele k rozšíření a doplnění komponentů na monitoring teploty a zobrazování stavů medicinálních plynů. Dále došlo na základě požadavku specialisty IT ke změně licence kamerového systému a byl doplněn zdroj ke dvěřím v rámci systému EPS. Změny se týkají této části: D.1.01.4d SLP a D.1.01.4h EPS.

Cena méněprací bez DPH:

0,00 Kč

Cena víceprací bez DPH:

353 066,60 Kč

Výsledná cena změn bez DPH:

353 066,60 Kč

Výsledná celková cena změny DPH

74 143,99 Kč

Výsledná celková cena změny vč. DPH


427 210,59 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava


Datum: 29.5.23

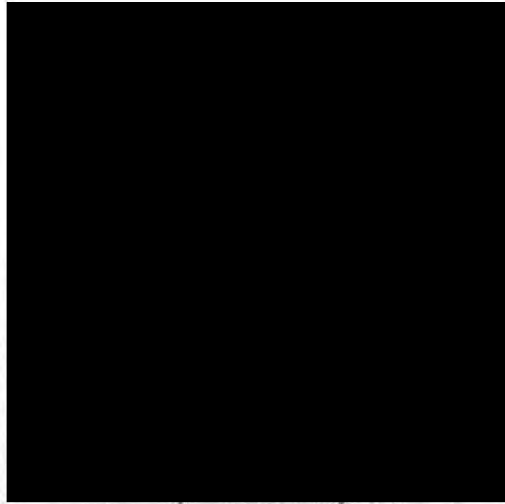

Ing. Marek Veselý
náměstek ředitele pro techniku a provoz

Datum: 29.5.23

Podpis zmocněnce zhotovitele:



Stanovisko TDI:

Datum: 29.5.23


Podpis TDI:



Stanovisko projektanta stavby:

Datum: 29.5.23

Podpis projektanta stavby:



Seznam příložených dokladů:


1. Příloha č. 1 - rozpočet ZL 37 SLP, Příloha č. 2 - rozpočet ZL 37 EPS

Oznámení o změnách akce č. 38

Identifikační údaje akce	
Název	FN Ostrava – Klinika popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie – JIP
SOD ev. č. 001/OVZ/22/100D	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	HOCHTIEF CZ a. s.
Adresa	Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
Oznámení vystavil:	
Lukáš Jambor	
Navrhované změny akce	
Změny v rámci revize PD R08.	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
Po upřesnění požadavků ze strany objednatele (specialista elektro) byla provedena revize PD R08. Na základě této revize došlo k doplnění rozvaděčů 01RMO2 a 01RJIP1. Změny se týkají této části: D.1.01.4c Silnoproudé elektroinstalace.	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,00 Kč	269 283,00 Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	
	269 283,00 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	56 549,43 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	325 832,43 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	

Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum: 29.5.23

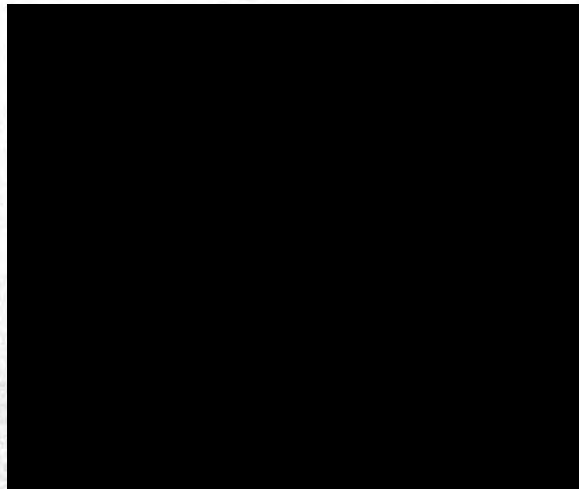

Ing. Marek Verselý
náměstek ředitele pro techniku a provoz

Datum: 29.5.23

Podpis zmocněnce zhotovitele:



Stanovisko TDI:

Datum: 29.5.23


Podpis TDI:



Stanovisko projektanta stavby:

Datum: 29.5.23

Podpis projektanta stavby:



Seznam příložených dokladů:


1. Příloha č. 1 - rozpočet ZL 38

Oznámení o změnách akce č. 39

Identifikační údaje akce	
Název	FN Ostrava – Klinika popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie – JIP
SOD ev. č. 001/OVZ/22/10OD	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	HOCHTIEF CZ a. s.
Adresa	Přízeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
Oznámení vystavil:	
Lukáš Jambor	
Navrhované změny akce	
Silnoproud – doplnění zásuvek.	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
Na základě požadavku objednatele a uživatele došlo k doplnění zásuvek v místnosti sesterny a očisty. Změny se týkají této části: D.1.01.4c ELE.	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,00 Kč	3 970,00 Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	
	3 970,00 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	833,70 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	4 803,70 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	

Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava


Datum: 29.5.23

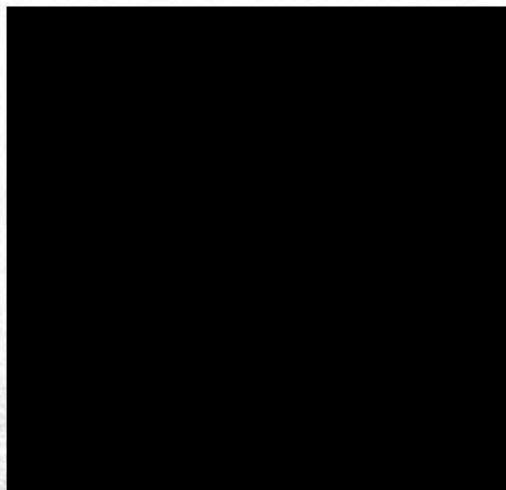

Ing. Marek Veselý
náměstek ředitele pro techniku a provoz

Datum: 29.5.23

Podpis zmocněnce zhotovitele:



Stanovisko TDI:

Datum: 29.5.23


Podpis TDI:



Stanovisko projektanta stavby:

Datum: 29.5.23

Podpis projektanta stavby:



Seznam příložených dokladů:

1. Příloha č. 1 - rozpočet ZL 39

Oznámení o změnách akce č. 40

Identifikační údaje akce	
Název	FN Ostrava – Klinika popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie – JIP
SOD ev. č. 001/OVZ/22/100D	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	HOCHTIEF CZ a. s.
Adresa	Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
Oznámení vystavil:	
Lukáš Jambor	
Navrhované změny akce	
Doplnění parapetního žlabu u pultu sester	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
Na základě požadavku objednatele a uživatele byl doplněn parapetní žlab u pultu sester. Změny se týkají této části: D.1.01.4h EPS.	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,00 Kč	11 329,50 Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	11 329,50 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	2 379,20 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	13 708,70 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	

Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum: 29.5.23



Ing. Marek Veselý
náměstek ředitele pro techniku a provoz

Datum: 29.5.23


Podpis zmocněnce zhotovitele:



Stanovisko TDI:

Datum: 29.5.23

Podpis TDI:



Stanovisko projektanta stavby:

Datum: 29.5.23

Podpis projektanta stavby:



Seznam příložených dokladů:

1. Příloha č. 1 - rozpočet ZL 40

Oznámení o změnách akce č. 41

Identifikační údaje akce	
Název	FN Ostrava – Klinika popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie – JIP
SOD ev. č. 001/OVZ/22/10/OD	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	HOCHTIEF CZ a. s.
Adresa	Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
Oznámení vystavil:	
Lukáš Jambor	
Navrhované změny akce	
Drobné změny a odpočty - revizní dvířka, mřížky, madla, prahy, žlab.	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
Tento změnový list řeší skutečnost u množství a provedení revizních dvířek, mřížek, madel, prahů a žlabů. Dále je v tomto ZL odečteno měření hluku, které nebylo nutno provádět. Změny se týkají této části: D.1.01.1 arch-stav části.	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
-55 516,00Kč	38 170,00 Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	
	-17 346,00 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	-3 642,66 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	-20 988,66 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	

Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum: 29.5.23



Ing. Marek Veselý
náměstek ředitele pro techniku a provoz

Datum: 29.5.23


Podpis zmocněnce zhotovitele:



Stanovisko TDI:

Datum: 29.5.23

Podpis TDI:



Stanovisko projektanta stavby:

Datum: 29.5.23

Podpis projektanta stavby:



Seznam příložených dokladů:

1. Příloha č. 1 – rozpočet ZL 41

Oznámení o změnách akce č. 42

Identifikační údaje akce

Název FN Ostrava – Klinika popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie – JIP

SOD ev. č. 001/OVZ/22/10/OD

Objednatel:

Název Fakultní nemocnice Ostrava

Adresa 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba

Zhotovitel

Název HOCHTIEF CZ a. s.

Adresa Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

Oznámení vystavil:

Lukáš Jambor

Navrhované změny akce

Úprava potrubí pod myčku podložných mís + dřez v m. č. B0139

Zdůvodnění navrhovaných změn

S ohledem na samostatnou dodávku myčky podložných mís a přístroje na míchání desinfekcí ze strany objednatele, bylo nutno upravit rozvody ZTI pro tyto přístroje. Změny se týkají této části: D.1.01.4a ZTI.

Cena méněprací bez DPH:

0,- Kč

Cena víceprací bez DPH:

31 063,53 Kč

Výsledná cena změn bez DPH:

31 063,53 Kč

Výsledná celková cena změny DPH

6 523,34 Kč

Výsledná celková cena změny vč. DPH

37 586,87 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum: 29.5.23



Ing. Marek Veselý
náměstek ředitele pro techniku a provoz

Datum: 29.5.23


Podpis zmocněnce zhotovitele:



Stanovisko TDI:

Datum: 29.5.23

Podpis TDI:



Stanovisko projektanta stavby:

Datum: 29.5.23

Podpis projektanta stavby:



Seznam příložených dokladů:


1. Příloha č. 1a, Příloha č. 1b – rozpočet ZL 42

Oznámení o změnách akce č. 43

Identifikační údaje akce	
Název	FN Ostrava – Klinika popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie – JIP
SOD ev. č. 001/OVZ/22/10/OD	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	HOCHTIEF CZ a. s.
Adresa	Pižeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
Oznámení vystavil:	
Lukáš Jambor	
Navrhované změny akce	
Odvodnění havarijního žlabu v m. č. B0203	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
S ohledem na bezpečný provoz v místnosti rozvodny elektro bylo dohodnuto doplnit odvodnění havarijního žlabu do kanalizace. Změny se týkají této části: D.1.01.4a ZTI.	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,- Kč	6 967,41 Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	6 967,41 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	1 463,16 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	8 430,57 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	

Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum: 29.5.23

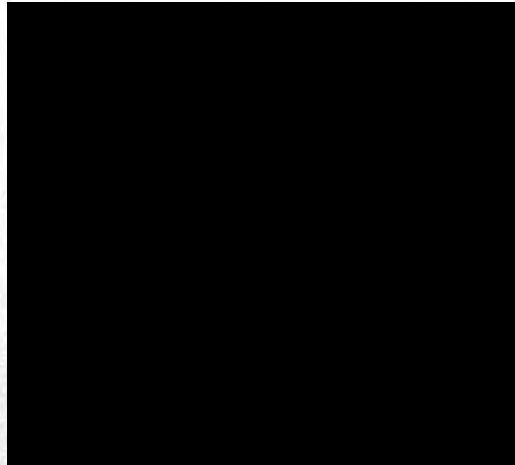

Ing. Marek Veselý
náměstek ředitele pro techniku a provoz

Datum: 29.5.23


Podpis zmocněnce zhotovitele:



Stanovisko TDI:

Datum: 29.5.23


Podpis TDI:



Stanovisko projektanta stavby:

Datum: 29.5.23

Podpis projektanta stavby:



Seznam příložených dokladů:


1. Příloha č. 1 – rozpočet ZL 43

Oznámení o změnách akce č. 44

Identifikační údaje akce	
Název	FN Ostrava – Klinika popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie – JIP
SOD ev. č. 001/OVZ/22/100D	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	HOCHTIEF CZ a. s.
Adresa	Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
Oznámení vystavil:	
Lukáš Jambor	
Navrhované změny akce	
EPS – drobné změny.	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
S ohledem na nedostatečnou kapacitu stávajícího systému EPS v době realizace stavby bylo nutno doplnit a upravit řešení napojení EPS dle požadavku provozovatele. Změny se týkají této části: D.1.01.4h EPS.	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,00 Kč	10 253 Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	
	10 253 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	2 153,13 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	12 406,13 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	

Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum: 29.5.23

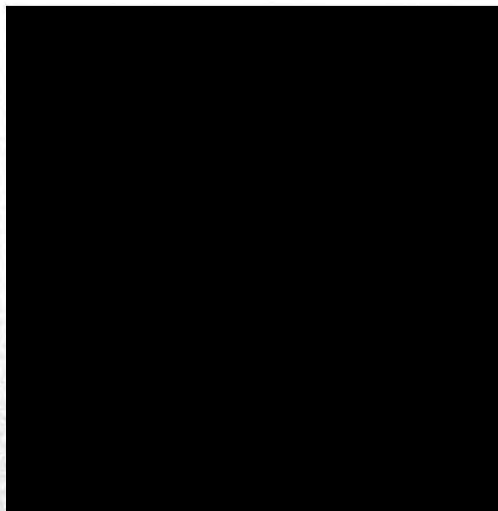

Ing. Marek Veselý
náměstek ředitele pro techniku a provoz

Datum: 29.5.23

Podpis zmocněnce zhotovitele:



Stanovisko TDI:

Datum: 29.5.23


Podpis TDI:



Stanovisko projektanta stavby:

Datum: 29.5.23

Podpis projektanta stavby:



Seznam příložených dokladů:


1. Příloha č. 1 - rozpočet ZL 44

Oznámení o změnách akce č. 45

Identifikační údaje akce	
Název	FN Ostrava – Klinika popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie – JIP
SOD ev. č. 001/OVZ/22/100D	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	HOCHTIEF CZ a. s.
Adresa	Pížeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
Oznámení vystavil:	
Lukáš Jambor	
Navrhované změny akce	
Zrušení VZT zař. 19 – odvětrání digestoře	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
<p>S ohledem na komplikace a kolize vedení VZT pro odtah z digestoře, bylo dohodnuto toto vedení nerealizovat a digestoř bude rekuperační (nebylo nutno měnit dodávku digestoře, tato splňuje tuto funkci). Změny se týkají této části: D.1.01.4f VZT.</p>	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,- Kč	-5 910,00 Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	
	-5 910,00 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	-1 241,10 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	-7 151,10 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>	

Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum: 29.5.21

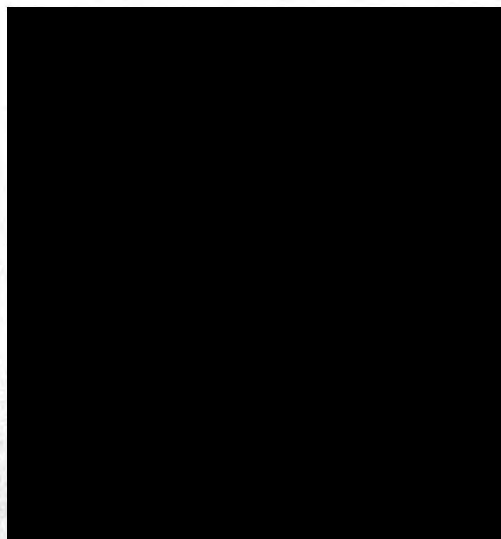

Ing. Marek Veselý
náměstek ředitele pro techniku a provoz

Datum: 29.5.21


Podpis zmocněnce zhotovitele:



Stanovisko TDI:

Datum: 29.5.21

Podpis TD



Stanovisko projektanta stavby:

Datum: 29.5.21

Podpis projektanta stavby:



Seznam příložených dokladů:


1. Příloha č. 1 - rozpočet ZL 45

Oznámení o změnách akce č. 46

Identifikační údaje akce	
Název	FN Ostrava – Klinika popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie – JIP
SOD ev. č. 001/OVZ/22/10/OD	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	HOCHTIEF CZ a. s.
Adresa	Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
Oznámení vystavil:	
Lukáš Jambor	
Navrhované změny akce	
Neprováděné práce a dodávky, dopojení stoupaček	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
<p>S ohledem na nutné omezení provozu ve stávajícím objektu a po konzultacích se zástupci provozu, objednatele a uživatele došlo ke zrušení výměny ležatého rozvodu vody v 2.PP. Oproti tomuto bylo nutno provést částečnou úpravu – dopojení stoupaček na stávající ležaté rozvody. Změny se týkají této části: D.1.01.4a ZTI.</p>	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
-845 677,92 Kč	51 226,62 Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	
	-794 451,30 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	-166 834,77 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	-961 286,07 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>	

Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava


Datum: 29.5.23

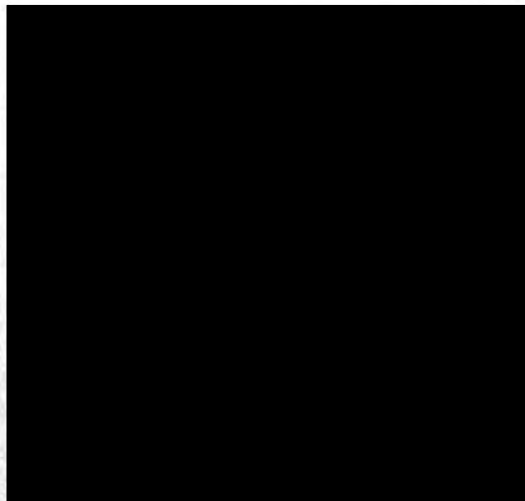

Ing. Marek Veselý
náměstek ředitele pro techniku a provoz

Datum: 29.5.23


Podpis zmocněnce zhotovitele:



Stanovisko TDI:

Datum: 29.5.23

Podpis TDI:



Stanovisko projektanta stavby:

Datum: 29.5.23

Podpis projektanta stavby:



Seznam příložených dokladů:


1. Příloha č. 1a, Příloha č. 1b – rozpočet ZL 46

Oznámení o změnách akce č. 47

Identifikační údaje akce	
Název	FN Ostrava – Klínika popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie – JIP
SOD ev. č. 001/OVZ/22/10/OD	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	HOCHTIEF CZ a. s.
Adresa	Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
Oznámení vystavil:	
Lukáš Jambor	
Navrhované změny akce	
Změny požárních ucpávek.	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
Tento změnový list řeší skutečné provedení a rozsah požárních ucpávek oproti zadávací projektové dokumentaci. Změny se týkají této části: D.1.01.1a-j.	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
-390 407,45 Kč	201 723,36 Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	
	-188 684,09 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	-39 623,66 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	-228 307,75 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	

Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava


Datum: 29.5.23

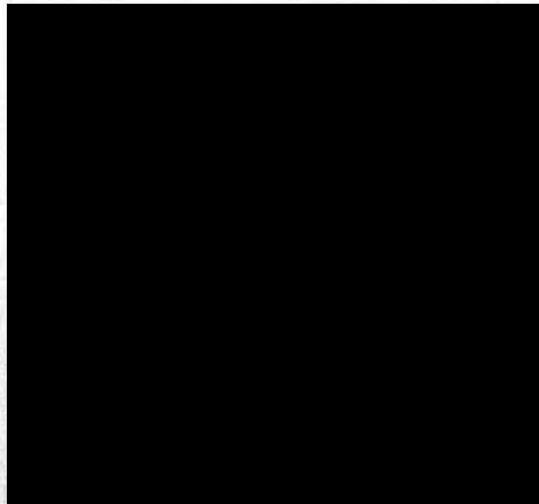

Ing. Marek Veselý
náměstek ředitele pro techniku a provoz

Datum: 29.5.23

Podpis zmocněnce zhotovitele:



Stanovisko TDI:

Datum: 29.5.23

Podpis TDI:



Stanovisko projektanta stavby:

Datum: 29.5.23

Podpis projektanta stavby:



Seznam příložených dokladů:

1. Příloha č. 1, 1a – j rozpočet ZL 47

Zakázka

FN OSTRAVA - KLINIKA POPÁLENINOVÉ
MEDICÍNY A REKONSTRUKČNÍ CHIRURGIE - JIP

Stupeň

DPS

Potrubní pošta

Kapitola

Soupis prací

Datum

Zhotovitel

11-2020

Číslo

PROFITERM PROCZECH s.r.o.

D.1.01.4i-S

Číslo položky	Položka	Množství	Jednotky	Cena za jednotku	Cena celkem
POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ					
22	Protipožární ucpávka - certifikovaná, min. EI 90 DP1	-2	ks	2 783,0 Kč	-5 566,0 Kč
23	Protipožární zajištění prostupu potrubí ze strany ucpávky (protipožární tmel, vata, ID štítek)	-2	ks	537,0 Kč	-1 074,0 Kč
24	Protipožární zajištění prostupů kabelů ze strany ucpávky (protipožární tmel, vata, ID štítek)	-2	ks	383,0 Kč	-766,0 Kč
25	Dokumentace protipožárních prostupů (soupis, označení, fotodokumentace)	-1	kpl	857,0 Kč	-857,0 Kč
26	Montážní a instalační materiál pro kotvení protipožárního systému	-2	ks	281,0 Kč	-562,0 Kč

Cena celkem v Kč bez DPH bez stavební připravenosti**-8 825 Kč**

Celková cena díla zahrnuje montáž a dopravu na místo instalace (ev. vč. potřebných manipulačních prostředků, přípravků nebo pomocných lešení). Součástí dodávky je provedení zkoušek, revizí, komplexní uvedení do provozu, průvodní technické dokumentace jednotlivých zařízení, návody k obsluze, individuální a komplexní vyzkoušení. Úprava potrubní pošty navazuje na stávající provozovaný systém potrubní pošty FN Ostrava, součástí dodávky je tedy kompletní zaintegrovaní do tohoto stávajícího systému jako celku a oživení systému tak, aby bylo možné využívat vše jako jeden systém se všemi již dodanými/zprovozněnými funkcemi a vybavením. V celkové ceně musí být zahrnut veškerý související potřebný materiál tak, aby každé zařízení (nebo komplex souvisejících zařízení) bylo funkční dle požadavků popsanych v technické zprávě, i když u daného dodavatele je potřebné dodání dalších, v Soupisu prací neuvedených, komponentů. Související stavební přípomoce nejsou součástí dodávky technologie PP, jsou zpracovány v samostatných částech projektové dokumentace. Součástí dodávky je finální povrchová úprava všech prvků a dodání atestů, certifikátů, osvědčení dle legislativy platné v době uvádění díla do provozu.

Podrobný popis jednotlivých komponentů a požadavky na jejich funkčnost jsou uvedeny v Technické zprávě projektové dokumentace. Nedílnou doplňující součástí Soupisu prací je Technická zpráva a Výkresová část technologie potrubní pošty.

Oznámení o změnách akce č. 48

Identifikační údaje akce

Název FN Ostrava – Klinika popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie – JIP
SOD ev. č. 001/OVZ/22/10/OD

Objednatel:

Název Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba

Zhotovitel

Název HOCHTIEF CZ a. s.
Adresa Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

Oznámení vystavil:

Lukáš Jambor

Navrhované změny akce

Drobné práce na SDK, předstěny, opláštění, zapravování.

Zdůvodnění navrhovaných změn

Jedná se o drobné práce na SDK (předstěny, opláštění, zapravování po montážích atd.), které vyplynuly ze skutečných tras a provedení rozvodů jednotlivých technologií. Změny se týkají této části: D.1.01.1 arch-stav části.

Cena méněprací bez DPH:

0,- Kč

Cena víceprací bez DPH:

53 190,10 Kč

Výsledná cena změn bez DPH:

53 190,10 Kč

Výsledná celková cena změny DPH

11 169,92 Kč

Výsledná celková cena změny vč. DPH

64 360,02 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum: 29.5.23



Ing. Marek Veselý /
náměstek ředitele pro techniku a provoz

Datum: 29.5.23

Podpis zmocněnce zhotovitele:



Stanovisko TDI:

Datum: 29.5.23

Podpis TDI:



Stanovisko projektanta stavby:

Datum: 29.5.23

Podpis projektanta stavby:



Seznam příložených dokladů:


1. Příloha č. 1 – rozpočet ZL 48

Oznámení o změnách akce č. 49

Identifikační údaje akce	
Název	FN Ostrava – Klinika popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie – JIP
SOD ev. č. 001/OVZ/22/10/OD	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	HOCHTIEF CZ a. s.
Adresa	Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
Oznámení vystavil:	
Lukáš Jambor	
Navrhované změny akce	
Provedení provizorní příčky v m. č. B0153.	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
S ohledem na koordinaci se současně probíhající stavbou „Lůžkového bloku“ je nutno provést provizorní oddělení prostor pomocí požární příčky a dveří v m. č. B0153. Změny se týkají této části: D.1.01.1 ARCH-STAV.	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0 Kč	31 308,50 Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	
	31 308,50 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	6 574,79 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	37 883,29 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	

Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum: 29.5.23

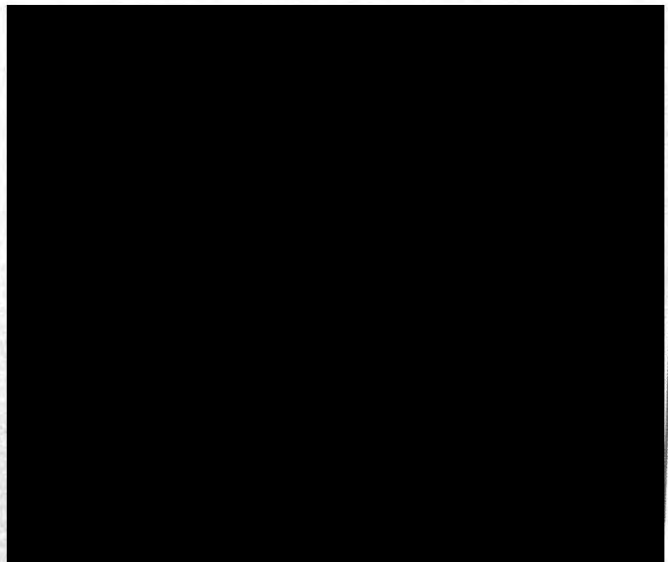

Ing. Marek Veselý
náměstek ředitele pro techniku a provoz

Datum: 29.5.23

Podpis zmocněnce zhotovitele:



Stanovisko TDI:

Datum: 29.5.23

Podpis TDI:



Stanovisko projektanta stavby:

Datum: 29.5.23

Podpis projektanta stavby:



Seznam příložených dokladů:

1. Příloha č. 1 – rozpočet ZL 49

Oznámení o změnách akce č. 50

Identifikační údaje akce

Název: FN Ostrava – Klinika popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie – JIP

SOD ev. č. 001/OVZ/22/100D

Objednatel:

Název: Fakultní nemocnice Ostrava

Adresa: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba

Zhotovitel

Název: HOCHTIEF CZ a. s.

Adresa: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

Oznámení vystavil:

Lukáš Jambor

Navrhované změny akce

Drobné elektro - přesuny přístrojů, zásuvek, doplnění rozvaděče EGB8

Zdůvodnění navrhovaných změn

V průběhu montáže interiérového vybavení došlo k upřesnění požadavku objednatele a uživatele na umístění vývodu silnoproudu a slaboproudu s ohledem na plánovaný provoz. Došlo tedy k drobným přesunům přístrojů, zásuvek, doplnění rozvaděče EGB8. Změny se týkají se této části: D.1.01.4c EL.

Cena méněprací bez DPH:

0,00 Kč

Cena víceprací bez DPH:

14 786,48 Kč

Výsledná cena změn bez DPH:

14 786,48 Kč

Výsledná celková cena změny DPH

3 105,16 Kč

Výsledná celková cena změny vč. DPH


17 891,64 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum: 29.5.23

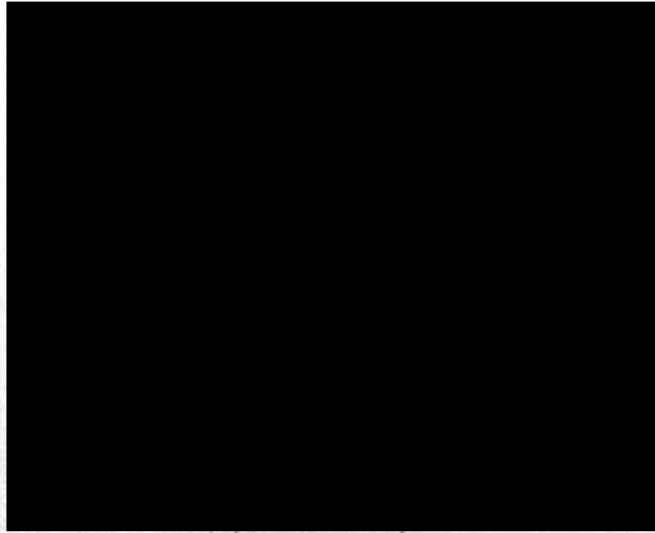

Ing. Marek Veselý
náměstek ředitele pro techniku a provoz

Datum: 29.5.23

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Ing. Petr Slezáček

Stanovisko TDI:

Datum: 29.5.23

Podpis TDI:




Ing. Pavel Hynčica
ATS International Projects s.r.o.

Stanovisko projektanta stavby:

Datum: 29.5.23

Podpis projektanta stavby:



Seznam příložených dokladů:

1. Příloha č. 1 - rozpočet ZL 50

Oznámení o změnách akce č. 51

Identifikační údaje akce	
Název	FN Ostrava – Klinika popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie – JIP
SOD ev. č. 001/OVZ/22/10/OD	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	HOCHTIEF CZ a. s.
Adresa	Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
Oznámení vystavil:	
Lukáš Jambor	
Navrhované změny akce	
Drobné práce na ZTI a ÚT (2. sada)	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
<p>S ohledem na kolizi interiérového vybavení (stolů) s radiátory, je nutno upravit výšku radiátorů v m. č. A0112, v m. č. B0121 a B0122. Dále došlo na základě samostatné dodávky zajišťované objednatelem (mycí panel s WC pro TP) k upřesnění požadavků na vývody a tyto je nutno upravit. V místnosti A0147 je na základě požadavku objednatele a uživatele nutno doplnit vývody pro napojení varny teplých nápojů, se kterým zadávací PD neuvažovala. Změny se týkají této části: D.1.01.4a ZTI a D.1.01.4b ÚT.</p>	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,- Kč	30 476,31 Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	
	30 476,31 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	6 400,03 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	36 876,34 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>	

Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum: 29.5.25



Ing. Marek Veselý
náměstek ředitele pro techniku a provoz

Datum: 29.5.25


Podpis zmocněnce zhotovitele:



Stanovisko TDI:

Datum: 29.5.25


Podpis TDI:



Stanovisko projektanta stavby:

Datum: 29.5.25

Podpis projektanta stavby:



Seznam příložených dokladů:


1. Příloha č. 1, 2, 3 – rozpočet ZL 51

Oznámení o změnách akce č. 52

Identifikační údaje akce	
Název	FN Ostrava – Klinika popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie – JIP
SOD ev. č. 001/OVZ/22/10/OD	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	HOCHTIEF CZ a. s.
Adresa	Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
Oznámení vystavil:	
Lukáš Jambor	
Navrhované změny akce	
Drobné práce na SDK.	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
ZL řeší drobné dodatečně požadované práce na SDK - kastlík kolem VZT klapek vstupních dveří, oprava SDK + obkladu po vytvoření přívodu vody pro varnu teplých nápojů v m. č. A0147. Změny se týkají této části: D.1.01.1 arch-stav části.	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
-5 015,00 Kč	10 893,05 Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	5 878,05 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	1 234,39 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	7 112,44 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	

Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava


Datum: 29.5.23

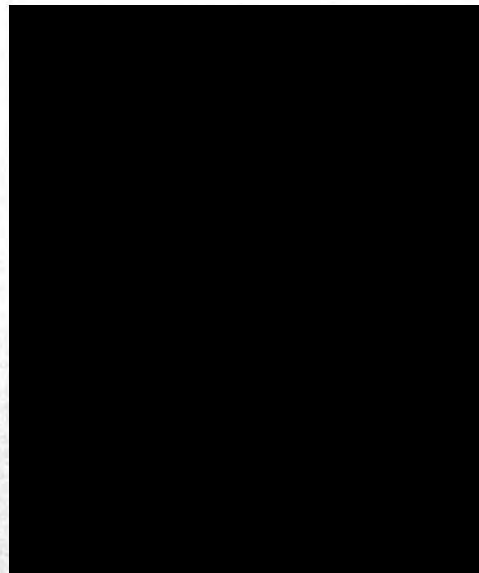

Ing. Marek Veselý
náměstek ředitele pro techniku a provoz

Datum: 29.5.23


Podpis zmocněnce zhotovitele:



Stanovisko TDI:

Datum: 29.5.23

Podpis TDI:



ATS International Projects s.r.o.

Stanovisko projektanta stavby:

Datum: 29.5.23

Podpis projektanta stavby:



Seznam příložených dokladů:

1. Příloha č. 1 – rozpočet ZL 52
