

ZMĚNOVÝ LIST: Expanzní nádoba a filtry		Číslo ZL: ZL14
Název akce:	„Výjezdová základna ZZS JMK v Mikulově“	
Objednatel:	Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82, Brno	
Zhotovitel:	ESOX, spol. s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Zástupce GD	
Datum:	24.4.2023	

Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou Dodatku smlouvy o dílo, který podléhá schválení volenými orgány jihomoravského kraje. Zhotovitel tyto práce provedl v souladu s ustanovením smlouvy

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

V PD nebyla řešena nutná dodávka odkalovacích elektronických filtrů a 50 l expanzní nádoby.

Nové řešení:

Dodávka byla o tyto chybějící komponenty doplněna.

Zdůvodnění změny:

Dodávka byla o tyto chybějící komponenty doplněna z důvodu zajištění správné funkcionality systému rozvodu užitkové vody.

Vazba na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

- Odstavec 5 ustanovení § 222
- Jedná se o změnu vyvolanou technickými důvody a změnami nutnými ke zdárnému dokončení díla.

Výsledná cena změny bez DPH:	Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:
81 813,04,-	<u>NE</u>
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Vyjádření zhotovitele:	Vyjádření technického dozoru investora (TDI):
Souhlasím: Bc. Tomáš Sedláček Datum: 24.4.2023 [redacted] (jméno, příjmení, podpis)	Souhlasím: Ing. Libor Studený Datum: 24.4.2023 [redacted] (jméno, příjmení, podpis)
Vyjádření projektanta:	Vyjádření objednatele:
Souhlasím: Ing. Rastislav Tesařík Datum: 24.4.2023 [redacted] (jméno, příjmení, podpis)	Souhlasím: Ing. Roman Hamerský (krajský úřad Jihomoravského kraje) Datum: 24.4.2023 [redacted] (jméno, příjmení, podpis)
Přílohy:	
1. Rozpočet Změnového listu	

Položka č	Název	Jednotka	Množství		JC D+M Kč/mj	CELKEM Kč	Poznámka	
			VV	Skutečnost				
1	2	3	4	5	6	7	11	12
	ZL 14 Chybějící bečka (vodárna)							
	ZL 14 Celkem					81 813,04 Kč		
1	Vodárna 50l	ks	0,00	1,00	13 614,00 Kč	13 614,00 Kč		
2	Dvoucestný KK DN 25	ks	0,00	1,00	3 673,60 Kč	3 673,60 Kč		
3	Servopohon DN 25	ks	0,00	1,00	11 481,60 Kč	11 481,60 Kč		
4	Jemný potrubní filtr "1" se zpětným proplachem	ks	0,00	1,00	21 034,24 Kč	21 034,24 Kč		
5	Elektronická programovatelná automatika pro odkakování filtrů	ks	0,00	1,00	14 791,68 Kč	14 791,68 Kč		
6	Plovákový spínač 3m	ks	0,00	3,00	538,88 Kč	1 616,64 Kč		
7	Plastová nádrž	ks	0,00	1,00	9 601,28 Kč	9 601,28 Kč		
8	Elektromotázni práce	hod	0,00	8,00	750,00 Kč	6 000,00 Kč		

VYJÁDŘENÍ AD

SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME

DŮVOD ZAMÍTNUTÍ

DATUM 24.4.2023

PODPIS

VYJÁDŘENÍ TDS

SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME

DŮVOD ZAMÍTNUTÍ

DATUM 24.4.2023

PODPIS

VYJÁDŘENÍ IR

SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME

DŮVOD ZAMÍTNUTÍ

DATUM 27/4/2023

PODPIS

ZMĚNOVÝ LIST: Poštovní schránka, vlajkový stožár, myčka		Číslo ZL: ZL15
Název akce:	„Výjezdová základna ZZS JMK v Mikulově“	
Objednatel:	Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82, Brno	
Zhotovitel:	ESOX, spol. s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Zástupce GD	
Datum:	24.4.2023	

Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou Dodatku smlouvy o dílo, který podléhá schválení volenými orgány jihomoravského kraje. Zhotovitel tyto práce provedl v souladu s ustanovením smlouvy

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Dle PD měl být dodán vlajkový stožár a vestavěná nerezová schránka u výstupních dveří. Dále nebyla řešena v PD myčka nádobí v kuchyňce.

Nové řešení:





Nebude dodán vlajkový stožár. Nerezový fasádní panel se schránkou bude nahrazen přisazenou schránkou u vstupu na vnějším oplocení. Bude dodána vestavěná myčka nádobí.

Zdůvodnění změny:

Na základě požadavku budoucího provozovatele ZZS JMK nebude dodán nerezový fasádní panel a bude schránka osazena na oplocení z důvodu lepší dostupnosti poštovních služeb. Nebude dodán vlajkový stožár pro nepotřebnost. Do kuchyňské linky bude dodána vestavěná myčka nádobí z důvodu zvýšení standartu vybavení.

Vazba na zákon č. 134/2016 Zákon o zadávání veřejných zakázek

- Odstavec 4, § 222
- Jedná se o změnu vyvolanou budoucím uživatelem ZZS JMK.

Výsledná cena změny bez DPH:	Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:
-76 990,00,-	<u>NE</u>
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Vyjádření zhotovitele:	Vyjádření technického dozoru investora (TDI):
Souhlasím: Bc. Tomáš Sedláček Datum: 24. 4. 2023  (jméno, příjmení, podpis)	Souhlasím: Ing. Libor Studený Datum: 24. 4. 2023  (jméno, příjmení, podpis)
Vyjádření projektanta:	Vyjádření objednatele:
Souhlasím: Ing. Rastislav Tesařík Datum: 24. 4. 2023  (jméno, příjmení, podpis)	Souhlasím: Ing. Roman Hamerský (krajský úřad Jihomoravského kraje) Datum: 24. 4. 2023  (jméno, příjmení, podpis)

Souhlasím: Ing. Milan Klusák, MBA
(ZZS JmK)

Datum: 14. 4. 2021

...

(jméno, příjmení, podpis)

Přílohy:

1. Rozpočet Změnového listu

Položka č	Název	Jednotka	Množství		Jc D+M Kč/mj	CELKEM Kč	Poznámka	
			VV	Skutečnost				
1	2	3	4	5	6	7	11	12
	ZL 15 Poštovní schránka, vlnkový stožár, myčka							
	ZL 15 Celkem						-76 990,00 Kč	
364	ZNS D+M VENKOVNÍ VLAJKOVÝ STOŽÁR, díle PD, NEREZOVÝ S TELESKOPICKÝM RAMENEM PRŮMĚR STOŽÁRU 102mm, CELKOVÁ VÝŠKA STOŽÁRU 6m	ks	3,00	0,00	16 110,00 Kč	-48 390,00 Kč	dle SdD	
363	ZVSP D+M VSTUPNÍ STĚNOVÝ PANEĽ U HLAVNÍCH VSTUPNÍCH DVEŘÍCH, díle PD, HLINIKOVÝ PANEĽ S PUR ÚPRAVOU 550xT1,240x2750, POŠTOVNÍ SCHRÁNKA ROZMĚR: 500x600x100mm	ks	1,00	0,00	49 000,00 Kč	-49 000,00 Kč	dle SdD	
01	D+M Nerezová poštovní schránka	ks	0,00	1,00	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč		
02	D+M Myčka Elektrolux KESCG9200L PerfectFit	ks	0,00	1,00	17 840,00 Kč	17 840,00 Kč		

VYJÁDŘENÍ AD SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME

DŮVOD ZAMÍTNUTÍ

PODPIS

VYJÁDŘENÍ TDS

SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME

DŮVOD ZAMÍTNUTÍ

PODPIS

DATUM 24.4.2023

VYJÁDŘENÍ IR

SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME

DŮVOD ZAMÍTNUTÍ

PODPIS

DATUM 24.4.2023



ZMĚNOVÝ LIST: Zúžení dodávky BMS		Číslo ZL: ZL16
Název akce:	„Výjezdová základna ZZS JMK v Mikulově“	
Objednatel:	Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82, Brno	
Zhotovitel:	ESOX, spol. s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Zástupce GD	
Datum:	10. 05. 2023	

Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou Dodatku smlouvy o dílo, který podléhá schválení volenými orgány jihomoravského kraje. Zhotovitel tyto práce provedl v souladu s ustanovením smlouvy

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Původní řešení obsahovalo výrobky v částech BMS, slaboproudu SK+TV, slaboproudu MR a slaboproudu SJČ dle zpracované PD.

Nové řešení:





Odstranění vybraných výrobků, které nejsou předmětem dodání díla.

Zdůvodnění změny:

Vybrané prvky byly odstraněny z důvodu jejich nadbytečnosti pro realizaci předmětu plnění.

Vazba na zákon č. 134/2016 Zákon o zadávání veřejných zakázek


- Odstavec 4, § 222
- Jedná se o změnu vyvolanou budoucím uživatelem ZZS JMK.

Výsledná cena změny bez DPH:	Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:
- 170 803,20,-	<u>NE</u>
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Vyjádření zhotovitele:	Vyjádření technického dozoru investora (TDI):
Souhlasím: Bc. Tomáš Sedláček Datum: 10. 5. 2023  (jméno, příjmení, podpis)	Souhlasím: Ing. Libor Studený Datum: 10. 5. 2023  (jméno, příjmení, podpis)
Vyjádření projektanta:	Vyjádření objednatele:
Souhlasím: Ing. Rastislav Tesařík Datum: 10. 5. 2023  (jméno, příjmení, podpis)	Souhlasím: Ing. Roman Hamerský (krajský úřad Jihomoravského kraje) Datum: 10. 5. 2023  (jméno, příjmení, podpis)

Souhlasím: Ing. Milan Klusák, MBA

(ZZS Jmk)

Datum: 10. 5. 2021



.....

(jméno, příjmení, podpis)

Přílohy:

1. Rozpočet Změnového listu

Položka č	Název	Jednotka	Množství		Jc	CELKEM	Poznámka	
			VV	Skutečnost				D+M Kč/mj
1	2	3	4	5	6	7	11	12
	ZL 16 Zúžení dodávky BMS							
	ZL 16 Celkem						-170 803,20 Kč	
R: 1	D 1.4.4.2	BMS - Monitorovací systém server + dispečink						
2	Pol_2	Rozšíření databáze o 250 datových bodů	ks	2,00	0,00	39 000,00 Kč	-70 000,00 Kč die SoD	
3	Pol_3	BMS - Base Documentation Set	ks	1,00	0,00	7 300,00 Kč	-7 300,00 Kč die SoD	
4	Pol_4	BMS instalační médium	ks	1,00	0,00	6 000,00 Kč	-6 000,00 Kč die SoD	
6	OS.KANC.	Balík kancelářského sw pro server - Office	ks	1,00	0,00	13 900,00 Kč	-13 900,00 Kč die SoD	
R: 2	D 1.4.7.6	SJC						
2	875912T10	Hlavní hodiny pro prostředí počítačových sítí do 1	kus	1,00	0,00	42 329,70 Kč	-42 329,70 Kč die SoD	
3	M_100355T	Přijímač satelitního signálu GPS včetně antény	kus	1,00	0,00	14 389,90 Kč	-14 389,90 Kč die SoD	
R: 3	D_1.4.7.1	SK+TV						
35	222490001R00	Stolní telefon, připojení do zásuvky, vyzkoušení - montáž	kus	5,00	0,00	165,10 Kč	-825,50 Kč die SoD	
91	46636,01	Stolní telefonní přístroj kompatibilní s Pbu v ZZS, podružný, včetně licence ke sítav.Pbu v ZZS	ks	4,00	0,00	2 733,90 Kč	-10 935,60 Kč die SoD	
92	46636,02	Stolní telefonní přístroj kompatibilní s Pbu v ZZS, systémový, včetně licence ke sítav.Pbu v ZZS	ks	1,00	0,00	5 122,50 Kč	-5 122,50 Kč die SoD	

VYJADŘENÍ AD

DŮVOD ZAMÍTNUTÍ

24.4.2023

PODPIS

SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME

DŮVOD ZAMÍTNUTÍ

24.4.2023


PODPIS

SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME

DŮVOD ZAMÍTNUTÍ

24.4.2023

PODPIS

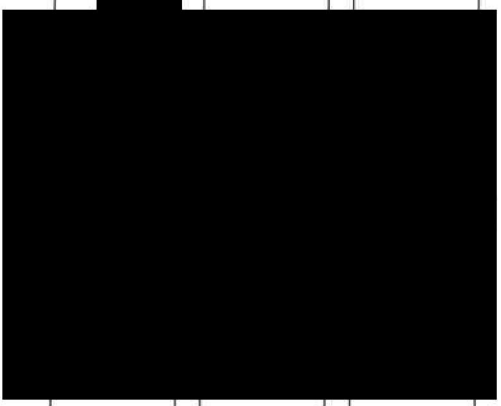

ZMĚNOVÝ LIST: Epoxidová spárovací hmota do myčky		Číslo ZL: ZL17
Název akce:	„Výjezdová základna ZZS JMK v Mikulově“	
Objednatel:	Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82, Brno	
Zhotovitel:	ESOX, spol. s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Zástupce GD	
Datum:	10. 05. 2023	

Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou Dodatku smlouvy o dílo, který podléhá schválení volenými orgány jihomoravského kraje. Zhotovitel tyto práce provedl v souladu s ustanovením smlouvy

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Dle PD je použita cementová spárovací hmota v mycím boxu.

Nové řešení:





Epoxidová spárovací hmota v mycím boxu.

Zdůvodnění změny:

Na základě požadavku budoucího provozovatele ZZS JMK byla nahrazena cementová spárovací hmota za epoxidovou. Bude také zvýšena udržitelnost a nezbytné hygienické parametry mycího boxu v provozních podmínkách.

Vazba na zákon č. 134/2016 Zákon o zadávání veřejných zakázek

- Odstavec 4, § 222
- Jedná se o změnu vyvolanou budoucím uživatelem ZZS JMK, který ji požaduje nad rámec původního řešení dle PD.

Výsledná cena změny bez DPH:	Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:
91 175,00,-	<u>NE</u>
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Vyjádření zhotovitele:	Vyjádření technického dozoru investora (TDI):
Souhlasím: Bc. Tomáš Sedláček Datum: 10. 5. 2023  (jméno, příjmení, podpis)	Souhlasím: Ing. Libor Studený Datum: 10. 5. 2023  (jméno, příjmení, podpis)
Vyjádření projektanta:	Vyjádření objednatele:
Souhlasím: Ing. Rastislav Tesařík Datum: 10. 5. 2023  (jméno, příjmení, podpis)	Souhlasím: Ing. Roman Hamerský (krajský úřad Jihomoravského kraje) Datum: 10. 5. 2023  (jméno, příjmení, podpis)

Souhlasím: Ing. Milan Klusák, MBA
(ZZS JmK)

Datum: 10.5.2021

...

(jméno, příjmení, podpis)

Přílohy:

1. Rozpočet Změnového listu

Položka č	Název	Jednotka	Množství		JC D+M Kč/mj	CELKEM Kč	Poznámka	
			VV	Skutečnost				
1	2	3	4	5	6	7	11	12
	ZL 17 Epoxidová spárovací hmota do myčky							
	ZL 17 Celkem						91 175,00 Kč	
01	771589794.R Příplatek za spárování epoxidovou pryskyřicí	m2	0,00		175,00	521,00 Kč	91 175,00 Kč	RTS23/

VYJÁDŘENÍ AD

SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME →

DŮVOD ZAMÍTNUTÍ

DATUM 24.4.2023

PODPIS

VYJÁDŘENÍ TDS

SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME

DŮVOD ZAMÍTNUTÍ

DATUM 24.4.2023

PODPIS

VYJÁDŘENÍ IR

SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME

DŮVOD ZAMÍTNUTÍ

DATUM 24/4 2023

PODPIS



ZMĚNOVÝ LIST: Odsávání botníku		Číslo ZL: ZL18
Název akce:	„Výjezdová základna ZZS JMK v Mikulově“	
Objednatel:	Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82, Brno	
Zhotovitel:	ESOX, spol. s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Zástupce GD	
Datum:	10. 05. 2023	

Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou Dodatku smlouvy o dílo, který podléhá schválení volenými orgány jihomoravského kraje. Zhotovitel tyto práce provedl v souladu s ustanovením smlouvy

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

V PD nebyl řešen VZT odvětrání botníku.

Nové řešení:

Na stávající VZT potrubí se připojí kruhovým potrubím nucené odvětrání botníku.

Zdůvodnění změny:

Na základě požadavku budoucího provozovatele ZZS JMK bylo doplněné VZT nucené odsávání botníku z důvodu zvýšení hygienického standartu místnosti.

Vazba na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

- Odstavec 4 ustanovení § 222
- Jedná se o změnu vyvolanou budoucím uživatelem ZZS JMK, který ji požaduje nad rámec původního řešení dle PD.

Výsledná cena změny bez DPH:	Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:
7 852,00,-	<u>NE</u>
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Vyjádření zhotovitele:	Vyjádření technického dozoru investora (TDI):
Souhlasím: Bc. Tomáš Sedláček Datum: 10.5.2023 [redacted]	Souhlasím: Ing. Libor Studený Datum: 10.5.2023 [redacted]
(jméno, příjmení, podpis)	(jméno, příjmení, podpis)
Vyjádření projektanta:	Vyjádření objednatele:
Souhlasím: Ing. Rastislav Tesařík Datum: 10.5.2023 [redacted]	Souhlasím: Ing. Roman Hamerský (krajský úřad Jihomoravského kraje) Datum: 10.5.2023 [redacted]
(jméno, příjmení, podpis)	(jméno, příjmení, podpis)

Souhlasím: Ing. Milan Klusák, MBA
(ZZS JmK)

Datum: 14.4.2023

(jméno, příjmení, podpis)

Přílohy:

1. Rozpočet Změnového listu

Položka č	Název	Jednotka	Množství		JC D+M Kč/mj	CELKEM Kč	Poznámka
			VV	Skutečnost			
1		mj.	4	6	7	11	12
2	3		5				
ZL 18 Odsávání botníku							
ZL 18 Celkem							
33004	Kruhové potrubí skl. pozlínk; SPIRO100, vč. 35% tvarovek	bm	0,00	4,00	176,00 Kč	704,00 Kč	dle SoD
34003	Ohebná hlukové a tepelné izolovaná hadice, tl. izolace 25 mimo 102	bm	0,00	8,00	89,00 Kč	712,00 Kč	dle SoD
30606	Talířový ventil O100, vč. Zoláře, styřhranný, odvodní	ks	0,00	2,00	408,00 Kč	816,00 Kč	dle SoD
20302	Regulační klapka O100, ruční ovládání	ks	0,00	2,00	320,00 Kč	640,00 Kč	dle SoD
503	Montážní, spojovací a těsnící materiál (závitové tyče, matice, šrouby, objímky, ...)	kg	0,00	8,00	110,00 Kč	880,00 Kč	dle SoD
507	Kompletační a koordinační činnost Přesun limot	hod	0,00	6,00	350,00 Kč	2 100,00 Kč	dle SoD
		kpl	0,00	1,00	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	

VYJÁDŘENÍ AD SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME

DŮVOD ZAMÍTNUTÍ

DATUM 24.4.2023

PODPIS

VYJÁDŘENÍ TDS

SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME

DŮVOD ZAMÍTNUTÍ

DATUM 24.4.2023

PODPIS


VYJÁDŘENÍ IR

SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME

DŮVOD ZAMÍTNUTÍ

DATUM 24/4/2023

PODPIS

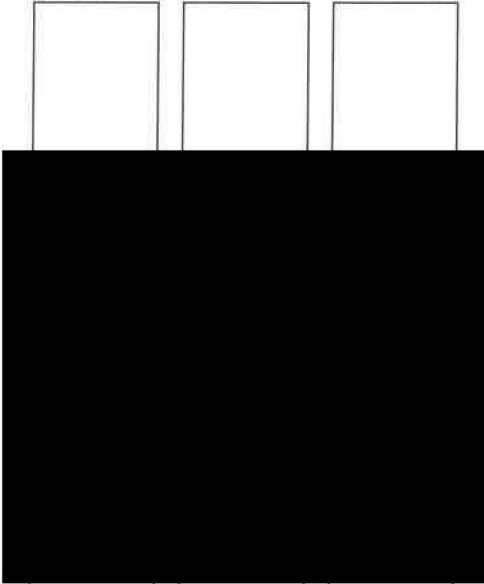

ZMĚNOVÝ LIST: Rozdělení výkonu FVE		Číslo ZL: ZL019
Název akce:	„Výjezdová základna ZZS JMK v Mikulově“	
Objednatel:	Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82, Brno	
Zhotovitel:	ESOX, spol. s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Zástupce GD	
Datum:	10.05.2023	

Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou Dodatku smlouvy o dílo, který podléhá schválení volenými orgány jihomoravského kraje. Zhotovitel tyto práce provedl v souladu s ustanovením smlouvy

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Projekt řeší energetický standart Pasiv s výkonem 13KWp FVE.

Nové řešení:

Dodatečná instalace technologie pro uložení přebytku výkonu 3KWp z FVE skládajícího se z doplnění ohřivače Tuv, řešení MaR, včetně doplnění silnoproudých a slaboproudých rozvodů.

Zdůvodnění změny:



Na základě požadavku investora na zvýšení energetického standartu objektu z Pasiv na Pasiv plus byl navýšen rezervovaný příkon z 13KW na 20KW distributor v současné chvíli je schopen v stávající síti rezervovat 17KW z důvodu dodržení energetického standartu Pasiv +, bylo instalováno zařízení pro ostrovního systému s vyvedením tohoto výkonu do nově instalované technologie předehevu Tuv.

Vazba na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

- **Odstavec 4 ustanovení § 222**
- Jedná se o změnu vyvolanou změnou projektu.

Zdůvodnění žádosti na změnu lhůty dokončení díla

Prodloužení lhůty pro dokončení díla o **33 kalendářních dní** je způsobeno dodatečnou instalací technologie předehevu TUV obsahující zásobník, který po průzkumu trhu, je možné dodat vlivem dlouhé dodací lhůty za 4 týdny (28 dní) od objednání. Tento požadavek vyvstal až v průběhu realizace a dodavatel neměl možnost tento zásobník TUV objednat s předstihem. Dále zhotovitel potřebuje k zprovoznění této technologie rezervovat kapacitu subdodavatele na zapojení silnoproudu a slaboproudu a MaR ve lhůtě 5 dnů. Tento proces má návaznost na závěrečné zprovoznění celého systému ohřevu TUV, který může být proveden až po instalaci této technologie. S ohledem na požadavek prodloužení termínů dokončení díla o 38 kalendářních dní ve změnovém listu označeném jako ZL20, není nutné dále zdůvodňovat předmětnou změnu lhůty dokončení díla.

Výsledná cena změny bez DPH:	Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:
149 957,50,-	<u>ANO – 33 kalendářních dnů</u>
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Vyjádření zhotovitele:	Vyjádření technického dozoru investora (TDI):
Souhlasím: Bc. Tomáš Sedláček Datum:  (jméno, příjmení, podpis)	Souhlasím: Ing. Libor Studený Datum:  (jméno, příjmení, podpis)
Vyjádření projektanta:	Vyjádření objednatele:

Souhlasím: Ing. Rastislav Tesařík
Datum:



.....
(jméno, příjmení, podpis)

Souhlasím: Ing. Roman Hamerský (krajský úřad
Jihomoravského kraje)

Datum:



.....
(jméno, příjmení, podpis)

Přílohy:

1. Rozpočet Změnového listu

ZMĚNOVÝ LIST: SBI, čtečka, CISCO		Číslo ZL: ZL20
Název akce:	„Výjezdová základna ZZS JMK v Mikulově“	
Objednatel:	Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82, Brno	
Zhotovitel:	ESOX, spol. s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Zástupce GD	
Datum:	10.05.2023	

Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou Dodatku smlouvy o dílo, který podléhá schválení volenými orgány jihomoravského kraje. Zhotovitel tyto práce provedl v souladu s ustanovením smlouvy

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Původní řešení projektu uvažovalo s koncovými prvky, které se již na trhu nejsou dostupné.

Nové řešení:

Záměna prvků switch, acces point a čteček na aktuální standart budoucího uživatele ZZS JMK a zároveň na aktuálně vyráběné výrobky.

Zdůvodnění změny:



Switeche, acces pointy a čtečky nově dodány ve standartu Cisco pro zajištění komunikace v síti uživatele a pro nahrazení zastaralých, již nevyráběných výrobků. Zároveň jsou přidány prvky pro zajištění síťové kompatibility a možnosti upgradu programu.




Vazba na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

- **Odstavec 5 ustanovení § 222**
- Jedná se o změnu vyvolanou technickými důvody a změnami nutnými ke zdárnému dokončení díla.

Zdůvodněné žádosti na změnu lhůty dokončení díla

Prodloužení lhůty pro dokončení díla **o 38 kalendářních dní** je způsobeno změnou prvků BMS slaboproudu. Původní prvky je třeba vyměnit za nové, které mají dlouhý termín dodání. Po průzkumu trhu lze tyto nové prvky dodat za 4 týdny (28 dní) od objednání. Tento požadavek vyvstal až v průběhu realizace a dodavatel neměl možnost objednat dané prvky s předstihem. Na vybrané prvky je nutné provést nahrání firmwaru pro osazení do systému SBI, které následně prodlužuje termín montáže a zprovoznění. Zhotoviteli se podařilo rezervovat kapacitu subdodavatele pro nahrání firmwaru, i tak ale bude trvat cca 8 dní, než budou práce provedeny. Instalační úpravu a následnou asistenci při oživení celého systému provádí pouze jeden dodavatel pro celou ČR. Zbývající dny do lhůty 38 kalendářních dní uvažujeme na dopravu prvků od výrobce k subdodavateli pro nahrání firmwaru a dále na místo osazení. Celý tento proces má návaznost na závěrečné oživení kompletního systému, který může být provedeno až po osazení všech prvků. Proto žádáme o prodloužení lhůty pro dokončení díla o 38 kalendářních dní.

Výsledná cena změny bez DPH:	Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:
366 337,70,-	<u>ANO - 38 kalendářních dnů</u>
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Vyjádření zhotovitele:	Vyjádření technického dozoru investora (TDI):
Souhlasím: Bc. Tomáš Sedláček Datum: 	Souhlasím: Ing. Libor Studený Datum: 

..... (jméno, příjmení, podpis) (jméno, příjmení, podpis)
Vyjádření projektanta:	Vyjádření objednatele:
Souhlasím: Ing. Rastislav Tesařík Datum:  (jméno, příjmení, podpis)	Souhlasím: Ing. Roman Hamerský (krajský úřad Jihomoravského kraje) Datum:  (jméno, příjmení, podpis)
Souhlasím: Ing. Milan Klusák, MBA (ZZS JmK) Datum:  (jméno, příjmení, podpis)	
Přílohy:	
1. Rozpočet Změnového listu	

ZMĚNOVÝ LIST: Výměna semaforů		Číslo ZL: ZL21
Název akce:	„Výjezdová základna ZZS JMK v Mikulově“	
Objednatel:	Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82, Brno	
Zhotovitel:	ESOX, spol. s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Zástupce GD	
Datum:	24.4.2023	

Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou Dodatku smlouvy o dílo, který podléhá schválení volenými orgány jihomoravského kraje. Zhotovitel tyto práce provedl v souladu s ustanovením smlouvy

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

V PD bylo řešeno použití stávajícího výstražného systému přesunutím.

Nové řešení:





Stávající signalizační světla budou nahrazena novými s vyšší intenzitou výstražného osvětlení. Semafor bude doplněn o dopravní značení pro zvýšení bezpečnosti.

Zdůvodnění změny:

Na základě upozornění HZS o nerespektování vystražných světel v průběhu stavající dopravy a následného požadavku budoucího provozovatele ZZS JMK bude vyměněna stávající semaforová světla za světla s vyšší svítivostí a doplněna o dopravní značení z důvodu zvýšení bezpečnosti dopravní situace během výjezdu IZS.

Vazba na zákon č. 134/2016 Zákon o zadávání veřejných zakázek

- Odstavec 4, § 222
- Jedná se o změnu vyvolanou budoucím uživatelem ZZS JMK.

Výsledná cena změny bez DPH:	Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:
110 337,50,-	<u>NE</u>
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Vyjádření zhotovitele:	Vyjádření technického dozoru investora (TDI):
Souhlasím: Bc. Tomáš Sedláček Datum: 24.4.2023 	Souhlasím: Ing. Libor Studený Datum: 24.4.2023 
(jméno, příjmení, podpis)	(jméno, příjmení, podpis)
Vyjádření projektanta:	Vyjádření objednatele:
Souhlasím: Ing. Rastislav Tesařík Datum: 24.4.2023 	Souhlasím: Ing. Roman Hamerský (krajský úřad Jihomoravského kraje) Datum: 24.4.2023 
(jméno, příjmení, podpis)	(jméno, příjmení, podpis)

Souhlasím: Ing. Milan Klusák, MBA
(ZZS JmK)

Datum: 24. 4. 2023



..
(jméno, příjmení, podpis)

Přílohy:

1. Rozpočet Změnového listu

Položka č	Název	Jednotka	Množství		JC D+M Kč/mj	CELKEM Kč	Poznámka
			4 mj.	5 VV			
1							
2							
	ZL 21 Výměna semaforů						
	ZL 21 Celkem					110 337,50 Kč	
1	Projekt vč. stanovení MUP	ks	0,00	1,00	6 875,00 Kč	6 875,00 Kč	
2	Navěstidlo, 2xčervená, LED 230V, s elektronikou blikáče 230 V AC	ks	0,00	1,00	42 687,50 Kč	42 687,50 Kč	
3	Navěstidlo, 2xčervená, LED 230V, bez elektroniky blikáče 230 V AC	ks	0,00	1,00	38 687,50 Kč	38 687,50 Kč	
4	Svislé dopravní značení - montážní souprava pro upevnění na výložník - montáž vč. zapojení	ks	0,00	1,00	7 337,50 Kč	7 337,50 Kč	
5	Kontrastní rám - IP22 ref. fólie št. RA2 1000x1500mm vč., uchycení handimex	ks	0,00	1,00	5 625,00 Kč	5 625,00 Kč	
6	Vodorovné dopravní značení: nápis "POZOR VÝJEZD HZS A ZZS"	ks	0,00	3,00	2 500,00 Kč	7 500,00 Kč	
7	doprava	ks	0,00	1,00	1 625,00 Kč	1 625,00 Kč	

VYJADŘENÍ AD

SOUHLASÍME / ~~NE~~SOUHLASÍME

DŮVOD ZAMÍTNUTÍ

DATUM

24.4.2023

PODPIS

VYJADŘENÍ TDS

SOUHLASÍME / ~~NE~~SOUHLASÍME

DŮVOD ZAMÍTNUTÍ

DATUM

24.4.2023

PODPIS

VYJADŘENÍ IR

SOUHLASÍME / ~~NE~~SOUHLASÍME

DŮVOD ZAMÍTNUTÍ

DATUM

24.4.2023

PODPIS

