

SMLOUVA O DÍLO - Dodatek č. 3

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj,

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice

č. účtu (podíl Jčk) 199783072/0300

č. účtu (dotace SFDI) 2006-3126231/0710

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:

JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH, tel. [REDACTED]

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna vystupovat a jednat:

Bc. Pavla Pulcová, investiční technik ODSH, tel. [REDACTED]

K výkonu stavebního a technického dozoru stavebníka pro investora stavby je oprávněna:

Spol. TES Consulting, s.r.o., IČ: 17059071

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

Ing. Martin Dostál, dopravní stavby

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: STRABAG a.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČO: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu. 1100029040/5500

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, ve vložce 7634

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. Pavel Klas, prokurista

tel. č. [REDACTED]

Ing. Lukáš Příbyl, prokurista

tel. č. [REDACTED]

Odpovědný geodet: Ing. Stanislav Bílek

tel. č. [REDACTED]

Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):

Ing. Martin Bartizal, tel. č. [REDACTED]


Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):

Petr Civiš, tel. č. [REDACTED]

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Petr Tolar, tel. č. [REDACTED]

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)



Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo na akci „Modernizace komunikací SFDI 2022 – okres Prachatice“ ze dne 5.8.2022 takto:

I. Úvod dodatku

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/331/22, č. zhotovitele 841/TD/TC/22/42 ze dne 5.8.2022 a ve znění dodatku č. 1 a č. 2 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení díla „Modernizace komunikací SFDI 2022 – okres Prachatice“. Důvodem změny je vznik víceprací a méněprací při realizaci prováděných na základě Smlouvy, předem odsouhlasené objednatelem, zhotovitelem, projektantem a technickým dozorem stavby, provedené na základě dohody obou smluvních stran, tak jak jsou zachyceny ve Změnovém listu č. 3.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 a č. 2, jak je uvedeno níže:

Původní znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1 ve znění dodatku č. 1 a č. 2:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

Název	Celkem bez DPH	DPH 21 %	Celkem včetně DPH
Modernizace silnice II/167 Svinná Lada – Borová Lada – Pravětínská Lada	15 998 579,29 Kč	3 359 701,65 Kč	19 358 280,94 Kč
Modernizace silnice II/170 Přečín – Vacov, Most ev. č. 170-016 - Zdíkovec	17 536 672,96 Kč	3 682 701,32 Kč	21 219 374,28 Kč
Modernizace silnice II/170 Čestice – Chvalšovice - Přečín	35 451 797,73 Kč	7 444 877,52 Kč	42 896 675,25 Kč
Celkem	68 987 049,98 Kč	14 487 280,50 Kč	83 474 330,48 Kč

Nové znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

Název	Celkem bez DPH	DPH 21 %	Celkem včetně DPH
Modernizace silnice II/167 Svinná Lada – Borová Lada – Pravětínská Lada	16 068 773,99 Kč	3 374 442,54 Kč	19 443 216,53 Kč
Modernizace silnice II/170 Přečín – Vacov, Most ev. č. 170-016 - Zdíkovec	17 536 672,96 Kč	3 682 701,32 Kč	21 219 374,28 Kč
Modernizace silnice II/170 Čestice – Chvalšovice - Přečín	35 451 797,73 Kč	7 444 877,52 Kč	42 896 675,25 Kč
Celkem	69 057 244,68 Kč	14 502 021,38 Kč	83 559 266,06 Kč

III. Závěrečná ustanovení dodatku

Dodatek č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/331/22, č. zhotovitele 841/TD/TC/22/42 ze dne 5.8.2022, jejíž ostatní ustanovení nedotčené dodatkem č. 3 zůstávají nadále v platnosti beze změn.

Tento dodatek č. 3 bude vyhotoven elektronicky, každý elektronicky podepsaný obraz smlouvy má platnost originálu.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 3, že s jeho obsahem souhlasí a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísni či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.


Tento dodatek nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 589/2023/RK-68 ze dne 25.5.2023.

Přílohou tohoto dodatku je Změnový list č.3.

V Českých Budějovicích dne

z a o b j e d n a t e l e :



.....
MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

V Českých Budějovicích dne

z a z h o t o v i t e l e :
STRABAG a.s.

Ing. Pavel
Klas

Podepsal Ing. Pavel Klas
DN: cn=Ing. Pavel Klas, c=CZ,
o=STRABAG a.s., ou=4,
email=pavel.klas@strabag.com
Datum: 2023.06.05 13:37:00
+02'00'



Ing. Lukáš Příbyl
05.06.2023

.....
Ing. Pavel Klas
prokurista

.....
Ing. Lukáš Příbyl
prokurista

Stavba: Modernizace komunikací SFDI 2022 – okres Prachatice

Úsek: Modernizace silnice II/167 Svinná Lada – Borová Lada – Pravětínská Lada, SO 102

č. smlouvy objednatele:

SOL/ODSH/331/22

č. smlouvy zhotovitele:

841/TD/TG/22/42

Investor (objednatel) stavby: Jihočeský kraj

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

TDS: TES Consulting s.r.o.

V Olšinách 2300/75, Strašnice, 100 00 Praha 10

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Nemanická 2133/10, 370 76 České Budějovice

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Předmět změny:

1) Bourání ŽB propustku - Na základě pochůzky za účasti TDS a správce komunikace (projektanta) po odfrézování asfaltové vrstvy bylo zjištěno, že ve staničení km 7,290 se pod konstrukcí nachází historický a dnes již nefunkční betonový propustek napříč komunikací. Tato konstrukce brání v provedení celoplošné recyklace a navíc je v tomto místě značně vychýlena niveleta vozovky. Konstrukce navíc evidentně není dostatečně unosná. Navrženo vybourání konstrukce a nahrazení vhodným materiálem do podkladních vrstev, vyrovnaní nivelety.

2) Silniční obrubník - U objektu Borová Lada č.p.8 (staničení km 7,150) zjištěno nevhodné odvodnění komunikace směrem do travnaté plochy navazující na objekt. Navrženo, 11m příkopového žlabu nahradit 28 m silničních obrubníků až za hranici objektu. Tím dojde k zamezení kontaktu povrchové vody s budovou a dojde k jejímu nasměrování k neblížeší uliční vpusť.

3) Hloubkové sanace - Oproti předpokladu ze zadání realizován menší rozsah hloubkových sanací. Množství poníženo na skutečnost. SO 102 - Modernizace silnice II/167 most - průtah Borová Lada 6,738 - 7,500 km

Dotčené místo:

Odkaz na výkresy:

Odkaz na soupis prací:

viz.příloha

Odkaz na jinou část smlouvy:

Návrh ocenění:

Vícepráce:

124 156,42

Méněpráce:

-53 961,72

Celkem bez DPH

70 194,70

DPH 21%

14 740,89

Celkem v

84 935,59

STRABAG

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744
(582)

Podpis navrhovatele:

Datum: 17.4.2023

Vyjádření:

TDS: Ing. Martin Dostál

datum:

Projektant: Ing. Jiří Růžicka

datum:

Investor: Jihočeský kraj - Bc. Pavla Pulcová

datum:

JIHOČESKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD

Odbor dopravy
a silničního hospodářství

U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice (25)

Přílohy:

položkový rozpočet

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

závod PRACHATICE

Žemovická 916, 383 11 Prachatice


IČO: 709 71 641 DIČ: CZ70971641 ①

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Modernizace komunikací SFDI 2022 – okres Prachatice						
Číslo a název objektu: SO 102 - Modernizace silnice II/167 most - průtah Borová Lada 6.738 - 7.500 km						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
3	17.04.2023	113321	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 1 KM	vícepráce	v niveletě uvažované recyklace vozovky zjištěn historický nefunkční železobetonový propustek	
Výkaz výměr - vrstva kameniva nad žb propustkem = délka*šířka*tloušťka = 5*8*0,2						
N	17.04.2023	966168	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20 KM	vícepráce	v niveletě uvažované recyklace vozovky zjištěn historický nefunkční železobetonový propustek	
Výkaz výměr - ŽB kce - 1) nosná část = 5*7,5*0,3 2) deska čelo 2x (s přesahem) = 5*0,5*0,25*2						
7	17.04.2023	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	vícepráce	v niveletě uvažované recyklace vozovky zjištěn historický nefunkční železobetonový propustek	
Výkaz výměr - nahrazení ŽB kce zásepovým materiálem se zhutnění - viz položka "Bourání konstrukcí ze železobetonu s odvozem do 20 km".						
N	17.04.2023	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU - ŽELEZOBETON	vícepráce	v niveletě uvažované recyklace vozovky zjištěn historický nefunkční železobetonový propustek	
Výkaz výměr - skládkovné ŽB - viz položka "Bourání konstrukcí ze železobetonu s odvozem do 20 km".						
N	17.04.2023	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150 MM	vícepráce	nedostatečné a nevhodné odvodnění komunikace okolo objektu Borová Lada č.p. 8	
Výkaz výměr - zaměření délky = 28 m						
22	17.04.2023	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 60MM DO BETONU TL 100 MM	méněpráce	nedostatečné a nevhodné odvodnění komunikace okolo objektu Borová Lada č.p. 8	
1	17.04.2023	113318	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY, ODVOZ DO 20 KM	méněpráce	menší rozsah hloubkových sanací	
3	17.04.2023	113321	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 1 KM	méněpráce	menší rozsah hloubkových sanací	
7	17.04.2023	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	méněpráce	menší rozsah hloubkových sanací	
23	17.04.2023	014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	méněpráce	menší rozsah hloubkových sanací	

* může být doloženo na samostatném listu

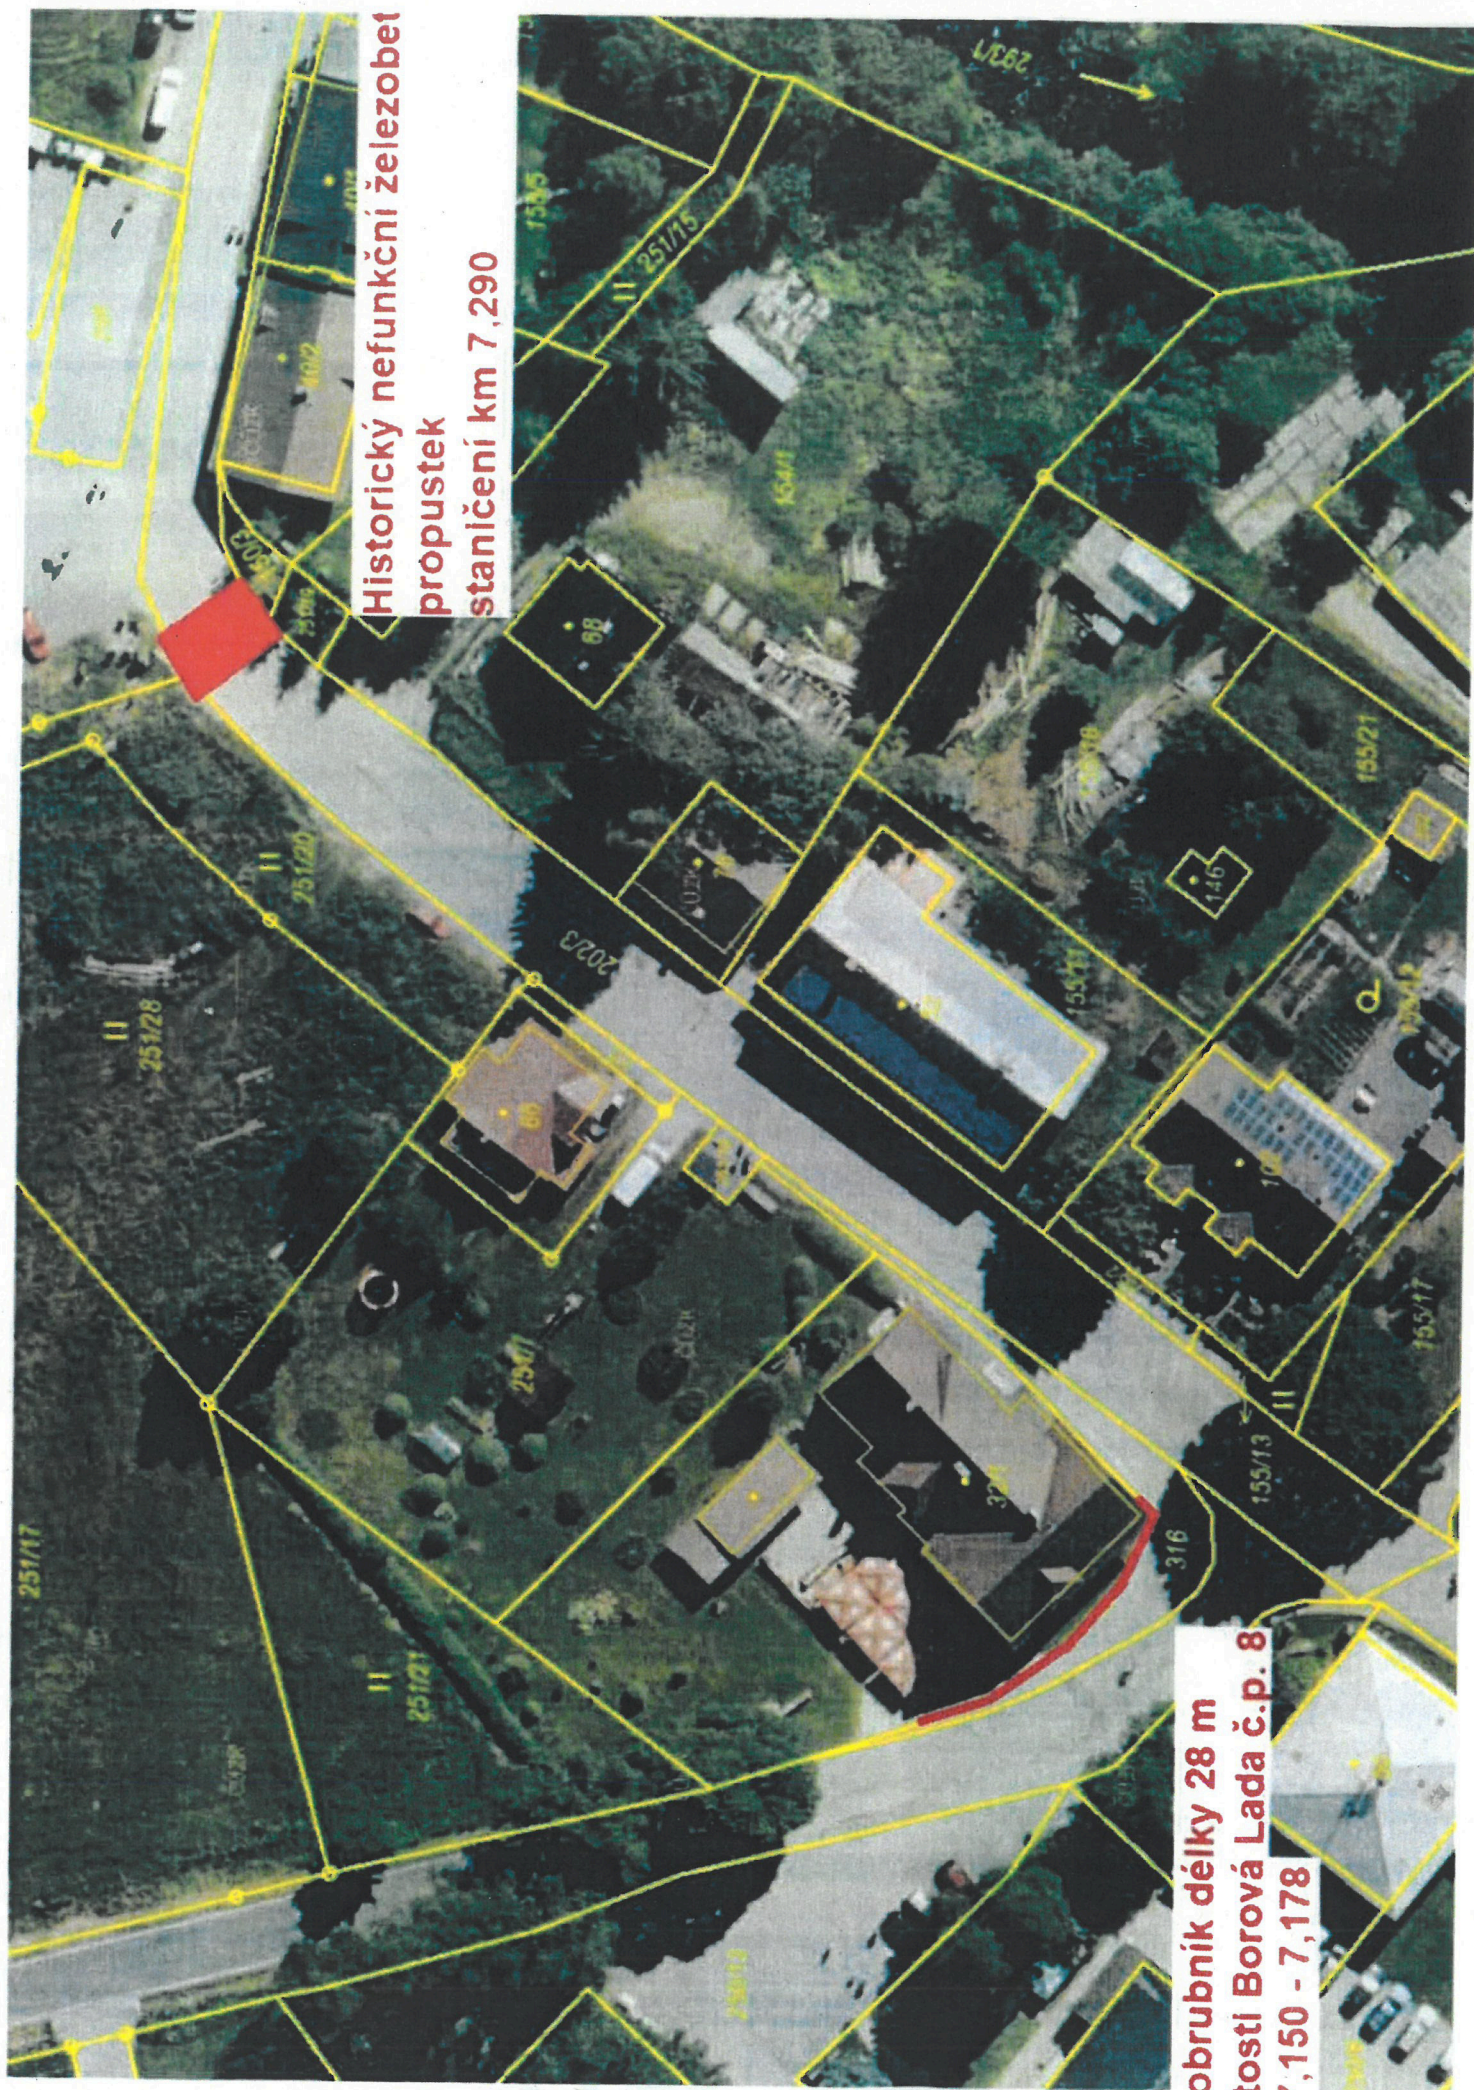

Historický nefunkční železobetonový propustek staničení km 7,290

obrubník délky 28 m
kostli Borová Lada č.p. 8
7,150 - 7,178



STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, Jinonice
158 00 Praha 5

STRABAG

Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2,
370 76 České Budějovice
p. Bc. Pavla Pulcová

V Českých Budějovicích dne 17.4.2023

Žádost o změnu

SóD č. SDL/ODSH/331/22 (objednatel) , 841/TD/TC/22/42 (zhotovitel)

Modernizace komunikace II/167 Svinná Lada – Borová Lada – Pravětínská Lada

Předmět změny a jeho zdůvodnění:

- 1) Bourání ŽB propustku - Na základě pochůzky za účasti TDS a správce komunikace (projektanta) po odfrézování asfaltové vrstvy bylo zjištěno, že ve staničení km 7,290 se pod konstrukcí nachází historický a dnes již nefunkční betonový propustek napříč komunikací. Tato konstrukce brání v provedení celoplošné recyklace a navíc je v tomto místě značně vychýlena niveleta vozovky. Konstrukce navíc evidentně není dostatečně unosná. Navrženo vybourání konstrukce a nahrazení vhodným materiálem do podkladních vrstev, vyrovnaní nivelety.
- 2) Silniční obrubník - U objektu Borová Lada č.p.8 (staničení km 7,150) zjištěno nevhodné odvodnění komunikace směrem do travnaté plochy navazující na objekt. Navrženo, 11m příkopového žlabu nahradit 28 m silničních obrubníků až za hranici objektu. Tím dojde k zamezení kontaktu povrchové vody s budovou a dojde k jejímu nasměrování k nebližší uliční vpusti.
- 3) Hloubkové sanace - Oproti předpokladu ze zadání realizován menší rozsah hloubkových sanací. Množství poníženo na skutečnost.

S navrženými změnami projektant i TDS souhlasí, viz vyjádření.
Fotodokumentace přílohou žádosti.

S pozdravem

Ing. Martin Bartizal, stavbyvedoucí

STRABAG a.s.

STRABAG

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
Č. 60838744
502)

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, Jinonice
158 00 Praha 5/Česká republika
www.strabag.cz

Tel. +420 222 868 111
Fax. +420 222 868 211
pr@strabag.com

IČO: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení: ČSOB, č.ú. 112071233/0300
BIC CODE: CEKOCZPP

STRABAG a.s., se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634



SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC Jihočeského kraje

PŘÍLOHA č. 2 - AD
př. 1. 1. 2023

příspěvková organizace
Nemanická 2133/10, PSČ 370 10 České Budějovice
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích
odd.Pr., vložka 173, datum zápisu dne 1.7.2002

Jihočeský kraj
Odbor dopravy a SH
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka
SUSJcK /2023

Vyřizuje / linka

v Prachaticích
26.4.2023

„Modernizace silnice II/167 SO 102 most-průtah Borová Lada 6,738-7,500 km“ -vyjádření projektanta a správce ke změnám stavebních prací.

Na základě zjištění neznámého trubního vedení pod silnicí II/167 v průtahu obce Borová Lada při provádění stavebních prací se uskutečnilo dne 18.4.2023 šetření na místě stavby za účasti zhotovitele a projektanta. Ve staničení 7,290 km byl zjištěn pod konstrukcí vozovky nefunkční železobetonový propustek. Dle sdělení místního pamětníka se jednalo o historickou výpust' od rybníčku, který se dříve nacházel v obci Borová Lada. Vzhledem k tomu, že nebyl patrný vtok ani výtok tohoto propustku, nebylo možné při projektování modernizace silnice tuto skutečnost zahrnout do stavebních prací. V místě propustku by nebylo možné provést recyklaci za studena a jeho odstraněním dojde k eliminaci původní výškové nerovnosti na vozovce.

Srážkové vody kolem domu č.p. 8 byly svedeny betonovými žlaby, které byly v projektové dokumentaci navrženy k výměně. Místo betonových žlabovek je vhodné kolem domu č.p. 8 umístit silniční obrubníky a srážkové vody tak nasměrovat až za roh domu k uliční vpusti.

Za projektanta a správce pozemní komunikace souhlasím s navrženým řešením zjištěných skutečností.

Ing. V. Růžička
ředitel závodu Prachatice

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

závod PRACHATICE

Žernovická 916, 383 11 Prachatice

IČO: 709 71 641 DIČ: CZ70971641 ①

telefon

Fax

E-mail

IČO

70971641

Bankovní spojení

Jihočeský kraj
 U Zimního stadionu 1952/2,
 370 10 České Budějovice
 K rukám Bc. Pavly Pulcové

Věc: Vyjádření TDS k vícepracem vzniklým na základě nepředpokládaných nálezů v podloží komunikace a optimalizace odtokových poměrů č.p.8 Borová Lada na stavební akci „Modernizace komunikací SFDI 2022 – okres Prachatice“:

Na st.části „SO 102 - Modernizace silnice II/167 most-průtah Borová Lada 6,738-7,500 km“.

Na základě pochůzky za účasti TDS a správce komunikace (projektanta) po odfrézování asfaltové vrstvy bylo zjištěno, že ve staničení km 7,290 se pod konstrukcí nachází historický a dnes již nefunkční betonový propustek napříč komunikací. Tato konstrukce brání v provedení celoplošné recyklace a navíc je v tomto místě značně vychýlena niveleta vozovky. Konstrukce navíc evidentně není dostatečně únosná. Vzhledem k nefunkčnosti kce bylo navrženo vybourání konstrukce a nahrazení vhodným materiálem do podkladních vrstev a zároveň bude provedeno vyrovnání nivelety vozovky.

U objektu Borová Lada č.p.8 (staničení km 7,150) bylo zjištěno nevhodné odvodnění komunikace směrem do travnaté plochy navazující na objekt. Z tohoto důvodu bylo navržena úprava odtokových poměrů. Původní návrh 11 m příkopového žlabu, který respektoval původní nevyhovující stav byl nahrazen 28 m silničních obrubníků až za hranici objektu. Tím dojde k zamezení kontaktu povrchové vody s budovou a dojde k jejímu nasměrování k nejbližší uliční vpusti.

Zhotovitel přikládá k ZBV srozumitelnou prostorovou situaci umístění stavebních úprav. V již zmíněném cenovém návrhu ZBV jsou použity v maximálním možném rozsahu stavební položky z daného stavebního objektu nebo z výskytu v SoD. Zbylé položky obsahují odkaz na tvorbu jednotkové ceny a odpovídají současným cenovým normativům. Součástí návrhu ZBV je též odečet neprováděných hloubkových sanací.

Zhotovitel nepředpokládá časové prodloužení realizace stavebního objektu a tudíž nevniknou související vícenáklady s úpravou DIO.

TDS překontroloval tyto podklady, zkontroloval výměry položky a odsouhlasil jejich množství. Doporučujeme tedy návrh tohoto ZBV ke schválení.


TES
 CONSULTING

TES consulting s.r.o.

Technický dozor stavebníka (TDS)
 Ing. Martin Dostál
 Tel: 775 89 44 50
martin.dostal@tes-consulting.cz

TES
 CONSULTING

TES Consulting s. r. o.
 V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10 – Strašnice
 tel./fax: +420 234 256 212
 e-mail: info@tes-consulting.cz

IČ: 17059071 DIČ: CZ17059071
 Obchodní rejstřík: Městský soud
 v Praze, oddíl C, vložka 365965
