

DODATEK Č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 23.03.2023 na realizaci veřejné zakázky
„Dobruška, ulice Javorová – I. etapa“

Objednatel: **Město Dobruška**
Sídlo: nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška
zastoupeno: Miroslav Sixta, starosta
IČ: 00274879
DIČ: CZ00274879
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
Číslo účtu: 1721571/0100
Telefon: 494 629 643

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- smluvních: Miroslav Sixta, starosta
- technických: Miloš Votroubek, DiS., referent odboru rozvoje města

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **KVIS Pardubice, a. s.**
Sídlo: Rosice 151, 533 53 Pardubice
zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová zn. B 2435
zastoupen: Ing. Pavlem Jenišťou
IČ: 46506934
DIČ: CZ46506934
Bank. spojení : ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 17394093/0300
Telefon:
E-mail:

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

ve věcech smluvních: Ing. Libor Žižka, obchodní ředitel
tel.:
email:

ve věcech technických: Ing. Ondřej Sedláček, výrobní ředitel

tel.:
email:

(dále jen „zhotovitel“)

společně také „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku jako projev svobodné a vážné vůle
tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo:

Článek I.

1. Smluvní strany dne 23.03.2023 uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na realizaci veřejné zakázky objednatele „**Dobruška, ulice Javorová – I. etapa**“, jejímž předmětem je provedení díla zahrnujícího mj. výměnu vodovodu o dimenzi DN 160 za vodovod s profilem DN 200 z důvodu posílení vyššího tlakového pásma skupinového vodovodu Dobruška, rekonstrukce kanalizace DN 400 metodou vyvolžkování a výměna části kanalizačního potrubí DN 400 za potrubí DN 1000 umožňující svým profilem plnění akumulární funkce (dále jen „dílo“).

2. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 (dále jen „dodatek“) dohodly na změnách Smlouvy uvedených v čl. II – V tohoto dodatku.

Článek II.

1. Změny ve smyslu § 222 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, uvedené níže pod body 1.1 – 1.4:

1.1 Vodovod – změna dimenze vodovodu z D110 na D160

Změna je specifikována a oceněna ve Změnovém listu č. **301 – 01** tvořící přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Cena příslušných méněprací činí 22.435,00 Kč bez DPH.

Cena příslušných víceprací činí 62.430,00 Kč bez DPH

Celková cena změny činí 39.995,00 Kč bez DPH.

1.2 Vodovod – přesun stávajícího hydrantu

Změna je specifikována a oceněna ve Změnovém listu č. **301 – 03** tvořící přílohu č. 2 tohoto dodatku.

Cena příslušných méněprací činí 0,00 Kč bez DPH.

Cena příslušných víceprací činí 11.973,00 Kč bez DPH

Celková cena změny činí 11.973,00 Kč bez DPH.

1.3 Kanalizace – boční stoka, úsek Š4 – směr garáže

Změna je specifikována a oceněna ve Změnovém listu č. **302 – 05** tvořící přílohu č. 3 tohoto dodatku.

Cena příslušných méněprací činí 0,00 Kč bez DPH.

Cena příslušných víceprací činí 268.678,00 Kč bez DPH

Celková cena změny činí 268.678,00 Kč bez DPH.

1.4 Kanalizace – podkladní beton

Změna je specifikována a oceněna ve Změnovém listu č. **302 – 06** tvořící přílohu č. 4 tohoto dodatku.

Cena příslušných méněprací činí 0,00 Kč bez DPH.

Cena příslušných víceprací činí 168.865,00 Kč bez DPH

Celková cena změny činí 168.865,00 Kč bez DPH.

2. Změny ve smyslu § 222 odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, uvedené níže pod body 2.1 – 2.3

Jedná se o změny v rozsahu a v provedení díla, jejichž potřeby vznikly v důsledku okolností, které objednatel, ačkoliv jednal s náležitou péčí, nemohl předvídat. Tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky realizovanou Smlouvou.

2.1 Vodovod – napojení bytových domů

Změna je specifikována a oceněna ve Změnovém listu č. **301 – 04** tvořící přílohu č. 5 tohoto dodatku.

Cena příslušných méněprací činí 42.167,00 Kč bez DPH.

Cena příslušných víceprací činí 73.417,00 Kč bez DPH

Celková cena změny činí 31.250,00 Kč bez DPH.

2.2 Kanalizace – úsek Š4 – Š5

Změna je specifikována a oceněna ve Změnovém listu č. **302 – 01** tvořící přílohu č. 6 tohoto dodatku.

Cena příslušných méněprací činí 0,00 Kč bez DPH.

Cena příslušných víceprací činí 294.302,00 Kč bez DPH

Celková cena změny činí 294.302,00 Kč bez DPH.

2.3 Kanalizace – sanace šachet

Změna je specifikována a oceněna ve Změnovém listu č. **302 – 04** tvořící přílohu č. 7 tohoto dodatku.

Cena příslušných méněprací činí 247.365,00 Kč bez DPH.

Cena příslušných víceprací činí 0,00 Kč bez DPH

Celková cena změny činí -247.365 Kč bez DPH.

Článek III.

1. S ohledem na shora v odst. 1. (v bodech 1.1 – 1.4) a v odst. 2. (v bodech 2.1 – 2.3) sjednané změny Smlouvy se smluvní strany dohodly na změně ceny za dílo. Smlouvou sjednaná cena za dílo se zvyšuje o částku ve výši celkového rozdílu cen tímto Dodatkem č. 1 sjednaných víceprací a méněprací, tj. o **567.698,00 Kč bez DPH** (slovy: pětsetšedesátšestsetdevadesátosm korun českých bez daně z přidané hodnoty), a nově tak po tomto zvýšení činí **12.095.044,00 Kč bez DPH** (slovy: dvanáctmilionůdevadesátšesttisícčtyřicetčtyři korun českých bez daně z přidané hodnoty), **14.635.003,24 Kč včetně DPH** (slovy čtrnáctmilionůšestsetřicetpěttisícčtyřicet korun českých a dvacetčtyři haléřů včetně daně z přidané hodnoty).

DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, tj. daňový doklad bude Zhotovitelem vystaven podle § 92a odst. 2 ZDPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění (objednatel).

Článek IV.

1.1 Dopad dodatečných stavebních prací uvedených v článku II., v odst. 1.3 a 2.2 na smluvní termín provedení díla činí dohromady 1 měsíc. S ohledem na tento časový dopad tak smluvní strany zároveň sjednávají prodloužení termínu dokončení a předání díla objednateli sjednaného Smlouvou o 1 měsíc.

V článku III. Smlouvy se proto nahrazuje odst. 3.1 následujícím zněním:

1.2 **Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle čl. II. odst. 2.1 této smlouvy v celém rozsahu do 5 měsíců od převzetí staveniště zhotovitelem.**

Článek V.

1.1 Smluvní strany se tímto dohodly na novém znění odst. 4.14 Smlouvy

1.2 Pokud bude část díla dle této smlouvy plněna formou poddodávky (viz bod 9.1 zadávací dokumentace k veřejné zakázce), zhotovitel závazně uvádí identifikační údaje dotčeného poddodavatele:

Trasko BVT, s.r.o.

Na Nouzce 487/8, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov

IČ: 06020666

Článek VI.

1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly a že jej uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

2. Tento dodatek se uzavírá v elektronické podobě, přičemž každá smluvní strana obdrží její elektronický originál.

3. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek včetně jeho příloh podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv souhlasí a sjednávají, že jeho uveřejnění zajistí objednatel.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání oběma smluvními stranami, tj. připojením platného kvalifikovaného elektronického podpisu objednatele dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a platného uznávaného elektronického podpisu či zaručeného elektronického podpisu zhotovitele dle téhož zákona do tohoto dodatku a všech dokumentů tvořících jeho obsah, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu tento dodatek). Účinnosti tento dodatek nabývá jeho uveřejněním v registru smluv.

5. Součástí tohoto dodatku jsou tyto jeho přílohy:

Příloha č. 1 - Změnový list č. 301-01

Příloha č. 2 - Změnový list č. 301-03

Příloha č. 3 - Změnový list č. 302-05

Příloha č. 4 - Změnový list č. 302-06

Příloha č. 5 - Změnový list č. 301-04

Příloha č. 6 - Změnový list č. 302-01

Příloha č. 7 - Změnový list č. 302-04

6. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Dobrušky na své schůzi konané dne 12.06.2023.

Objednatel:

Zhotovitel:

Město Dobruška

Miroslav Sixta, starosta města
podepsáno elektronicky

KVIS Pardubice, a.s.

Ing. Pavel Jeništa, předseda představenstva
podepsáno elektronicky

DOBRUŠKA – UL. JAVOROVÁ – I. ETAPA	
Změnový list č. 301 - 01	
Vodovod – změna dimenze vodovodu z D110 na D160	
Část stavby dotčená změnou:	SO 301 - Vodovod
Projektční zpracování změny:	Návrh zhotovitele stavby
Popis změny: Z důvodu výhledové zástavby v boční ulici Javorová se objednatel rozhodl zvýšit kapacitu stávajícího vodovodního potrubí. Původní řešení bylo změna dimenze z D90 na D110. Nový návrh je dimenzi D110 (dle SOD) zvětšit na D160. Délka zůstává stejná (15,4m), pouze je nutno upravit související armatury (T-kus, šoupě, redukce) dle nové dimenze.	
Ohodnocení změny	39 995,00 Kč bez DPH
Vliv změny na termín dokončení:	bez vlivu - nemění se
Přílohy změnového listu: <ol style="list-style-type: none"> 1 Položkový rozpočet 2 Schéma s vyznačením změny 	
Za investora: Město Dobruška Miloš Votroubek, Dis. Podpis: Datum:	Za zhotovitele: KVIS Pardubice a.s. Ing. Tomáš Danda Podpis: Datum:
Za TDS: Ing. Miroslav Netík Podpis: Datum:	Za projektanta: Podpis: Datum:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dobruška, ulice Javorová

Objekt:

SO 301 - Rekonstrukce vodovodu - ZL 301 - 01 - Změna dimenze

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

16.05.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

KVIS Pardubice a.s.

IČ:

465 06 934

DIČ:

CZ46506934

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

39 995,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	39 995,00	21,00%	8 398,95
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

48 393,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dobruška, ulice Javorová

Objekt:

SO 301 - Rekonstrukce vodovodu - ZL 301 - 01 - Změna dimenze

Místo:

Datum: 16.05.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: KVIS Pardubice a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

39 995,00

HSV - Práce a dodávky HSV

39 995,00

1 - Zemní práce

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

8 - Trubní vedení

39 969,00

998 - Přesun hmot

26,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dobruška, ulice Javorová

Objekt:

SO 301 - Rekonstrukce vodovodu - ZL 301 - 01 - Změna dimenze

Místo:

Datum: 16.05.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

KVIS Pardubice a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

39 995,00

D HSV

Práce a dodávky HSV


39 995,00

D 8

Trubní vedení

39 969,00

1	K	871251141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 110 x 10,0 mm	m	-15,40	120,00	-1 848,00
2	M	28613557	potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 110x10,0 dl 12m	m	-16,00	351,90	-5 630,00
3	K	871321141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 160 x 14,6 mm	m	15,40	170,00	2 618,00
4	M	28613560	potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 160x14,6 dl 12m	m	16,00	1 240,00	19 840,00
5	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	-1,00	1 400,00	-1 400,00
6	M	42221303	šoupátko pitná voda litina PN10/16 DN 80x180mm	kus	-1,00	3 676,60	-3 677,00
7	K	891311112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150	kus	1,00	1 940,00	1 940,00
8	M	42221306	šoupátko pitná voda litina GGG 50 PN 10/16, DN 150x210 mm	kus	1,00	15 700,00	15 700,00
9	K	899881113	T 200/100 D+M (T 200/80)	kus	-1,00	9 880,00	-9 880,00
10	K	857354122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 200	kus	1,00	2 530,00	2 530,00
11	M	55253535	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 200/150	kus	1,00	17 600,00	17 600,00
12	K	877321101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 160	kus	1,00	456,00	456,00
13	M	28614980	elektroredukce PE 100 PN16 D 160-110mm	kus	1,00	1 720,00	1 720,00
D	998		Přesun hmot				26,00
14	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,09	290,00	26,00

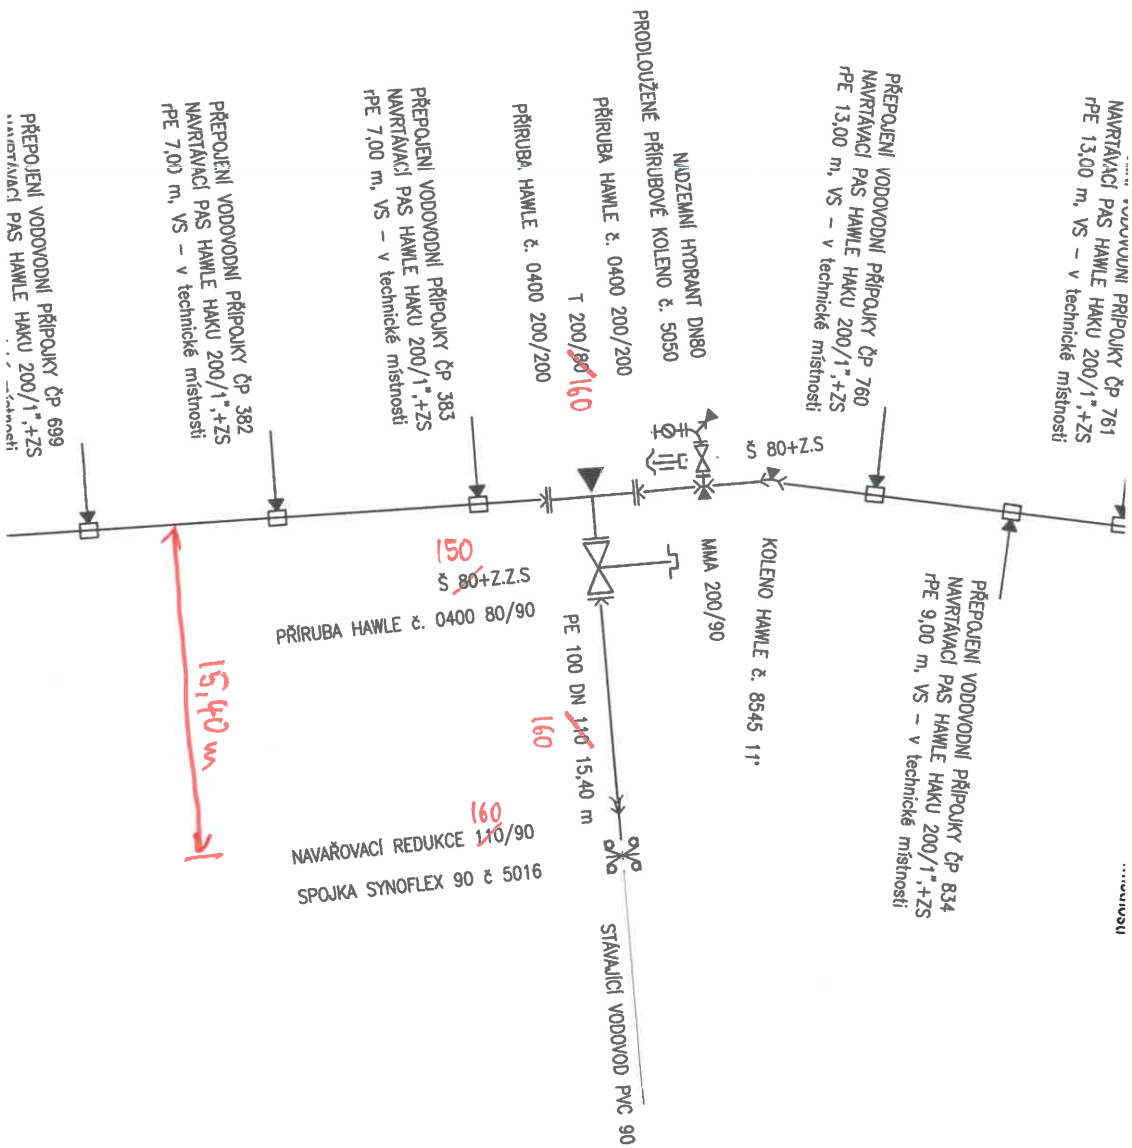

ŘAD A HDPE 100 SDR

STAVAJÍCÍ VODOVOD PVC

PŘEPOJENÍ VOD
NAVRTÁVACÍ PAS
PPE 1,50 m, VS

Závěrečná dílka za díllo
kl. výška 1,374 m

BLOK PRO ODBOČENÍ TVAROVKY
ANPL, BNPL 90/90, 110/110



DOBRUŠKA – UL. JAVOROVÁ – I. ETAPA	
Změnový list č. 301 - 03	
Vodovod – přesun stávajícího hydrantu	
Část stavby dotčená změnou:	SO 301 - Vodovod
Projektční zpracování změny:	Návrh zhotovitele stavby
Popis změny: Demontáž, přesunutí a opětovná montáž stávajícího podzemního hydrantu u domu čp. 449 - v místě provedení části řadu A je osazen v chodníku podzemní hydrant, který bude na základě rozhodnutí objednatele přesunut do nové trasy vodovodu, tj. do silnice. Přesun je počítán včetně souvisejících armatur (T-kus, šoupě, koleno), nové těsnění a nový nerez spojovací materiál.	
Ohodnocení změny	11 973,00 Kč bez DPH
Vliv změny na termín dokončení:	bez vlivu - nemění se
Přílohy změnového listu: 1 Položkový rozpočet	
Za investora: Město Dobruška Miloš Votroubek, Dis. Podpis: Datum:	Za zhotovitele: KVIS Pardubice a.s. Ing. Tomáš Danda Podpis: Datum:
Za TDS: Ing. Miroslav Netík Podpis: Datum:	Za projektanta: Podpis: Datum:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dobruška

Objekt:

ZL 301_03 - Hydrant přesun

KSO:

Místo: Dobruška

CC-CZ:

Datum: 16.05.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

KVIS Pardubice a.s.

IČ:

465 06 934

DIČ:

CZ46506934

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

11 973,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	11 973,00	21,00%	2 514,33
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

14 487,33

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dobruška

Objekt:

ZL 301_03 - Hydrant přesun

Místo:

Dobruška

Datum:

16.05.2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

KVIS Pardubice a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

11 973,00

HSV - Práce a dodávky HSV

10 053,00

4 - Vodorovné konstrukce

374,00

8 - Trubní vedení

9 537,00

998 - Přesun hmot

142,00

PSV - Práce a dodávky PSV

1 920,00

734 - Ústřední vytápění - armatury

1 920,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dobruška

Objekt:

ZL 301_03 - Hydrant přesun

Místo:

Dobruška

Datum:

16.05.2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

KVIS Pardubice a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

11 973,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				10 053,00
D	4		Vodorovné konstrukce				374,00
1	K	452313141	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,07	3 560,00	249,00
2	K	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	0,32	390,00	125,00
D	8		Trubní vedení				9 537,00
3	K	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	1,00	1 070,00	1 070,00
VV			"montáž patní koleno DN 80" 1		1,00		
VV			Součet		1,00		
4	K	857264122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100	kus	1,00	1 480,00	1 480,00
VV			"montáž T-kus 100/80" 1		1,00		
VV			Součet		1,00		
5	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	1,00	1 400,00	1 400,00
6	K	891241811	Demontáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	3,00	634,00	1 902,00
VV			"demontáž vodovodního šoupátka, podzemního hydrantu a patního kolena" 1+1+1		3,00		
VV			Součet		3,00		
7	K	891247112	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,00	1 140,00	1 140,00
8	K	891261811	Demontáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	1,00	762,00	762,00
VV			"demontáž T-kus 100/80" 1		1,00		
VV			Součet		1,00		
9	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,00	593,00	593,00
10	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,00	1 190,00	1 190,00
D	998		Přesun hmot				142,00
11	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,49	290,00	142,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 920,00
D	734		Ústřední vytápění - armatury				1 920,00
12	K	734173217 R	Spoj přírubový - příplatek za nerez spojovací materiál	soubor	4,00	480,00	1 920,00

DOBRUŠKA – UL. JAVOROVÁ – I. ETAPA	
Změnový list č. 302 - 05	
Kanalizace – boční stoka, úsek Š4 – směr garáže	
Část stavby dotčená změnou:	SO 302 - Kanalizace
Projekční zpracování změny:	Kopírování skutečnosti
Popis změny: Z důvodu výhledové zástavby v boční ulici Javorová se objednatel rozhodl zvýšit kapacitu stávajícího kanalizačního potrubí. Stávající stav: DN250 beton Nový návrh: D315 – SN12 v délce cca 15,4m vč. osazení nové revizní šachty, odbočení pro novou UV a dočasné propojení stávající UV do šachty Š4.	
Ohodnocení změny	268 678,00 Kč bez DPH
Vliv změny na termín dokončení:	Na provedení daného úseku bude třeba ½ měsíce.
Přílohy změnového listu: 1 Položkový rozpočet	
Za investora: Město Dobruška Miloš Votroubek, Dis. Podpis: Datum:	Za zhotovitele: KVIS Pardubice a.s. Ing. Tomáš Danda Podpis: Datum:
Za TDS: Ing. Miroslav Netík Podpis: Datum:	Za projektanta: Podpis: Datum:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dobruška, ulice Javorová

Objekt:

ZL 302_05 - Boční stoka DN 300 - délka 15,4 m

KSO:

Místo: Dobruška

CC-CZ:

Datum: 16.05.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

KVIS Pardubice a.s.

IČ:

465 06 934

DIČ:

CZ46506934

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

268 678,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	268 678,00	21,00%	56 422,38
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

325 100,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dobruška, ulice Javorová

Objekt:

ZL 302_05 - Boční stoka DN 300 - délka 15,4 m

Místo:

Dobruška

Datum:

16.05.2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

KVIS Pardubice a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

268 678,00

HSV - Práce a dodávky HSV

268 678,00

1 - Zemní práce	110 060,00
2 - Zakládání	4 250,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 310,00
8 - Trubní vedení	100 686,00
89 - Sanace kanalizace	10 350,00
997 - Přesun sutě	12 074,00
998 - Přesun hmot	28 948,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dobruška, ulice Javorová

Objekt:

ZL 302_05 - Boční stoka DN 300 - délka 15,4 m

Místo:

Dobruška

Datum:

16.05.2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

KVIS Pardubice a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

268 678,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

268 678,00

D 1

Zemní práce

110 060,00

1	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	26,80	390,00	10 452,00
---	---	-----------	---	----	-------	--------	-----------

VV 15,4*1,2*2,9*0,5

26,80

VV Součet

26,80

2	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	26,80	490,00	13 132,00
---	---	-----------	--	----	-------	--------	-----------

VV 15,4*1,2*2,9*0,5

26,80

VV Součet

26,80

3	K	151811131	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	89,32	60,00	5 359,00
---	---	-----------	---	----	-------	-------	----------

VV 15,4*2,9*2

89,32

VV Součet

89,32

4	K	151811231	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	89,32	30,00	2 680,00
---	---	-----------	--	----	-------	-------	----------

VV 15,4*2,9*2

89,32

VV Součet

89,32

5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	26,80	338,00	9 058,00
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

6	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	26,80	355,00	9 514,00
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

7	K	171151111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů zhutněných strojně	m3	53,60	25,00	1 340,00
---	---	-----------	---	----	-------	-------	----------

VV 26,8+26,8

53,60

VV Součet

53,60

8	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	91,12	180,00	16 402,00
---	---	-----------	---	---	-------	--------	-----------

VV 53,6*1,7

91,12

VV Součet

91,12

9	K	174152103	Zásyp zářezů pro podzemní vedení do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překozech inženýrských sítí	m3	38,81	145,00	5 627,00
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

VV 26,8+26,8-13,55-(0,16*0,16*3,14*15,4)

38,81

VV Součet

38,81

10	M	58981152	recyklát asfaltový frakce 0/8 R-materiál	t	69,86	352,00	24 591,00
----	---	----------	--	---	-------	--------	-----------

VV 38,81*1,8

69,86

VV Součet

69,86

11	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	13,55	245,00	3 320,00
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

VV "podsyp" 15,4*1,2*0,2

3,70

VV "obsyp" 15,4*((1,2*0,6)-(0,16*0,16*3,14))

9,85

VV Součet

13,55

12	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	24,39	352,00	8 585,00
----	---	----------	-----------------------	---	-------	--------	----------

VV 13,55*1,8

24,39

VV Součet

24,39

D 2

Zakládání

4 250,00

13	K	212752101	Tratívod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby	m	15,40	160,00	2 464,00
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

14	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného šterkopísku	m3	1,54	1 160,00	1 786,00
----	---	-----------	--	----	------	----------	----------

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

2 310,00

15	K	359901111	Vyčištění stok	m	15,40	60,00	924,00
----	---	-----------	----------------	---	-------	-------	--------

16	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	15,40	90,00	1 386,00
----	---	-----------	--	---	-------	-------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 8			Trubní vedení				100 686,00
13	K	810391811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 200 do 400	m	15,40	380,00	5 852,00
14	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160	m	5,00	140,00	700,00
15	M	28611230	trubka kanalizační PVC-U DN 160x3000mm SN12	m	5,07	396,80	2 012,00
16	K	871351811	Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu D přes 140 do 225 mm	m	2,00	89,60	179,00
17	K	871373121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 315	m	15,40	182,00	2 803,00
18	M	28611109	trubka kanalizační PVC-U DN 315x6000mm SN12	m	15,86	2 080,00	32 989,00
19	K	877370320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 300	kus	1,00	710,00	710,00
20	M	PPL.MKGEA300 150	PP MASTER odbočka 45° DN300x150 tvarovka k plnostěnnému odpanímu potrubí z PP (použití UD)	kus	1,00	2 321,50	2 322,00
21	K	890411811	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	3,85	4 100,00	15 785,00
	VV		0,65*0,65*3,14*2,9		3,85		
	VV		Součet		3,85		
22	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN přes 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	1,00	6 650,00	6 650,00
23	M	59224029	dno betonové šachtové DN 300 betonový žlab i nástupnice 100x78,5x15cm	kus	1,00	12 821,60	12 822,00
24	M	59224050	skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x25x12cm	kus	1,00	1 377,60	1 378,00
25	M	59224051	skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x50x12cm	kus	1,00	1 786,80	1 787,00
26	M	59224168	skruž betonová přechodová , stupadla poplastovaná kapsová	kus	1,00	3 298,40	3 298,00
27	M	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	1,00	197,20	197,00
28	M	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	1,00	222,00	222,00
29	K	899311114	Osazení poklopů s rámem hmotnosti přes 150 kg	kus	1,00	650,00	650,00
30	M	55241031	poklop šachtový třída D400, kruhový s ventilací	kus	1,00	3 824,20	3 824,00
31	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	20,40	15,00	306,00
32	K	899981188	Napojení přípojky DN do betonového potrubí navrtávkou		1,00	6 200,00	6 200,00
	VV		"napojení přípojky UV do šachty" 1		1,00		
	VV		Součet		1,00		
D 89			Sanace kanalizace				10 350,00
33	K	810991117	Přečerpávání splašků po dobu výstavby - pohotovost čerpadel	kpl	1,00	10 350,00	10 350,00
D 997			Přesun sutě				12 074,00
34	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	12,32	245,00	3 018,00
35	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	110,88	11,00	1 220,00
36	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	12,32	456,00	5 618,00
37	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	12,32	180,00	2 218,00
D 998			Přesun hmot				28 948,00
38	K	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	t	99,82	290,00	28 948,00

DOBRUŠKA – UL. JAVOROVÁ – I. ETAPA	
Změnový list č. 302 - 06	
Kanalizace – podkladní beton	
Část stavby dotčená změnou:	SO 302 - Kanalizace
Projektování zpracování změny:	Návrh zhotovitele
<p>Popis změny: Z důvodu budoucí stability nového retenčního potrubí DN1000 a revizních šachet, zhotovitel doporučuje provést podkladní beton pod tyto prvky. Šachty a potrubí jsou umístěny v komunikaci a tak je tu nebezpečí posunu, či jiné destabilizace prefabrikovaných prvků. Řešení dle PD: podsyp a obsyp - štěrkopísek Nový návrh: podkladní beton C12/15 v tl. min. 15cm pod šachtové dna a pod rouru DN1000 vč. betonového sedla.</p>	
Ohodnocení změny	168 865,00 Kč bez DPH
Vliv změny na termín dokončení:	Bez vlivu na termín.
<p>Přílohy změnového listu: 1 Položkový rozpočet</p>	
Za investora: Město Dobruška Miloš Votroubek, Dis. Podpis: Datum:	Za zhotovitele: KVIS Pardubice a.s. Ing. Tomáš Danda Podpis: Datum:
Za TDS: Ing. Miroslav Netík Podpis: Datum:	Za projektanta: Podpis: Datum:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dobruška, ulice Javorová

Objekt:

ZL 302_06 - podkladní beton

KSO:

Místo:

Dobruška

CC-CZ:

Datum:

18.05.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

KVIS Pardubice a.s.

IČ:

465 06 934

DIČ:

CZ46506934

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

168 865,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	168 865,00	21,00%	35 461,65
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

204 326,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dobruška, ulice Javorová

Objekt:

ZL 302_06 - podkladní beton

Místo:

Dobruška

Datum:

18.05.2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

KVIS Pardubice a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

168 865,00

HSV - Práce a dodávky HSV

168 865,00

4 - Vodorovné konstrukce

168 865,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dobruška, ulice Javorová

Objekt:

ZL 302_06 - podkladní beton

Místo:

Dobruška

Datum:

18.05.2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

KVIS Pardubice a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							168 865,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV				168 865,00
D		4	Vodorovné konstrukce				168 865,00
15	K	452312131	Sedlové lože z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	46,78	3 610,00	168 865,00
	VV		1,35+0,9+44,53		46,78		
	VV		Součet		46,78		

ÚRS

DOBRUŠKA – UL. JAVOROVÁ – I. ETAPA	
Změnový list č. 301 - 04	
Vodovod – napojení bytových domů	
Část stavby dotčená změnou:	SO 301 - Vodovod
Projektční zpracování změny:	Návrh zhotovitele stavby
Popis změny: Změna dimenze přípojek k bytovým domům. V zadání byly navrženy všechny vodovodní přípojky v zájmové lokalitě dimenze d32. Vzhledem k počtu obyvatel v bytových domech je tento návrh nevyhovující. Pro bytové domy se dimenze zvětší z d32 na d50. Jedná se o 8 přípojek.	
Ohodnocení změny	31 250,00 Kč bez DPH
Vliv změny na termín dokončení:	bez vlivu - nemění se
Přílohy změnového listu: <ol style="list-style-type: none"> 1 Položkový rozpočet 2 Seznam dotčených přípojek 	
Za investora: Město Dobruška Miloš Votroubek, Dis. Podpis: Datum:	Za zhotovitele: KVIS Pardubice a.s. Ing. Tomáš Danda Podpis: Datum:
Za TDS: Ing. Miroslav Netík Podpis: Datum:	Za projektanta: Podpis: Datum:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dobruška, ulice Javorová

Objekt:

ZL 301_04 - Změna dimenze přípojek

KSO:

Místo: Dobruška

CC-CZ:

Datum: 16.05.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

KVIS Pardubice a.s.

IČ:

465 06 934

DIČ:

CZ46506934

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

31 250,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	31 250,00	21,00%	6 562,50
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

37 812,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dobruška, ulice Javorová

Objekt:

ZL 301_04 - Změna dimenze přípojek

Místo:

Dobruška

Datum:

16.05.2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

KVIS Pardubice a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

31 250,00

HSV - Práce a dodávky HSV

31 250,00

8 - Trubní vedení

31 235,00

998 - Přesun hmot

15,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dobruška, ulice Javorová

Objekt:

ZL 301_04 - Změna dimenze přípojek

Místo: Dobruška

Datum: 16.05.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: KVIS Pardubice a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

31 250,00

D HSV Práce a dodávky HSV 31 250,00

D 8 Trubní vedení 31 235,00

1	K	871161141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm	m	-72,00	50,00	-3 600,00
2	M	28613170	trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 32x3,0mm	m	-72,34	40,30	-2 915,00
3	K	871181141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 50 x 4,6 mm	m	72,00	88,70	6 386,00
4	M	28613172	trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 50x4,6mm	m	72,34	141,00	10 200,00

VV 71,2709359605911*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 72,34

5	K	891181112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40	kus	-8,00	650,00	-5 200,00
6	M	42221300	šoupátko pitná voda litina PN10/16 DN 40x140mm	kus	-8,00	3 806,50	-30 452,00
7	K	891211112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 50	kus	8,00	942,00	7 536,00
8	M	42221301	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 50x150mm	kus	8,00	6 160,00	49 280,00

D 998 Přesun hmot 15,00

9	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,05	290,00	15,00
---	---	-----------	--	---	------	--------	-------

Příloha č.2

ZL 301-05

ŘAD A - vodovodní přípojky

SOD - zadání			ZL - požadavek	
čp	dimenze	m	dimence	m
698	32	7	50	7
699	32	7	50	7
382	32	7	50	7
383	32	7	50	7
760	32	13	50	13
761	32	13	50	13
762	32	13	50	13
789	32	5	50	5
8ks		72,0		72,0

DOBRUŠKA – UL. JAVOROVÁ – I. ETAPA	
Změnový list č. 302 - 01	
Kanalizace – úsek Š4 – Š5	
Část stavby dotčená změnou:	SO 302 - Kanalizace
Projektční zpracování změny:	Dle původního PP
<p>Popis změny: V zadání – ve výkresové části bylo uvažováno, že se tento úsek sanuje bezvýkopovou technologií – vložkováním. V rozpočtu ale tento úsek úplně chybí. Dále je v daném úseku směrový lom, a tudíž je to navrženou bezvýkopovou technologií neproveditelné. Bylo navrženo, že se úsek Š4 – Š5 v délce 21,65m provede otevřeným výkopem, stávající potrubí bude odstraněno a bude nahrazeno novým betonovým potrubím DN400. Součástí ZL je i DIO související s prodloužením uzavírky o 4 týdny.</p>	
Ohodnocení změny	294 302,00 Kč bez DPH
Vliv změny na termín dokončení:	Na provedení daného úseku bude třeba ½ měsíce.
<p>Přílohy změnového listu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Položkový rozpočet 2 Podélný profil (původní zadání) 	
Za investora: Město Dobruška Miloš Votroubek, Dis. Podpis: Datum:	Za zhotovitele: KVIS Pardubice a.s. Ing. Tomáš Danda Podpis: Datum:
Za TDS: Ing. Miroslav Netík Podpis: Datum:	Za projektanta: Podpis: Datum:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dobruška, ulice Javorová

Objekt:

ZL 302_01 - Stoka DN 400 - Š4-Š5

KSO:

Místo: Dobruška

CC-CZ:

Datum: 29.05.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

KVIS Pardubice a.s.

IČ:

465 06 934

DIČ:

CZ46506934

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

294 302,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	269 302,00	21,00%	56 553,42
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

350 855,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dobruška, ulice Javorová

Objekt:

ZL 302_01 - Stoka DN 400 - Š4-Š5

Místo:

Dobruška

Datum:

29.05.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

KVIS Pardubice a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

294 302,00

HSV - Práce a dodávky HSV

294 302,00

1 - Zemní práce

153 788,00

2 - Zakládání

3 456,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 944,00

4 - Vodorovné konstrukce

9 855,00

8 - Trubní vedení

56 029,00

997 - Přesun sutě

6 782,00

998 - Přesun hmot

37 448,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

25 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dobruška, ulice Javorová

Objekt:

ZL 302_01 - Stoka DN 400 - Š4-Š5

Místo:

Dobruška

Datum:

29.05.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

KVIS Pardubice a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

294 302,00

D HSV Práce a dodávky HSV 294 302,00

D 1 Zemní práce 153 788,00

1	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	39,40	390,00	15 366,00
---	---	-----------	---	----	-------	--------	-----------

VV 21,65*1,3*2,8*0,5 39,40
VV Součet 39,40

2	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	39,40	490,00	19 306,00
---	---	-----------	--	----	-------	--------	-----------

VV 21,65*1,3*2,8*0,5 39,40
VV Součet 39,40

3	K	151811131	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	121,24	60,00	7 274,00
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

VV 21,65*2,8*2 121,24
VV Součet 121,24

4	K	151811231	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	121,24	30,00	3 637,00
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

VV 21,65*2,8*2 121,24
VV Součet 121,24

5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	39,40	338,00	13 317,00
---	---	-----------	---	----	-------	--------	-----------

6	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	39,40	355,00	13 987,00
---	---	-----------	---	----	-------	--------	-----------

7	K	171151111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů zhutněných strojně	m3	78,80	25,00	1 970,00
---	---	-----------	---	----	-------	-------	----------

8	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	133,96	180,00	24 113,00
---	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

VV 78,8*1,7 133,96
VV Součet 133,96

9	K	174152103	Zásyp zářezů pro podzemní vedení do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překozech inženýrských sítí	m3	49,33	145,00	7 153,00
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

VV "výkop" 39,4+39,4 78,80
VV "potrubí" 0,28*0,28*3,14*-21,65 -5,33
VV "sedla" -0,7*0,18*21,65 -2,73
VV "obsyp" -21,65*((1,3*0,95)-(0,28*0,28*3,14)) -21,41
VV Součet 49,33

10	M	58981152	recyklát asfaltový frakce 0/8 R-materiál	t	88,79	352,00	31 254,00
----	---	----------	--	---	-------	--------	-----------

VV 49,33*1,8 88,79
VV Součet 88,79

11	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	18,68	245,00	4 577,00
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

VV "sedla" -0,7*0,18*21,65 -2,73
VV "obsyp" 21,65*((1,3*0,95)-(0,28*0,28*3,14)) 21,41
VV Součet 18,68

12	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	33,62	352,00	11 834,00
----	---	----------	-----------------------	---	-------	--------	-----------

VV 18,68*1,8 33,62
VV Součet 33,62

D 2 Zakládání 3 456,00


13	K	212752101	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby	m	21,60	160,00	3 456,00
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 944,00

14	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	21,60	90,00	1 944,00
----	---	-----------	--	---	-------	-------	----------

D 4 Vodorovné konstrukce 9 855,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	452312131	Sedlové lože z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	2,73	3 610,00	9 855,00
	VV		0,7*0,18*21,65		2,73		
	VV		Součet		2,73		
D 8			Trubní vedení				56 029,00
16	K	810391811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 200 do 400	m	21,65	380,00	8 227,00
17	K	812392121	Montáž potrubí z trub TBH s integrovaným pryžovým těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 400	m	21,65	708,00	15 328,00
18	M	59223021	trouba betonová hrdlová DN 400	m	21,87	1 470,00	32 149,00
	VV		21,65*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		21,87		
19	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	21,65	15,00	325,00
D 997			Přesun sutě				6 782,00
20	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,92	245,00	1 695,00
21	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	62,28	11,00	685,00
22	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	6,92	456,00	3 156,00
23	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	6,92	180,00	1 246,00
D 998			Přesun hmot				37 448,00
24	K	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	t	129,13	290,00	37 448,00
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				25 000,00
24	K	VRN_05	Dopravní značení na staveništi (DIO)	kpl	1,00	25 000,00	25 000,00

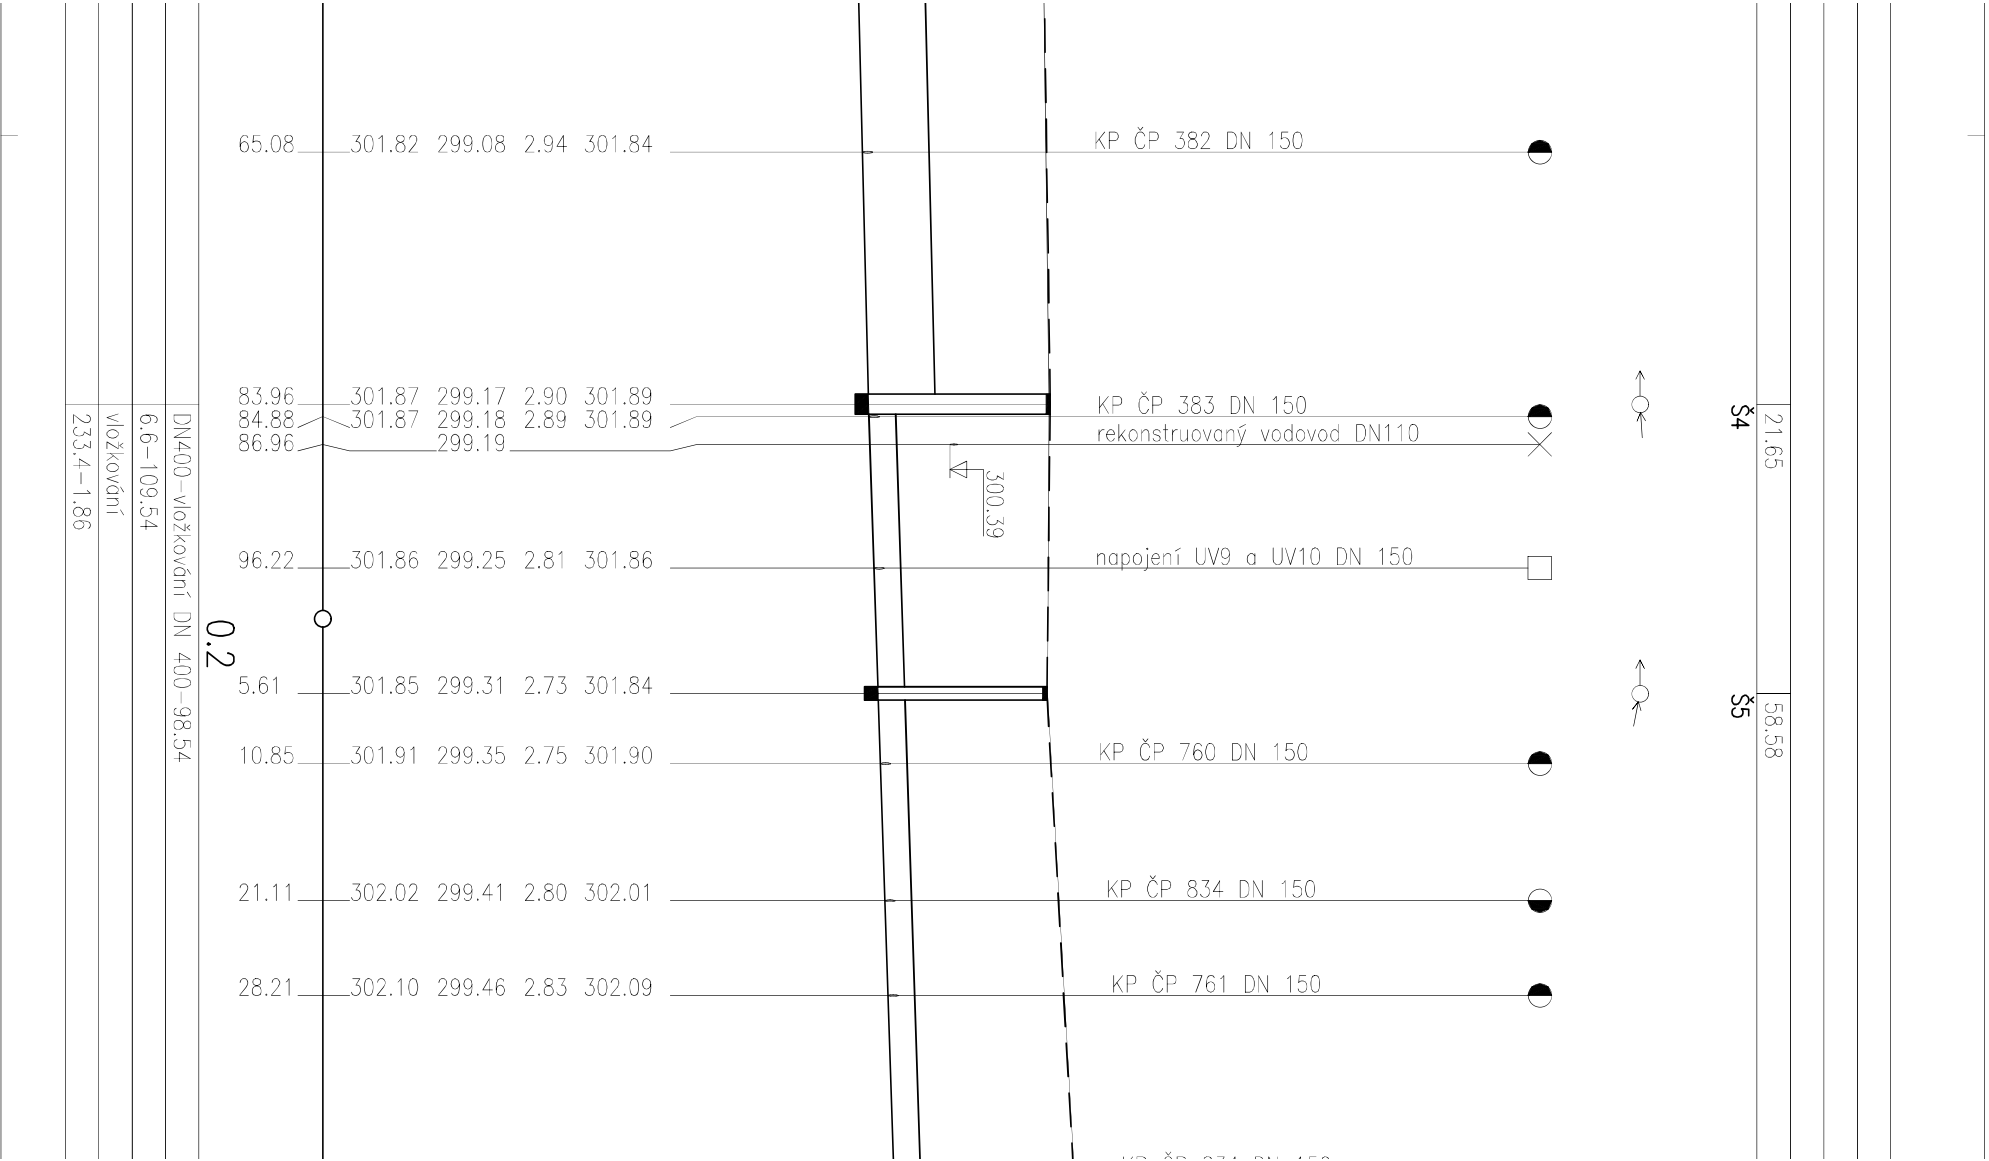

21.65
§4

58.58
§5

0.2

DN400 – vložkování DN 400–98,54
6,6–109,54
vložkování

233,4–1,86

DOBRUŠKA – UL. JAVOROVÁ – I. ETAPA	
Změnový list č. 302 - 04	
Kanalizace – sanace šachet	
Část stavby dotčená změnou:	SO 302 - Kanalizace
Projekční zpracování změny:	Dle původní PD
Popis změny: V zadání – ve výkazu výměr – bylo uvažováno se sanací 10ks revizních šachet, ale zároveň byla navržena kompletní výměna všech 10-ti šachet. Vzhledem k realizované kompletní výměně 9-ti šachet, není nutné sanaci těchto šachet uvažovat. Sanovat se bude pouze 1 šachta.	
Ohodnocení změny	247 365,00 Kč bez DPH
Vliv změny na termín dokončení:	Bez vlivu.
Přílohy změnového listu: 1 Položkový rozpočet	
Za investora: Město Dobruška Miloš Votroubek, Dis. Podpis: Datum:	Za zhotovitele: KVIS Pardubice a.s. Ing. Tomáš Danda Podpis: Datum:
Za TDS: Ing. Miroslav Netík Podpis: Datum:	Za projektanta: Podpis: Datum:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dobruška, ulice Javorová

Objekt:

SO 302 - Rekonstrukce kanalizace

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

31.05.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

KVIS Pardubice a.s.

IČ:

465 06 934

DIČ:

CZ46506934

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

247 365,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	247 365,00	21,00%	51 946,65
snížená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

299 311,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dobruška, ulice Javorová

Objekt:

SO 302 - Rekonstrukce kanalizace

Místo:

Datum: 31.05.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: KVIS Pardubice a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	247 365,00
HSV - Práce a dodávky HSV	247 365,00
89 - Sanace kanalizace	247 365,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dobruška, ulice Javorová

Objekt:

SO 302 - Rekonstrukce kanalizace

Místo:

Datum: 31.05.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: KVIS Pardubice a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							247 365,00
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				247 365,00
	D	89	Sanace kanalizace				247 365,00
58	K	810991115	Sanace šachet - zednický (dno, stěny stupačky)	ks	9,00	27 485,00	247 365,00
