







Dodatek č.1 k SOD č.OISM 135/22

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)

1 SMLUVNÍ STRANY A ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Objednatel: **Město Moravská Třebová**
Sídlo: nám. T. G. Masaryka 32/29, 571 01 Moravská Třebová
Zastoupený: Ing. Pavel Charvát, starosta
IČO: 002 77 037
DIČ: CZ00277037
Bankovní ústav: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 27-1283386349/0800
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Pavel Charvát, starosta
Tel.: +420 461 353 132
E-mail: pcharvat@mtrebova.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
Tel.: 
E-mail: 

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: STAVITELSTVÍ – TRUNEC s.r.o.
Sídlo: Zimní 823, 566 01 Vysoké Mýto
Zastoupený: Josef Trunec, jednatel
Zapsán v obchodním rejstříku: KS u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 24274,
IČO: 275 28 545
DIČ: CZ27528545
Bankovní ústav: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 43-954840297/0100
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: 
Tel.: 
E-mail: 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
Tel.: 
E-mail: 

(dále jen „Zhotovitel“)

2 PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. OISM 0135/22 (dále jen „smlouva“) jehož předmětem je změna ceny díla. Změny jsou specifikované ve Změnovém listu č.ZL1 a ZL1 a v rozpočtu změnových listů. Všechny uvedené dokumenty jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří jeho přílohy. Finanční rekapitulace dodatku č. 1 dle změnových listů je uvedena v následující tabulce:

| | MÉNĚPRÁCE | VÍCEPRÁCE |
|----------------|------------------------|---------------------|
| ZL č. 1 | - 304.037,62 Kč | 26.881,76 Kč |
| ZL č. 2 | - 20.250,56 Kč | 5.504,70 Kč |
| CELKEM | - 324.288,18 Kč | 32.386,46 Kč |

2.2 Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně odst. 6.1.1. smlouvy o dílo:

Původní znění:

6.1.1 Cena za dílo je sjednána ve výši:

6.1.1.1 Cena 3 279 278,07 Kč bez DPH

6.1.1.2 Cena slovy třimilionydvěstěsedmdesátdevět tisíc dvěstěsedmdesát osm korun a sedm haléřů

Nové znění:

6.1.1 Cena za dílo je sjednána ve výši:

6.1.1.1 Cena 2 987 376,35 Kč bez DPH

6.1.1.2 Cena slovy dvě miliony devět set osmdesát sedm tisíc tři st a sedmdesát šest korun a třicet pět haléřů

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Závěrečná ustanovení

3.1.1 Ostatní ujednání smlouvy ze dne 21.9.2022 zůstávají v platnosti beze změny.

3.2 Platnost a účinnost smlouvy.

3.2.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem připojení podpisu oběma smluvními stranami. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, přičemž jeho uveřejnění zajistí Objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.

3.2.2 Tento dodatek se uzavírá elektronicky, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Dodatek č.1 je uzavřen v souladu s usnesením rady města č.649/R/100723 ze dne 10.7.2023.

V Moravské Třebové

V Moravské Třebové

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Změnový list č. 1

Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SOD

| | |
|----------------|--|
| Stavba: | „Oprava MK v Sušicích, p.č. 3630/4, Moravská Třebová“ |
| objekt: | SO 101.1 Rozšíření komunikace - uznatelné |

identifikační číslo projektu 117D8220A8849

Odstranění sedimentu

| | Specifikace změny | Výměry komunikace |
|--------------------------------------|---|-------------------|
| Zdůvodnění změny - kód změny: 9.2.2. | Popis změny: - na základě hutnicích zkoušek a kontroly zemní pláně byl stanoven rozsah provedení sanace zemní pláně na 445m ² - rozpočtovaná výměra byla snížena - pro provedení nového povrchu komunikace v místě napojení na stávající komunikaci byl navýšen rozsah obrusné vrstvy o 39,7m ² | |
| Vícepráce - bez DPH | | 26 881,76 |
| Méněpráce | | -304 037,62 |
| Rozdíl | | -277 155,86 |

| | |
|----------|------------------------|
| Přílohy: | Položkový rozpočet ZL1 |
|----------|------------------------|

Souhlas se změnovým listem ZL-1

| účastník | podpis |
|--|-----------|
| objednatel: Město Moravská Třebová [obrazek] - zástupce investora ve věcech technických | [obrazek] |
| zhotovitel: STAVITELSTVÍ - TRUNEC s.r.o. [obrazek] | |
| TD: JAFIS s.r.o. [obrazek] | |

SOUPIS PRACÍ ZL1

Stavba:

Oprava MK v Sušicích, p.č. 3630/4, Moravská Třebová

Objekt:

SO 101.1 - Rozšíření komunikace - uznatelné

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Město Moravská Třebová, nám. T.G. Masaryka 29

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-277 155,86

D HSV Práce a dodávky HSV

-277 155,86

D 1 Zemní práce

-58 551,40

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|----------|--|--------|------------|
| 5 | K | 113154122 | Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase | m2 | 25,500 | | 108,00 | 2 754,00 |
| 7 | K | 122251104 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojné | m3 | -170,000 | | 156,00 | -26 520,00 |
| 10 | K | 162451106 | Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | -170,000 | | 128,00 | -21 760,00 |
| 14 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | -306,000 | | 29,90 | -9 149,40 |
| 15 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | -170,000 | | 22,80 | -3 876,00 |

D 2 Zakládání

-35 032,22

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|----------|-------|-------|------------|
| 26 | K | 213141112 | Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 3 do 6 m | m2 | -335,000 | | 23,40 | -7 839,00 |
| 27 | M | 69311089 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 600g/m2 | m2 | -396,808 | 68,53 | | -27 193,22 |

D 5 Komunikace pozemní

-185 929,27

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|----------|--------|--------|-------------|
| 29 | K | 564871111 | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm | m2 | -670,000 | 310,00 | | -207 700,00 |
| 31 | K | 565135111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m | m2 | 8,750 | | 444,95 | 3 893,31 |
| 32 | K | 573111112 | Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 | m2 | 8,750 | | 41,80 | 365,75 |
| 33 | K | 573211109 | Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 | m2 | 39,700 | | 25,30 | 1 004,41 |
| 34 | K | 577134111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 39,700 | | 415,80 | 16 507,26 |

D 997 Přesun sutě

2 357,03

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|--------|--|--------|----------|
| 42 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 2,346 | | 52,50 | 123,17 |
| 43 | K | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 32,844 | | 13,30 | 436,83 |
| 47 | K | 997221611 | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 2,346 | | 209,00 | 490,31 |
| 50 | K | 997221875 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t | 2,346 | | 557,00 | 1 306,72 |

Změnový list č. 2

Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SOD

| | |
|----------------|--|
| Stavba: | „Oprava MK v Sušicích, p.č. 3630/4, Moravská Třebová“ |
| objekt: | SO 001 Všeobecné položky - neuznatelné |
| objekt: | SO 101.3 Chodníky, vjezdy - neuznatelné |

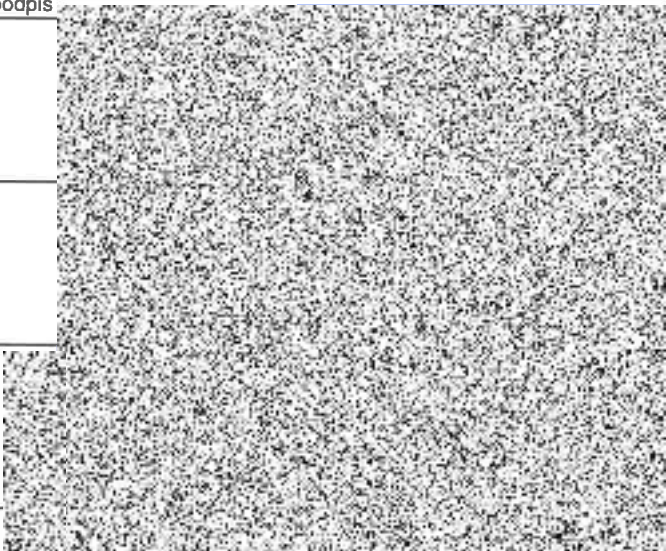
identifikační číslo projektu 117D8220A8849

Odstranění sedimentu

| | Specifikace změny | Neprovedené práce |
|---|--|-------------------|
| Zdůvodnění změny - kód změny: 9.2.2. | Popis změny: - v rozšířené části komunikace v zatáčce nebyly provedeny vodící pásy z důvodu nemožnosti provádět pokladku živičných vstev strojně - statické zkoušky únosnosti podloží byly provedeny celkem 4 - v koncové části komunikace v místě napojení na stávající komunikaci budou osazeny 2 řady nájezdových silničních obrub místo 1 | |
| Vícepráce - bez DPH | | 5 504,70 |
| Méněpráce | | -20 250,56 |
| Rozdíl | | -14 745,86 |

| | |
|----------|-------------------------------|
| Přílohy: | Položkový rozpočet ZL2a, ZL2b |
|----------|-------------------------------|

Souhlas se změnovým listem ZL-2

| účastník | podpis |
|---|--|
| objednatel: Město Moravská Třebová - zástupce investora ve věcech technických |  |
| zhotovitel: STAVITELSTVÍ - TRUNEC s.r.o. | |
| TD: JAFIS s.r.o. | |

SOUPIS PRACÍ ZL2b

Stavba:

Oprava MK v Sušicích, p.č. 3630/4, Moravská Třebová

Objekt:

SO 101.3 - Chodníky, vjezdy - neuznatelné

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Město Moravská Třebová, nám. T.G. Masaryka 29

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem**-8 745,86**

D HSV

Práce a dodávky HSV

-8 745,86

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

-8 521,13

| | | | | | | | | |
|-------------------|---|-----------|--|---|----------|--------|--------|----------------|
| 35 | K | 915491211 | Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm | m | -35,000 | | 130,00 | -4 550,00 |
| 36 | M | 59218001 | <i>krajník betonový silniční 500x250x80mm</i> | m | -35,700 | 224,40 | | -8 011,08 |
| 37 | K | 915499211 | Příplatek ZKD 10 mm přes 100 mm tl lože u osazení vodícího proužku š 250 mm | m | -175,000 | | 8,37 | -1 464,75 |
| 38 | K | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 10,500 | | 303,00 | 3 181,50 |
| 40 | M | 59217029 | <i>obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm</i> | m | 11,000 | 211,20 | | 2 323,20 |
| D 998 Přesun hmot | | | | | | | | -224,73 |
| 54 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | -2,930 | | 76,70 | -224,73 |

SOUPIS PRACÍ ZL2a

Stavba:

Oprava MK v Sušicích, p.č. 3630/4, Moravská Třebová

Objekt:

SO 001 - Všeobecné položky - neuznatelné

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Město Moravská Třebová, nám. T.G. Masaryka 29

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------|-----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | | -6 000,00 |
| D | VRN | | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | | -6 000,00 |
| 4 | K | 043002001 | Statická zkouška hutnění zemní pláně | kus | -1,000 | | 6 000,00 | -6 000,00 |
