

Harmonogram stavby: 2023/152 Mateřská škola Vsetín, Rokytnice 425 - snížení energetické náročnosti


Zhotovitel : TM Stav, spol. s r.o.
 Jasenice 729
 75501 Vsetín

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	Cena (Kč)	srpen	
					1	2
2023/152	Mateřská škola Vsetín, Rokytnice 425 - snížení energetické náročnosti	1.8.2023	31.5.2024	25 766 884		
OVN	Ostatní a vedlejší náklady	1.8.2023	31.5.2024	282 000		
OVN.1	Ostatní a vedlejší náklady - způsobilé výdaje	1.8.2023	31.5.2024	247 000		
VN	Vedlejší náklady	1.8.2023	31.5.2024	141 000		
ON	Ostatní náklady	1.8.2023	31.5.2024	106 000		
OVN.2	Ostatní a vedlejší náklady - nezpůsobilé výdaje	1.8.2023	1.8.2023	35 000		
VN	Vedlejší náklady	1.8.2023	1.8.2023	12 000		
ON	Ostatní náklady	1.8.2023	1.8.2023	23 000		
SO 01	MŠ - žlutý pavilon	1.8.2023	30.11.2023	6 138 565		
SO 01.1	Výdaje na zateplení	1.8.2023	30.11.2023	4 181 617		
1	Zemní práce	23.10.2023	8.11.2023	34 620		
11	Přípravné a přidružené práce	23.10.2023	31.10.2023	1 970		
46	Zpevněné plochy	9.11.2023	30.11.2023	16 980		
61	Úpravy povrchů vnitřní	11.9.2023	28.9.2023	31 873		
62	Úpravy povrchů vnější	6.9.2023	8.11.2023	1 339 265		
63	Podlahy a podlahové konstrukce	10.9.2023	10.10.2023	71 317		
64	Výplně otvorů	26.9.2023	30.9.2023	24 504		
94	Lešení a stavební výtahy	7.8.2023	15.11.2023	126 477		
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	23.8.2023	30.11.2023	78 022		
96	Bourání konstrukcí	1.8.2023	25.8.2023	46 212		
99	Staveništní přesun hmot	1.8.2023	30.11.2023	24 769		
999	Poplatky za skládky	1.8.2023	3.9.2023	44 967		
711	Izolace proti vodě	26.10.2023	3.11.2023	46 313		
712	Povlakové krytiny	16.8.2023	8.10.2023	620 817		
713	Izolace tepelné	30.8.2023	12.10.2023	409 063		
721	Vnitřní kanalizace	11.9.2023	30.9.2023	20 111		
762	Konstrukce tesařské	9.10.2023	15.10.2023	85 349		
764	Konstrukce klempířské	12.10.2023	2.11.2023	196 500		

prosinec 2023			leden 2024				únor 2024				březen 2024			
2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4

duben 2024				květen 2024			
1	2	3	4	1	2	3	4

767	Konstrukce zámečnické	1.11.2023	8.11.2023	51 683	
769	Otvorové prvky z plastu	28.8.2023	17.9.2023	706 441	
777	Podlahy ze syntetických hmot	25.9.2023	8.10.2023	68 194	
783	Nátěry	21.9.2023	21.9.2023	16 467	
784	Malby	22.9.2023	30.9.2023	24 445	
M21	Elektromontáže	25.10.2023	31.10.2023	7 500	
M22	PŘÍSTROJ SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE (s bezšroubovými svorkami)	21.8.2023	13.9.2023	1 034	
M23	Bleskosvod	21.8.2023	13.9.2023	55 967	
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	21.8.2023	13.9.2023	30 754	
SO 01.2	Nezpůsobitelné výdaje	1.8.2023	30.11.2023	258 944	
1	Zemní práce	23.10.2023	30.11.2023	9 008	
11	Přípravné a přidružené práce	23.10.2023	3.11.2023	18 823	
46	Zpevněné plochy	9.11.2023	30.11.2023	40 400	
94	Lešení a stavební výtahy	1.8.2023	25.8.2023	17 766	
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	1.8.2023	15.11.2023	28 953	
96	Bourání konstrukcí	1.8.2023	6.8.2023	4 310	
99	Staveništní přesun hmot	1.8.2023	30.11.2023	10 329	
999	Poplatky za skládky	23.10.2023	3.11.2023	8 640	
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	21.8.2023	13.9.2023	7 520	
767	Konstrukce zámečnické	1.8.2023	25.8.2023	27 744	
771	Podlahy z dlaždic a obklady	13.11.2023	22.11.2023	1 905	
783	Nátěry	25.10.2023	15.11.2023	43 246	
M99	Ostatní práce "M"	21.8.2023	13.9.2023	12 460	
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	23.10.2023	3.11.2023	27 839	
SO 01.3	Výdaje na stínící techniku s ručním ovládním	21.8.2023	27.8.2023	35 802	
767	Konstrukce zámečnické	21.8.2023	27.8.2023	35 802	
SO 01.4	Výdaje na stínící techniku s elektronickým ovládním	21.8.2023	27.8.2023	230 172	
767	Konstrukce zámečnické	21.8.2023	27.8.2023	214 914	
M21	Elektromontáže	21.8.2023	27.8.2023	8 359	
M21.1	Silnoproudá elektrotechnika - Žlutý pavilon - Rozvaděč 1.NP	21.8.2023	27.8.2023	3 360	
M21.2	Silnoproudá elektrotechnika - Žlutý pavilon - Rozvaděč 2.NP	21.8.2023	27.8.2023	1 680	
M22	PŘÍSTROJ SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE (s bezšroubovými svorkami)	21.8.2023	27.8.2023	1 859	
SO 01.5	Výdaje na větrání s využitím odpadního tepla (Vzduchotechnika)	1.8.2023	17.9.2023	473 602	
61	Úpravy povrchů vnitřní	8.8.2023	25.8.2023	5 776	
96	Bourání konstrukcí	1.8.2023	9.8.2023	4 333	
99	Staveništní přesun hmot	1.8.2023	17.9.2023	328	
999	Poplatky za skládky	1.8.2023	9.8.2023	183	
784	Malby	23.8.2023	25.8.2023	1 830	

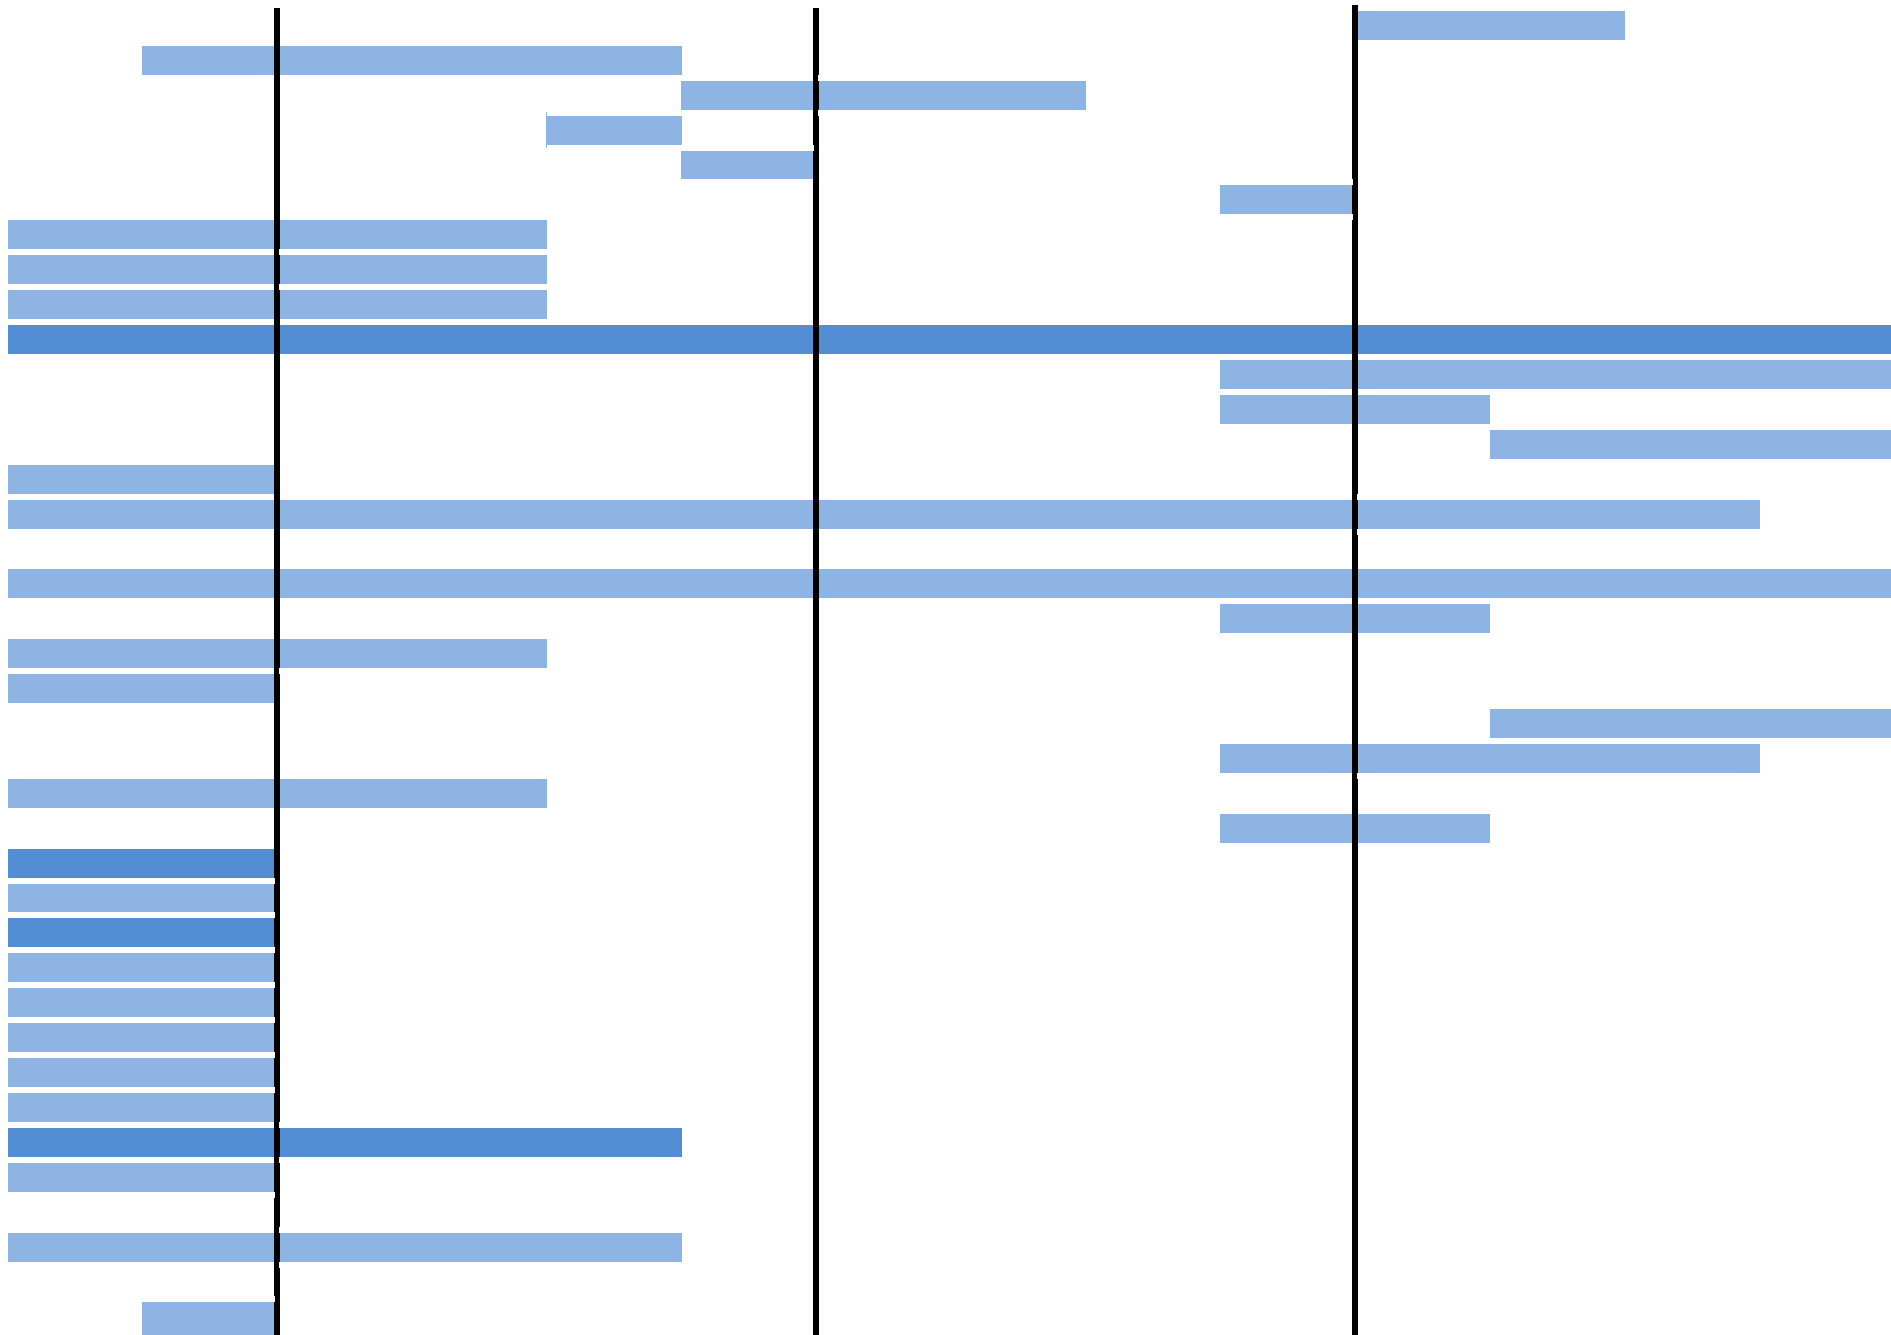





799	Ostatní	14.8.2023	25.8.2023	34 150
M21	Elektromontáže	10.8.2023	17.9.2023	16 986
M21.1	Silnoproudá elektrotechnika - Žlutý pavilon - Rozvaděč 1.NP	10.8.2023	17.9.2023	4 578
M21.2	Silnoproudá elektrotechnika - Žlutý pavilon - Rozvaděč 2.NP	10.8.2023	17.9.2023	4 578
M22	PŘÍSTROJ SPÍNÁČE, PŘEPÍNAČE (s bezšroubovými svorkami)	10.8.2023	17.9.2023	484
M24	HOP (hlavní ochranná přípojnice)	10.8.2023	17.9.2023	18 736
M24.1	Zařízení č.1 - Žlutý pavilon - větrání hery 1.NP	10.8.2023	17.9.2023	185 455
M24.2	Zařízení č.2 - Žlutý pavilon - větrání hery 2.NP	10.8.2023	17.9.2023	195 763
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	1.8.2023	9.8.2023	424
SO 01.6	Výdaje na instalaci fotovoltaického systému	16.10.2023	12.11.2023	801 791
739	Fotovoltaické panely na střeše	16.10.2023	12.11.2023	371 280
739.1	Fotovoltaické panely na střeše - konstrukce	16.10.2023	12.11.2023	206 603
739.3	Fotovoltaické panely na střeše - rozvaděče a výstroj	16.10.2023	12.11.2023	28 505
739.4	Fotovoltaické panely na střeše - kabely	16.10.2023	12.11.2023	61 926
739.5	Fotovoltaické panely na střeše - ostatní položky	16.10.2023	12.11.2023	38 325
M23	Bleskosvod	16.10.2023	12.11.2023	95 152
SO 01.7	Výdaje na instalaci akumulace k fotovoltaickému systému	21.8.2023	12.11.2023	156 638
64	Výplně otvorů	21.8.2023	25.8.2023	3 100
99	Staveništní přesun hmot	21.8.2023	25.8.2023	36
739.2	Fotovoltaické panely na střeše - střídače a příslušenství	16.10.2023	12.11.2023	128 100
766	Konstrukce truhlářské	21.8.2023	25.8.2023	25 401
SO 01 - SO	Uzemnění - elektromontáže	4.9.2023	10.11.2023	275 830
SO 01 - SO	Nezpůsobilé výdaje	4.9.2023	10.11.2023	275 830
1	Zemní práce	7.9.2023	5.11.2023	67 253
11	Přípravné a přidružené práce	4.9.2023	15.9.2023	9 313
46	Zpevněné plochy	30.10.2023	10.11.2023	23 664
99	Staveništní přesun hmot	4.9.2023	10.11.2023	4 882
999	Poplatky za skládky	4.9.2023	15.9.2023	4 776
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	2.10.2023	26.10.2023	30 993
M23	Bleskosvod	2.10.2023	26.10.2023	104 733
M46	Zemní práce při montážích	2.10.2023	26.10.2023	3 620
M99	Ostatní práce "M"	2.10.2023	26.10.2023	14 246
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	4.9.2023	15.9.2023	12 349
SO 02	Hospodářský pavilon, zelený pavilon	1.8.2023	30.11.2023	6 174 213
SO 02.1	Výdaje na zateplení	1.8.2023	30.11.2023	3 799 972
1	Zemní práce	25.10.2023	7.11.2023	36 752
11	Přípravné a přidružené práce	24.10.2023	1.11.2023	4 844
3	Svislé a kompletní konstrukce	29.9.2023	12.10.2023	23 490








46	Zpevněné plochy	6.11.2023	26.11.2023	41 179	
61	Úpravy povrchů vnitřní	14.8.2023	25.8.2023	21 388	
62	Úpravy povrchů vnější	1.9.2023	2.11.2023	772 124	
63	Podlahy a podlahové konstrukce	10.8.2023	10.10.2023	19 144	
64	Výplně otvorů	21.8.2023	25.8.2023	10 548	
94	Lešení a stavební výtahy	7.8.2023	12.11.2023	56 334	
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	23.8.2023	30.11.2023	56 074	
96	Bourání konstrukcí	1.8.2023	23.8.2023	23 406	
99	Staveništní přesun hmot	1.8.2023	30.11.2023	26 370	
999	Poplatky za skládky	1.8.2023	31.8.2023	51 147	
711	Izolace proti vodě	27.10.2023	2.11.2023	29 640	
712	Povlakové krytiny	14.8.2023	11.10.2023	880 779	
713	Izolace tepelné	28.8.2023	18.10.2023	513 353	
721	Vnitřní kanalizace	4.9.2023	25.9.2023	43 586	
738	Solární systémy	10.8.2023	31.10.2023	135 500	
762	Konstrukce tesařské	4.10.2023	15.10.2023	96 073	
764	Konstrukce klempířské	9.10.2023	29.10.2023	238 997	
766	Konstrukce truhlářské	21.8.2023	23.8.2023	161 110	
769	Otvorové prvky z plastu	7.8.2023	25.8.2023	411 786	
783	Nátěry	16.8.2023	16.8.2023	9 056	
784	Malby	18.8.2023	25.8.2023	31 306	
M21	Elektromontáže	26.10.2023	3.11.2023	6 890	
M23	Bleskosvod	21.8.2023	13.9.2023	62 375	
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	21.8.2023	13.9.2023	36 719	
SO 02.2	Nezpůsobilé výdaje	1.8.2023	30.11.2023	606 917	
1	Zemní práce	23.10.2023	30.11.2023	12 843	
11	Přípravné a přidružené práce	23.10.2023	1.11.2023	23 263	
46	Zpevněné plochy	6.11.2023	27.11.2023	9 834	
61	Úpravy povrchů vnitřní	11.9.2023	28.9.2023	3 664	
63	Podlahy a podlahové konstrukce	10.8.2023	10.10.2023	8 749	
94	Lešení a stavební výtahy	1.8.2023	25.8.2023	27 592	
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	23.8.2023	30.11.2023	50 637	
96	Bourání konstrukcí	2.8.2023	10.8.2023	20 345	
99	Staveništní přesun hmot	1.8.2023	30.11.2023	3 091	
999	Poplatky za skládky	2.8.2023	10.8.2023	8 735	
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	21.8.2023	13.9.2023	10 040	
712	Povlakové krytiny	11.9.2023	17.9.2023	11 259	
766	Konstrukce truhlářské	15.8.2023	17.8.2023	1 166	








767	Konstrukce zámečnické	1.8.2023	10.11.2023	99 756
771	Podlahy z dlaždic a obklady	14.11.2023	20.11.2023	18 802
777	Podlahy ze syntetických hmot	30.10.2023	15.11.2023	200 160
783	Nátěry	25.10.2023	15.11.2023	73 495
M99	Ostatní práce "M"	21.8.2023	13.9.2023	12 460
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	2.8.2023	10.8.2023	11 025
SO 02.3	Výdaje na stínící techniku s ručním ovládáním	21.8.2023	27.8.2023	19 696
767	Konstrukce zámečnické	21.8.2023	27.8.2023	19 696
SO 02.4	Výdaje na větrání s využitím odpadního tepla (Vzduchotechnika)	8.8.2023	20.9.2023	1 082 307
3	Svislé a kompletní konstrukce	9.8.2023	20.8.2023	6 240
61	Úpravy povrchů vnitřní	14.8.2023	25.8.2023	6 821
96	Bourání konstrukcí	8.8.2023	17.8.2023	2 011
99	Staveništní přesun hmot	8.8.2023	20.9.2023	644
999	Poplatky za skládky	8.8.2023	17.8.2023	88
766	Konstrukce truhlářské	18.8.2023	23.8.2023	1 316
767	Konstrukce zámečnické	10.8.2023	25.8.2023	2 687
784	Malby	21.8.2023	27.8.2023	3 584
799	Ostatní	8.8.2023	20.9.2023	39 500
M21	Elektromontáže	8.8.2023	20.9.2023	23 878
M21.1	Silnoproudá elektrotechnika - Zelený pavilon - Rozvaděč HR	8.8.2023	20.9.2023	18 409
M22	PŘÍSTROJ SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE (s bezšroubovými svorkami)	8.8.2023	20.9.2023	25 966
M24	HOP (hlavní ochranná přípojnice)	8.8.2023	20.9.2023	25 077
M24.10	Zařízení č.10 - Hospodářský pavilon - větrání sušárny a žehlírny	8.8.2023	20.9.2023	21 387
M24.7	Zařízení č.7 - Hospodářský pavilon - větrání kuchyně	8.8.2023	20.9.2023	858 733
M24.8	Zařízení č.8 - Hospodářský pavilon - větrání bateriové místnosti	8.8.2023	20.9.2023	20 958
M24.9	Zařízení č.9 - Hospodářský pavilon - větrání prádelny	8.8.2023	20.9.2023	24 834
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	8.8.2023	17.8.2023	177
SO 02.5	Výdaje na větrání s využitím odpadního tepla (Vytápění)	1.8.2023	25.8.2023	116 265
61	Úpravy povrchů vnitřní	14.8.2023	25.8.2023	1 704
94	Lešení a stavební výtahy	1.8.2023	25.8.2023	2 940
96	Bourání konstrukcí	1.8.2023	9.8.2023	1 301
99	Staveništní přesun hmot	1.8.2023	25.8.2023	89
713	Izolace tepelné	1.8.2023	25.8.2023	17 819
732	Strojovny	1.8.2023	25.8.2023	4 714
733	Rozvod potrubí	1.8.2023	25.8.2023	51 395
734	Armatury	1.8.2023	25.8.2023	9 833
767	Konstrukce zámečnické	1.8.2023	25.8.2023	2 892
783	Nátěry	1.8.2023	25.8.2023	2 332

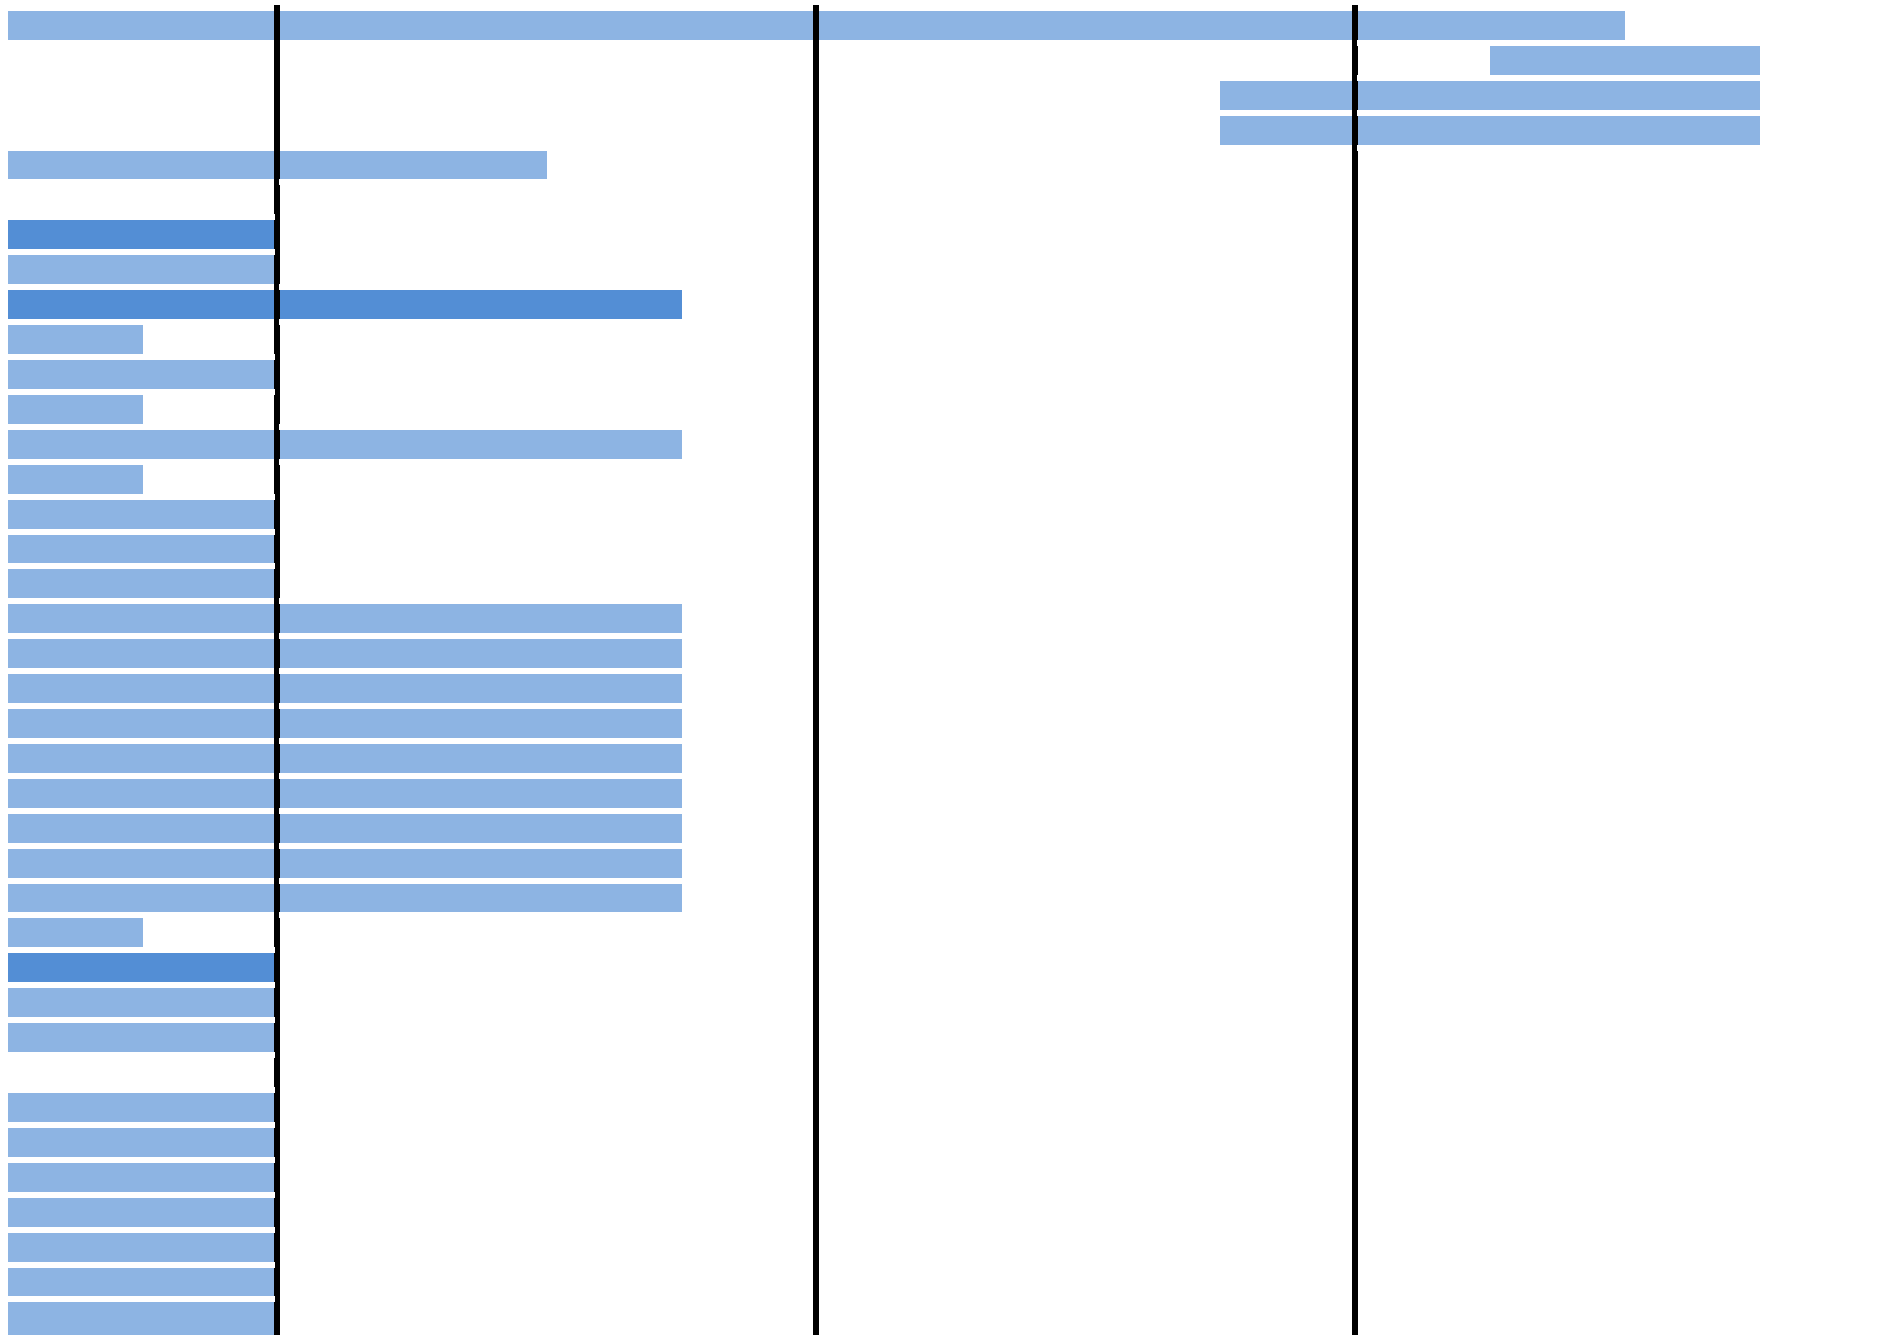






799	Ostatní	1.8.2023	25.8.2023	21 497
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	1.8.2023	9.8.2023	-250
SO 02.6	Výdaje na větrání s využitím odpadního tepla (Zdravotně technická instalace)	1.8.2023	25.8.2023	37 308
61	Úpravy povrchů vnitřní	14.8.2023	25.8.2023	2 916
94	Lešení a stavební výtahy	1.8.2023	25.8.2023	1 092
96	Bourání konstrukcí	1.8.2023	9.8.2023	2 159
99	Staveništní přesun hmot	1.8.2023	25.8.2023	91
713	Izolace tepelné	1.8.2023	25.8.2023	225
721	Vnitřní kanalizace	1.8.2023	25.8.2023	1 594
722	Vnitřní vodovod	1.8.2023	25.8.2023	20 363
724	Strojní vybavení	1.8.2023	25.8.2023	3 653
767	Konstrukce zámečnické	1.8.2023	25.8.2023	413
799	Ostatní	1.8.2023	25.8.2023	4 830
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	1.8.2023	9.8.2023	-28
SO 02.7	Výdaje na instalaci akumulace k fotovoltaickému systému	16.8.2023	12.11.2023	511 747
3	Svislé a kompletní konstrukce	16.8.2023	25.8.2023	11 585
61	Úpravy povrchů vnitřní	16.8.2023	25.8.2023	11 565
64	Výplně otvorů	16.8.2023	25.8.2023	3 100
94	Lešení a stavební výtahy	16.8.2023	25.8.2023	571
96	Bourání konstrukcí	16.8.2023	22.8.2023	4 112
99	Staveništní přesun hmot	16.8.2023	12.11.2023	823
999	Poplatky za skládky	16.8.2023	22.8.2023	54
739.2	Fotovoltaické panely na střeše - střídače a příslušenství	16.10.2023	12.11.2023	448 406
766	Konstrukce truhlářské	16.8.2023	25.8.2023	22 072
771	Podlahy z dlaždic a obklady	16.8.2023	25.8.2023	7 775
776	Podlahy povlakové	16.8.2023	25.8.2023	1 577
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	16.8.2023	22.8.2023	108
SO 03	MŠ - modrý pavilon	25.9.2023	31.5.2024	4 793 698
SO 03.1	Výdaje na zateplení	25.9.2023	31.5.2024	3 798 325
1	Zemní práce	22.4.2024	15.5.2024	44 047
11	Přípravné a přidružené práce	15.4.2024	30.4.2024	4 432
46	Zpevněné plochy	6.5.2024	26.5.2024	37 677
61	Úpravy povrchů vnitřní	26.10.2023	8.11.2023	33 751
62	Úpravy povrchů vnější	2.10.2023	14.4.2024	1 123 582
63	Podlahy a podlahové konstrukce	4.11.2023	17.4.2024	18 880
64	Výplně otvorů	6.11.2023	10.11.2023	31 941
94	Lešení a stavební výtahy	25.9.2023	5.5.2024	116 274
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	6.11.2023	31.5.2024	71 696

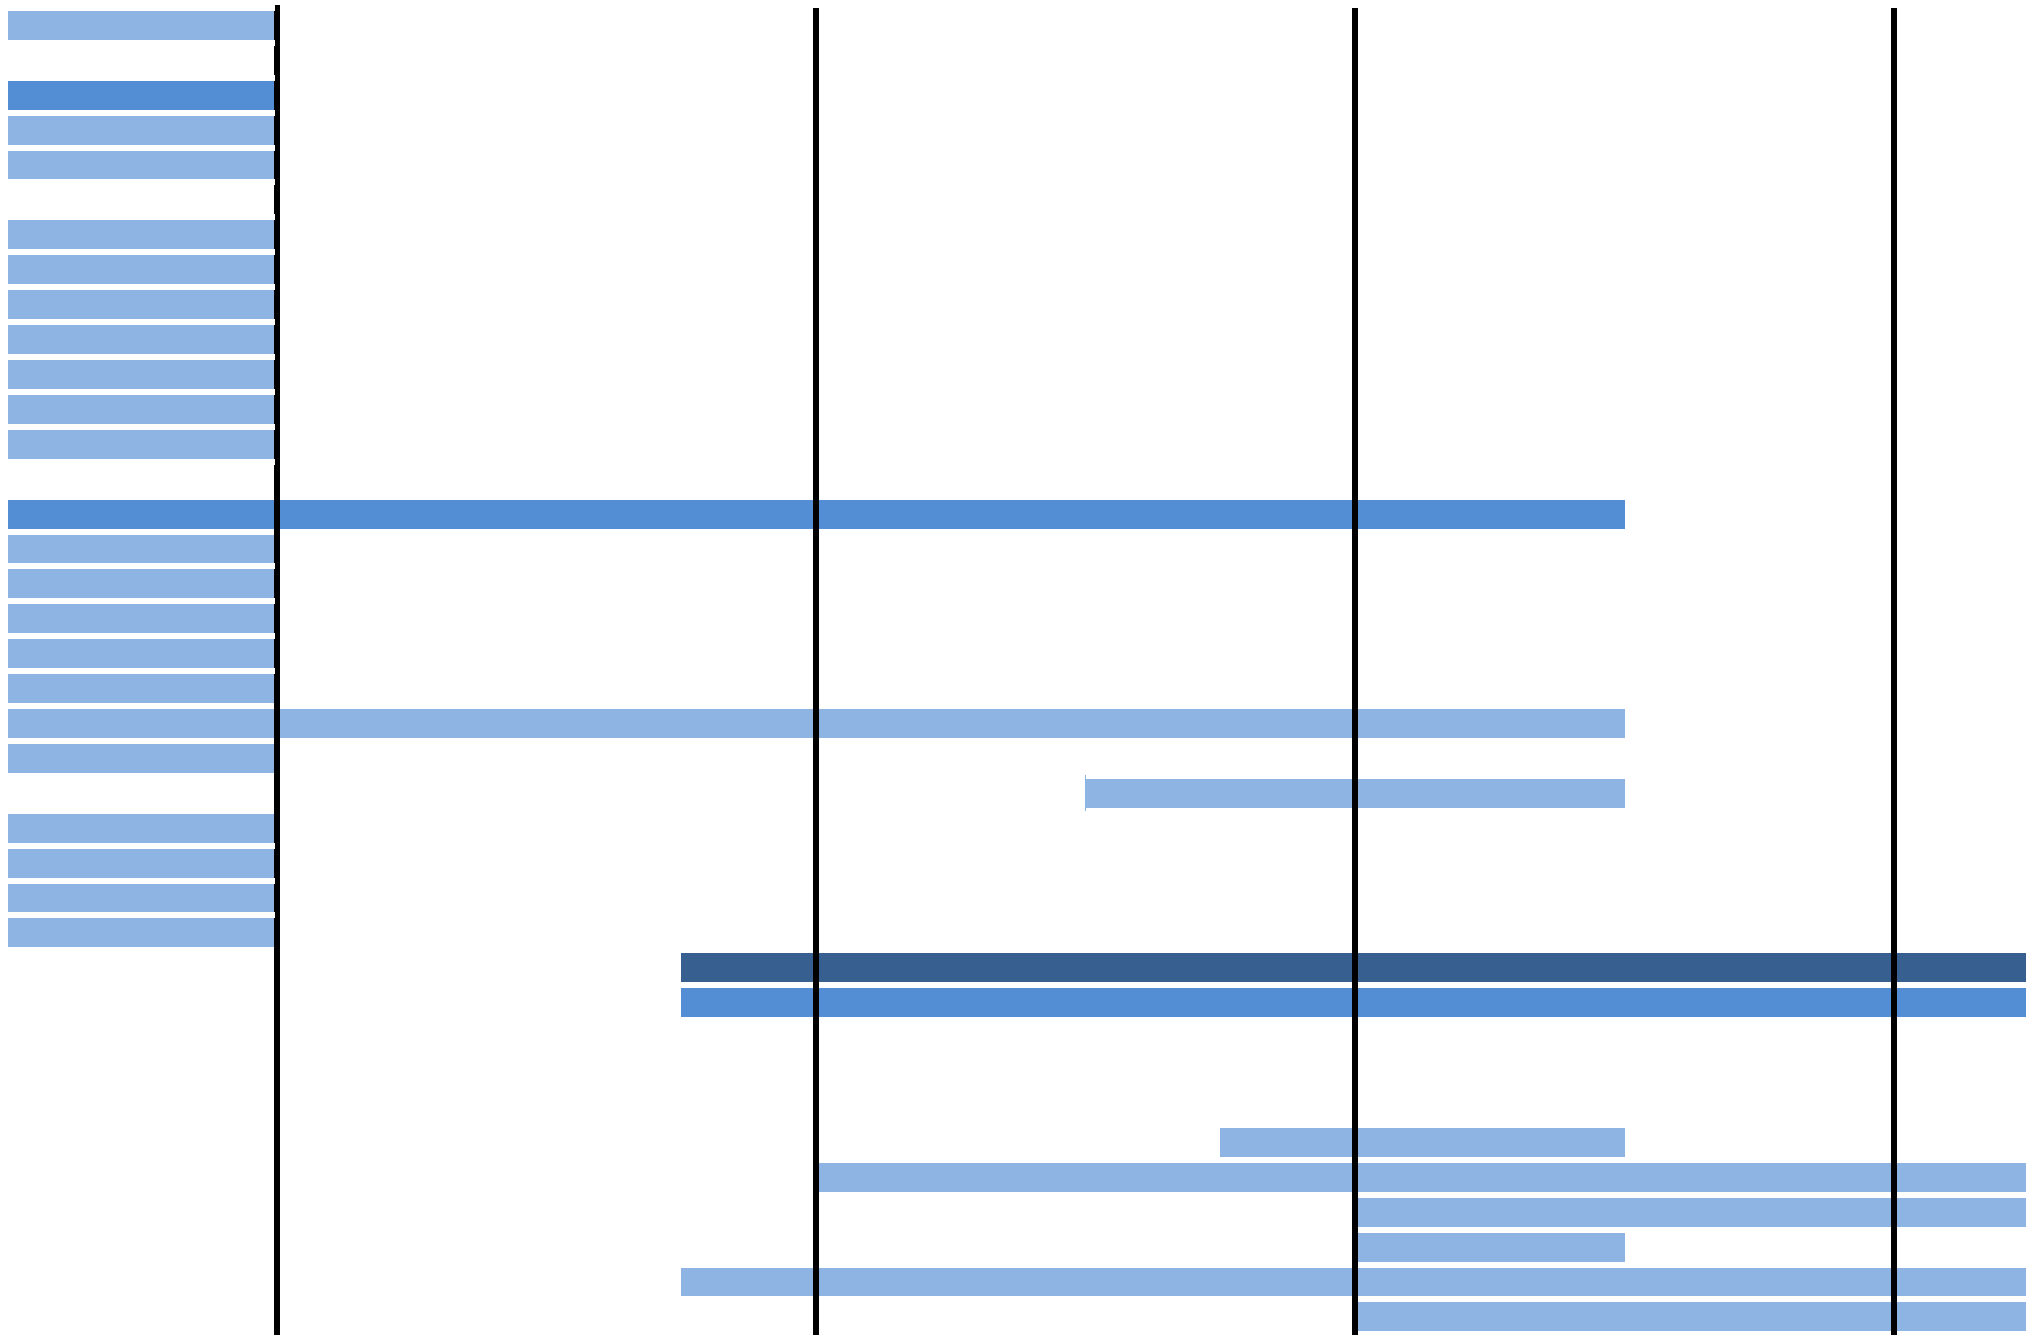




96	Bourání konstrukcí	2.10.2023	26.10.2023	34 487
99	Staveništní přesun hmot	30.9.2023	31.5.2024	27 317
999	Poplatky za skládky	2.10.2023	15.10.2023	42 324
711	Izolace proti vodě	1.5.2024	7.5.2024	33 546
712	Povlakové krytiny	30.9.2023	24.4.2024	521 356
713	Izolace tepelné	4.10.2023	30.4.2024	307 749
721	Vnitřní kanalizace	1.4.2024	14.4.2024	22 807
762	Konstrukce tesařské	19.4.2024	6.5.2024	78 623
764	Konstrukce klempířské	26.4.2024	8.5.2024	190 191
767	Konstrukce zámečnické	16.10.2023	5.5.2024	51 898
769	Otvorové prvky z plastu	23.10.2023	8.11.2023	858 198
783	Nátěry	3.11.2023	3.11.2023	9 754
784	Malby	6.11.2023	10.11.2023	26 443
M21	Elektromontáže	24.4.2024	30.4.2024	8 750
M22	PŘÍSTROJ SPÍNÁČE, PŘEPÍNAČE (s bezšroubovými svorkami)	18.3.2024	31.3.2024	2 020
M23	Bleskosvod	18.3.2024	31.3.2024	70 843
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	2.10.2023	15.10.2023	29 739
SO 03.2	Nezpůsobilé výdaje	10.10.2023	31.5.2024	195 387
1	Zemní práce	22.4.2024	31.5.2024	7 166
11	Přípravné a přidružené práce	10.4.2024	30.4.2024	13 964
46	Zpevněné plochy	6.5.2024	28.5.2024	43 081
94	Lešení a stavební výtahy	10.10.2023	10.11.2023	11 150
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	10.10.2023	14.5.2024	48 068
96	Bourání konstrukcí	10.10.2023	22.10.2023	62
99	Staveništní přesun hmot	10.10.2023	31.5.2024	11 485
999	Poplatky za skládky	10.10.2023	22.10.2023	7 534
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	18.3.2024	31.3.2024	7 520
767	Konstrukce zámečnické	2.11.2023	8.11.2023	8 976
771	Podlahy z dlaždic a obklady	6.11.2023	9.11.2023	1 629
783	Nátěry	24.4.2024	28.4.2024	1 789
M99	Ostatní práce "M"	18.3.2024	31.3.2024	12 460
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	10.10.2023	22.10.2023	20 503
SO 03.3	Výdaje na stínící techniku s ručním ovládáním	3.11.2023	12.11.2023	52 142
767	Konstrukce zámečnické	3.11.2023	12.11.2023	52 142
SO 03.4	Výdaje na stínící techniku s elektronickým ovládáním	3.11.2023	12.11.2023	224 758
767	Konstrukce zámečnické	3.11.2023	12.11.2023	207 060
M21	Elektromontáže	3.11.2023	12.11.2023	11 894
M21.1	Sílnoproudá elektrotechnika - Modrý pavilon - Rozvaděč 1.NP	3.11.2023	12.11.2023	1 790

Blue bar	Blue bar	Blue bar
Blue bar	Blue bar	Blue bar
Blue bar	Blue bar	Blue bar
Blue bar	Blue bar	Blue bar
Blue bar	Blue bar	Blue bar
Blue bar	Blue bar	Blue bar
Blue bar	Blue bar	Blue bar
Blue bar	Blue bar	Blue bar
Blue bar	Blue bar	Blue bar
Blue bar	Blue bar	Blue bar
Blue bar	Blue bar	Blue bar




M21.2	Silnoproudá elektrotechnika - Modrý pavilon - Rozvaděč 2.NP	3.11.2023	12.11.2023	1 790
M22	PŘÍSTROJ SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE (s bezšroubovými svorkami)	3.11.2023	12.11.2023	2 224
SO 03.5	Výdaje na větrání s využitím odpadního tepla (Vzduchotechnika)	10.10.2023	10.11.2023	512 825
61	Úpravy povrchů vnitřní	24.10.2023	10.11.2023	10 906
96	Bourání konstrukcí	10.10.2023	22.10.2023	7 081
99	Staveništní přesun hmot	10.10.2023	10.11.2023	607
999	Poplatky za skládky	10.10.2023	22.10.2023	282
784	Malby	6.11.2023	10.11.2023	12 488
799	Ostatní	10.10.2023	10.11.2023	33 400
M21	Elektromontáže	10.10.2023	10.11.2023	31 687
M21.1	Silnoproudá elektrotechnika - Modrý pavilon - Rozvaděč 1.NP	10.10.2023	10.11.2023	4 577
M21.2	Silnoproudá elektrotechnika - Modrý pavilon - Rozvaděč 2.NP	10.10.2023	10.11.2023	4 518
M22	PŘÍSTROJ SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE (s bezšroubovými svorkami)	10.10.2023	10.11.2023	484
M24	HOP (hlavní ochranná přípojnice)	10.10.2023	10.11.2023	20 585
M24.3	Zařízení č.3 - Modrý pavilon - větrání hery 1.NP	10.10.2023	10.11.2023	194 031
M24.4	Zařízení č.4 - Modrý pavilon - větrání hery 2.NP	10.10.2023	10.11.2023	191 526
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	10.10.2023	22.10.2023	654
SO 03.6	Výdaje na větrání s využitím odpadního tepla (Zdravotně technická instalace)	10.10.2023	10.11.2023	10 261
3	Svislé a kompletní konstrukce	6.11.2023	10.11.2023	3 920
94	Lešení a stavební výtahy	10.10.2023	10.11.2023	168
99	Staveništní přesun hmot	10.10.2023	10.11.2023	40
721	Vnitřní kanalizace	10.10.2023	10.11.2023	4 872
725	Zařizovací předměty	10.10.2023	10.11.2023	869
767	Konstrukce zámečnické	10.10.2023	10.11.2023	304
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	10.10.2023	10.11.2023	87
SO 04	MŠ - růžový pavilon	25.9.2023	31.5.2024	4 827 832
SO 04.1	Výdaje na zateplení	25.9.2023	31.5.2024	3 816 344
1	Zemní práce	22.4.2024	15.5.2024	39 832
11	Přípravné a přidružené práce	15.4.2024	30.4.2024	4 432
46	Zpevněné plochy	6.5.2024	26.5.2024	37 677
61	Úpravy povrchů vnitřní	4.12.2023	13.12.2023	33 751
62	Úpravy povrchů vnější	2.10.2023	14.4.2024	1 135 098
63	Podlahy a podlahové konstrukce	11.12.2023	17.4.2024	18 880
64	Výplně otvorů	11.12.2023	15.12.2023	31 941
94	Lešení a stavební výtahy	25.9.2023	5.5.2024	127 424
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	11.12.2023	31.5.2024	76 546
96	Bourání konstrukcí	13.11.2023	30.11.2023	34 487
99	Staveništní přesun hmot	30.9.2023	31.5.2024	27 541







999	Poplatky za skládky	2.10.2023	15.10.2023	42 324
711	Izolace proti vodě	1.5.2024	7.5.2024	37 652
712	Povlakové krytiny	30.9.2023	24.4.2024	521 356
713	Izolace tepelné	4.10.2023	30.4.2024	307 749
721	Vnitřní kanalizace	1.4.2024	14.4.2024	22 827
762	Konstrukce tesařské	19.4.2024	6.5.2024	78 623
764	Konstrukce klempířské	26.4.2024	8.5.2024	190 191
767	Konstrukce zámečnické	16.10.2023	5.5.2024	51 898
769	Otvorové prvky z plastu	1.12.2023	12.12.2023	858 198
783	Nátěry	8.12.2023	8.12.2023	9 754
784	Malby	7.12.2023	15.12.2023	26 443
M21	Elektromontáže	24.4.2024	30.4.2024	8 560
M22	PŘÍSTROJ SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE (s bezšroubovými svorkami)	18.3.2024	31.3.2024	1 790
M23	Bleskosvod	18.3.2024	31.3.2024	61 630
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	2.10.2023	15.10.2023	29 739
SO 04.2	Nezpůsobitelné výdaje	15.11.2023	31.5.2024	213 340
1	Zemní práce	22.4.2024	31.5.2024	8 584
11	Přípravné a přidružené práce	10.4.2024	30.4.2024	12 825
2	Základy a zvláštní zakládání	29.4.2024	8.5.2024	15 694
46	Zpevněné plochy	6.5.2024	28.5.2024	42 740
94	Lešení a stavební výtahy	15.11.2023	15.12.2023	11 150
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	15.11.2023	31.5.2024	48 068
96	Bourání konstrukcí	15.11.2023	19.11.2023	62
99	Staveništní přesun hmot	15.11.2023	31.5.2024	16 275
999	Poplatky za skládky	15.11.2023	19.11.2023	6 941
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	18.3.2024	31.3.2024	7 520
767	Konstrukce zámečnické	15.11.2023	21.11.2023	8 976
771	Podlahy z dlaždic a obklady	6.12.2023	13.12.2023	1 629
783	Nátěry	24.4.2024	28.4.2024	1 789
M99	Ostatní práce "M"	18.3.2024	31.3.2024	12 460
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	15.11.2023	19.11.2023	18 627
SO 04.3	Výdaje na stínící techniku s ručním ovládním	11.12.2023	17.12.2023	52 142
767	Konstrukce zámečnické	11.12.2023	17.12.2023	52 142
SO 04.4	Výdaje na stínící techniku s elektronickým ovládním	11.12.2023	17.12.2023	224 754
767	Konstrukce zámečnické	11.12.2023	17.12.2023	207 060
M21	Elektromontáže	11.12.2023	17.12.2023	11 894
M21.1	Silnoproudá elektrotechnika - Růžový pavilon - Rozvaděč 1.NP	11.12.2023	17.12.2023	1 788
M21.2	Silnoproudá elektrotechnika - Růžový pavilon - Rozvaděč 2.NP	11.12.2023	17.12.2023	1 788




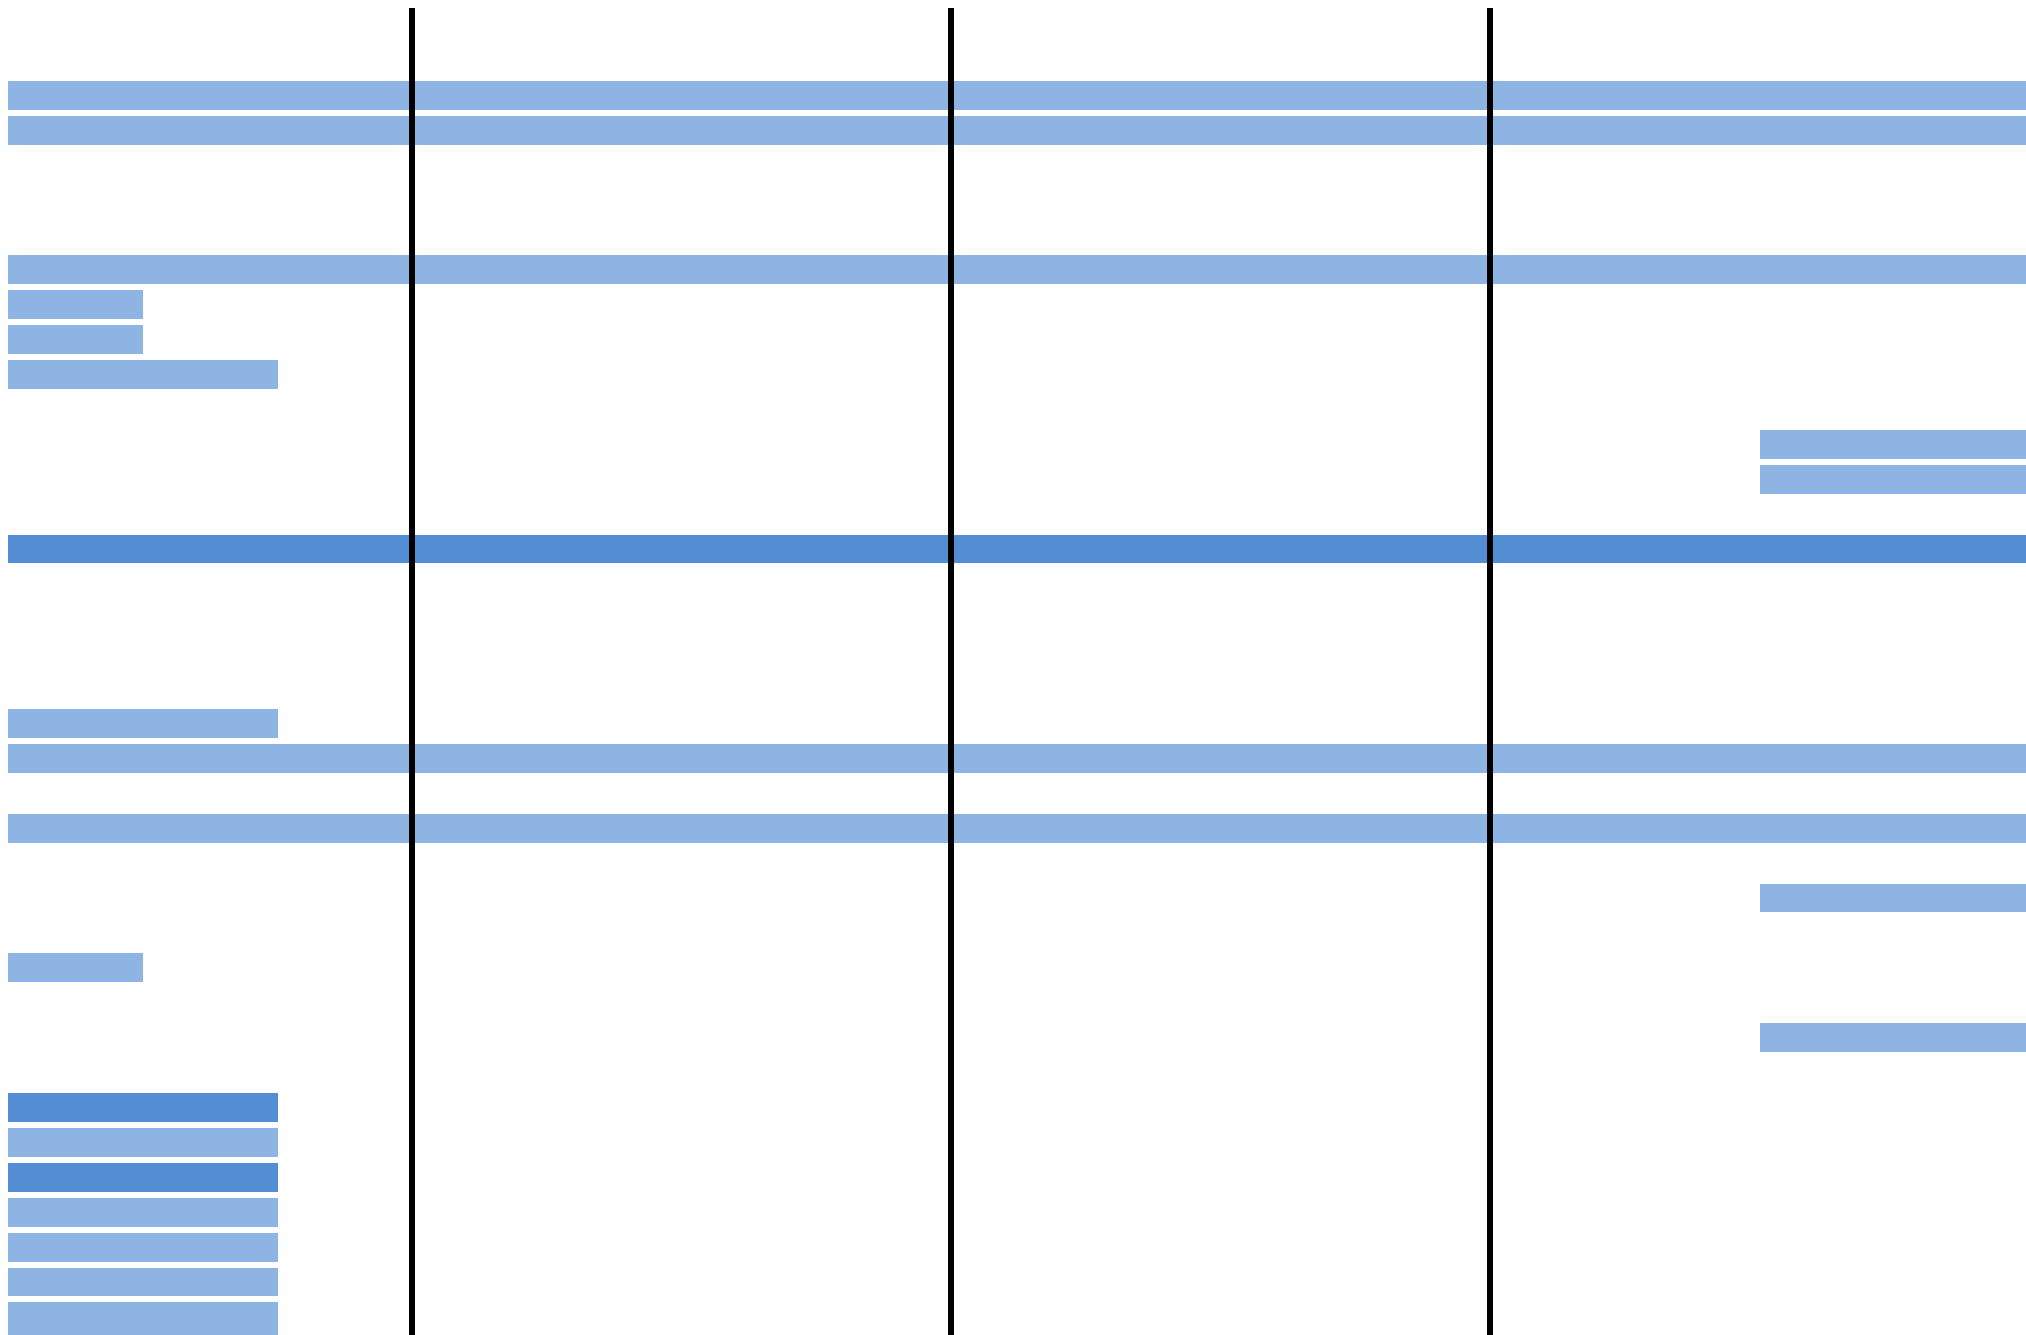



M22	PŘÍSTROJ SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE (s bezšroubovými svorkami)	11.12.2023	17.12.2023	2 224
SO 04.5	Výdaje na větrání s využitím odpadního tepla (Vzduchotechnika)	15.11.2023	15.12.2023	510 990
61	Úpravy povrchů vnitřní	4.12.2023	15.12.2023	10 906
96	Bourání konstrukcí	15.11.2023	26.11.2023	7 081
99	Staveništní přesun hmot	15.11.2023	15.12.2023	607
999	Poplatky za skládky	15.11.2023	26.11.2023	282
784	Malby	11.12.2023	15.12.2023	12 488
799	Ostatní	15.11.2023	15.12.2023	33 400
M21	Elektromontáže	15.11.2023	15.12.2023	31 687
M21.1	Silnoproudá elektrotechnika - Růžový pavilon - Rozvaděč 1.NP	15.11.2023	15.12.2023	4 576
M21.2	Silnoproudá elektrotechnika - Růžový pavilon - Rozvaděč 2.NP	15.11.2023	15.12.2023	4 576
M22	PŘÍSTROJ SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE (s bezšroubovými svorkami)	15.11.2023	15.12.2023	484
M24	HOP (hlavní ochranná přípojnice)	15.11.2023	15.12.2023	18 693
M24.5	Zařízení č.5 - Růžový pavilon - větrání hery 1.NP	15.11.2023	15.12.2023	194 031
M24.6	Zařízení č.6 - Růžový pavilon - větrání hery 2.NP	15.11.2023	15.12.2023	191 526
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	15.11.2023	26.11.2023	654
SO 04.6	Výdaje na větrání s využitím odpadního tepla (Zdravotně technická instalace)	15.11.2023	15.12.2023	10 261
3	Svislé a kompletní konstrukce	11.12.2023	14.12.2023	3 920
94	Lešení a stavební výtahy	15.11.2023	15.12.2023	168
99	Staveništní přesun hmot	15.11.2023	15.12.2023	40
721	Vnitřní kanalizace	15.11.2023	15.12.2023	4 872
725	Zařizovací předměty	15.11.2023	15.12.2023	869
767	Konstrukce zámečnické	15.11.2023	15.12.2023	304
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	15.11.2023	30.11.2023	87
SO 05	Spojovací chodba A, B	13.11.2023	31.5.2024	3 274 745
SO 05.1	Způsobilé výdaje	13.11.2023	31.5.2024	2 755 663
3	Svislé a kompletní konstrukce	20.11.2023	3.12.2023	438 278
61	Úpravy povrchů vnitřní	27.11.2023	15.12.2023	102 251
62	Úpravy povrchů vnější	11.3.2024	17.4.2024	383 490
63	Podlahy a podlahové konstrukce	6.12.2023	21.4.2024	33 668
64	Výplně otvorů	8.12.2023	12.12.2023	11 925
94	Lešení a stavební výtahy	16.11.2023	12.5.2024	106 103
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	13.12.2023	31.5.2024	13 230
96	Bourání konstrukcí	13.11.2023	1.12.2023	57 933
99	Staveništní přesun hmot	13.11.2023	31.5.2024	44 493
999	Poplatky za skládky	13.11.2023	7.4.2024	13 322
712	Povlakové krytiny	31.3.2024	1.5.2024	380 152
713	Izolace tepelné	3.4.2024	8.5.2024	171 379

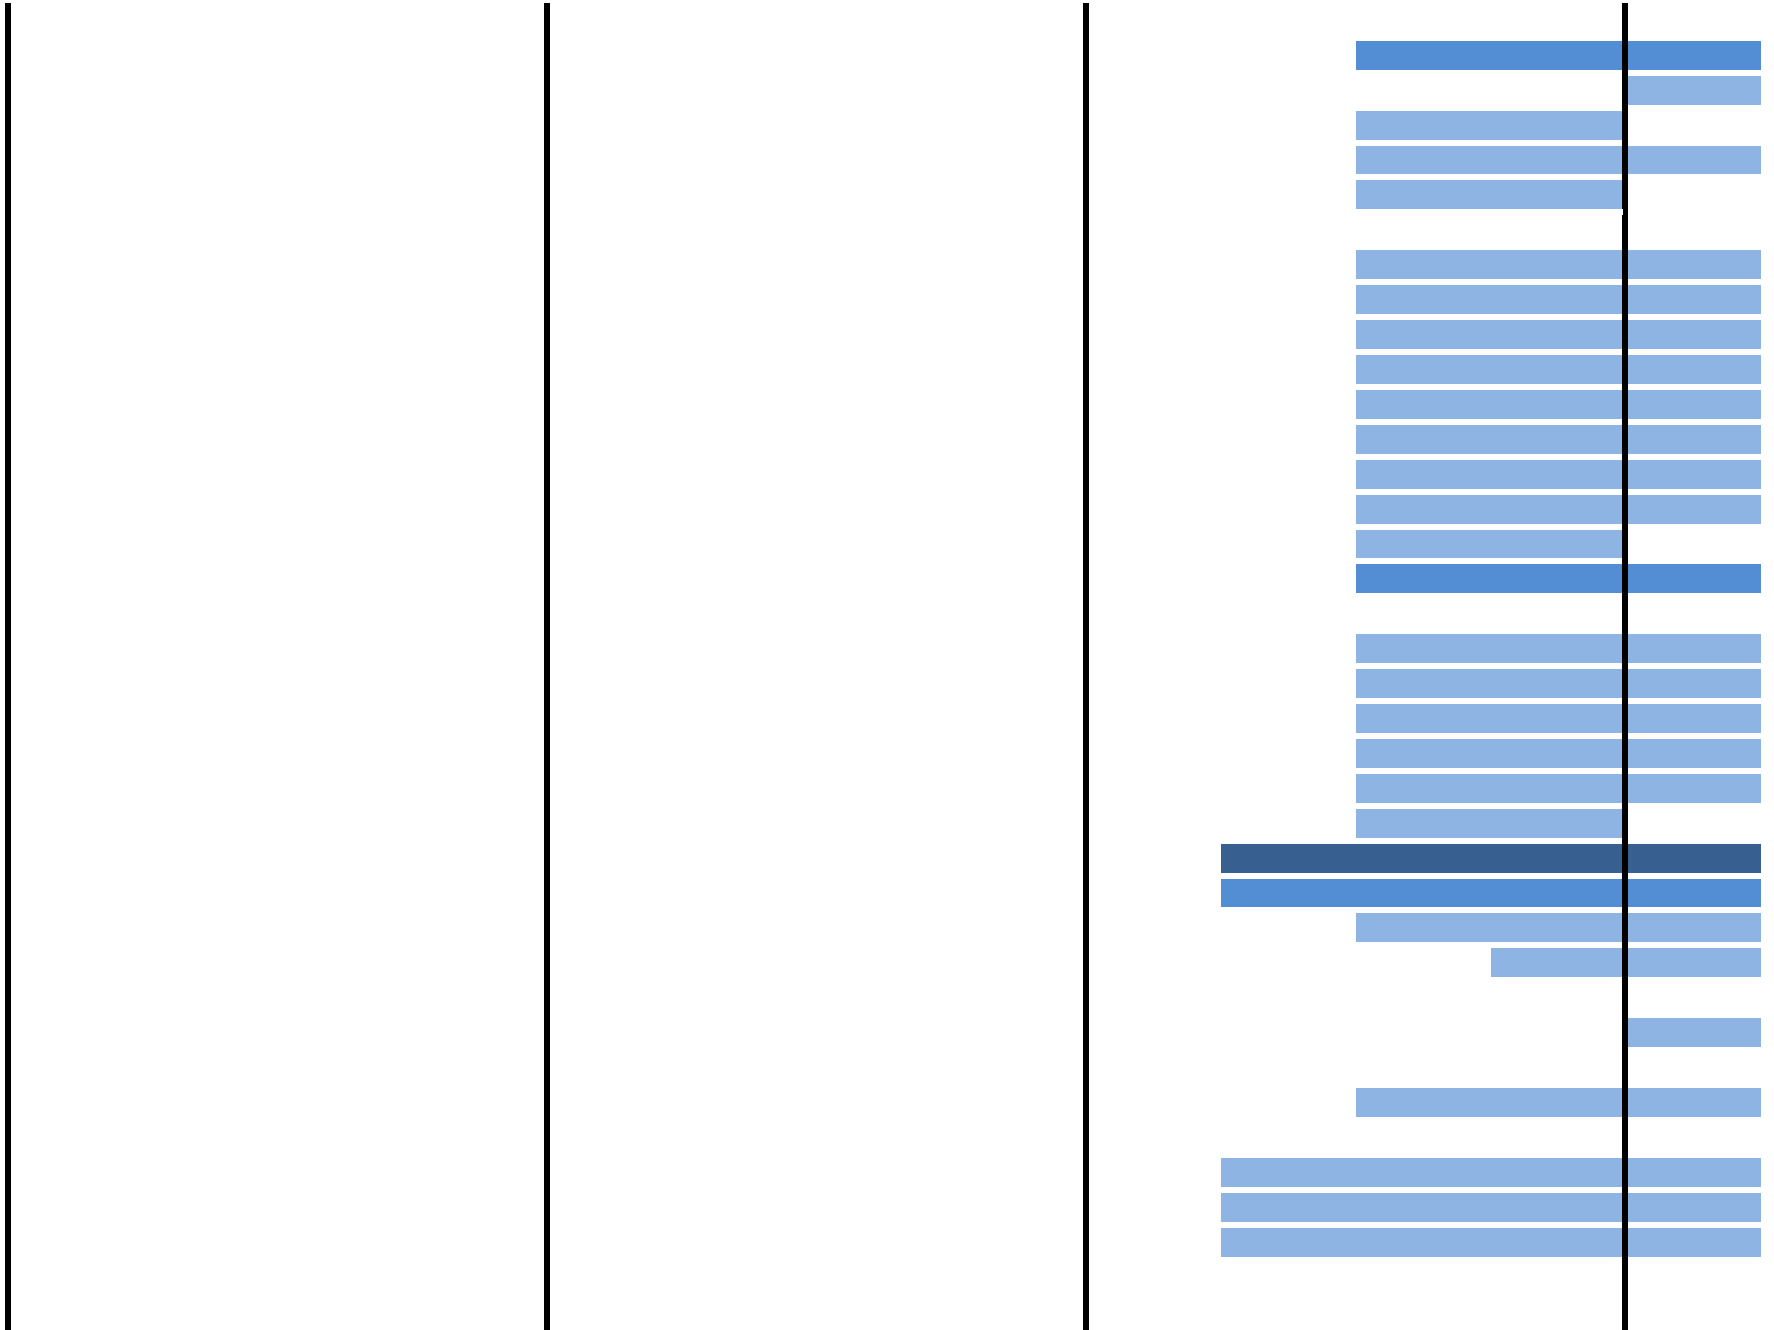



721	Vnitřní kanalizace	15.4.2024	24.4.2024	34 308
762	Konstrukce tesařské	29.4.2024	8.5.2024	85 399
764	Konstrukce klempířské	29.4.2024	10.5.2024	234 756
766	Konstrukce truhlářské	4.12.2023	7.12.2023	69 524
769	Otvorové prvky z plastu	1.12.2023	8.12.2023	519 921
783	Nátěry	7.12.2023	7.12.2023	3 154
784	Malby	7.12.2023	14.12.2023	29 078
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	13.11.2023	7.4.2024	23 298
SO 05.2	Nezpůsobitelné výdaje	13.12.2023	31.5.2024	519 083
1	Zemní práce	22.4.2024	29.5.2024	40 670
11	Přípravné a přidružené práce	8.4.2024	22.4.2024	30 580
46	Zpevněné plochy	8.5.2024	29.5.2024	133 929
62	Úpravy povrchů vnější	15.4.2024	21.4.2024	13 369
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	13.12.2023	12.5.2024	62 250
99	Staveništní přesun hmot	13.12.2023	31.5.2024	42 560
999	Poplatky za skládky	8.4.2024	22.4.2024	11 112
711	Izolace proti vodě	25.4.2024	3.5.2024	36 217
767	Konstrukce zámečnické	15.5.2024	22.5.2024	59 160
783	Nátěry	13.5.2024	26.5.2024	61 746
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	8.4.2024	22.4.2024	27 490
	Cena za měsíc			3 318
	Cena za rok			

3 142	4 200 777	5 391 485	3 885 781	
		25 766 884		

3 101 054	799 297	747 730	1 199 349
			0

