











Dodatek č. 1**ke smlouvě o dílo ze dne 09. 06. 2023****č. j. KRPK-41531-12/ČJ-2023-1900VZ**

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:

1. „Objednatel“

Česká republika – Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
Zastoupený: **plk. Mgr. Jiří Matouš**, ředitel krajského ředitelství v zastoupení
náměstek ředitele krajského ředitelství pro vnější službu
Sídlo: Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary – Dvory
IČO: 72051612
DIČ: CZ72051612
Bankovní ústav: 
Číslo účtu: 
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon: 
Datová schránka: upshp5u

2. „Zhotovitel“

JÍŠA s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl C, vložka 89713
Zastoupený: Josef Jíša, jednatel
Sídlo: Kolčavka 1/68, 190 00 Praha 9
IČO: 26724332
DIČ: CZ26724332
Bankovní ústav: 
Číslo účtu: 
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon: 
Datová schránka: wihd2gm

I.

Změna termínu dokončení díla

Z důvodů uvedených v úředním záznamu č. j. KRPK-40874-14/ČJ-2023-1900MZ ze dne 26. 7. 2023 a žádosti zhotovitele ze dne 28. 7. 2023, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na termínu dokončení díla (předání projektové dokumentace) nejpozději do 31. 08. 2023.


II.

Závěrečné ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podepsání oprávněnými osobami za obě smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě a přílohy jsou jeho nedílnou součástí.

Přílohy:

- 1) Úřední záznam KRPK-40874-14/ČJ-2023-1900MZ ze dne 1. 8. 2023
- 2) Žádost zhotovitele ze dne 28. 7. 2023

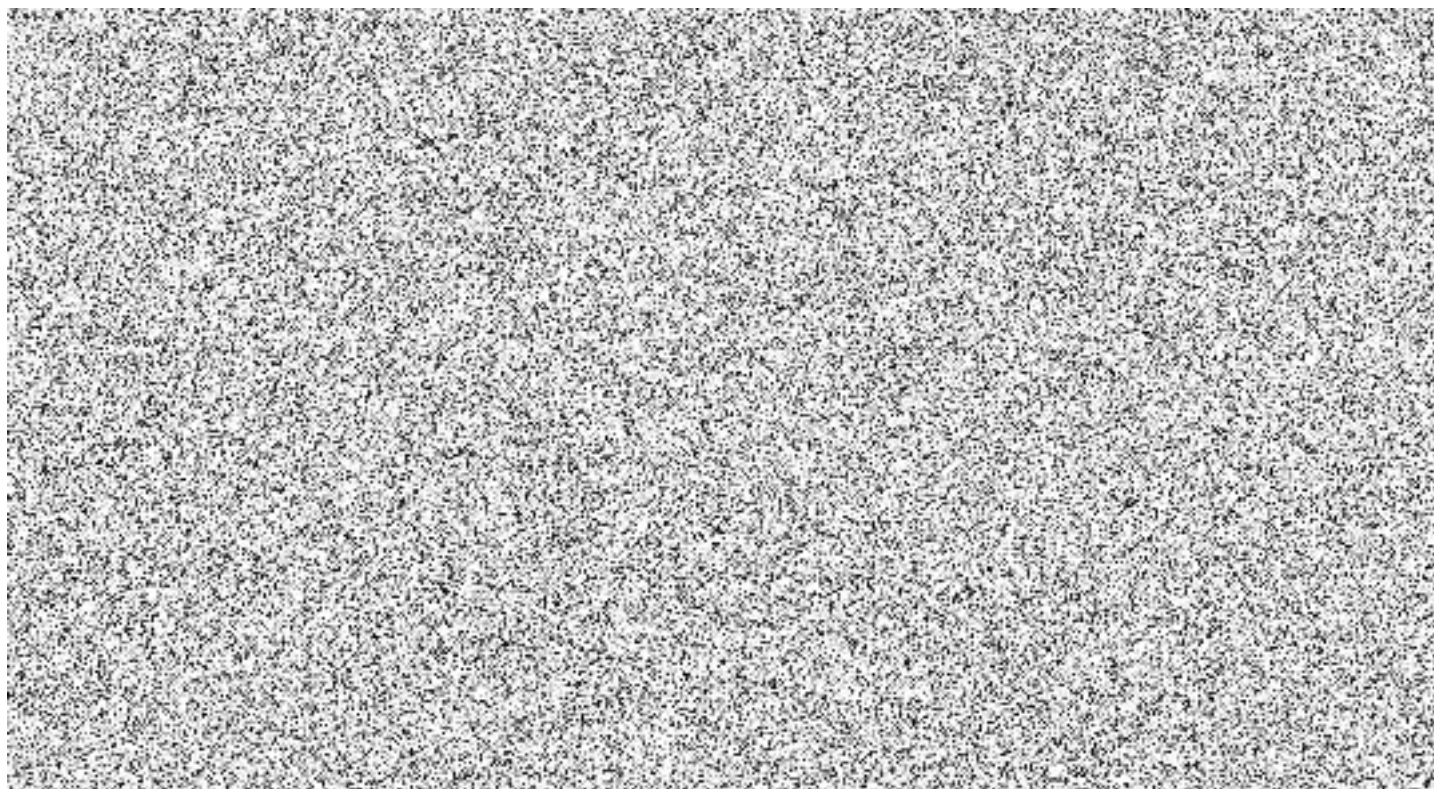

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
oddělení materiálně-technického zabezpečení
Dobrovského 1935, 356 04 Dolní Rychnov

Č. j. KRPK-40874-14/ČJ-2023-1900MZ

Dolní Rychnov 1. srpna 2023

Počet stran: 1

Úřední záznam

V souvislosti s montáží plovoucí garáže č. 106 953 na VN Skalka v obci Pomezí u Chebu, která vlivem nepříznivého počasí (extrémní sucho) nadále probíhá, jsem ke Smlouvě o dílo pod ČJ:KRPK-41531-12/ČJ-2023-1900VZ sepsal tento ÚZ.


Zástupce zhotovitele smlouvy o dílo f. Jíša s.r.o. pan [REDACTED] provádějící a řídící práce na plovoucí garáži mne v průběhu měsíce červenec upozornil na komplikace vzniklé s neočekávaným nadměrným úbytkem vody ve VN Skalka v místě montáže, tedy v obci Pomezí.

Konstrukce plovoucí garáže byla cíleně montována z větší části na hladině, aby se jí pomocí přizvednutí jeřábem podařilo přesunout na hladinu a poté by následoval převoz garáže na vývaziště, kde by došlo k finálnímu opláštění garáže. Před tímto krokem však v průběhu měsíce došlo k výraznému poklesu hladiny VN Skalka, kdy samotná konstrukce je z větší části nyní na suchu a dle vyjádření [REDACTED] není možné plovoucí garáž bezpečně přemístit na vodní hladinu, aniž by se plovoucí garáž o dno VN Skalka nepoškodila. Do současné doby se čekalo na deště a zvýšení vodní hladiny, což se však nestalo, proto byl [REDACTED] nucen zvolit jiné řešení přemístění plovoucí garáže na hladinu a to pomocí vzduchových vaků, které si však musí dodatečně obstarat, neboť jimi nedisponuje.

Vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem jsem se telefonicky spojil se zástupcem Povodí Ohře provoz Cheb p. [REDACTED] aby mi potvrdil danou situaci a uvedl příčinu poklesu vodní hladiny VN Skalka. [REDACTED] mi sdělil, že pokles vodní hladiny VN Skalka vznikl jako u jiných vod z čistě hydrologických důvodů, tedy vlivem extrémního sucha a absenci dešťových srážek. K upouštění nádrže v tomto období nedocházelo. Ode dne 26.6.2023 až k dnešnímu dni vodní hladina VN Skalka postupně klesla o 80 cm.

Na základě zjištěných okolností a po vzájemné domluvě jsem od zhotovitele díla spol. Jíša s.r.o. dne 1.8.2023 emailem obdržel Žádost o prodloužení termínu zhotovení díla, ve kterém je uvedeno zdůvodnění žádosti s navrhovaným termínem ukončení prací do 31.8.2023.

Po vyhodnocení dané situace navrhuji termín realizace celé akce prodloužit do 31.8.2023 včetně.



Odběratel:

pan: [REDACTED]
Česká republika – Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary
IČ: 720 51 612
E: [REDACTED]
M: [REDACTED]

Dodavatel:

[REDACTED]
JISA s.r.o.
Kolčavka 68/1, 190 00 Praha 9
IČ: 267 24 332
E: [REDACTED]
M: [REDACTED]

VĚC: ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU ZHOTOVENÍ DÍLA

Vážený pane [REDACTED]

z důvodu extrémního sucha a snížení hladiny nádrže Vás žádáme o prodloužení termínu zhotovení díla.

Naše firma na základě Smlouvy o dílo KRPK-41531-12/ČJ-2023-1900VZ ze dne 9.6.2023 vykonala veškeré možné činnosti spojené s rozebráním, přepravou a složením garáže na vodní nádrži Skalka tak, jak je uvedeno ve smlouvě. V průběhu montáže však opadla hladina nádrže na takovou úroveň, že se místo kotviště pro stavbu garáže ocitlo na suchu, čímž z důvodu tzv. „vyšší moci“ nemohla být garáž přepravena na požadované místo. Zdvořile proto žádáme o prodloužení termínu zhotovení díla do doby, než hladina vody vystoupá na takovou úroveň, aby bylo možno garáž bezpečně odvléci na požadované místo, a to nejpozději do 31.8.2023.

Předem děkujeme za kladné stanovisko a děkujeme za pochopení.

V Praze, dne 28.07.2023

