

Dodatek č. 1**ke Smlouvě o dílo č. j. KRPK-36435-11/ČJ-2023-1900VZ uzavřené dne 2. 6. 2023**

Č. j. KRPK-36435-14/ČJ-2023-1900VZ

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
mezi těmito smluvními stranami:**Objednatel****Česká republika – Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje**

Zastoupený:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

Kontaktní adresa:

Kontaktní osoba:

E-mail:

Telefon:

Datová schránka:

Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary – Dvory

72051612

CZ72051612

upshp5u

a

Zhotovitel**IZOWEN a. s. zapsána v OR vedený KS v Ústí nad Labem, B 2718**

Zastoupený:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

E-mail:

Telefon:

Datová schránka:

Litvínov, Masarykovo nám. 292, PSC: 436 01

14891115

CZ14891115

cc4be8

I.

Změna termínu dokončení díla

1. Na základě písemně zdůvodněné žádosti zhotovitele ze dne 19. 9. 2023 a uznání důvodů ze strany objednatele, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla **do 30. 11. 2023.**
2. Žádost zhotovitele a souhlas objednatele jsou přílohami tohoto dodatku č. 1.

II.

Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Přílohy:

- Žádost zhotovitele ze dne 19. 9. 2023
- Úřední záznam objednatele č. j. KRPK-18618-56/ČJ-2023-1900MN ze dne 22. 9. 2023


V Litvínově dne

V Karlových Varech dne

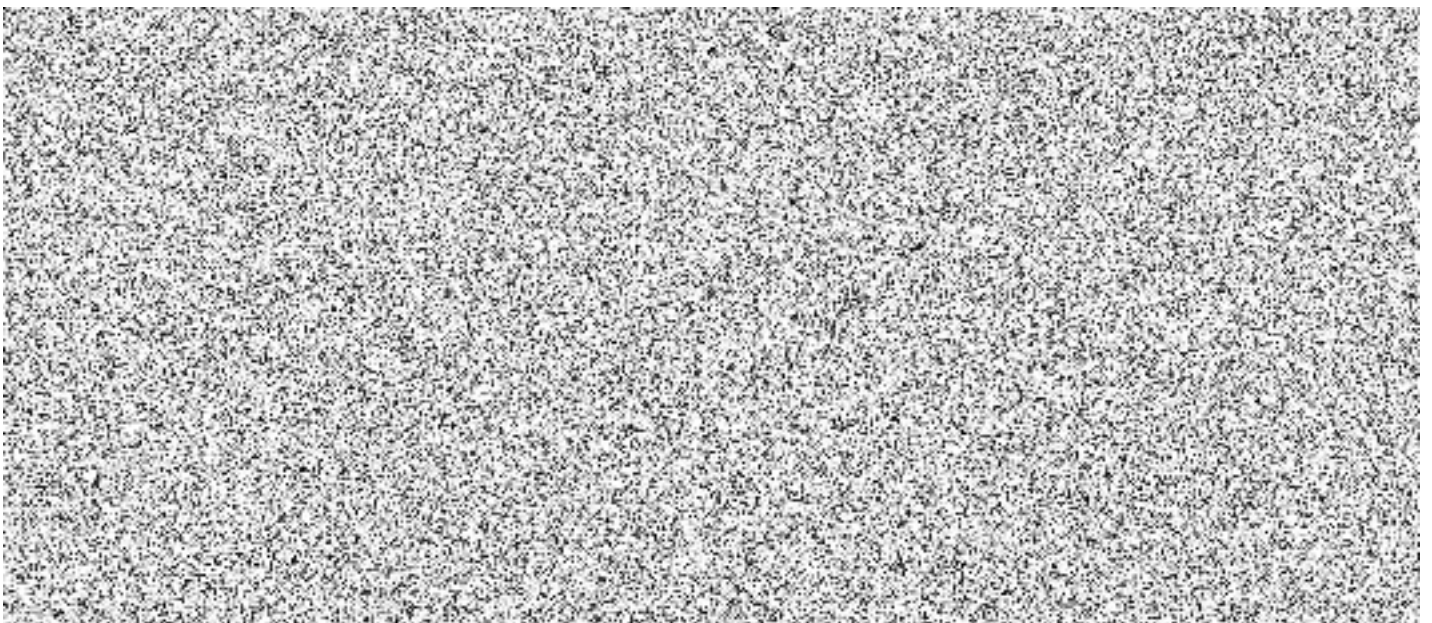

Dobrý den,
v průběhu realizace díla na zakázce OOP Mariánské Lázně, kdy se odstraňovali dřevěné obklady na stěnách a původní podlahové krytiny v určitých místech objektu, vyšlo najevo, že podkladní plochy byly v nevyhovujícím stavu pro následnou výmalbu či pokládku nového zátěžového PVC. Tyto skutečnosti nemohli být předem známy.
Z tohoto důvodu žádáme o posunutí termínu dokončení díla a to do: 30.11.2023.

Děkuji
S pozdravem





Č.j. KRPK-18618-56/ČJ-2023-1900MN

Dolní Rychnov, 22. září 2023

Počet listů: 1

Počet příloh: 1

Úřední záznam

na akci **KŘP Kvk – P 2.0** Obnova podlahových krytin a výmalba **OOP Mariánské Lázně**

Na základě žádosti zhotovitele, firmy IZOWEN a.s., IČO: 14891115, doručené dne 22.9.2023 žádáme o vyhotovení Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. j. KRPK-36435-11/ČJ-2023-1900VZ ze dne 1. 6. 2023 s názvem „KŘP Kvk – P 2.0 Obnova podlahových krytin a výmalba OOP Mariánské Lázně“, e.č.: 114V352003100.

Důvod je uveden v žádosti zhotovitele, která je přílohou tohoto úředního zaznamu.

Proto vznikl požadavek na prodloužení termínu realizace akce **do 30.11.2023**.

Firma: IZOWEN a.s.
Masarykovo nám. 292
436 01
IČO 14891115

Příloha: Žádost o prodloužení termínu plnění

