

# Dodatek č.5 SMLOUVY O DÍLO z 23.12.2021

132/2S/2021

na akci : „**Multifunkční sportovní hala Slaný**“

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

## 1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

1.1

**Objednatel** : **Město Slaný**  
Sídlo : Velvarská 136, 274 01 Slaný  
IČO : 00234877  
Bankovní ústav : ██████████  
Číslo účtu : ██████████  
Zastoupený : **Mgr. Martin Hrabánek**, starosta

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních : **Mgr. Martin Hrabánek**, starosta  
tel.:602 234 859  
e-mail: hrabaneck@meuslany.cz

b) ve věcech technických : ██████████  
██████████  
██████████

1.2

**Zhotovitel** : **METALL QUATRO spol. s r.o.**  
Sídlo : Vysoká Pec 600, 431 59 Vysoká Pec  
IČO : 61538213  
DIČ : CZ61538213  
Bankovní ústav : ██████████  
Číslo účtu : ██████████  
Zastoupený : ██████████

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních : I ██████████  
██████████  
██████████

b) ve věcech technických : ██████████  
██████████  
██████████

**Strany se dohodly na změnách následujících článků SoD :**

**Mění se článek 3. takto:**

### 3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

**Mění se odstavec 3.1 b)**

Původní znění ( z dodatku č. 3 SoD ) :

b) Stanovený termín ukončení plnění a protokolárního předání a převzetí díla (z původ. 9.10.2023 ) na **30.11.2023**

Nové znění :

b) Stanovený termín ukončení plnění a protokolárního předání a převzetí díla na **31.12.2023**

## mění se článek 4. takto:

### 4. CENA DÍLA

#### Mění se odstavec 4.1

Původní znění ( z dodatku č.4 SoD ) :

- 4.1 Cena díla zahrnuje **veškeré náklady** potřebné ke zhotovení díla a vynaložené v přímé či nepřímé souvislosti s ním v rozsahu dle čl. 2. a v ostatních ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až ke dni podpisu dodatku č.1 smlouvy, náklady za vícepráce a méněpráce dle dodatku č.2 smlouvy, náklady za vícepráce a méněpráce dle dodatku č.3 smlouvy, a náklady za vícepráce a méněpráce dle přílohy tohoto dodatku č.4 smlouvy.

Nové znění :

- 4.1 Cena díla zahrnuje **veškeré náklady** potřebné ke zhotovení díla a vynaložené v přímé či nepřímé souvislosti s ním v rozsahu dle čl. 2. a v ostatních ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až ke dni podpisu dodatku č.1 smlouvy, náklady za vícepráce a méněpráce dle dodatků č.2, č.3 a č.4 smlouvy a **náklady za vícepráce a méněpráce** dle přílohy **tohoto dodatku č.5 smlouvy**.

#### Mění se odstavec 4.2

Původní znění ( z dodatku č.4 SoD ) :

- 4.2 Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, ZL.č.1, ZL.č.2, ZL.č.3, ZL.č.4 a **ZL.č.5** jako cena pevná a činí:

**125 352 957,05 (bez DPH)**

( stodvacetpětmilionů třistapadesátdvatisíc devětsetpadesátsedm korun českých a pět haléřů)

26 324 120,98 Kč DPH 21%

**151 677 078,03 Kč (včetně DPH)**

(stopadesátjednamilionů šestsetšestmdesátsedmtisíc sedmdesátosm korun českých a tři haléře).

Nové znění :

- 4.2 Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, ZL.č.1, ZL.č.2, ZL.č.3, ZL.č.4, ZL.č.5 a **ZL.č.6** jako cena pevná a činí:

**127 651 123,32 (bez DPH)**

( stodvacetsedmmilionů šestsetpadesátjedentisíc stodvacettri korun českých a třicetdva haléřů)

26 806 735,90 Kč DPH 21%

**154 457 859,21 Kč (včetně DPH)**

(stopadesátčtyřmilionů čtyřistapadesátsedmtisíc osmsetpadesátdevět korun českých a dvacetjedna haléřů).

#### Mění se odstavec 4.3

Původní znění ( z dodatku č.3 SoD ) :

- 4.3 Cena díla je stanovena na základě položkového rozpočtu vypracovaného zhotovitelem, který je součástí Dodatku č.1 smlouvy o dílo, rozpočtů ZL.č.2 a ZL.č.3 k Dodatku č.2 smlouvy o dílo, a ZL.č.4 k Dodatku č.3 smlouvy o dílo a **rozpočtů ke ZL.č.5** k tomuto dodatku č.4 smlouvy o dílo. Tyto položkové rozpočty budou nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem dílčí

fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jejich základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro měsíční fakturaci zhotovitele. **Položkový rozpočet ke ZL.č.5 tvoří přílohu tohoto dodatku** smlouvy. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb a ve smyslu odstavce 4.1 tohoto dodatku. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu díla. Veškeré náklady zhotovitele vyplývající ze smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

#### Nové znění :

4.3 Cena díla je stanovena na základě položkového rozpočtu vypracovaného zhotovitelem, který je součástí Dodatku č.1 smlouvy o dílo, rozpočtů ZL.č.2 a ZL.č.3 k Dodatku č.2 smlouvy o dílo, ZL.č.4 k Dodatku č.3 smlouvy o dílo, ZL.č.5 k Dodatku č.4 smlouvy o dílo a **rozpočtů ke ZL.č.6** k tomuto dodatku č.5 smlouvy o dílo. Tyto položkové rozpočty budou nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem dílčí fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jejich základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro měsíční fakturaci zhotovitele. **Položkový rozpočet ke ZL.č.6 tvoří přílohu tohoto dodatku** smlouvy. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb a ve smyslu odstavce 4.1 tohoto dodatku. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu díla. Veškeré náklady zhotovitele vyplývající ze smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

#### **Mění se článek 25. takto:**

### **25. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

#### **Doplňuje se odstavec 25.9.5, 25.10.5, 25.11.5, 25.12.5**

25.9.5 Dodatek č.5 Smlouvy je vyhotoven v elektronickém originále, přičemž jak objednatel, tak zhotovitel obdrží elektronický originál smlouvy.

25.10.5 Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č.5 smlouvy.

25.11.5 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č.5 smlouvy před jeho podpisem přečetly a s jejím obsahem souhlasí, že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

25.12.5 Přílohami tohoto dodatku smlouvy jako jeho nedílné součásti jsou dokumenty:

- Odsouhlasení změny č.6
- Rozpočet ke ZL.č.6

#### **Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.**

**Uzavření dodatku č.5 smlouvy z 23.12.2021 schválila rada města dne 18. 10. 2023 pod číslem usnesení 02/28/2023/RM.**

Ve Slaném, dne .....

Objednatel

**Mgr.  
Martin  
Hrabánek**

Digitálně podepsal  
Mgr. Martin  
Hrabánek  
Datum: 2023.10.24  
07:51:52 +02'00'

.....  
Město Slaný

**Mgr. Martin Hrabánek**  
starosta

Ve Vysoké Peci, dne .....

Zhotovitel

**Ing. Milan  
Karfík**

Podepsal Ing. Milan Karfík  
DN: cn=Ing. Milan Karfík, c=CZ,  
o=Ing. Milan Karfík, ou=1,  
email=m.karfik@seznam.cz  
Datum: 2023.10.23 12:53:58  
+02'00'

.....  
METALL QUATRO spol. s r.o.

**Ing. Milan Karfík ml.**  
Jednatel

MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ HALA SLANÝ

09.10.2023

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ 1 - 6

ZL č.	SoD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
název	zákl.smlouva	INDEXACE CEN	ZEMNÍ PRÁCE,BETON	FVE	STAVEBNÍ, ELE	ÚPRAVNA VODY	OSTATNÍ	0	0	0	0
počáteční	Cena díla bez DPH	98 979 931,45	98 979 931,45	113 813 917,73	115 983 682,03	119 595 695,45	123 295 208,15	125 352 957,05			
	DPH 21 %	20 785 785,60	20 785 785,60	23 900 922,72	24 356 573,23	25 115 096,04	25 891 993,71	26 324 120,98			
	Cena díla s DPH	119 765 717,05	119 765 717,05	137 714 840,45	140 340 255,25	144 710 791,49	149 187 201,86	151 677 078,03			
	VP		14 833 986,28	2 169 764,30	3 726 427,88	3 942 409,78	2 866 259,33	2 298 166,27			
	MP		0,00		-114 414,46	-242 897,09	-808 510,43	0,00			
změna	Cena díla bez DPH	0,00	14 833 986,28	2 169 764,30	3 612 013,42	3 699 512,70	2 057 748,90	2 298 166,27	0,00	0,00	0,00
	DPH 21 %	0,00	3 115 137,12	455 650,50	758 522,82	776 897,67	432 127,27	482 614,92	0,00	0,00	0,00
	Cena díla s DPH	0,00	17 949 123,40	2 625 414,80	4 370 536,24	4 476 410,37	2 489 876,17	2 780 781,19	0,00	0,00	0,00
nová	Cena díla bez DPH	98 979 931,45	113 813 917,73	115 983 682,03	119 595 695,45	123 295 208,15	125 352 957,05	127 651 123,32			
	DPH 21 %	20 785 785,60	23 900 922,72	24 356 573,23	25 115 096,04	25 891 993,71	26 324 120,98	26 806 735,90			
	Cena díla s DPH	119 765 717,05	137 714 840,45	140 340 255,25	144 710 791,49	149 187 201,86	151 677 078,03	154 457 859,21			
	změna v %		14,99	17,18	20,83	24,57	26,64	28,97			
původní	termín dokončení	17 měsíců	09.10.2023	09.10.2023	09.10.2023	09.10.2023	30.11.2023	30.11.2023			
	změna - prodloužení					52		31			
	změna - zkrácení										
nový	termín dokončení	09.10.2023	09.10.2023	09.10.2023	09.10.2023	30.11.2023	30.11.2023	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023
ZL se týká	dohodnuté ceny dohodnutého termínu		X	X	X	X	X	X			
odesláno	e-mailem		X	X	X	X	X	X			
	osobně			X	X						
	jinak		X								
důvod	záměrem objednatele			X	X	X	X	X			
	chybou v dokumentaci			X		X	X	X			
	rozdílem mezi PD a skut.			X				X			
	jiný		X					X			
vystaven odsouhlasen		23.12.2021	14.04.2022 09.05.2022	09.12.2022 09.12.2022	15.02.2023	06.06.2023	15.08.2023	09.10.2023 17.10.2023			

<b>SKUTEČNÝ</b>	
termín PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ	09.05.2022
PŮVODNÍ SMLUVNÍ	17 měsíců
<b>TERMÍN DOKONČENÍ</b>	09.10.2023

**TERMÍN DOKONČENÍ 31.12.2023**



# ODSOUHLAŠENÍ ZMĚNY

(na základě "návrhu" o změnu)

identifikace stavby:	<b>MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ HALA SLANÝ</b>		číslo změny <b>6</b>
SoD ze dne :	23.12.2021		

datum : **09.10.2023**

Určeno pro :	projektanta	TDS	zhotovitele	objednatele	jiny
Odesláno / předáno :					

**Podepsaní zmocněnci v souladu se "Smlouvou o dílo" potvrzují tuto změnu díla :**





Změna je podložena těmito podklady :  
rozpočtem jako samostatnou přílohou  
komentářem jako samostatnou přílohou

## ZL č. 6 OSTATNÍ

<b>Změna ceny díla :</b>			
Rozdíl :	přípočet za vícepráce (+) / odpočet za méněpráce (-)	KČ	<b>2 298 166,27</b>
viz přílohy :	položkový rozpočet		
Původní cena díla ( dle předchozího ZL č. 5 ) :			
	Cena díla bez DPH	KČ	125 352 957,05
	DPH 21 %	KČ	26 324 120,98
	Cena díla s DPH	KČ	151 677 078,03
<b>Nová cena díla včetně ZL č. 6 :</b>			
	Cena díla bez DPH	KČ	127 651 123,32
	DPH 21 %	KČ	26 806 735,90
	Cena díla s DPH	KČ	154 457 859,21
<b>Odsouhlasená NOVÁ cena díla včetně DPH :</b>		<b>KČ</b>	<b>154 457 859,21</b>
zvýšení ceny o :	základ :	KČ	2 298 166,27
	DPH 21 % :	KČ	482 614,92
	Cena včetně DPH :	KČ	2 780 781,19
snížení ceny o :	základ :	KČ	0,00
	DPH 21 % :	KČ	0,00
	Cena včetně DPH :	KČ	0,00

<b>Změna lhůty dokončení díla :</b>			
Původní termín dokončení ( dle předchozího ZL č. 5 ) :			30.11.2023
prodloužení lhůty o :	kalendářních dní		
zkrácení lhůty o :	kalendářních dní		
<b>Odsouhlasený NOVÝ termín dokončení díla :</b>			<b>31.12.2023</b>

Změna byla vyvolána :	záměrem objednatele	<input checked="" type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky	<input checked="" type="checkbox"/>
	rozdílem mezi PD a skutečností	<input checked="" type="checkbox"/>

Za zhotovitele :	Za objednatele :
	
Podpis zmocněnce zhotovitele	Podpis zmocněnce objednatele
	

**REKAPITULACE ROZPOČTŮ ZL.č.6 pro Dodatek č.5 SoD**

17.10.2023

poř.č.	název rozpočtu	přípočty	odpočty	celkem
1	Přípojka elektro NN	429 476,33	0,00	<b>429 476,33</b>
2	Doplnění hromosvodu	396 118,51	0,00	<b>396 118,51</b>
3	Doplňky WC a koupelen	154 788,80	0,00	<b>154 788,80</b>
4	Sadové úpravy	80 252,35	0,00	<b>80 252,35</b>
5	Podhledy, žaluzie	64 218,98	0,00	<b>64 218,98</b>
6	Změna WiFi	38 602,00	0,00	<b>38 602,00</b>
7	VRN	112 337,00	0,00	<b>112 337,00</b>
8	Klima jednotky - napájení,	111 784,36	0,00	<b>111 784,36</b>
9	Dodatečné akustické podhledy	822 375,94	0,00	<b>822 375,94</b>
10	AL stěna mezi 1N10 a 1N30 - chodba v 1.NP	88 212,00	0,00	<b>88 212,00</b>
<b>CELKEM - REKAPITULACE ROZPOČTŮ pro Dodatek č.5 SoD</b>		<b>2 298 166,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2 298 166,27</b>

# ROZPOČET dílčí ke ZL.č. 6 - přípojka NN

27.09.2023

**429 476,33**


429 476,33	
VP	MP
429 476,33	0,00

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem			
<b>Díl: ELE</b>						<b>382 476,33</b>			
SoD - příp.NN	42	Chráníčka dvouplášťová korugovaná pr. 110 mm	m	100	50,34	5 034,00	100,00	50	5 034,00
SoD - příp.NN	43	montáž	m	100	60,00	6 000,00	100,00	60	6 000,00
SoD - příp.NN	40	Chráníčka dvouplášťová korugovaná pr. 75 mm	m	50	32,23	1 611,50	50,00	32	1 611,50
SoD - příp.NN	41	montáž	m	50	50,00	2 500,00	50,00	50	2 500,00
SoD - příp.NN	44	Výstražná folie do výkopu	m	50	2,02	101,00	50,00	2	101,00
SoD - příp.NN	45	montáž	m	50	30,00	1 500,00	50,00	30	1 500,00
URS	URS 34113223	Kabel AYKY-J 3x120+70	m	130	293,00	38 090,00	130,00	293	38 090,00
URS	URS 741123272R	montáž	m	130	105,00	13 650,00	130,00	105	13 650,00
SoD - příp.NN	10	DRÁT ZEMNICÍ 10 FEZN (0,62KG/M)	kg	16	56	897,12	16,00	56	897,12
SoD - příp.NN	11	montáž	kg	16	45	720,00	16,00	45	720,00
		<b>ROZVADĚČOVÁ SESTAVA</b>	kpl	1	203 288,71	203 288,71	1,00	203 289	203 288,71
		<i>Jedná se o sestavu rozváděčů:</i>							
		<i>1) měření 250A (PERP 250) - zapojení pro odběr (bez FVE), hlavní jistič 250A, MTP CLA 2.2 250/5A,</i>							
		<i>5VA, tř.př:0,5S cejchované, přívod do 240 mm2, vývod do 240 mm2</i>							
		<i>2) pojistková skříň (SRPL) - 2x přívod (smyčka) do 240 mm2 na W svorky na sběrnice, 3x pojistkový</i>							
		<i>lišťový spodek 400A, 3x vývod do 240 mm2 z W svorek. (PR 1.1.3 je rezerva - doplnění výšky)</i>							
		<i>3) měření 160A (PERP 160) - zapojení pro odběr (bez FVE), hlavní jistič 160A, MTP CLA 1.2 200/5A,</i>							
		<i>5VA, tř.př:0,5S cejchované, přívod do 95 mm2, vývod do 240 mm2</i>							
		<i>4) měření 80A (PER 2) - zapojení pro odběr (bez FVE), hlavní jistič 80A, přívod do 25 mm2,</i>							
		<i>vývod do 25 mm2 (PR 3.1.3 je rezerva - doplnění výšky)</i>							
		Rozvaděč pro nepřímé měření, hlavní jistič 250A	ks	1	71 824,20		1,00	71 824	0,00
		Skříň pro instalaci el. zařízení IP43	ks	1	5 108,29		1,00	5 108	0,00
		Rozpojovací a jističí skříň	ks	1	30 457,14		1,00	30 457	0,00
		Jednobodové zamykání s energetickým zámkem	ks	1	102,82		1,00	103	0,00
		Rozvaděč pro nepřímé měření, hlavní jistič 160A	ks	1	57 600,00		1,00	57 600	0,00
		Skříň pro instalaci el. zařízení IP43	ks	1	6 291,71		1,00	6 292	0,00
		Jednobodové zamykání se čtyřhranem	ks	1	102,82		1,00	103	0,00
		Rozvaděč elektroměrový pro třífázový elektroměr, hlavní jistič 80A	ks	1	10 300,00		1,00	10 300	0,00
		Jistič 80A	ks	1	4 775,79		1,00	4 776	0,00
		Sokl plastový	ks	1	16 725,94		1,00	16 726	0,00
SoD - ELE nn	2	montáž rozvaděče	ks	2,000	45 000	90 000,00	2,00	45 000	90 000,00
	51R	Betonový základ pod rozvaděč	ks	4	3 000		4,00	3 000	0,00
URS-HZS	HZS2231	Přetažení kabelů z haly do ER-bez zemních prací	hod	6	494	2 964,00	6,00	494	2 964,00
URS-HZS	HZS 2232	Zapojení ER, zapojení v TS	hod	16	559	8 944,00	16,00	559	8 944,00
URS	HZS 4232	Technická činnost - technik odborný	hod	12	598	7 176,00	12,00	598	7 176,00



<b>Díl:</b>		<b>ELE - zemní práce</b>				<b>34 600,00</b>				
SoD - příp.NN	54	Výkop včetně záhozu a pískového lože 500x800	m	50	450	22 500,00	50,00	450	22 500,00	
URS	460241111	Příplatek k cenám vykopávek v blízkosti podzemního vedení pro jakoukoliv horninu <i>0,5*0,8*50</i>	m3	20	605	12 100,00	20	605	12 100,00	
				<i>20</i>						

<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>						<b>12 400,00</b>				
SoD - VRN	5	005124010R Dílčí koordinační činnost	kpl	0,310	40 000,00	12 400,00	0,31	40 000	12 400,00	

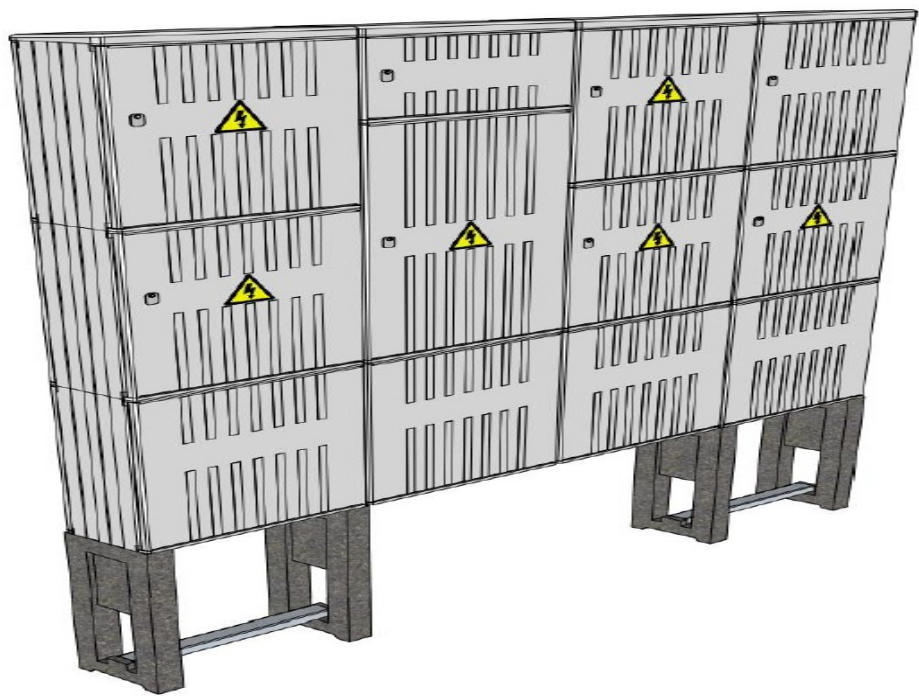

ROZPOČET dílčí ke **ZL.č. 6** - Doplnění hromosvodu

22.09.2023

**396 118,51**

396 118,51	
VP	MP
396 118,51	0,00

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
-----	-----	-------	----	----------	--------	-------------

<b>Díl:</b>	<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>29 533,16</b>
-------------	------------	------------------------------	--	--	--	------------------

Doplnění slunolamu na jižním štítu						
210	76701Z01	D+M venkovních vertikálních pevných slunolamů, ozn. Z01	ks	0,08	369 164,47	29 533,16

0,08 369 164,47 29 533,16

<b>Díl:</b>	<b>ELE - silnoproud</b>					<b>354 985,35</b>
-------------	-------------------------	--	--	--	--	-------------------

Sestava dle GP

Hromosvod - D+M ELE						<b>84 235,35</b>
---------------------	--	--	--	--	--	------------------

Typ	Kód	Popis ( výměry dle GP)	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
rozp SoD-ELE	79	Vodič kruhový 8 AlMgSi T/2 (0,135Kg/m) měkký	kg	55,00	109,57	6 026,35
rozp SoD-ELE	80	Montáž	kg	55,00	140,00	7 700,00
	<i>R- HUPRO</i>	<i>níže</i> <i>Atypické úchyty</i>	<i>ks</i>	<i>650,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>R- HUPRO</i>	<i>níže</i> <i>Montáž</i>	<i>ks</i>	<i>650,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>R- HUPRO</i>	<i>níže</i> <i>Svorka nerezová SOc N pro Al profil FVE</i>	<i>ks</i>	<i>48,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>R- HUPRO</i>	<i>níže</i> <i>Montáž</i>	<i>ks</i>	<i>48,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
rozp SoD-ELE	107	Montážní materiál	kpl.	1,00	1 509,00	1 509,00
rozp SoD-ELE	108	Montáž	kpl.	1,00	1 000,00	1 000,00

55,00 109,57 6 026,35

55,00 140,00 7 700,00

1,00 1 509,00 1 509,00

1,00 1 000,00 1 000,00

Vedlejší rozpočtové náklady						
rozp SoD-ELE	229	Pronájem montážní plošiny 15 m ( ELE )	den	3,00	20 000,00	60 000,00
rozp SoD-ELE	230	Závěrečný úklid po montáži	kpl.	1,00	4 000,00	4 000,00
rozp SoD-ELE	231	Dokumentace skutečného provedení	kpl.	1,00	4 000,00	4 000,00

3,00 20 000,00 60 000,00

1,00 4 000,00 4 000,00

1,00 4 000,00 4 000,00

Hromosvod - D+M HUPRO						<b>270 750,00</b>
-----------------------	--	--	--	--	--	-------------------

Typ	Kód	Popis ( výměry dle GP)	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
-----	-----	------------------------	----	----------	--------	-------------

Poznámka \*)

**Jedná se o zásah do konstrukce dodavatele střechy. Aby nebyly porušeny záruční podmínky,**

**je nutné respektovat jejich podmínky, aby přípravu pro montáž hromosvodu provedla firma HUPRO**

\*) viz poznámka

<b>R- srovnatelná s URS</b>	<b>R- HUPRO</b>	Atypické úchyty "HUPRO"	ks	650,00	195,00	126 750,00
-----------------------------	-----------------	-------------------------	----	--------	--------	------------

650,00 195,00 126 750,00

*Dodávka - 7,90€/ks => 195 Kč/ks*

Dle SoD 4.8.c) - kalkulace ceny dohodou na základě **srovnatelné URS položky** :

srovnatelná položka URS	URS online	1030040202R	Nerezový držák DEHN vedení pro plechovou střechu na kulatý falc ( výrobce REMA)		1,00	304,01
srovnatelná položka URS	URS online	1030040203R	Nerezový držák DEHN vedení pro plechovou střechu na hranatý falc ( výrobce REMA)	ks	1,00	329,34
srovnatelná položka URS	URS online	1030040205R	Nerezový držák DEHN vedení pro plechovou střechu s přípojovací destičkou ( výrobce REMA)	ks	1,00	224,39

.\*) viz poznámka

R- srovnatelná s URS	R- HUPRO	Montáž	ks	650,00	160,00	104 000,00
<i>Montáž - 6,50€/ks=&gt; 160 Kč/ks</i>						
Dle SoD 4.8.c) - kalkulace ceny dohodou na základě <b>srovnatelné URS položky</b> :						
URS online	741420101	Montáž držáků na zdivo	ks	1,00	157,00	
URS online	741420102	Montáž držáků do dřeva	ks	1,00	152,00	
URS online	741420103	Montáž držáků na trubku	ks	1,00	201,00	

rozp SoD-ELE


229		Pronájem montážní plošiny 15 m ( HUPRO )	den	2,00	20 000,00	40 000,00
-----	--	--	-----	------	-----------	-----------

**Ostatní rozpočtové náklady**

**11 600,00**

SoD stav VRN

5	005124010R	Díčí koordináční činnost	kpl	0,29	40 000,00	11 600,00
---	------------	--------------------------	-----	------	-----------	-----------

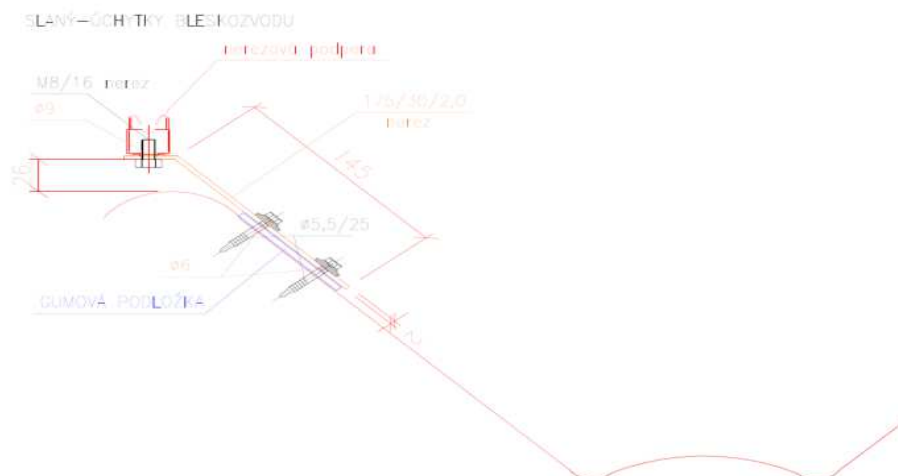

# ROZPOČET dílčí ke ZL.č. 6 - Doplnky koupelen

22.09.2023

**154 788,80**

154 788,80	
VP	MP
154 788,80	0,00

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
-----	-----	-------	----	----------	--------	-------------

## Díl: Doplnky koupelen - dodávka **126 400,00**

výběr objednatele		SIKO zrcadlo 40 x 60 cm, nástěnné	ks	13,000	389,00	5 057,00
výběr objednatele		SIKO zásobník toaletního papíru	ks	17,000	938,00	15 946,00
výběr objednatele		SIKO WC štětka nástěnná	ks	17,000	715,00	12 155,00
výběr objednatele		SIKO dávkovač mýdla Bemeta	ks	15,000	653,00	9 795,00
výběr objednatele		SIKO zásobník papírových ručníků	ks	13,000	852,00	11 076,00
výběr objednatele		SIKO odpadkový koš Bemeta 25 x 50 cm	ks	13,000	3 113,00	40 469,00
výběr objednatele		SIKO zásobník na hygienické sáčky	ks	14,000	833,00	11 662,00
výběr objednatele		SIKO odpadkový koš Bemeta 25 x 50 cm	ks	14,000	535,00	7 490,00
výběr objednatele		SIKO háček Bemeta	ks	50,000	255,00	12 750,00

13,00	389	5 057,00
17,00	938	15 946,00
17,00	715	12 155,00
15,00	653	9 795,00
13,00	852	11 076,00
13,00	3 113	40 469,00
14,00	833	11 662,00
14,00	535	7 490,00
50,00	255	12 750,00

## Díl: Doplnky koupelen - montáž **23 788,80**

URS	725900952	Upevnění doplňkového zařízení přišroubování za 1 vrut	m3	448,000	53,10	23 788,80
		116 * 3		348		
		50*2		100		

448,00	53,10	23 788,80
--------	-------	-----------

## Ostatní rozpočtové náklady **4 600,00**

SoD - VRN	5	005124010R	Dílčí koordináční činnost	kpl	0,115	40 000,00	4 600,00
-----------	---	------------	---------------------------	-----	-------	-----------	----------

0,12	40 000	4 600,00
------	--------	----------

# ROZPOČET dílčí ke ZL.č. 6 - Sadové úpravy

22.09.2023

**80 252,35**

80 252,35	
VP	MP
80 252,35	0,00

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
-----	-----	-------	----	----------	--------	-------------

<b>Díl: Sadové úpravy</b>						<b>66 189,85</b>
---------------------------	--	--	--	--	--	------------------

URS	111200211	Příprava půdy pod porostem chemickým herbicidem v rovině	ha	2,173	2 950,00	6 410,35	2,17	2 950	6 410,35
URS	25234001	Herbicid totální systémový neselektivní	ltr	10,000	479,00	4 790,00	10,00	479	4 790,00
URS	111103201	Kosení travního porostu řídkého	ha	2,173	11 500,00	24 989,50	2,17	11 500	24 989,50
URS	185851121	Dovoz vody pro závlivku do 1000 m	m3	40,000	388,00	15 520,00	40,00	388	15 520,00
URS	185804312R	Zalítí vodou - rok 2023	m3	40,000	362,00	14 480,00	40,00	362	14 480,00

<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>11 662,50</b>
-----------------------------------	--	--	--	--	--	------------------

URS	962032241	Bourání zdiva nadzákladového MC ( bez odvozu )	m3	7,500	1 030,00	7 725,00	7,50	1 030	7 725,00
		2,5*2,5*4*,03		7,5					
URS	963012510	Bourání stropu z železobetonové desky tl.do 140 mm ( bez odvozu )	m3	0,875	4 500,00	3 937,50	0,88	4 500	3 937,50
		2,5*2,5*0,14		0,875					

<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>						<b>2 400,00</b>
-----------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------

SoD - VRN	5	005124010R	Dílčí koordinační činnost	kpl	0,060	40 000,00	2 400,00	0,06	40 000	2 400,00
-----------	---	------------	---------------------------	-----	-------	-----------	----------	------	--------	----------

**ROZPOČET dílčí ke ZL.č. 6 - SDK pohled v bufetu - m.č.1N08, žalizie m.č.1N03**

27.09.2023

**64 218,98**

64 218,98	
VP	MP
64 218,98	0,00

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
-----	-----	-------	----	----------	--------	-------------

**STAVEBNÍ ČÁST**

**62 338,98**

SoD stav	63	416021121R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace	m2	68,11	800,57	54 528,42	68,11	800,57	54 528,42
			<i>plocha místnosti minus 0,5 m po obvodě(10,465-2*0,5)*(7,5-2*0,5)</i>			61,5225				
			<i>svílý lem po obvodu pohledu cca 0,15m 2*0,15*((10,465-2*0,5)+(7,5-2*0,5))</i>			4,7895				
			<i>svílý lem po obvodu jednotek cca 0,15m 2*0,15*(5+1)</i>			1,8				
			<i>Celkem</i>			68,112				
URS		55346100R	Žaluzie interiérové vertikální <i>2,4*3,6</i>	m2	8,64	685,00	5 918,40	8,64	685,00	5 918,40
URS		786626121	Montáž žaluzií zastíňujících vnitřních	m2	8,64	219,00	1 892,16	8,64	219,00	1 892,16
			<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>				<b>1 880,00</b>			
SoD stav VRN	5	005124010R	Dílčí koordinační činnost	kpl	0,047	40 000,00	1 880,00	0,047	40 000	1 880,00

# ROZPOČET dílčí ke ZL.č. 5 - Změna WiFi

22.09.2023

**38 602,00**

38 602,00	
VP	MP
38 602,00	0,00

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
-----	-----	-------	----	----------	--------	-------------

**Díl: ELE - slaboproud 37 402,00**

Typ	Kód	Popis ( výměry dle GP)	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
-----	-----	------------------------	----	----------	--------	-------------

rozp SoD-ELE	45	Kabel UTP,Cat5E,LSOH plášť,4páry (i pro CCTV, PZTS, TV, AV)	m	20,000	40,00	800,00	20,00	40	800,00
rozp SoD-ELE	46	montáž	m	20,000	10,00	200,00	20,00	10	200,00
rozp SoD-ELE	43R	Ubiquiti UniFi 6 LR, výkonný přístupový bod s WiFi 802.11a/b/g/Wi-Fi 4/Wi-Fi 5/Wi-Fi 6, vhodný i do venkovního prostředí. Nabízí dvoupásmové rádio s celkovou přenosovou rychlostí až 3000 Mbps (5GHz propustnost až 2400 Mbps; 2.4GHz propustnost až 600 Mbps). Další parametry: 8 SSID na pásmo, až pro 300+ klientů. Rozhraní: 1 Gbps ethernet RJ45 s podporou PoE+.	ks	2,000	7 500,00	15 000,00	2,00	7 500	15 000,00
rozp SoD-ELE	44	Instalace aktivního prvku wifi	ks	2,000	3 000,00	6 000,00	2,00	3 000	6 000,00
nabídka INTERNET		UBNT UniFi Cloud Key Gen2 Plus - Centrální správa zařízení	ks	1,000	5 742,00	5 742,00	1,00	5 742	5 742,00
		<a href="#">(6623+5499+5104)/3=5742</a>							
rozp SoD-ELE	44	Instalace aktivního prvku wifi	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	1,00	3 000	3 000,00
rozp SoD-ELE	49	Propojovací patch kabel	ks	1,000	50,00	50,00	1,00	50	50,00
rozp SoD-ELE	50	Montáž	ks	1,000	20,00	20,00	1,00	20	20,00
rozp SoD-ELE	34	Keystone modul RJ45 nestíněný, Cat.5e, SFA, bílý	ks	2,000	500,00	1 000,00	2,00	500	1 000,00
URS	HZS2232	Montáž (vytažení kabelu z krabice a příprava na stěnu, zaříznutí, montáž keystonů)	hod	10,000	559,00	5 590,00	10,00	559	5 590,00

**Ostatní rozpočtové náklady 1 200,00**

SoD stav VRN	5	005124010R	Dílčí koordinační činnost	kpl	0,030	40 000,00	1 200,00	0,03	40 000	1 200,00
--------------	---	------------	---------------------------	-----	-------	-----------	----------	------	--------	----------

eltrox

UBIQUITI UNIFI CLOUD KEY GEN 2 (UCK-G2-PLUS)

6 623,05 Kč

Prošlou zimu jsme se rozhodli, abychom Vám umožnili přeměnit prostředky našeho e-shopu na virtuální peníze pomocí možnosti předplacené karty. Všechny výplaty a používání s ÚČK Křídlo.

UBIQUITI

eltrox

allegro

Ubiquiti Unifi Cloud Key UCK-G2-PLUS

5 499 Kč

UBIQUITI UNIFI CLOUD KEY GEN 2 (UCK-G2-PLUS)

Parametry

allegro

elbros

UBIQUITI UNIFI CLOUD KEY, G2, WITH HDD

5 104 Kč

UBIQUITI UNIFI CLOUD KEY GEN 2 (UCK-G2-PLUS)

elbros



# ROZPOČET dílčí ke ZL.č. 6 - VRN

05.10.2023

**112 337,00**

112 337,00	
VP	MP
112 337	0,00

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
-----	-----	-------	----	----------	--------	-------------

**Díl: VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY 109 137,00**

**Díl: VN Vedlejší náklady 88 920,00**

SoD stav VRN	1	004211020T	Vypracování dílenské dokumentace	Soubor	0,26450	100 000	26 450	0,26	100 000	26 450
			Náklady spojené s vypracováním výrobní a dílenské dokumentace.							
						125 352 957,05				
			Původní cena			98 979 931,45	100 000			
			VP a MP poměr			26 373 025,60				
							0,2645			

SoD stav VRN	3	005121021R	Provoz zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803	Soubor	0,62470	100 000	62 470	0,62	100 000	62 470
			3*15000 nájem kanceláří Energie			45 000				
			100 000/17*3 provoz ZS			17 647				

**Díl: ON Ostatní náklady 20 217,00**

SoD stav VRN	7	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	0,17646	80 000	14 117	0,18	80 000	14 117
			80 000/17*3			14 118				
SoD stav VRN	5	005124010R	Prodloužení bankovních záruk	Soubor	1,00	6 100	6 100	1,00	6 100	6 100
			1000+3*1700.							

**Ostatní rozpočtové náklady 3 200,00**

SoD stav VRN	5	005124010R	Dílčí koordinační činnost	kpl	0,080	40 000	3 200	0,08	40 000	3 200
--------------	---	------------	---------------------------	-----	-------	--------	-------	------	--------	-------

ROZPOČET dílčí ke ZL.č. 6 - ELE napájení KLIM, bar.řešení v baru a VIP

09.10.2023

111 784,36

111 784,36	
VP	MP
111 784	0,00

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
-----	-----	-------	----	----------	--------	-------------

**Díl: ELE - silnoproud 108 584,36**

SoD - ELE	151R	Kabel CYKY-J 5x6	m	120	65	7 777,20	120,00	65	7 777	
SoD - ELE	152R	montáž	m	120	45	5 400,00	120,00	45	5 400	
SoD - ELE	151R	Kabel CYKY-J 3x4	m	70	65	4 536,70	70,00	65	4 537	
SoD - ELE	152R	montáž	m	70	45	3 150,00	70,00	45	3 150	
SoD - ELE	143	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	60	15	899,40	60,00	15	899	
SoD - ELE	144	montáž	m	60	30	1 800,00	60,00	30	1 800	
SoD - ELE	155R	Kabel CYKY-J 5x16	m	25	316	7 895,75	25,00	316	7 896	
SoD - ELE	154R	montáž	m	25	50	1 250,00	25,00	50	1 250	
SoD - ELE	181R	Žlab perforovaný 100x60 (kotvený do stropu)	m	9	171	1 534,59	9,00	171	1 535	
SoD - ELE	182	montáž	m	9	270	2 430,00	9,00	270	2 430	
SoD - ELE	183R	Žebřík stoupací vedení 200x60	m	3	160	480,63	3,00	160	481	
SoD - ELE	184	montáž	m	3	270	810,00	3,00	270	810	
SoD - ELE	181R	Žlab perforovaný 100x60 žárově zinkovaný	m	12	171	2 046,12	12,00	171	2 046	
SoD - ELE	182	montáž	m	12	270	3 240,00	12,00	270	3 240	
		Svazkový držák GRIP M30	ks	12		0,00	12,00	0	0	
		montáž	ks	12		0,00	12,00	0	0	
SoD - ELE	189	Trubka ohebná d32 černá UV odolná	m	50	31	1 560,00	50,00	31	1 560	
SoD - ELE	190	montáž	m	50	40	2 000,00	50,00	40	2 000	
SoD - ELE	5 R	R-VZT_ nástěnný rozvaděč, IP44 přívodní vypínač 100A/3, vývody 2x 32A/3/C (venkovní j.1, VJ2, 1x 1/10/C (vnitřní jednotky)), 1x 63A/3/C elektrokotel	kpl.	1	32 191	19 314,60	0,60	32 191	19 315	
URS-HZS	HZS 2232	montáž	hod	8	559	4 472,00	8,00	559	4 472	
URS - MAT	R	Doplnění RP2 o jistič 32A/3/C	ks	1	710	710,00	1,00	710	710	
URS-HZS	HZS 2232	montáž	hod	1	559	559,00	1,00	559	559	
URS - MAT	R	Doplnění RP2 o jistič 25A/1/C	ks	1	190	190,00	1,00	190	190	
URS-HZS	HZS 2232	montáž	hod	1	559	559,00	1,00	559	559	
URS-HZS	HZS 2232	Vydrátování doplnění RP2	hod	3	559	1 677,00	3,00	559	1 677	
SoD - ELE	233	Revize	kpl.	0	40 000	9 600,00	0,24	40 000	9 600	
URS-HZS	HZS 4232	Technická činnost - technik odborný	hod	12	598	7 176,00	12,00	598	7 176	
SoD - ELE	226	Průrazy pro trasy 50x50mm	ks	6	150	900,00	6,00	150	900	
SoD - ELE	95	Betonové podpěry hromosvodové PV21d	ks	12	227	2 718,24	12,00	227	2 718	
SoD - ELE	96	montáž	ks	12	70	840,00	12,00	70	840	
URS-HZS	HZS 2232	Úprava stávajícího kabelu CYKY 4x35 a vstup do místnosti VZT	hod	5	559	2 795,00	5,00	559	2 795	
SoD 4.8.b akt.cú	ELE	109	Zásuvka 230V Legrand Niloé barva černá	ks	33	165	5 460,57	33,00	165	5 461
SoD 4.8.b akt.cú	ELE	125	Vypínač řaz. 1 Legrand Niloé barva černá	ks	1	144	143,77	1,00	144	144
SoD 4.8.b akt.cú	ELE	125	Vypínač řaz. 6 Legrand Niloé barva černá	ks	2	158	316,23	2,00	158	316
SoD 4.8.b akt.cú	SLB	28	Zásuvka datová pro 2 keystone RJ45 barva černá	ks	3	631	1 892,18	3,00	631	1 892
SoD 4.8.b akt.cú	SLB	37	Jednorámeček barva černá	ks	39	63	2 450,38	39,00	63	2 450

**Ostatní rozpočtové náklady 3 200,00**

SoD stav VRN	5	005124010R	Dílčí koordinační činnost	kpl	0,080	40 000	3 200	0,08	40 000	3 200
--------------	---	------------	---------------------------	-----	-------	--------	-------	------	--------	-------

# ROZPOČET dílčí ke ZL.č. 6 - akustický pohled HERADESIGN superfine - m.č.2N14

27.09.2023

**822 375,94**

822 375,94	
VP	MP
822 375,94	0,00

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
-----	-----	-------	----	----------	--------	-------------

<b>m.č.2N14</b>			m2	259,9		
-----------------	--	--	----	-------	--	--

<b>Díl: Přípravné práce</b>					<b>231 342,19</b>
-----------------------------	--	--	--	--	-------------------

SoD - STAV	232	776101101R00	Příprava podkladu - vysátí povlakových podlah	m2	779,70	6,39	4 982,28
------------	-----	--------------	---	----	--------	------	----------

779,70	6,39	4 982,28
--------	------	----------

*m.č.2N14 \* 3*

URS		619991001R	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií	m2	259,90	23,00	5 977,70
-----	--	------------	--	----	--------	-------	----------

259,90	23,00	5 977,70
--------	-------	----------

URS		213141113	Zřízení vrstvy ochranné z geotextilie v rovině - bez materiálu	m2	259,90	26,90	6 991,31
-----	--	-----------	--	----	--------	-------	----------

259,90	26,90	6 991,31
--------	-------	----------

URS		69311224	geotextilie netkaná ochranná PES 110 g/ m2	m2	259,90	108,00	28 069,20
-----	--	----------	--	----	--------	--------	-----------

259,90	108,00	28 069,20
--------	--------	-----------

URS		619996117	Ochrana podlahy obedněním včetně odstranění z desek OSB	m2	259,90	538,00	139 826,20
-----	--	-----------	---	----	--------	--------	------------

259,90	538,00	139 826,20
--------	--------	------------

SoD - STAV	107	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné o výšce lešenové podlahy do 2,5 m	m2	259,90	175,05	45 495,50
------------	-----	--------------	---	----	--------	--------	-----------

259,90	175,05	45 495,50
--------	--------	-----------

<b>Díl: ELE</b>					<b>20 983,85</b>
-----------------	--	--	--	--	------------------

URS		741374821	Demontáž svítidel délky do 1100 mm	ks	34	165,00	5 610,00
-----	--	-----------	------------------------------------	----	----	--------	----------

34,00	165,00	5 610,00
-------	--------	----------

SoD-ELE	44		montáž svítidel "J"	ks	34	300,00	10 200,00
---------	----	--	---------------------	----	----	--------	-----------

34,00	300,00	10 200,00
-------	--------	-----------

SoD-ELE	143		Kabel CYKY-J 3x1,5	m	115	14,99	1 723,85
---------	-----	--	--------------------	---	-----	-------	----------

115,00	14,99	1 723,85
--------	-------	----------

	144		montáž	m	115	30,00	3 450,00
--	-----	--	--------	---	-----	-------	----------

115,00	30,00	3 450,00
--------	-------	----------

*3\*30+1\*25*

*115*

<b>Díl: 763 Konstrukce suché výstavby</b>					<b>546 049,90</b>
---	--	--	--	--	-------------------

URS		763131613	montáž nosné konstrukce z profilů CD, UD jednovrstvé	m2	259,90	596,00	154 900,40
-----	--	-----------	--	----	--------	--------	------------

259,90	596,00	154 900,40
--------	--------	------------

URS		763431702R	montáž panelu minerálního nevyjímatelného na zavěšený rošt	m2	259,90	313,00	81 348,70
-----	--	------------	--	----	--------	--------	-----------

259,90	313,00	81 348,70
--------	--------	-----------

<b>R-srovnatelná s URS</b>	desky AMF Heradesign superfine GK 1200x 600 x 35 - Naturton 13		m2	259,90	1 192,00	309 800,80
----------------------------	--	--	----	--------	----------	------------

259,90	1 192,00	309 800,80
--------	----------	------------

Dle SoD 4.8.c) - kalkulace ceny dohodou na základě srovnatelné URS položky :

srovnatelná položka URS		63126306	panel akustický povrch velice pórezní, šroubovaný tl.20 mm	m2	1,00	1 510,00
-------------------------	--	----------	--	----	------	----------

srovnatelná položka URS		63126324	panel akustický povrch velice pórezní, lepený tl.20 mm	m2	1,00	1 640,00
-------------------------	--	----------	--	----	------	----------

srovnatelná položka URS		63126323	panel akustický povrch velice pórezní, lepený s mezerou tl.20 mm	m2	1,00	1 550,00
-------------------------	--	----------	--	----	------	----------

srovnatelná položka URS						
-------------------------	--	--	--	--	--	--



<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>					<b>24 000,00</b>
-----------------------------------	--	--	--	--	------------------

SoD - VRN	5	005124010R	Dílčí koordinační činnost	kpl	0,600	40 000,00	24 000,00
-----------	---	------------	---------------------------	-----	-------	-----------	-----------

0,60	40 000	24 000,00
------	--------	-----------

ROZPOČET dílčí ke **ZL.č. 6 - AL stěna v 1.NP - m.č.1N10 x 1N30**

**88 212,00**

88 212,00	
VP	MP
88 212,00	0,00

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
-----	-----	-------	----	----------	--------	-------------

**Díl: 767 Konstrukce zámečnické 85 812,00**

R	nab.16.10.2023	D+M hliníková stěna a dvoukřídlové dveře 2x 800 mm	ks	1	85 812,00	85 812,00
---	----------------	--	----	---	-----------	-----------

*m.č.1N10 X 1N30*

*Hlavní křídlo pravé, obě křídla otvíravá o 180 st. směrem do chodby*

*2 x stěnová mřížka v pevné části stěny.*

*FABka pro generální klíč*

*začištění ostění z chodby profilem a zevnitř lištou*

1,00 85 812 85 812,00

**Ostatní rozpočtové náklady 2 400,00**

5	005124010R	Dílčí koordinační činnost	kpl	0,060	40 000,00	2 400,00
---	------------	---------------------------	-----	-------	-----------	----------

SoD - VRN

0,06 40 000 2 400,00



**METALL QUATRO spol.s r.o.**

Ulice: Vysoká Pec č.p.600  
 PSC, město: 431 59 Vysoká Pec  
 IČO: 61538213  
 DIČ: CZ61538213  
 E-mail: info@mq.cz

Nabídka:

**23055**

ze dne: 16.10.2023

Akce: Multifunkční sportovní hala, Slaný

**Adresát:**

Ulice:  
 PSC, město:  
 IČO:  
 Telefon:  
 E-mail:

**Vážení,**

děkujeme za Vámi projevovaný zájem o výrobky naší firmy a tímto si dovoluujeme Vám předložit tuto cenovou nabídku.

**Popis konstrukcí:**

Hliníkové konstrukce v systémech: **ALUPROF (MB-45)**

Počet pozicí: **1**. Počet konstrukcí: **1**

Celková plocha: **6,1 m<sup>2</sup>**

Celkový obvod: **10,1 m**

Pozice	Nákres, rozměry, popis	Počet kusů	Jedn.cena bez DPH (CZK)	Celkem bez DPH (CZK)	Poznámky
<b>DI01</b>	<p>Poz. DI01 MB-45 Okna i dveřní vitríny (š = 3 027mm, v = 2 006mm)</p>	x 1	85 812  Z toho: Konstrukce: 77 311 Montáž: 8 501	85 812  77 311  8 501	Barva profilů: X) RAL 8R7016 - standardní Výplně: B5122008R7016 + XPS 20 + B5122008R7016 Kování: Kliky WALE (nerez) 80004634; Typ zámku=WILKA (jednobodový) západkovo-zásuvkový; Centrální zastrč ruční; Varianta podlahového protikus=Protikus Wala 80009595 Kování: 3 závěsy 2 dílné Wala WX Varianta uchycení=Uchycení standardní; Zvýšené požadavky (veřejné budovy); 3 závěsy 2 dílné Wala WX  Doplňkové informace:
