

DODATEK Č.2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
v platném znění


Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0143/2023

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel: 03/2023

Článek I.**Smluvní strany**

Objednatel: **Město Vsetín**
Adresa: Svárov 1080, 755 24 Vsetín
Zastoupeno: Jiřím Čunkem, starosta města
Zastoupení:
• ve věcech smluvních: Jiří Čunek, starosta města
• ve věcech technických: 
IČ: 00304450
DIČ: CZ00304450
č. ú.: 
(dále jen **objednatel**)

a

Zhotovitel: **Zdeněk Vladyka s.r.o.**
Adresa: Na Honech I, 5540, 760 05 Zlín
Zastoupena: 
Zastoupení:
• ve věcech smluvních: 
• ve věcech technických: 
IČ: 06409393
DIČ: CZ06409393
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. C 101940, pol. 2
(dále jen **zhotovitel**)

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	„Autobusové zastávky Sychrov, ul. Bratří Hlaviců – PD“
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY
FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU, UZAVŘENÁ VÝZVA
MÍSTO PLNĚNÍ VZ	VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ	290.000,-Kč bez DPH
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	MUVS 1896/2023

PREAMBULE

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 20. 03. 2023 uzavřely smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele 0143/2023, dále jen „smlouva o dílo“ a předmětem této smlouvy je vypracování projektové dokumentace vybudování autobusových zastávek včetně úpravy stávajících chodníků nástupišť pro cestující na stavební úpravu autobusových zálivů pod názvem „Autobusové zastávky Sychrov, ul. Bratří Hlaviců – PD“, na kterou zhotovitel předložil nejvýhodnější nabídku.

Čl. I

1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly, že ve smlouvě o dílo, z důvodu nesouhlasného vyjádření Policie DI k umístění dvou zastávek: obousměrné zastávky „Šibeňák“ včetně místa pro přecházení, kde nebude umístěna pravostranná zastávky u restaurace MAX a dále nesouhlasu Policie DI s umístěním zastávky „Plotky“ bude nutné v této již zpracované dokumentaci provést změny a dokumentaci přepracovat, co si vyžádá i dodatečné geodetické zaměření. Nové geodetické zaměření je nezbytné pro zpracování posunutí této zastávky i včetně místa pro přecházení do jiného místa a to v souladu s požadavkem Policie DI. V souvislosti se změnou je nutné požádat o nové vyjádření správců sítí a tím dojde i k nutnému prodloužení lhůty pro předání dokumentace a pravomocného povolení.

V článku III. se předmět díla rozšiřuje o geodetické zaměření pro zpracování dokumentace na posunutí a zastávky „Plotky“.

Článek VII. Cena díla nově zní:

Článek č. odst. 1. „smlouvy o dílo“ se v souvislosti se změnou čl. II původní smlouvy mění takto:

	Základní (Kč)	DPH 21 % (Kč)	Celková (Kč)
CENA CELKEM DLE SOD	220 000	46 200	266 200
VÍCEPRÁCE	17 000	3 570	20 570
VÍCEPRÁCE 2	15 000	3 150	18 150
CENA CELKEM VČ. DODATKU Č.1	252 000	52 920	304 920

2. S ohledem na přepracování PD a na zákonné lhůty stavebního řízení pro vydání společného povolení stavby se prodlužuje požadovaná dodací lhůta předání předmětu díla takto:

Článek IV. Doba a místo plnění odst.1 písm. b) a c) se mění následovně:

Objednatel se zavazuje, že provede dílo dle této smlouvy v těchto termínech:

- b) Předání všech stupňů projektové dokumentace včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr pro výběr zhotovitele do: **20.12.2023**
- c) Termín předání pravomocných povolení nebo jiných opatření dle stavebního zákona ke stavbě do: **31.03.2024**

Čl. II.

Závěrečná ujednání


1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo a jejího dodatku č.1, nedotčených tímto dodatkem č.2, se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
2. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek ke smlouvě o dílo byl uzavřen v souladu se zákonem č.128/2000 Sb., v platném znění a že byly splněny podmínky pro uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona), kdy starosta města Vsetína je oprávněn uzavřít tento dodatek na základě pravomoci, jež mu byla

svěřena (delegována) na základě usnesení Rady města Vsetína ze dne 02.12.2020 č.j. 19/54/RM/2020, učiněné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé tohoto dodatku v jeho plném znění. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.
4. Tento dodatek číslo 2 „smlouvy o dílo“ je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dva a nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci.


Za objednatele: 23. 10. 2023

Ve Vsetíně, dne

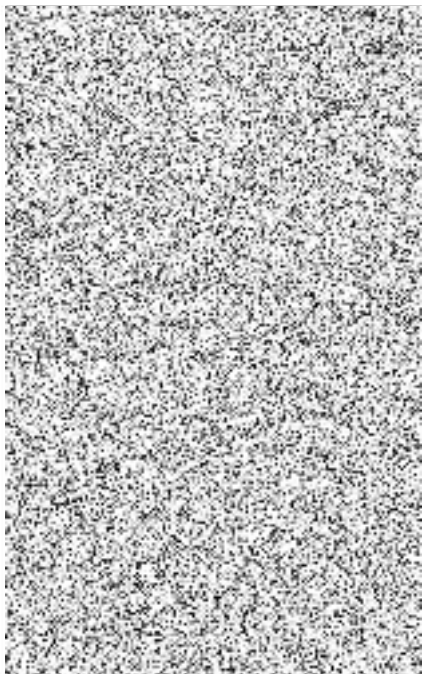

Za zhotovitele:

Ve Zlíně, dne 16. 10. 2023

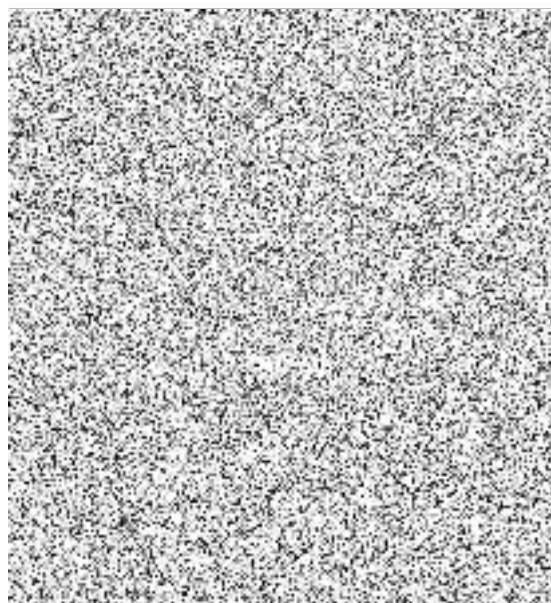

Zdeněk Vladyka s.r.o.
Na Honech I, 5540, Zlín 760 05, mobil 
IČ: 06409393

Cenová nabídka na projekční a inženýrské práce

„AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY SYCHROV, UL. BRATŘÍ HLAVICŮ“

Předmětem cenové nabídky je geodetické doměření území a změna projektové dokumentace vč. dokladové části

DOKUMENTACE DUR+DSP+DPS :

- geodetické doměření území
- změna projektové dokumentace
- dokladová část

Celkem – 15 000,-Kč

DPH 21% - 3 150,-Kč

Cena celkem s DPH 18 150,-Kč

23. 10. 2023

Předal :

27.9.2023

