

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

Králův Dvůr - obchvat - II.část

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Dopravně inženýrské opatření

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

102/1

Číslo ZBV:

5

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Stč. kraje, p.o.**
 Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
 IČ: 00066001 DIČ: CZ00066001

Město Králův Dvůr
 náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr
 IČ: 00509701 DIČ: CZ00509701

Zhotovitel:

STRABAG, a.s.

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice
 IČ: 60838744

Rekapitulace ZBV č. 5 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.3	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.4	0,00	67 745,63	67 745,63

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5	0,00	67 745,63	67 745,63

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
 Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
 a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Králův Dvůr - obchvat - II.část Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dopravně inženýrské opatření	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 102/1	Číslo ZBV: 5.4
--	---	--------------------------

Strany smlouvy o dílo č. S-1541/00066001/2021 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 27.7.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov a Město Králův Dvůr, náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr

Zhotovitel: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1, 2	Objednatel
2. Změnový list	3, 4	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	5	Projektant (AD)
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 1	6	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin	7	Supervize
6. Přehled dalších dokladů		
Další doklady dle přehledu dokladů	26	počet listů

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

V průběhu výstavby byl zjištěn havarijný stav opěrné zdi u objektu čp.399 firmy EZIKO s.r.o. Řešení způsobu opravy tohoto prostoru bylo odsouhlaseno v ZBV č.3. Při provádění nové pilotové stěny, zajišťující tělěso komunikace, byla nutná - z bezpečnostních důvodů a z důvodů proveditelnosti - změna dopravně inženýrských opatření. Pro zajištění bezpečnosti dopravy a provádění demoličních prací byl nejprve v termínu od 31.8 do 12.9.2022 veden provoz jednosměrně, řízen SZZ. Dopravní značení bylo osazeno na základě stanovení - doklad 10. Při samotném provádění pilotáže byla komunikace v termínu od 12.9. do 30.9.2022 kompletně uzavřena - na základě stanovení - doklad 11. Následně byl provoz od 30.9. do 13.10.2022 opět jednosměrný, řízen SSZ pro provedení ztužující římsy, zábradlí a dokončovacích prací před pokládkou obrusné vrstvy. V termínech 13.a 14.10.byla komunikace opět uzavřena pro pokládku obrusné vrstvy v prostoru celé křižovatk. Jednotlivé etapy viz. doklad 12.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle § 5, odst.1 písm.d), resp.podle § 11 Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazena do **Skupiny 4** jako změna nezbytná k dokončení. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5) se jedná o změnu nezbytnou, u níž není změna v osobě dodavatele možná z ekonomických anebo technických důvodů, kdy změna v osobě dodavatele by způsobila zadavateli značné obtíže (narušení postupů výstavby, nedodržení technických a technologických postupů, nebo rozdělení odpovědnosti za vady) nebo výrazné zvýšení nákladů a hodnota těchto dodatečných stavebních prací nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	67 745,63	67 745,63	67 745,63

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): STRABAG a.s.	jméno	Ing. Vlastimil Ptáček	datum	podpis
Projektant (autorský dozor): Spektra PRO spol. s r.o.	jméno	Ing. Martin Dejdar	datum	podpis
Stavební dozor: IBH spol. s r.o.	jméno	Petr Burger	datum	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno		datum	podpis
Zástupce Objednatele: KSÚS SK	jméno	Milan Veleba	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				
Objednatel KSÚS (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Fidler, Dis.	datum	podpis
Objednatel Město Králův Dvůr (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Petr Vychodil	datum	podpis
Zhotovitel: STRABAG, a.s.	jméno	David Müller Eva Klufová	datum	podpis
				Číslo paré:

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 5**

Název Stavby: Králov Dvůr - obchvat - II.část
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 102
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dopravně inženýrské opatření

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
181 607,80

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	181 607,80	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	67 745,63	67 745,63	37,30%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	249 353,43	67 745,63	37,30%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

STRABAG a.s.

souhlasím

Ing. Vlastimil Ptáček

Projektant (autorský dozor):

Spektra PRO spol. s r.o.

souhlasím

Ing. Martin Dejdar

Stavební dozor:

IBH spol. s r.o.

souhlasím

Petr Burger

Zástupce Objednatele:

KSÚS SK

souhlasím

Milan Veleba

Supervize (RDk):

Zaměstnanec KSÚS SK

odpovědný za cenové

projednání Změny:

souhlasím

Ing. Jaroslava Jurková

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo 5.4													
Evidenční číslo a název stavby: Králův Dvůr - obchvat - II.část								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Dopravně inženýrské opatření								č. 1					
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Dopravně inženýrské opatření								Skupina Změn: 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky (4 časová období)													
Částečná uzavírka 31.8.-12.9. (12 dnů)													
58	913411111	Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy se 2 semaforů	kus	0,000	1,00	1,00	282,00	0,00	0,00	282,00	282,00	282,00	100,00%
59	913411211	Příplatek k dočasné mobilní semaforové soupravě se 2 semaforů za první a ZKD den použití	kus	0,000	12,00	12,00	528,00	0,00	0,00	6 336,00	6 336,00	6 336,00	100,00%
60	913911112	Montáž a demontáž akumulátoru dočasného dopravního značení olověného 12 V/55 Ah	kus	0,000	2,00	2,00	53,80	0,00	0,00	107,60	107,60	107,60	100,00%
61	913911212	Příplatek k dočasnému akumulátoru 12V/55 Ah za první a ZKD den použití	kus	0,000	24,00	24,00	75,40	0,00	0,00	1 809,60	1 809,60	1 809,60	100,00%
50	913212111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	0,000	8,00	8,00	59,30	0,00	0,00	474,40	474,40	474,40	100,00%
52	913212121	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	0,000	96,00	96,00	13,60	0,00	0,00	1 305,60	1 305,60	1 305,60	100,00%
54	913221111	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany světelné šířky 1,5 m se 3 světly	kus	0,000	2,00	2,00	143,00	0,00	0,00	286,00	286,00	286,00	100,00%
55	913221211	Příplatek k dočasné dopravní zábraně světelné šířky 1,5 m se 3 světly za první a ZKD den použití	kus	0,000	24,00	24,00	109,00	0,00	0,00	2 616,00	2 616,00	2 616,00	100,00%
56	913321111	Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní	kus	0,000	7,00	7,00	25,50	0,00	0,00	178,50	178,50	178,50	100,00%
57	913321211	Příplatek k dočasné směrové desce základní za první a ZKD den použití	kus	0,000	84,00	84,00	8,92	0,00	0,00	749,28	749,28	749,28	100,00%
Úplná uzavírka 12.9.-30.9. - vrtání pilot (19 dnů)													
50	913212111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	0,000	47,00	47,00	59,30	0,00	0,00	2 787,10	2 787,10	2 787,10	100,00%
51	913212112	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní zvětšené	kus	0,000	8,00	8,00	68,10	0,00	0,00	544,80	544,80	544,80	100,00%
52	913212121	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	0,000	893,00	893,00	13,60	0,00	0,00	12 144,80	12 144,80	12 144,80	100,00%
53	913212122	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní zvětšené za první a ZKD den použití	kus	0,000	152,00	152,00	27,80	0,00	0,00	4 225,60	4 225,60	4 225,60	100,00%
54	913221111	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany světelné šířky 1,5 m se 3 světly	kus	0,000	2,00	2,00	143,00	0,00	0,00	286,00	286,00	286,00	100,00%
55	913221211	Příplatek k dočasné dopravní zábraně světelné šířky 1,5 m se 3 světly za první a ZKD den použití	kus	0,000	38,00	38,00	109,00	0,00	0,00	4 142,00	4 142,00	4 142,00	100,00%
56	913321111	Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní	kus	0,000	3,00	3,00	25,50	0,00	0,00	76,50	76,50	76,50	100,00%
57	913321211	Příplatek k dočasné směrové desce základní za první a ZKD den použití	kus	0,000	57,00	57,00	8,92	0,00	0,00	508,44	508,44	508,44	100,00%
Částečná uzavírka 30.9.-13.10. (14 dnů)													
58	913411111	Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy se 2 semaforů	kus	0,000	1,00	1,00	282,00	0,00	0,00	282,00	282,00	282,00	100,00%
59	913411211	Příplatek k dočasné mobilní semaforové soupravě se 2 semaforů za první a ZKD den použití	kus	0,000	14,00	14,00	528,00	0,00	0,00	7 392,00	7 392,00	7 392,00	100,00%
60	913911112	Montáž a demontáž akumulátoru dočasného dopravního značení olověného 12 V/55 Ah	kus	0,000	2,00	2,00	53,80	0,00	0,00	107,60	107,60	107,60	100,00%
61	913911212	Příplatek k dočasnému akumulátoru 12V/55 Ah za první a ZKD den použití	kus	0,000	28,00	28,00	75,40	0,00	0,00	2 111,20	2 111,20	2 111,20	100,00%
50	913212111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	0,000	8,00	8,00	59,30	0,00	0,00	474,40	474,40	474,40	100,00%
52	913212121	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	0,000	112,00	112,00	13,60	0,00	0,00	1 523,20	1 523,20	1 523,20	100,00%
54	913221111	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany světelné šířky 1,5 m se 3 světly	kus	0,000	2,00	2,00	143,00	0,00	0,00	286,00	286,00	286,00	100,00%
55	913221211	Příplatek k dočasné dopravní zábraně světelné šířky 1,5 m se 3 světly za první a ZKD den použití	kus	0,000	28,00	28,00	109,00	0,00	0,00	3 052,00	3 052,00	3 052,00	100,00%
56	913321111	Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní	kus	0,000	7,00	7,00	25,50	0,00	0,00	178,50	178,50	178,50	100,00%
57	913321211	Příplatek k dočasné směrové desce základní za první a ZKD den použití	kus	0,000	98,00	98,00	8,92	0,00	0,00	874,16	874,16	874,16	100,00%
Úplná uzavírka 13.10.-14.10. - pokládka obrusné vrstvy (2dny)													
50	913212111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	0,000	47,00	47,00	59,30	0,00	0,00	2 787,10	2 787,10	2 787,10	100,00%
51	913212112	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní zvětšené	kus	0,000	8,00	8,00	68,10	0,00	0,00	544,80	544,80	544,80	100,00%
52	913212121	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	0,000	94,00	94,00	13,60	0,00	0,00	1 278,40	1 278,40	1 278,40	100,00%
53	913212122	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní zvětšené za první a ZKD den použití	kus	0,000	16,00	16,00	27,80	0,00	0,00	444,80	444,80	444,80	100,00%
54	913221111	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany světelné šířky 1,5 m se 3 světly	kus	0,000	2,00	2,00	143,00	0,00	0,00	286,00	286,00	286,00	100,00%
55	913221211	Příplatek k dočasné dopravní zábraně světelné šířky 1,5 m se 3 světly za první a ZKD den použití	kus	0,000	4,00	4,00	109,00	0,00	0,00	436,00	436,00	436,00	100,00%
56	913321111	Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní	kus	0,000	3,00	3,00	25,50	0,00	0,00	76,50	76,50	76,50	100,00%
57	913321211	Příplatek k dočasné směrové desce základní za první a ZKD den použití	kus	0,000	6,00	6,00	8,92	0,00	0,00	53,52	53,52	53,52	100,00%
62	040001000	Inženýrská činnost (žádost o povolení - např. kácení stromu, dopravní značení apod...)	kpl	0,000	1,00	1,00	6 697,23	0,00	0,00	6 697,23	6 697,23	6 697,23	100,00%
Celkem								0,00	0,00	67 745,63	67 745,63	67 745,63	

Za Zhotovitele: Vlastimil Ptáček

Za TDS: Petr Burger

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: Králův Dvůr - obchvat - II. část

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	31 226 120,87
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	36 286 614,32
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	43 906 803,33
3=(2/1)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	116,21%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-4,83%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	5 060 493,45
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	16,21%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	9 367 836,26

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	0,00%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	25,87%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	8 078 148,05
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	15 613 060,44

12=(37)*0,15	Sledování limitu 15 %	0,00
13=37	Sledování limitu 137 366 000 Kč	0,00
14=137366000*(37)		137 366 000,00

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 -			- 2 -			- 3 -				- 4 -				- 5 -	
						Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 137 366 000 Kč)	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100
		Králův Dvůr - obchvat - II. část	- 1 508 827,30	6 569 320,75	5 060 493,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 508 827,30	6 569 320,75	5 060 493,45	8 078 148,05	0,00	0,00
101a	1	Větev A - komunikace/RDS (zvýšení nivelety, změna úpravy aktivní zóny)	- 1 477 871,40	2 745 822,56	1 267 951,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 477 871,40	2 745 822,56	1 267 951,16	4 223 693,96	0,00	0,00
301	2	Dešťová kanalizace /bourání základových konstrukcí ve výkopu kanalizace	0,00	890 887,22	890 887,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 887,22	890 887,22	890 887,22	0,00	0,00
101a/2	3	Větev A - komunikace / změna tvaru křižovatky a pilotová opěrná stěna	- 2 166,28	2 751 600,78	2 749 434,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 166,28	2 751 600,78	2 749 434,50	2 753 767,06	0,00	0,00
101a/3	4	Větev A - komunikace / úprava dopravního značení	- 28 789,62	113 264,56	84 474,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 28 789,62	113 264,56	84 474,94	142 054,18	0,00	0,00
102	5	Dopravné inženýrské opatření /změny při provádění pilotové stěny	0,00	67 745,63	67 745,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 745,63	67 745,63	67 745,63	0,00	0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	5
Název a evidenční číslo stavby:	Králův Dvůr - obchvat - II.část
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Dopravně inženýrské opatření
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	102

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Změnový soupis prací SO 102 po změně 1 pro ZBV 5	2	
08 Oznámení o zjištění skutečnosti - změna DZ včetně výkresů z 20. 6. 2022	4	
09 Souhlas objednatele z 27. 6. 2022	1	
10 Vyjádření AD z 15. 7. 2022	1	
11 Stanovení - jednosměrný provoz z 15. 8. 2022	6	
12 Stanovení - úplná uzavírka z 30. 8. 2022	10	
13 Termíny uzavírek křižovatky z 9. 11. 2022	1	
14 Vyjádření TDS z 5. 12. 2022	1	
Počet listů celkem	26	

55	913221211	Příplatek k dočasné dopravní zábraně světelné šířky 1,5 m se 3 světlými za první a ZKD den použití ZBV 5 - dle změny DIO, JC URS 2/2022, 24+38+28+4=94	kus	0,00	94,000	94,000	109,00	0,00	0,00	10 246,00	10 246,00	10 246,00	100,00%
56	913321111	Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní ZBV 5 - dle změny DIO, JC URS 2/2022, 7+3+7+3=20	kus	0,00	20,000	20,000	25,50	0,00	0,00	510,00	510,00	510,00	100,00%
57	913321211	Příplatek k dočasné směrové desce základní za první a ZKD den použití ZBV 5 - dle změny DIO, JC URS 2/2022, 84+57+98+6=245	kus	0,00	245,000	245,000	8,92	0,00	0,00	2 185,40	2 185,40	2 185,40	100,00%
58	913411111	Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy se 2 semaforů ZBV 5 - dle změny DIO, JC URS 2/2022, 1+1=2	kus	0,00	2,000	2,000	282,00	0,00	0,00	564,00	564,00	564,00	100,00%
59	913411211	Příplatek k dočasné mobilní semaforové soupravě se 2 semaforů za první a ZKD den použití ZBV 5 - dle změny DIO, JC URS 2/2022, 12+14=26	kus	0,00	26,000	26,000	528,00	0,00	0,00	13 728,00	13 728,00	13 728,00	100,00%
60	913911112	Montáž a demontáž akumulátoru dočasného dopravního značení olověného 12 V/55 Ah ZBV 5 - dle změny DIO, JC URS 2/2022, 2+2=4		0,00	4,000	4,000	53,80	0,00	0,00	215,20	215,20	215,20	100,00%
61	913911212	Příplatek k dočasnému akumulátoru 12V/55 Ah za první a ZKD den použití ZBV 5 - dle změny DIO, JC URS 2/2022, 24+28=52		0,00	52,000	52,000	75,40	0,00	0,00	3 920,80	3 920,80	3 920,80	100,00%
62	040001000	Inženýrská činnost (žádosti o povolení - např. kácení stromů, dopravní značení apod...) ZBV 5 - vyřízení DIR + DIO, JC dle SO VRN pol. 10	kpl	0,00	1,000	1,000	6 697,23	0,00	0,00	6 697,23	6 697,23	6 697,23	100,00%
		Celkem SO 102						181 607,80	0,00	67 745,63	249 353,43	67 745,63	37,30%

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4 ,158 00Praha 5 - Jinonice

KSÚS Středočeského kraje Nádvořník Petr
Oprávněný zástupce objednatele

Zborovská 11
150 21 Praha 5

Váš dopis značky

Naše značka

Vyřizuje / linka

Svoboda V. 602 220747

Příbram dne

20.6.2022

Věc: Oznámení o zjištění skutečnosti

Stavba obchvatu Králova Dvora -II část

Vážený pane Nádvořníku

Na základě oznámení o zjištěné skutečnosti o poruše stávající opěrné stěny v km 0,695 – 0,725 ze dne 2.6. 2022 je nutné po celou dobu výstavby místo podél opěry zajistit dopravním opatřením a dopravu odklonit od stěny do jednosměrného provozu tak , aby nedošlo vlivem těžké dopravy k případnému zřícení celé opěrné zdi .

Přílohy : foto

Zhotovitel žádá Oprávněného zástupce objednatele o vydání pokynu , ve kterém odsouhlasí výše navržené skutečnosti a návrhy řešení . V opačném případě ať navrhne nebo určí pokynem jiný postup prací .

S přátel

Václav :





STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 150 00 Praha 5
Václav Svoboda

Váš dopis zn. / ze dne

Naše značka

Vyřizuje / telefon
Ing. Petr Nádvorník,

Říčany
27. 6. 2022

Předmět: Souhlas s oznámeními změnami „Králov Dvůr – obchvat – II. část“

Vážení,

Na základě oznámení nově zjištěných skutečností na akci „**Králov Dvůr – obchvat – II. část**“ Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., **souhlasí** s navrženými změnami. Jmenovitě se jedná o změnu dopravních opatření pro odklon dopravy od opěrné stěny v havarijním stavu, aby bylo předcházeno možnému zřícení celé stěny. Oprava stěny byla odsouhlasena samostatně dne 3. 6. 2022.

Zhotovitele žádáme o neprodlené zpracování ZBV. Veškeré skutečnosti týkající se změny musí být podrobně zaznamenány a zdokumentovány.



PROJEKCE ENGINEERING REALIZACE STAVEB

VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA

Název akce: „KRÁLŮV DVŮR – OBCHVAT – II. ČÁST“

Zakázkové číslo: 4585-08-031 resp. 4699-09-031

Vyjádření projektanta k nutným dopravně inženýrským opatřením

V průběhu realizace po vyčištění příkopu bylo zjištěno, že opěrná stěna před objektem parc. č. st. 234 v k.ú. Králův Dvůr vykazuje vysoké známky degradace a bylo domluveno, že bude nahrazena novou opěrnou stěnou.

Po celou dobu výstavby je nutné odklonit stávající dopravu, aby vlivem dopravního zatížení nedošlo k případnému zřícení celé opěrné zdi. Toto bude zajištěno dopravně inženýrským opatřením, které převede dopravu do kyvadlového provozu.

V Berouně dne 15. července 2022

Ing. Martin Dejdar
Spektra PRO spol. s r.o.

Město Beroun

Městský úřad

Odbor dopravy a správních agend

Datum:
15.08.2022Číslo jednací:
MBE/52790/2022/DOPR-
OIMSpisová značka:
00059/2022/DOPR/97Vyřizuje / telefon:
Ing. Monika Olexová/

E-mail:

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA**OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY****STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI**

Městský úřad Beroun, odbor dopravy a správních agend, jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), na základě žádosti STRABAG a.s., Kačírková 982/4, 158 00 Praha 5, IČ: 60838744 v zastoupení ADSUM spol. s.r.o., Havlíčková 923, 273 51 Unhošť, IČ: 45144991 ze dne 09.08.2022 a po písemném vyjádření příslušného orgánu policie, tj. Policie ČR, Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje, územního odboru Beroun, dopravního inspektorátu, pod č.j.: KRPS-112558-3/ČJ-2022-010206.

s t a n o v u j e

podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o provozu na pozemních komunikacích opatřením obecné povahy podle § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

PŘECHODNOU ÚPRAVU PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

z důvodu opravy povrchu silnice č. III/11524, ul. Tovární v km staničení 15,460 – 15,550 v k.ú. Králův Dvůr a s touto stavbou spojených dopravních opatření na ul. Tovární – v úseku dle grafického vyobrazení (str. 4 - 6).

Dopravní značení bude upraveno dle předloženého a schváleného dopravně inženýrského opatření – schéma vyobrazení DIO je součástí tohoto stanovení (str. 4 - 6) a v souladu s TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.

Komunikace: silnice č. III/11524 ul. Tovární v k.ú. Králův Dvůr

Termín – 31.08.2022 – 30.10.2022 (přesný termín provedení přechodné úpravy bude v souladu s pravomocným rozhodnutím ve věci povolení zvláštního užívání/uzavírky silnice vydaného příslušným silničním správním úřadem).

Podmínky pro provedení přechodné úpravy:

1. Provedení a umístění přechodného dopravního značení musí být v souladu s vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v souladu s TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích a normou ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení. Veškeré svislé dopravní značky budou základní velikosti podle TP 66 a musí být provedeny jako retroreflexní. Všechny součásti dopravních značek (podkladní desky, sloupky, značky, uchycení, kotvicí prvky apod.) musí být schváleného typu.
2. Realizace přechodné úpravy provozu je podmíněna existencí pravomocného rozhodnutí ve věci povolení zvláštního užívání (příp. uzavírky) silnice (místní komunikace) a termín provedení přechodné úpravy bude v souladu s tímto rozhodnutím.
3. Žadatel zajistí pravidelnou kontrolu a údržbu dopravního značení.
4. Osazení dopravního značení zajistí žadatel. Osazení, kontrolu, údržbu i případné doplnění a změny dopravního značení v průběhu uzavírky hradí žadatel. Realizace dopravních opatření může být provedena pouze odbornou firmou. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další doplnění dopravního značení, případně stanovené dopravní značení změnit.
5. Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením bude překryto a po ukončení akce uvedeno do původního stavu.

O d ů v o d n ě n í :

Městský úřad Beroun, odbor dopravy a správních agend, stanovil na základě žádosti STRABAG a.s., Kačírková 982/4, 158 00 Praha 5, IČ: 60838744 v zastoupení ADSUM spol. s.r.o., Havlíčková 923, 273 51 Unhošť, IČ: 45144991 ze dne 09.08.2022, přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích z důvodu opravy povrchu silnice č. III/11524, ul. Tovární v km staničení 15,460 – 15,550 v k.ú. Králův Dvůr a s touto stavbou spojených dopravních opatření na silnici č. III/11524. ul. Tovární – v úseku dle grafického vyobrazení (str. 4 -6).

Přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích, stanovil obecní úřad s rozšířenou působností po předchozím písemném vyjádření policie, v tomto případě Policie ČR, Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje, územního odboru Beroun, dopravního inspektorátu, Tyršova 1635, 266 50 Beroun, která dala k tomuto stanovení přechodné úpravy kladné vyjádření pod č.j.: KRPS-112558-3/ČJ-2022-010206.

Poučení: Toto stanovení se vydává formou opatření obecné povahy, které se oznamuje veřejnou vyhláškou. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 správního řádu)

Ing. Albert Červenka
vedoucí odboru dopravy a správních agend

v z. Ing. Monika Olexová, v.r.

Za správnost vyhotovení: Iveta Brúnová

Toto opatření obecné povahy (č.j. MBE/52790/2022/DOPR-OIM) musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Beroun a Městského úřadu Králův Dvůr.

Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty vyznačení údajů musí být vyhláška neprodleně vrácena zpět odboru dopravy a správních agend. Zároveň žádáme o zveřejnění písemnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup a o potvrzení této skutečnosti!

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.

Obdrží:

Dotčené orgány:

- **Policie ČR**, Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, dopravní inspektorát, Tyršova 1635, 266 01 Beroun

Ostatní:


- **Městský úřad Beroun**, kancelář tajemníka, podatelna MěÚ Beroun, Husovo náměstí 68, 266 01 Beroun, IČ: 00233129.
(pro zveřejnění na úřední desce na dobu nejméně 15 dnů – podle § 172 odst. 1 správního řádu)
- **Městský úřad Králův Dvůr**, náměstí Míru 39, 267 01 Králův Dvůr, IČ: 00509701.
(pro zveřejnění na úřední desce na dobu nejméně 15 dnů – podle § 172 odst. 1 správního řádu)
- **STRABAG a.s.**, Kačírková 982/4, 158 00 Praha 5, IČ: 60838744 v zastoupení ADSUM spol. s.r.o., Havlíčková 923, 273 51 Unhošť, IČ: 45144991.

Schematický plánek D0 - celková situace



DETAILY KŘIŽOVATEK S DZ


ETAPA A.

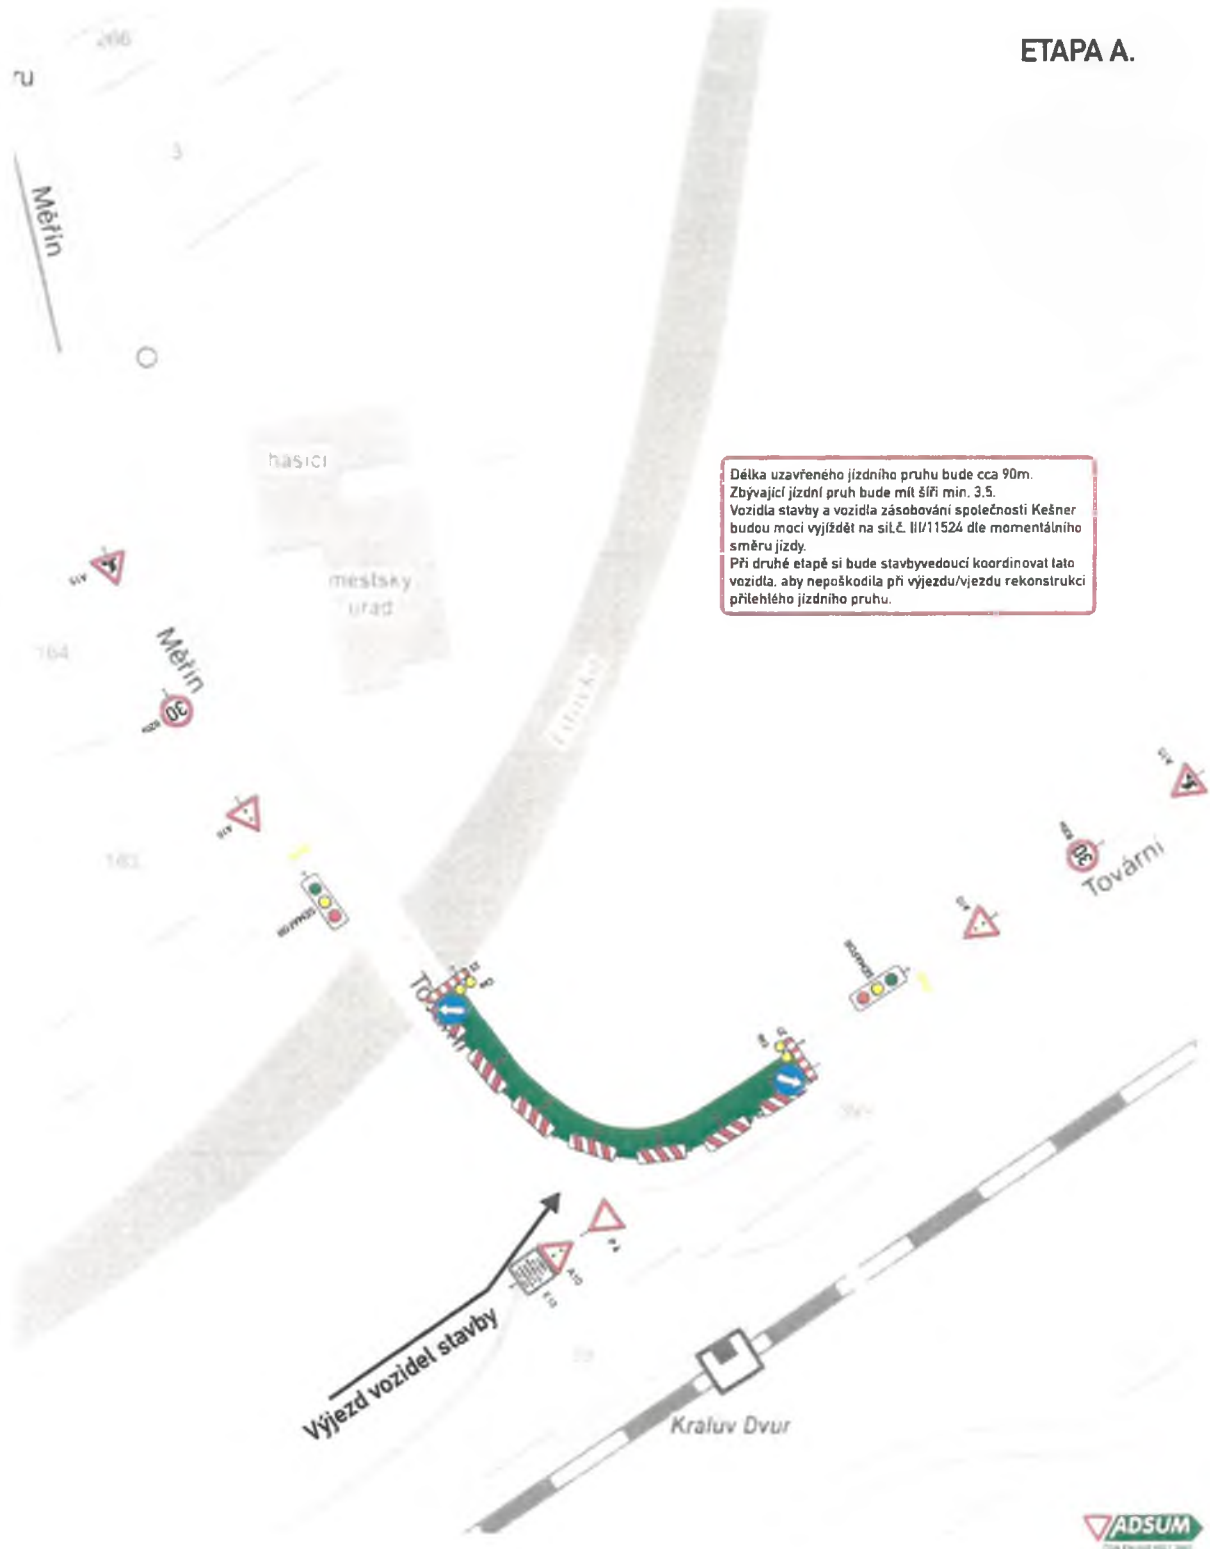

Příloha č. 3:

DETAILY KŘÍŽOVATEK S DZ

ETAPA B.

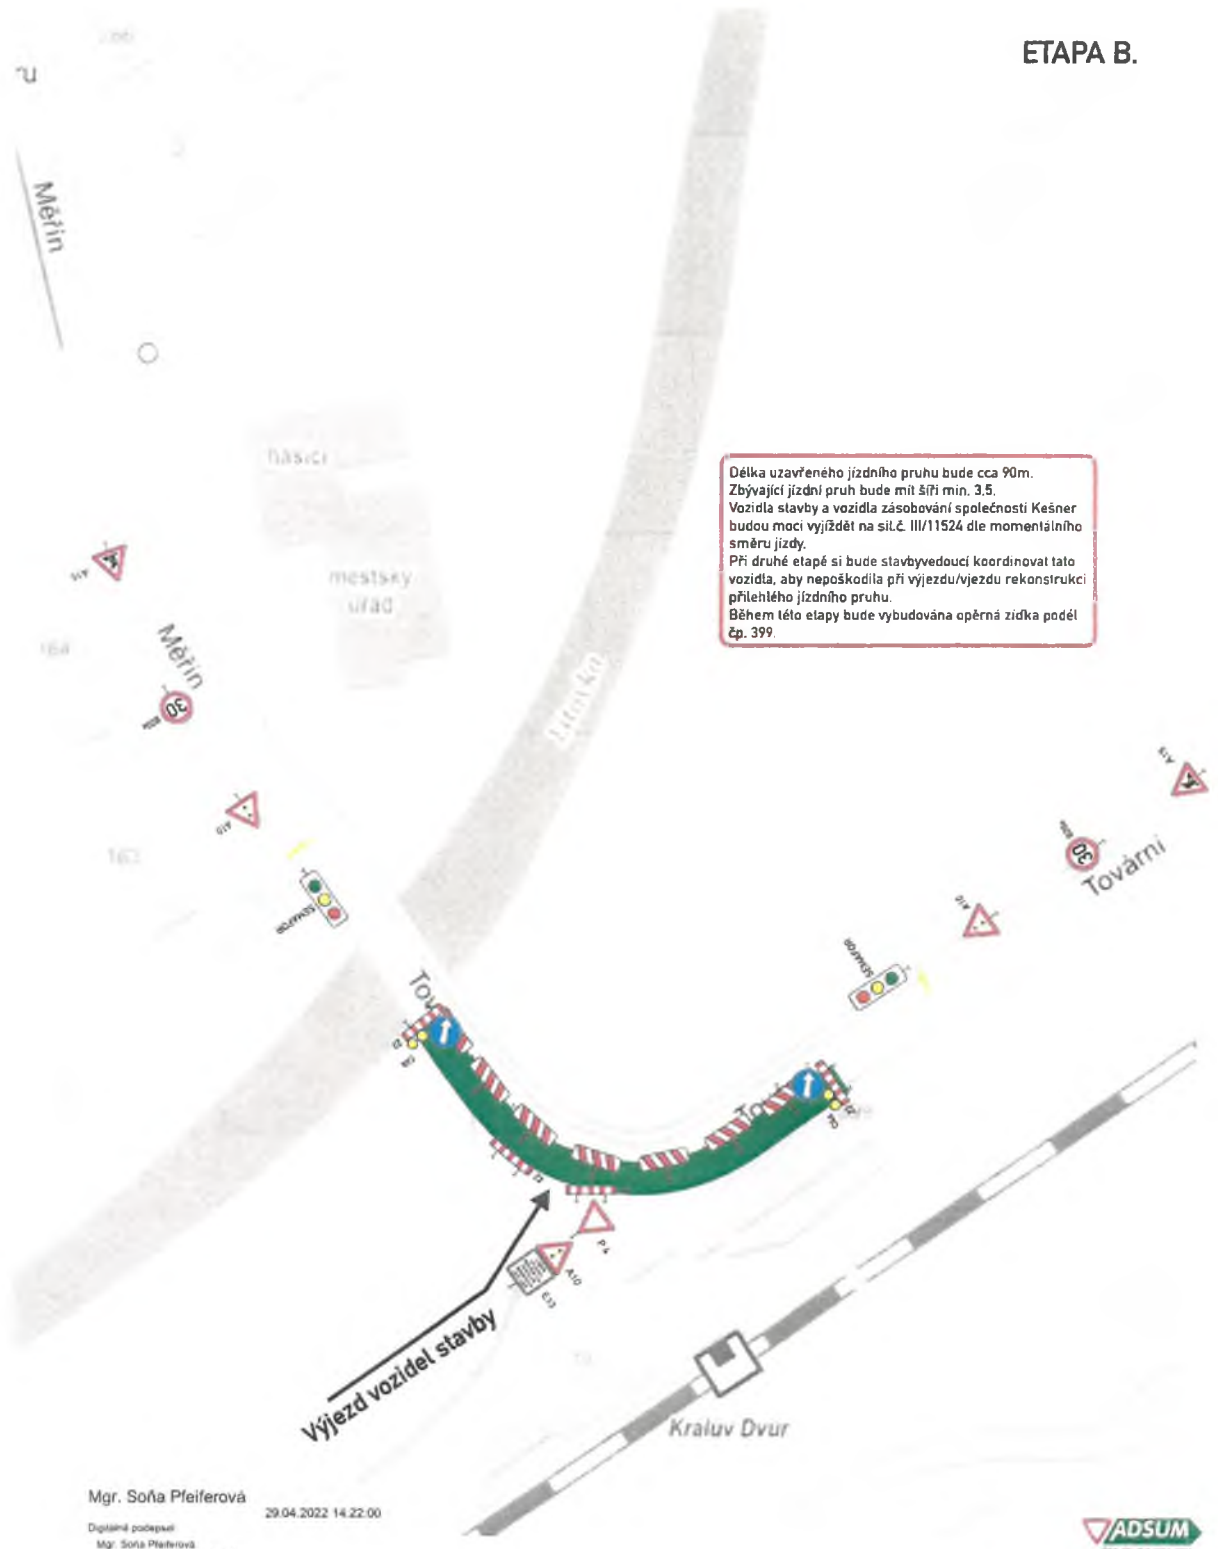

Mgr. Soňa Pfeiferová
29.04.2022 14:22:00
Digitálně podepsal
Mgr. Soňa Pfeiferová
POLICE ČESKÉ REPUBLIKY



Město Beroun

Městský úřad

Odbor dopravy a správních agend

Datum:
30.08.2022Číslo jednací:
MBE/55331/2022/DOPR-
OIMSpisová značka:
00059/2022/DOPR/99Vyřizuje / telefon:
Ing. Monika Olexová/

E-mail:

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA**OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY****STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI**

Městský úřad Beroun, odbor dopravy a správních agend, jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), na základě žádosti STRABAG a.s., Kačírková 982/4, 158 00 Praha 5, IČ: 60838744 v zastoupení ADSUM spol. s.r.o., Havlíčková 923, 273 51 Unhošť, IČ: 45144991 ze dne 19.08.2022 a po písemném vyjádření příslušného orgánu policie, tj. Policie ČR, Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje, územního odboru Beroun, dopravního inspektorátu, pod č.j.: KRPS-209995-2/ČJ-2022-010206 ze dne 22.08.2022.

s t a n o v u j e

podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o provozu na pozemních komunikacích opatřeními obecné povahy podle § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

PŘECHODNOU ÚPRAVU PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

z důvodu opravy opěrné zdi před budovou nádraží Králův Dvůr u silnice č. III/11524 – umístění vrtné soupravy v k.ú. Králův Dvůr a s touto stavbou spojených dopravních opatření na ul. Tovární – v úseku dle grafického vyobrazení (str. 4 -6).

Dopravní značení bude upraveno dle předloženého a schváleného dopravně inženýrského opatření – schéma vyobrazení DIO je součástí tohoto stanovení (str. 4 -6) a v souladu s TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.

Komunikace: silnice č. III/11524 ul. Tovární v k.ú. Králův Dvůr

Termín – 12.09.2022 – 03.10.2022 (přesný termín provedení přechodné úpravy bude v souladu s pravomocným rozhodnutím ve věci povolení zvláštního užívání/uzavírky silnice vydaného příslušným silničním správním úřadem).

Podmínky pro provedení přechodné úpravy:

1. Provedení a umístění přechodného dopravního značení musí být v souladu s vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v souladu s TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích a normou ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení. Veškeré svislé dopravní značky budou základní velikosti podle TP 66 a musí být provedeny jako retroreflexní. Všechny součásti dopravních značek (podkladní desky, sloupky, značky, uchycení, kotvící prvky apod.) musí být schváleného typu.
2. Realizace přechodné úpravy provozu je podmíněna existencí pravomocného rozhodnutí ve věci povolení zvláštního užívání (příp. uzavírky) silnice (místní komunikace) a termín provedení přechodné úpravy bude v souladu s tímto rozhodnutím.
3. Žadatel zajistí pravidelnou kontrolu a údržbu dopravního značení.
4. Osazení dopravního značení zajistí žadatel. Osazení, kontrolu, údržbu i případné doplnění a změny dopravního značení v průběhu uzavírky hradí žadatel. Realizace dopravních opatření může být provedena pouze odbornou firmou. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další doplnění dopravního značení, případně stanovené dopravní značení změnit.
5. Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením bude překryto a po ukončení akce uvedeno do původního stavu.

O d ů v o d n ě n í :

Městský úřad Beroun, odbor dopravy a správních agend, stanovil na základě žádosti STRABAG a.s., Kačírková 982/4, 158 00 Praha 5, IČ: 60838744 v zastoupení ADSUM spol. s.r.o., Havlíčková 923, 273 51 Unhošť, IČ: 45144991 ze dne 19.08.2022, přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích z důvodu opravy opěrné zdi před budovou nádraží Králův Dvůr u silnice č. III/11524 – umístění vrtné soupavy v k.ú. Králův Dvůr a s touto stavbou spojených dopravních opatření na ul. Tovární – v úseku dle grafického vyobrazení (str. 4 -6).

Dne 04.08.2022 se uskutečnilo jednání ohledně uzavírky v Královém Dvoře, kde se domluvila objízdná trasa pro vozidla CEMIXu a i změna termínu začátku celé akce.

Přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích, stanovil obecní úřad s rozšířenou působností po předchozím písemném vyjádření policie, v tomto případě Policie ČR, Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje, územního odboru Beroun, dopravního inspektorátu, Tyršova 1635, 266 50 Beroun, která dala k tomuto stanovení přechodné úpravy kladné vyjádření pod č.j.: KRPS-209995-2/ČJ-2022-010206 ze dne 22.08.2022.

Poučení: Toto stanovení se vydává formou opatření obecné povahy, které se oznamuje veřejnou vyhláškou. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 správního řádu)

Ing. Albert Červenka
vedoucí odboru dopravy a správních agend

v z. Ing. Monika Olexová, v.r.

Za správnost vyhotovení: Iveta Brůnová

Toto opatření obecné povahy (č.j. MBE/55331/2022/DOPR-OIM) musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Beroun a Městského úřadu Králův Dvůr.

Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty vyznačení údajů musí být vyhláška neprodleně vrácena zpět odboru dopravy a správních agend. Zároveň žádáme o zveřejnění písemnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup a o potvrzení této skutečnosti!

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.

Obdrží:

Dotčené orgány:


- **Policie ČR**, Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, dopravní inspektorát, Tyršova 1635, 266 01 Beroun

Ostatní:


- **Městský úřad Beroun**, kancelář tajemníka, podatelna MěÚ Beroun, Husovo náměstí 68, 266 01 Beroun, IČ: 00233129.
(pro zveřejnění na úřední desce na dobu nejméně 15 dnů – podle § 172 odst. 1 správního řádu)
- **Městský úřad Králův Dvůr**, náměstí Míru 39, 267 01 Králův Dvůr, IČ: 00509701.
(pro zveřejnění na úřední desce na dobu nejméně 15 dnů – podle § 172 odst. 1 správního řádu)
- **STRABAG a.s.**, Kačírková 982/4, 158 00 Praha 5, IČ: 60838744 v zastoupení ADSUM spol. s.r.o., Havlíčková 923, 273 51 Unhošť, IČ: 45144991.

Příloha č.1:

Schematický plánek D0 - celková situace

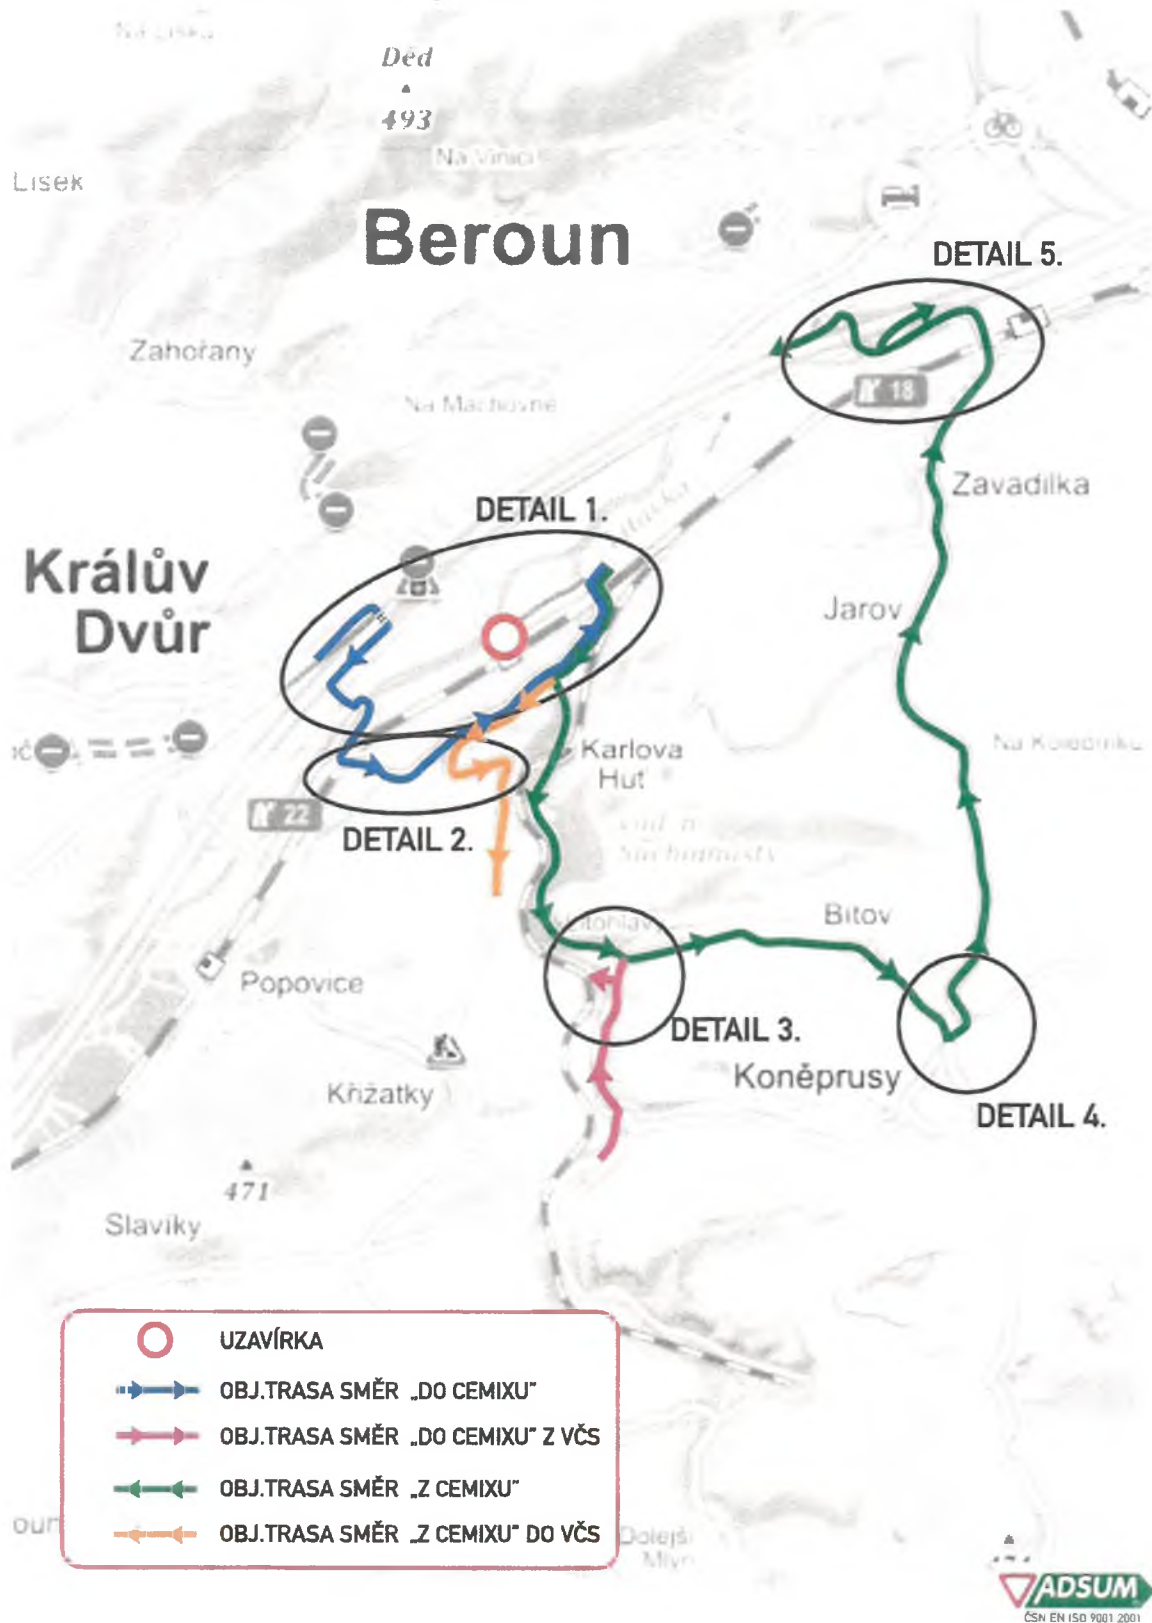

Příloha č. 2:

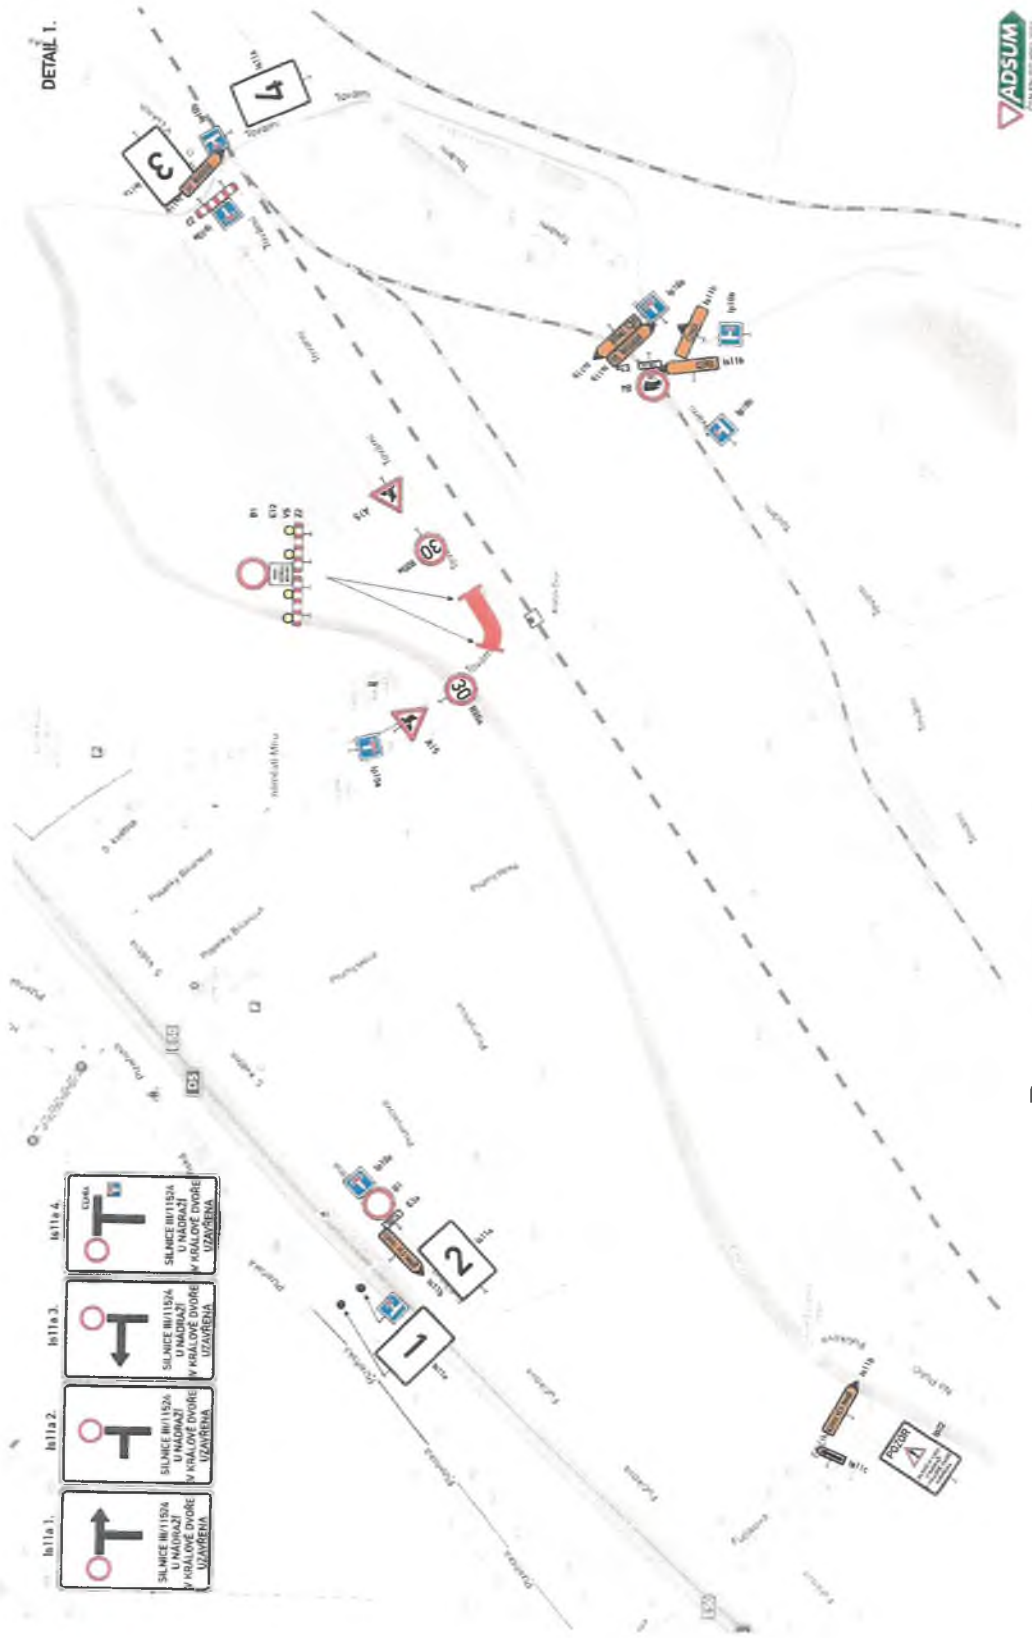

Detail křižovatek s DZ

Příloha č. 3:

Detail křižovatek s DZ





Beroun

Město Beroun

Městský úřad

Odbor dopravy a správních agend

Datum:
05.09.2022

Číslo jednací:
MBE/57372/2022/DOPR-
OIM

Spisová značka:
00763/2022/DOPR/3

Vyřizuje / telefon:
Inn. Monika Olexová/

E-mail: -----

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Beroun, odbor dopravy a správních agend obdržel dne 19.08.2022 žádost od STRABAG, a.s., Kačírková 982/4, 158 00 Praha 5, IČ: 60838744 zastoupen na základě plné moci ADSUM spol s.r.o., Lidická 7, 273 51 Unhošť, IČ: 45144991, (dále jen „žadatel“) o **povolení uzavírky a zvláštního užívání silnice č. III/11524, ul. Tovární z důvodu opravy opěrné zdi před budovou nádraží Králův Dvůr.**

Městský úřad Beroun, odbor dopravy a správních agend, jako silniční správní úřad obce s rozšířenou působností, podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) příslušný rozhodovat ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo krajský úřad

p o v o l u j e

- Podle § 25 odst. 6 písm. c bod 2 a 3) zákona o pozemních komunikacích a § 40 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se zákon o pozemních komunikacích provádí, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „prováděcí vyhláška“) **zvláštní užívání silnice č. III/11524, ul. Tovární z důvodu opravy opěrné zdi před budovou nádraží Králův Dvůr.**

- Odpovědný pracovník: p. Václav Svoboda, tel.: 602 220 747.
- Zvláštní užívání silnice č. III/11524 bude realizováno v době od:

od 12.09.2022 – do 03.10.2022

- Při stavbě nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti chodců ani silničního provozu nebo k znečištění komunikací.
- Dopravní opatření: dopravní značení bude v souladu se schváleným stanovením přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích odborem dopravy a správních agend Městského úřadu Beroun, ze dne 30.08.2022, pod č.j.: MBE/55331/2022/DOPR-OIM,
- Žadatel v případě časového zkrácení prací zajistí úpravu dopravního značení a zařízení a bude o tom informovat účastníky řízení, dotčené orgány, dopravce a další subjekty kterým byla uzavírka tímto rozhodnutím oznámena, podle níže uvedených adres.
- Za dopravní značení odpovídá zhotovitel.
- Toto rozhodnutí bude na požádání kontrolních orgánů, Policie ČR a zaměstnanců Městského úřadu Beroun provádějících státní dozor předloženo oprávněnou osobou za zhotovitele v místě stavby.

II. Podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 prováděcí vyhlášky povoluje **uzavírku silnice č. III/11524, ul. Tovární z důvodu opravy opěrné zdi před budovou nádraží Králův Dvůr a nařizuje u uzavírky jednotlivé objízdné trasy:**

- Objízdná trasa pro příjezd do areálu firem Českomoravský cement a.s. a Franken Maxit s.r.o.: po silnici č. III/11524 podjetím D5 ke křižovatce se silnicí č. III/11542 a po této silnici (ul. Fučíková, Na Poříčí a Tovární) zpět na silnici č. III/11524. Délka trasy je cca 4 km.
- Objízdná trasa pro výjezd z areálu firem Českomoravský cement a.s. a Franken Maxit s.r.o.: po silnici č. III/1124 přes křižovatku se silnicí č. III/11542 a dále po silnici č. III/11524 až ke křižovatce se silnicí č. III/11534 (napojení / oddělení směru Vápenka Čertovy schody) a po této přes obec Bítov ke křižovatce se silnicí č. III/11533. Dále po této komunikaci až do Berouna na D5.

Důvodem pro rozdělení objízdných tras je poškození opěrné zdi na silnici č. III/11542 v ul. Tovární hned za křižovatkou se silnicí č. III/11546 ve směru do města Králův Dvůr. Z tohoto důvodu není možné vést objízdnou trasu obousměrně pro všechna vozidla.

1. Odpovědný pracovník: p. Václav Svoboda, tel.: 602 220 747.
2. Uzavírka silnice bude provedena v době:

od 12.09.2022 – do 03.10.2022

3. Důvod uzavírky je bezpečnost silničního provozu při opravě opěrné zdi před budovou nádraží Králův Dvůr.
4. Místo uzavírky silnice č. III/11524, ul. Tovární je vyznačeno v schematickém plánu, který je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
5. Autobusová doprava: nebude dotčena uzavírkou.
6. Při stavbě nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti chodců ani silničního provozu nebo k znečištění komunikací.
7. Dopravní opatření: dopravní značení bude v souladu se schváleným stanovením přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích odborem dopravy a správních agend Městského úřadu Beroun ze dne 30.08.2022, pod č.j.: MBE/55331/2022/DOPR-OIM.
8. Za průběh uzavírky odpovídá zhotovitel.
9. Toto rozhodnutí bude na požádání kontrolních orgánů, Policie ČR a zaměstnanců Městského úřadu Beroun provádějících státní dozor předloženo oprávněnou osobou za zhotovitele v místě stavby.

Účastníci řízení:

- STRABAG, a.s., Kačírková 982/4, 158 00 Praha 5, IČ: 60838744 zastoupen na základě plné moci ADSUM spol s.r.o., Lidická 7, 273 51 Unhošť, IČ: 45144991.
- Město Králův Dvůr, náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr, IČ: 00509701.
- Krajská správa a údržba silnic Stř. kraje, p.o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ: 00066001.
- Policie ČR, DI Beroun, Tyršova 1635, 266 50 Beroun – Město, IČ: 75151481.

O d ů v o d n ě n í

Dne 19.08.2022 podal žadatel na Městský úřad Beroun, odbor dopravy a správních agend žádost o **povolení uzavírky silnice č. III/11524, ul. Tovární z důvodu opravy opěrné zdi před budovou nádraží Králův Dvůr od 12.09.2022 do 03.10.2022.**

Ohledně objízdných tras bylo svolán jednání na 04.08.2022, kde byla domluvená objízdná trasa pro nákladní vozidla z areálu firem Českomoravský cement a.s. a Franken Maxit s.r.o..

K žádosti žadatel doložil DIO odsouhlasené Policií ČR, DI Beroun ze dne 22.08.2022, pod č.j.: KRPS-209995-2/ČJ-2022-010206, vyjádření a souhlas KSÚS Středočeského kraje p.o. ze dne 03.05.2022 pod č.j. 3498/22/KSUS/KLT/BALE, souhlas obce dotčené uzavírkou a objížděkou – Králův Dvůr ze dne 22.08.2022.

Původní termín začátku stavby byl stanoven na dne 31.08.2022 a po jednání byl změněn na 12.09.2022.

Po vyhodnocení žádosti, doložených podkladů, schválení Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Městským úřadem Beroun, odborem dopravy a správních agend, ze dne 30.08.2022, pod č.j.: MBE/55331/2022/DOPR-OIM, bylo rozhodnuto, jak je ve výroku rozhodnutí uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, podáním u Městského úřadu Beroun, odboru dopravy a správních agend, Politických vězňů 20, 266 43 Beroun.

Odvolání proti rozhodnutí o uzavírce a objížděce nemá podle § 24 odst. 4) zákona o pozemních komunikacích odkladný účinek.

Ing. Albert Červenka, v.r.
vedoucí odboru dopravy a správních agend

Za správnost vyhotovení: Iveta Brúnová

Správní poplatek byl vyměřen podle zákona č. 634/2004 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 500 Kč, slovy: pětsetkorunčeských a byl zaplacen převodem na účet Městského úřadu Beroun dne 23.08.2022, pod VS: 9031008262.

Obdrží: účastníci řízení:


- STRABAG, a.s., Kačírková 982/4, 158 00 Praha 5, IČ: 60838744 zastoupen na základě plné moci ADSUM spol s.r.o., Lidická 7, 273 51 Unhošť, IČ: 45144991.
- Město Králův Dvůr, náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr, IČ: 00509701.
- Krajská správa a údržba silnic Stř. kraje, p.o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ: 00066001.
- Policie ČR, DI Beroun, Tyršova 1635, 266 50 Beroun – Město, IČ: 75151481.

Na vědomí:

- ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o., Pod Hájem 97, 267 01 Králův Dvůr, IČ: 25620886.
- ROPID, Rytířská 10, 110 00 Praha 1, IČ: 60437359.
- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Beroun, Pod Studánkou 1258, 266 01 Beroun 2, IČ: 70885371.
- JESSENIA a.s., Okruhová 1135/44, 155 00 Praha 5, IČ: 26752051, dispečink dopravní zdravotní služby, Profesora Veselého 493, 266 01 Beroun 3.
- Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje, Vančurova 1544, 272 01 Kladno, IČ: 75030926, stanoviště Beroun, Profesora Veselého 641, 266 56 Beroun.
- IDSK, Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8, IČ:05792291.

Příloha č.1:

Schematický plánek D0 - celková situace

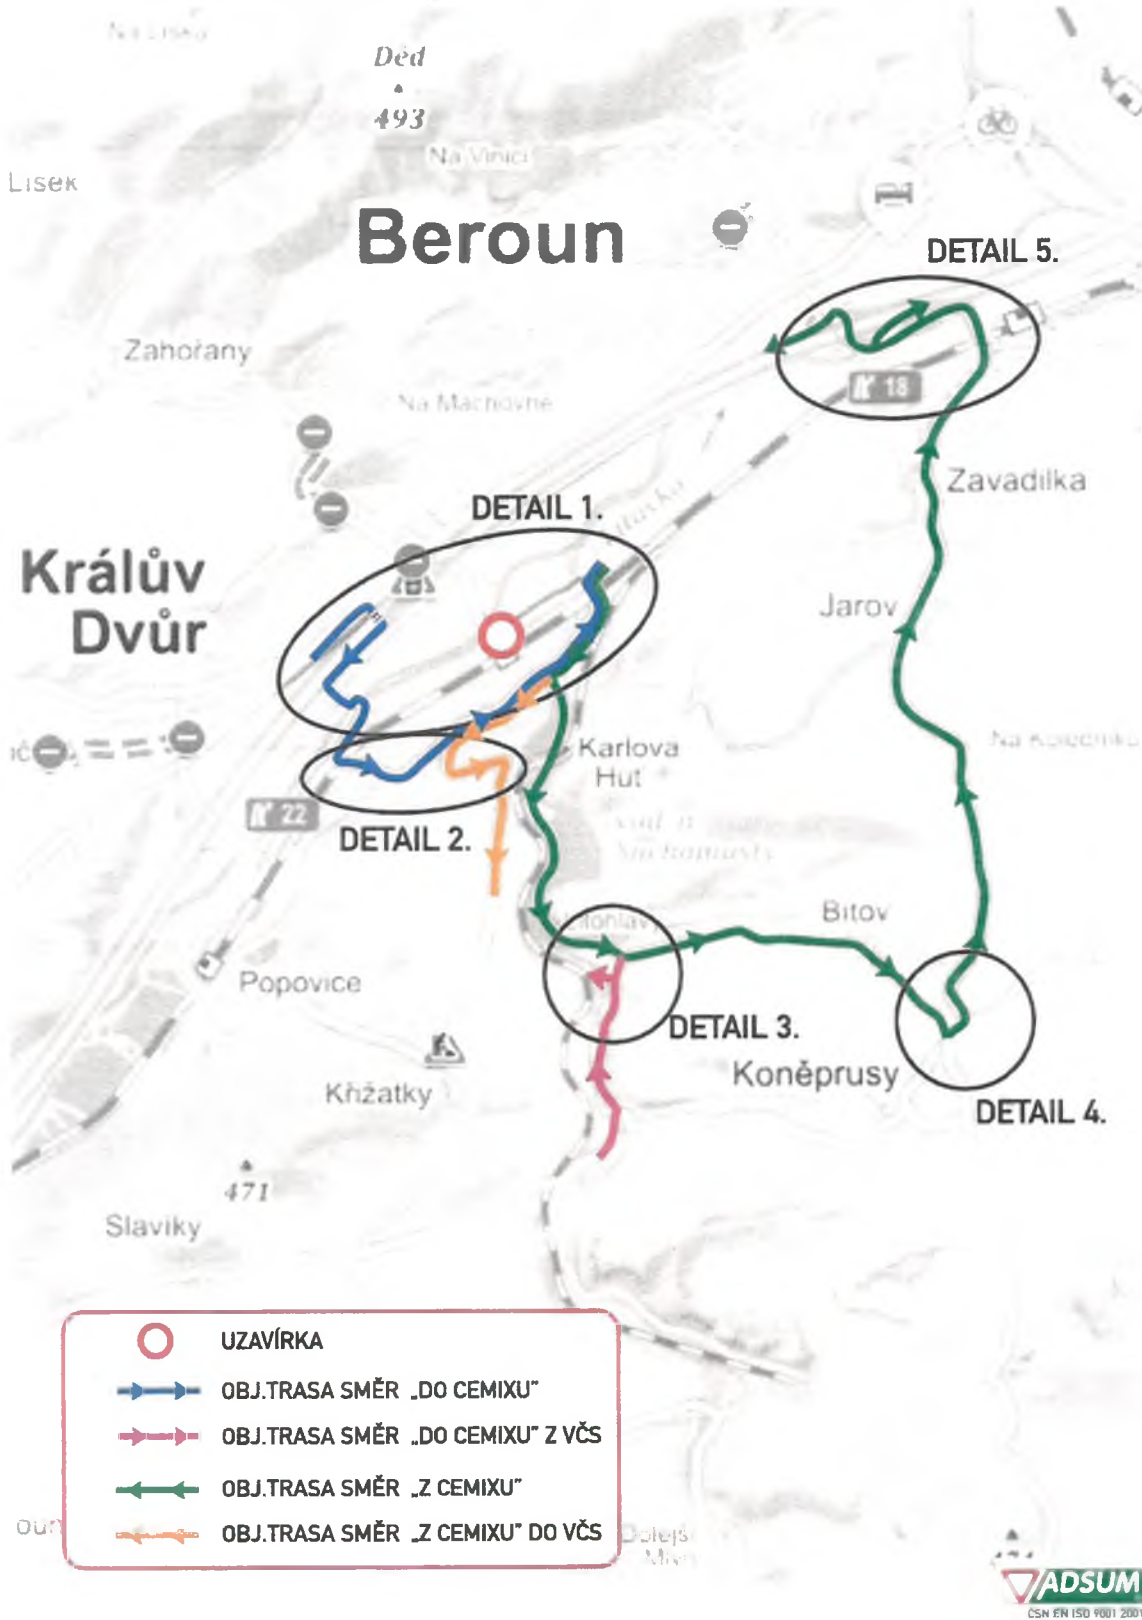

Dle rozdělovníku

Váš dopis č.j./ze dne:

Vyřizuje:
Michal Gregor
tel.:V Unhošti:
9.11.2022

, e-mail:

Věc: **Oznámení termínů**

Oznamujeme Vám tímto, že vývoj opatření na sil.č. III/11524 ul.Tovární ve Městě Králův Dvůr v km staničení 15,460 – 15,550 při stavbě **Obchvat Králův Dvůr – silnice II.třídy – II.etapa** bude proveden následovně.

Termíny:

12.9. – 30.9.2022 – úplná uzavírka – vrtání mikropilotů**30.9. – 13.10.2022 – část. uzavírka SSZ – dokončovací práce před homogenizací****13.10. – 14.10.2022 – úplná uzavírka - homogenizace**

Investor:

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
a Město Králův Dvůr**

Odpovědná organizace (zhotovitel):

STRABAG a.s.

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, IČ: 608 38 744

Odpovědná osoba: p. Václav Svoboda, tel.: 602 220 747

Dopravní značení bude provádět:

ADSUM spol. s r.o.

Havlíčková 923, 273 51 Unhošť, IČ: 451 44 991

Zodpovědná osoba: p. Martin Frolík, tel.:

.....
Martin Frolík – ředitel**Rozdělovník:**

MěU Beroun, odbor dopravy

PČR DI Beroun

KSÚS SK

Město Kr.Dvůr



Vyřizuje: P. Burger

V Kladně dne: 5.prosince 2022

KSSÚ Středočeského kraje
Zborovská 11
150 00 Praha 5

Věc: „Obchvat Králův Dvůr - II. etapa“

Změny oproti PDPS - ZBV 5

Vyjádření TDS

Předmětem změny je:

Změna DIO v souvislosti s výstavbou opěrné stěny, vypracování projektové dokumentace související s realizací opěrné stěny.

V průběhu výstavby byl zjištěn havarijní stav opěrné zdi u objektu čp.399 firmy EZIKO s.r.o. Řešení způsobu opravy opěrné zdi bylo odsouhlaseno v rámci ZBV č.3. Při provádění nové pilotové stěny, zajišťující těleso komunikace, byla nutná z bezpečnostních důvodů a z důvodů proveditelnosti změna dopravně inženýrských opatření. Pro bourání stávající opěrné zdi v havarijním stavu byl z bezpečnostních důvodů veden provoz jednosměrně, řízen SSZ po dobu čtrnácti dnů, (31.8 do 12.9.2022). Dopravní značení bylo osazeno na základě stanovení. Při samotném provádění pilotáže byla realizována úplná uzavírka komunikace. Následně byl provoz od 30.9. do 13.10.2022 opět jednosměrný, od 12.9.-13.10.2022) řízen SSZ pro provedení ztužující římsy, zábradlí a dokončovacích prací před pokládkou obrusné vrstvy. V termínech 13.a 14.10.byla komunikace opět uzavřena pro pokládku obrusné vrstvy v prostoru celé křižovatky.

Ocenění změny:

Výčet a množství měněných položek soupisu prací je odpovídající dle Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti, které dodavatel nemohl předvídat a ani je nezavinil, technický dozor objednatele s předloženým řešením **souhlasí**, a považuje je za oprávněné.

Jedná se o změny nezbytné pro realizaci a dokončení stavby.

Za IBH s.r.o.


Petr Burger
