

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na stavební práce

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

zastoupená Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem

nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022

č. smlouvy: S-2929/00066001/2022

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

M - SILNICE a.s.

se sídlem: Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice

IČO: 421 96 868

DIČ: CZ42196868

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430

zastoupená: Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva jednajícím na základě pověření představenstvem

č. smlouvy: 22-SOD-2022-009

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též „**občanský zákoník**“), tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“).

I. PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 20.12.2022 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) na akci: „**III/24423 Byšice, most ev.č. 24423 - 3 přes potok v obci Byšice**“.

S ohledem na vznik objektivně nepředvídaných okolností v průběhu realizace prací na díle, které nemohl zhotovitel před zahájením prací předpokládat, a které zapříčinily změnu rozsahu prací bylo 27.09.2023 podepsáno ZBV 4 s odůvodněním:

V rámci stavby „III/24423 Byšice, most ev.č. 24423 - 3 přes potok v obci Byšice“ bylo v PDPS uvažována se základovými poměry dle provedeného IGP, který byl součástí ZD stavby. Při realizaci provádění výkopů pro založení mostu zhotovitel zjistil částečně odlišné základové poměry oproti předpokladu z PDPS. Odlišné základové poměry spočívají zejména v jiné mocnosti velmi neúnosných organických zemin a v předpokládané velikosti přítoku podzemní vody do stavební jámy. Oprávněný geotechnik stavby zhodnotil zjištěný stav a potvrdil, že základová spára je nevyhovující, a doporučil výměnu podloží v odhadnuté mocnosti cca 800 mm

a zřízení podkladních vrstev ve větší mocnosti. Toto uvedené však nemohl zpracovatel PDPS předvídat. Geotechnik dále doporučil doplnění pažící konstrukce ze štětovnic na vtokové a výtokové straně stavební jámy pro snížení přítoku podzemní vody do stavební jámy. Větší mocnost organických zemin, než předpokládala PDPS, způsobuje menší odolnost pažení proti zemnímu tlaku. Proto je nezbytné doplnit ztužující ocelovou převážku, která zajistí potřebnou vodorovnou únosnost pažící konstrukce a eliminuje riziko náhlé ztráty stability pažící konstrukce. Geotechnik také doporučil zřízení čerpacích jímek pro odčerpávání spodní vody ze stavební jámy. **Současně změna znamená prodloužení doby realizace při zakládání objektu, mimo jiné i nutnost čerpání stavební jámy v delším časovém horizontu. PDPS předpokládalo dobu pro založení a osazení prefabrikátů do 28 dne po zahájení prací. Prefabrikáty se osazují 78 den po zahájení prací, respektive + 48 dnů od zjištění odlišných základových poměrů.** Změna řeší zlepšení základové spáry, statické zajištění pažících konstrukcí a odvodnění stavební jámy.

II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na prodloužení doby plnění, odst. 4.1. Smlouvy nově zní:

4.1. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli do 4 měsíců a 48 dnů od předání Staveniště Zhotoviteli.

Přílohou č. 1 tohoto dodatku je aktualizovaný harmonogram stavby.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek bude uveřejněn dle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) na profilu Objednatele.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
4. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží jeho elektronický originál.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.


V Říčanech dne

V Pardubicích dne

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace

M - SILNICE a.s.

Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva
jednající na základě pověření představenstvem

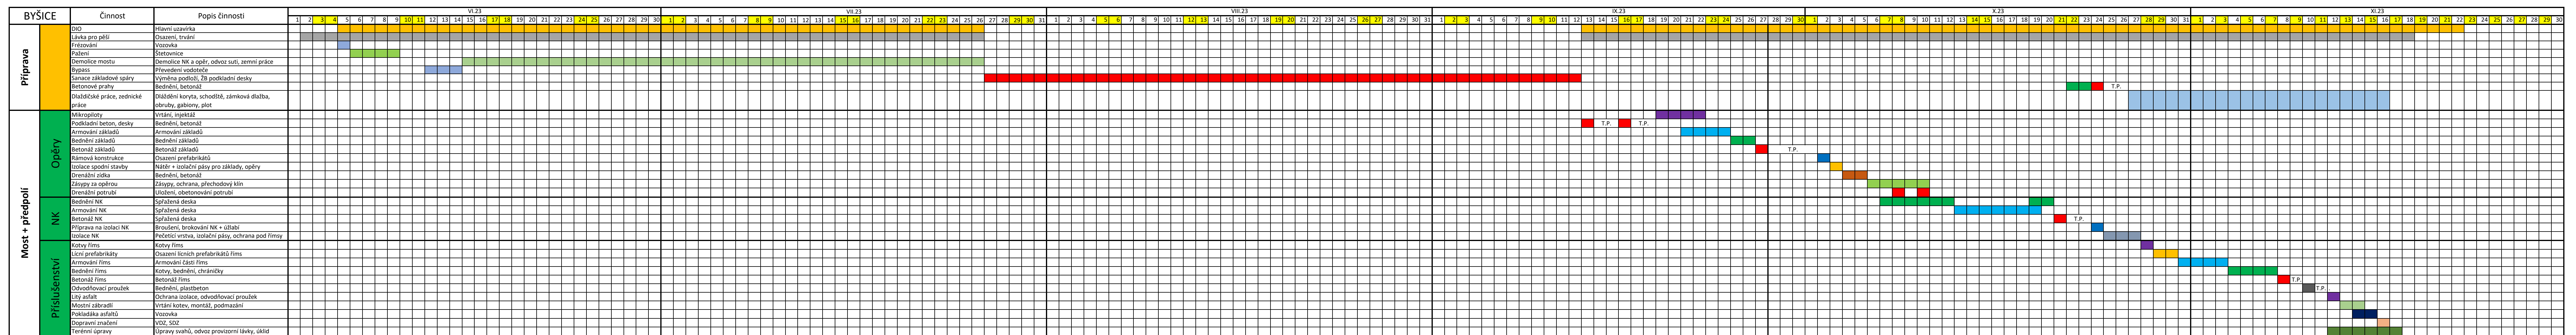

„III/24423 Byšice, most ev.č. 24423 - 3 přes potok v obci Byšice“
