

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. DSML_UM01/00077/23

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník


(dále též jen „občanský zákoník“)


Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice – městský obvod Pardubice I
Se sídlem: U Divadla 828
530 02 Pardubice
Zastoupený: Filipem Šťastným, starostou městského obvodu
IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
číslo účtu: 246670258/0600

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: TIMRA s.r.o.
Se sídlem: Semtín 85, 530 02 Pardubice
Zastoupen: Jan Kafka – jednatel
Jednající: Jan Kafka – jednatel
IČ: 048 06 859 DIČ: 
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u, Krajského soudu v Hradci Králové,

oddíl C, vložka 36654, zapsána dne 11. 02. 2016
bankovní spojení: ČSOB a.s., Pardubice
číslo účtu: 

(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek ke smlouvě o dílo:

Článek I.

Účastníci tohoto dodatku uzavřeli dne 16. 06. 2023 smlouvu o dílo na „Regenerace vnitrobloků ohraničených ul. Dašická, Na Okrouhlíku, Studánecká – IV. etapa.“

Článek II.

Tímto dodatkem se mění **článek II. Odst. 1. Termín a místo plnění**, a to následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v termínu:

Zhotovitel zahájí práce na díle (červenec – srpen 2023) 03. 07. 2023

Termín dokončení celého díla včetně jeho řádného odevzdání je nejpozději 14. 11. 2023

Článek III.

Tímto dodatkem se mění článek III. odst. 1. Cena za dílo této smlouvy, a to následovně:

během realizace došlo k změně rozsahu díla, tj. k tzv. vícepracím ve výši 131 416,51 Kč bez DPH, zároveň během realizace došlo k změně rozsahu díla, tj. k tzv. méněpracím ve výši 131 416,51 Kč bez DPH. Dohodnutá cena díla uvedená v článku II. odst. 1 Smlouvy o dílo se nemění.

Článek IV.

Podle předchozí dohody dle článku III. odst. 1 tohoto dodatku, se celková cena díla 2 463 305,48 Kč bez DPH, uvedená v článku II. odst. 1 smlouvy o dílo a platných dodatků, po přípočtu vícepráce a méněpráce nemění.

Předmětem DÍLA vícepráce a méněpráce je příloha č.1 Oznámené změny, příloha č.2 Soupis stavebních prací, příloha č.3 Podrozpočet výkaz výměr VO, příloha č.4 PD zrušený chodník, které je součástí přílohy dodatku ke smlouvě č. 1.

Článek V.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 16. 06. 2023, nedotčená výše uvedenou změnou termínu díla, zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, všechny jsou s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany tento dodatek přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Filip Šťastný, starosta městského obvodu

.....

Jan Kafka, jednatel společnosti

Předmět této smlouvy byl schválen usnesením
Rady – Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I
Č. 336 (30/10/23) ze dne 11. 10. 2022

V Pardubicích dne 19. 10. 2022

Vyhotovil: *Ing. Gabriela Křížková, tajemnice*

Úřad městského obvodu Pardubice I

OZNÁMENÍ ZMĚNY 09/2023		číslo OZ: 1
Zhotovitel:	Timra s.r.o.	
Investor:	Statutární město Pardubice – městský obvod Pardubice I	Datum: 21. 09. 2023
Název akce: Regenerace vnitrobloků ohraničených ul. Dašická, Na Okrouhlíku, Studánecká – IV. etapa		
Odkazy na	specifikaci:	Zrušení chodníku, rozšíření asfaltových vrstev a obnova uličních vpustí
	na výkresy:	PD zrušený chodník
	na rozpočtové podklady:	Objekt – SO 101 Komunikace, SO 401 VO
	na jinou část smlouvy:	
Důvod vícepráce / méněpráce:		
Předmět změny: Zrušení chodníku, rozšíření asfaltových vrstev a obnova uličních vpustí		
Zrušení chodníku:		
Na základě požadavku investora byla zrušena dodávka chodníku v úseku mezi st. 6835 a st. 616/1 vč. 1 ks veřejného osvětlení, viz. příloha PD zrušení chodníku. Na základě tohoto požadavku vznikly méněpráce a vícepráce spojené s vracením nakoupeného materiálů.		
Rozšíření asfaltových vrstev:		
Z důvodu špatného stavu komunikací a propadlých znaků inženýrských sítí v ulicích Na Okrouhlíku a Ke Kamenci, bylo na stavbě domluveno rozšíření napojení asfaltových vrstev oproti původní PD. Nové rozšíření je s ohledem na technologii pokládky asfaltových vrstev.		
Obnova uličních vpustí:		
S ohledem na výškové řešení, okolní terén a prudké nárazové deště, které se v posledních letech vyskytují, byla AD navržena obnova 2 stávajících UV. Poloha 2 nových uličních vpustí vychází ze stávajících a AD bylo provedeno „převýškování“ celé situace. Původní PD uvažovala v celé míře se zasakováním.		
Stanovisko technického dozoru stavby:		
Stanovisko projektanta stavby:		
Příloha: č.2 – Soupis stavebních prací, č.3 - Podrozpočet výkaz výměr VO , č.4 - PD zrušený chodník		

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	Timra s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Timra s.r.o.	
Datum:	21. 09. 2023	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Zrušení chodníku, rozšíření asfaltových vrstev a obnova uličních vpustí</p> <p>Zrušení chodníku:</p> <p>Na základě požadavku investora byla zrušena dodávka chodníku v úseku mezi st. 6835 a st. 616/1 vč. 1 ks veřejného osvětlení, viz. příloha PD zrušení chodníku. Na základě tohoto požadavku vznikly méněpráce a vícepráce spojené s vracením nakoupeného materiálů.</p> <p>Rozšíření asfaltových vrstev:</p> <p>Z důvodu špatného stavu komunikací a propadlých znaků inženýrských sítí v ulicích Na Okrouhlíku a Ke Kamenci, bylo na stavbě domluveno rozšíření napojení asfaltových vrstev oproti původní PD. Nové rozšíření je s ohledem na technologii pokládky asfaltových vrstev.</p> <p>Obnova uličních vpustí:</p> <p>S ohledem na výškové řešení, okolní terén a prudké nárazové deště, které se v posledních letech vyskytují, byla AD navržena obnova 2 stávajících UV. Poloha 2 nových uličních vpustí vychází ze stávajících a AD bylo provedeno „převýškování“ celé situace. Původní PD uvažovala v celé míře se zasakováním.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH: - 131 416,51 Kč	Cena víceprací bez DPH: + 131 416,51 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 0,00 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <u>14. 11. 2023</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
_____	_____	
Datum:	Datum:	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL č. 01

Stavba: Regenerace vnitrobloků ohraničených ul. Dašická, Na Okouhlíku, Studánecká - IV. etapa

KSO:
Místo: Pardubice

CC-CZ:
Datum: 2. 9. 2022

Zadavatel:
Městský obvod Pardubice I

IČ: 00274046
DIČ: CZ00274046

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Bc. Jakub Zítka

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH				0.00
---------------------	--	--	--	-------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21.00%	0.00		0.00
snížená	15.00%	0.00		0.00

Cena s DPH	v	CZK		0.00
-------------------	----------	------------	--	-------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL č. 01

Stavba: Regenerace vnitrobloků ohraničených ul. Dašická, Na Okouhlíku, Studánecká - IV. etapa

Místo: **Pardubice**

Datum: 2. 9. 2022

Zadavatel: Městský obvod Pardubice I

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Bc. Jakub Zítka

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

0.00

0.00

SO 101 **Komunikace - vnitroblok - méněpráce**

-110,966.20

-134,269.10

STA

SO 401 **VO**

-20,450.31

-24,744.88

STA

SO 101 **Komunikace - vnitroblok - vícepráce**

131,416.51

159,013.98

STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace vnitrobloků ohraničených ul. Dašická, Na Okouhlíku, Studánecká - IV. etapa

Objekt:

SO 101 - Komunikace - vnitroblok - méněpráce

KSO:

Místo: Pardubice

Zadavatel:

Městský obvod Pardubice I

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Bc. Jakub Zítka

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 2. 9. 2022

IČ:

00274046

DIČ:

CZ00274046

IČ:

0

DIČ:

0

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-110,966.20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-110,966.20	21.00%	-23,302.90
snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

-134,269.10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace vnitrobloků ohraničených ul. Dašická, Na Okouhlíku, Studánecká - IV. etapa

Objekt:

SO 101 - Komunikace - vnitroblok - méněpráce

Místo: Pardubice

Datum: 2. 9. 2022

Zadavatel: Městský obvod Pardubice I

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Bc. Jakub Zítka

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-110,966.20

HSV - Práce a dodávky HSV

-81,857.00

1 - Zemní práce

-12,087.00

4 - Vodorovné konstrukce

-7,900.00

5 - Komunikace pozemní

-41,870.00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-20,000.00

PSV - Práce a dodávky PSV

-29,109.20

771 - Podlahy z dlaždic

-29,109.20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace vnitrobloků ohraničených ul. Dašická, Na Okouhlíku, Studánecká - IV. etapa

Objekt:

SO 101 - Komunikace - vnitroblok - méněpráce

Místo: Pardubice

Datum: 2. 9. 2022

Zadavatel: Městský obvod Pardubice I

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Bc. Jakub Zítka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-110,966.20

D HSV Práce a dodávky HSV

-81,857.00

D 1 Zemní práce

-12,087.00

2	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	-79.000	40.00	-3,160.00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151123					
	P		Poznámka k položce:_x000D_ Dle SoD - pol.2					
8	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	-11.850	130.00	-1,540.50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251104					
	P		Poznámka k položce:_x000D_ Dle SoD - pol.8					
9	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-11.850	60.00	-711.00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103					
	P		Poznámka k položce:_x000D_ Dle SoD - pol.9					
10	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-11.850	240.00	-2,844.00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117					
	P		Poznámka k položce:_x000D_ Dle SoD - pol.10					
11	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-21.330	100.00	-2,133.00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201221					
	P		Poznámka k položce:_x000D_ Dle SoD - pol.11_x000D_					
12	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	-11.850	10.00	-118.50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201					
	P		Poznámka k položce:_x000D_ Dle SoD - pol.12_x000D_					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
16	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	-79.000	20.00	-1,580.00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112					
	P		Poznámka k položce: _x000D_ Dle SoD - pol.16_x000D_					
D	4		Vodorovné konstrukce				-7,900.00	
19	K	451561111	Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva tl do 100 mm	m2	-79.000	100.00	-7,900.00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného, tl. vrstvy do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451561111					
	P		Poznámka k položce: _x000D_ Dle SoD - pol.19_x000D_					
D	5		Komunikace pozemní				-41,870.00	
21	K	564851111	Podklad ze štěrku ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	-79.000	180.00	-14,220.00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podklad ze štěrku ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564851111					
	P		Poznámka k položce: _x000D_ Dle SoD - pol.21_x000D_					
33	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	-79.000	350.00	-27,650.00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211112					
	P		Poznámka k položce: _x000D_ Dle SoD - pol.33_x000D_					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-20,000.00	
47	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-80.000	250.00	-20,000.00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916231213					
	P		Poznámka k položce: _x000D_ Dle SoD - pol.47_x000D_					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-29,109.20	
D	771		Podlahy z dlaždic				-29,109.20	
31	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	-78.000	259.00	-20,202.00	CS ÚRS 2023 01
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní					
	P		Poznámka k položce: _x000D_ Dle SoD - pol.31					
32	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	-1.000	507.20	-507.20	CS ÚRS 2023 01
	PP		dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná					
	P		Poznámka k položce: _x000D_ Dle SoD - pol.32					
48	M	59217008	obrubník betonový parkový 1000x80x200mm	m	-80.000	105.00	-8,400.00	CS ÚRS 2023 01
	PP		obrubník betonový parkový 1000x80x200mm					
	P		Poznámka k položce: _x000D_ Dle SoD - pol.48					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace vnitrobloků ohraničených ul. Dašická, Na Okouhlíku, Studánecká - IV. etapa

Objekt:

SO 401 - VO

KSO:

Místo: Pardubice

Zadavatel:

Městský obvod Pardubice I

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Bc. Jakub Zítka

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 2. 9. 2022

IČ:

00274046

DIČ:

CZ00274046

IČ:

0

DIČ:

0

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-20,450.31

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-20,450.31	21.00%	-4,294.57
snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

-24,744.88

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace vnitrobloků ohraničených ul. Dašická, Na Okouhlíku, Studánecká - IV. etapa

Objekt:

SO 401 - VO

Místo:

Pardubice

Datum:

2. 9. 2022

Zadavatel:

Městský obvod Pardubice I

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Bc. Jakub Zítka

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-20,450.31

HSV - HSV

-20,450.31

401 - Veřejné osvětlení

-20,450.31

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Regenerace vnitrobloků ohraničených ul. Dašická, Na Okouhlíku, Studánecká - IV. etapa

Objekt: **SO 401 - VO**

Místo: Pardubice

Datum: 2. 9. 2022

Zadavatel: Městský obvod Pardubice I

Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel: Bc. Jakub Zítka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem							-20,450.31	
D	HSV		HSV				-20,450.31	
D	401		Veřejné osvětlení				-20,450.31	
1	K	401	Veřejné osvětlení dle samostatného rozpočtu	soubor	1.000	-20,450.31	-20,450.31	
PP			Veřejné osvětlení dle samostatného rozpočtu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace vnitrobloků ohraničených ul. Dašická, Na Okouhlíku, Studánecká - IV. etapa

Objekt:

SO 101 - Komunikace - vnitroblok - vícepráce

KSO:

Místo: Pardubice

Zadavatel:

Městský obvod Pardubice I

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Bc. Jakub Zítka

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 2. 9. 2022

IČ:

00274046

DIČ:

CZ00274046

IČ:

0

DIČ:

0

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

131,416.51

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	131,416.51	21.00%	27,597.47
snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

159,013.98

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace vnitrobloků ohraničených ul. Dašická, Na Okouhlíku, Studánecká - IV. etapa

Objekt:

SO 101 - Komunikace - vnitroblok - vícepráce

Místo: Pardubice

Datum: 2. 9. 2022

Zadavatel: Městský obvod Pardubice I

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Bc. Jakub Zítka

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

131,416.51

HSV - Práce a dodávky HSV

99,685.17

1 - Zemní práce

19,197.35

3 - Svislé a kompletní konstrukce

3,240.37

4 - Vodorovné konstrukce

1,760.40

5 - Komunikace pozemní

22,906.80

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3,130.00

8 - Trubní vedení

42,894.00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2,700.00

997 - Přesun sutě

3,856.25

PSV - Práce a dodávky PSV

31,731.34

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

15,291.00

767 - Konstrukce zámečnické

8,193.06

771 - Podlahy z dlaždic

8,247.28

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace vnitrobloků ohraničených ul. Dašická, Na Okouhlíku, Studánecká - IV. etapa

Objekt:

SO 101 - Komunikace - vnitroblok - vícepráce

Místo: Pardubice

Datum: 2. 9. 2022

Zadavatel: Městský obvod Pardubice I

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Bc. Jakub Zítka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

131,416.51

D HSV Práce a dodávky HSV

99,685.17

D 1 Zemní práce

19,197.35


1	K	113107242	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	54.000	50.90	2,748.60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107242					
	P		Poznámka k položce: _x000D_ 1x27m2 - napojení vozovky ulic - Na Okrouhlíku_x000D_ 1x27m2 - napojení vozovky ulic - Ke Kamenici					
	VV		2*27		54.000			
	VV		Součet		54.000			
2	K	132254201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	8.100	1,120.00	9,072.00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132254201					
	VV		9*0,6*1,5		8.100			
	VV		Výkop k uličním vpustím					
	VV		Součet		8.100			
3	K	161151103	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3	8.100	140.00	1,134.00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/161151103					
	VV		Výkop k uličním vpustím					
	VV		9*0,6*1,5		8.100			
	VV		Součet		8.100			
4	K	17410411R	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním (s materiálem)	m3	7.020	889.28	6,242.75	
	PP		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním (s materiálem)					
	VV		1,3*0,6*9		7.020			
	VV		Součet		7.020			
	D 3		Svislé a kompletní konstrukce				3,240.37	
5	K	35821511R	Bourání stávajících vpustí a potrubí	kpl	1.000	3,240.37	3,240.37	
	PP		Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva kamenného					
	D 4		Vodorovné konstrukce				1,760.40	
6	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	1.080	1,630.00	1,760.40	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451572111					
	VV		9*0,6*0,2		1.080			
D	5		Komunikace pozemní				22,906.80	
7	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	54.000	25.20	1,360.80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573111112					
	P		Poznámka k položce: _x000D_ 1x27m2 - napojení vozovky ulic - Na Okrouhlíku_x000D_ 1x27m2 - napojení vozovky ulic - Ke Kamenici					
8	K	577154121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	54.000	399.00	21,546.00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se ztuhnutím z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po ztuhnutí tl. 60 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577154121					
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3,130.00	
9	K	63134115R	Osazení vany roštu do betonu	kpl	2.000	1,565.00	3,130.00	
	PP		Osazení vany roštu do betonu					
D	8		Trubní vedení				42,894.00	
10	K	871350310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 200	m	9.000	171.00	1,539.00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 200					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871350310					
11	M	28617004	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x1000mm SN10	m	9.135	1,400.00	12,789.00	CS ÚRS 2023 01
	PP		trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x1000mm SN10					
	VV		9*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		9.135			
12	K	89-2	napojení vpustí na stávající šachty nebo potrubí	kus	2.000	1,800.00	3,600.00	
	PP		napojení vpustí na stávající šachty nebo potrubí					
13	K	8959413R	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců	kus	2.000	3,200.00	6,400.00	
	PP		Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců					
14	M	592-	vpust' uliční skruž betonová - kompletní: dno, skruže, mříž, koš, rám ...	kus	2.000	9,283.00	18,566.00	
	PP		vpust' uliční skruž betonová - kompletní: dno, skruže, mříž, koš, rám ...					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2,700.00	
15	K	96504222R	Odstranění čistícího roštu s rámem vč. betonového dna	kpl	2.000	1,350.00	2,700.00	
	PP		Odstranění čistícího roštu s rámem vč. betonového dna					
D	997		Přesun sutě				3,856.25	
16	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	7.128	541.00	3,856.25	CS ÚRS 2023 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221875					
	P		Poznámka k položce: _x000D_ 1x27m2 - napojení vozovky ulic - Na Okrouhlíku_x000D_ 1x27m2 - napojení vozovky ulic - Ke Kamenici					
	VV		54*0,06*2,2		7.128			
	VV		1x27m2 - napojení vozovky ulic - Na Okrouhlíku					
	VV		1x27m2 - napojení vozovky ulic - Ke Kamenici					
	VV		Součet		7.128			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D PSV			Práce a dodávky PSV					31,731.34
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					15,291.00
17	K	711161112	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií vodorovná, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	45.000	93.80	4,221.00	CS ÚRS 2023 02
PP			Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše vodorovné V vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711161112					
VV			90°0,5	45.000				
VV			Součet	45.000				
18	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou	m	90.000	123.00	11,070.00	CS ÚRS 2023 01
PP			Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711161383					
VV			90	90.000				
VV			Součet	90.000				
D 767			Konstrukce zámečnické					8,193.06
19	K	76753111R	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	ks	2.000	285.00	570.00	
PP			Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových					
20	M	ACO.82404	ACO Self Vario - rošt 750x500, mřížkový, oka 30x30, ZN	kus	2.000	1,866.53	3,733.06	
PP			ACO Self Vario - rošt 750x500, mřížkový, oka 30x30, ZN					
21	M	ACO.82405R	Vana podlahová polymerbetonová ACO Self Vario s odtokem DN 100 750×500 mm	kus	2.000	1,945.00	3,890.00	
PP			Vana podlahová polymerbetonová ACO Self Vario s odtokem DN 100 750×500 mm					
D 771			Podlahy z dlaždic					8,247.28
22	K	771591XO1	Poplatek 3 % storno - materiál	kpl	0.030	29,109.20	873.28	
PP			Poplatek 3 % storno - materiál					
23	K	998771XO2	Poplatek - dopravné	kpl	1.000	7,374.00	7,374.00	
PP			Poplatek - dopravné					
P			Poznámka k položce: _x000D_ Doprava BEST - stavba_x000D_ Doprava DEK_x000D_ Složení a naložení materiálu					

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Elektromontáže								
<i>KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC</i>								
CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	-4.00	17.33	-69.30	19.43	-77.70	36.75	-147.00
<i>UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI</i>								
Do 16 mm2	ks	-11.00	0.00	0.00	25.94	-285.29	25.94	-285.29
<i>OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ</i>								
Drát 10 drát ø 10mm(0,62kg/m), volně	m	-2.00	50.93	-101.85	61.64	-123.27	112.56	-225.12
<i>SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMNOVACÍ</i>								
SP přípojovací	ks	-1.00	40.64	-40.64	51.03	-51.03	91.67	-91.67
<i>STOŽÁROVÉ POUZDRO</i>								
SP250/1000 stožárové pouzdro	ks	-1.00	892.50	-892.50	4,809.00	-4,809.00	5,701.50	-5,701.50
<i>STOŽÁR ULIČNÍ BEZPATICOVÝ</i>								
žárově zinkovaný - provedení "Pardubice"								
133x4/89x3/60x3 - 5+0,8m	ks	-1.00	5,659.50	-5,659.50	1,764.00	-1,764.00	7,423.50	-7,423.50
ochranná manžeta plastová OM133	ks	-1.00	472.50	-472.50	110.25	-110.25	582.75	-582.75
<i>STOŽÁROVÁ VÝZBROJ</i>								
SR 481-27(14)Z/Cu st.výz.1xE27(14)/4xM8/35mm2	ks	-1.00	511.67	-511.67	340.73	-340.73	852.39	-852.39
<i>TAVNÁ VLOŽKA E27+STYČ.KROUŽEK</i>								
6A, char. normální	ks	-1.00	17.12	-17.12	6.83	-6.83	23.94	-23.94
<i>SVÍTIDLA PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - včetně světelných zdrojů</i>								
A - LED - uliční, 1000lm, 2700K, min. 100lm/W, IP66, IK08, opt. DM50	ks	-1.00	0.00	0.00	367.50	-367.50	367.50	-367.50
Elektromontáže - celkem				-7,765.07		-7,935.59		###

Zemní práce								
<i>JAMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ</i>								
<i>O OBJEMU DO 2 m3</i>								
Zemina třídy 3.ručně	m3	-0.80	855.00	-684.00		0.00	855.00	-684.00
<i>ZÁHOZ JÁMY,UPĚCHOVÁNÍ,ÚPRAVA</i>								
<i>POVRCHU</i>								
V zemině třídy 3-4	m3	-0.40	224.00	-89.60		0.00	224.00	-89.60
<i>ZÁKLAD Z PROSTĚHO BETONU</i>								
Do rostlé zeminy bez bednění	m3	-0.70	2,050.00	-1,435.00		0.00	2,050.00	-1,435.00
<i>POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK. OSV.</i>								
D 300x1000 mm	ks	-1.00	2,500.00	-2,500.00		0.00	2,500.00	-2,500.00
<i>ODVOZ ZEMINY</i>								
Do vzdálenosti 1 km	m3	-0.40	103.00	-41.20		0.00	103.00	-41.20
Zemní práce - celkem				-4,749.80		0.00		-4,749.80
Cena celkem bez DPH								-20,450.45

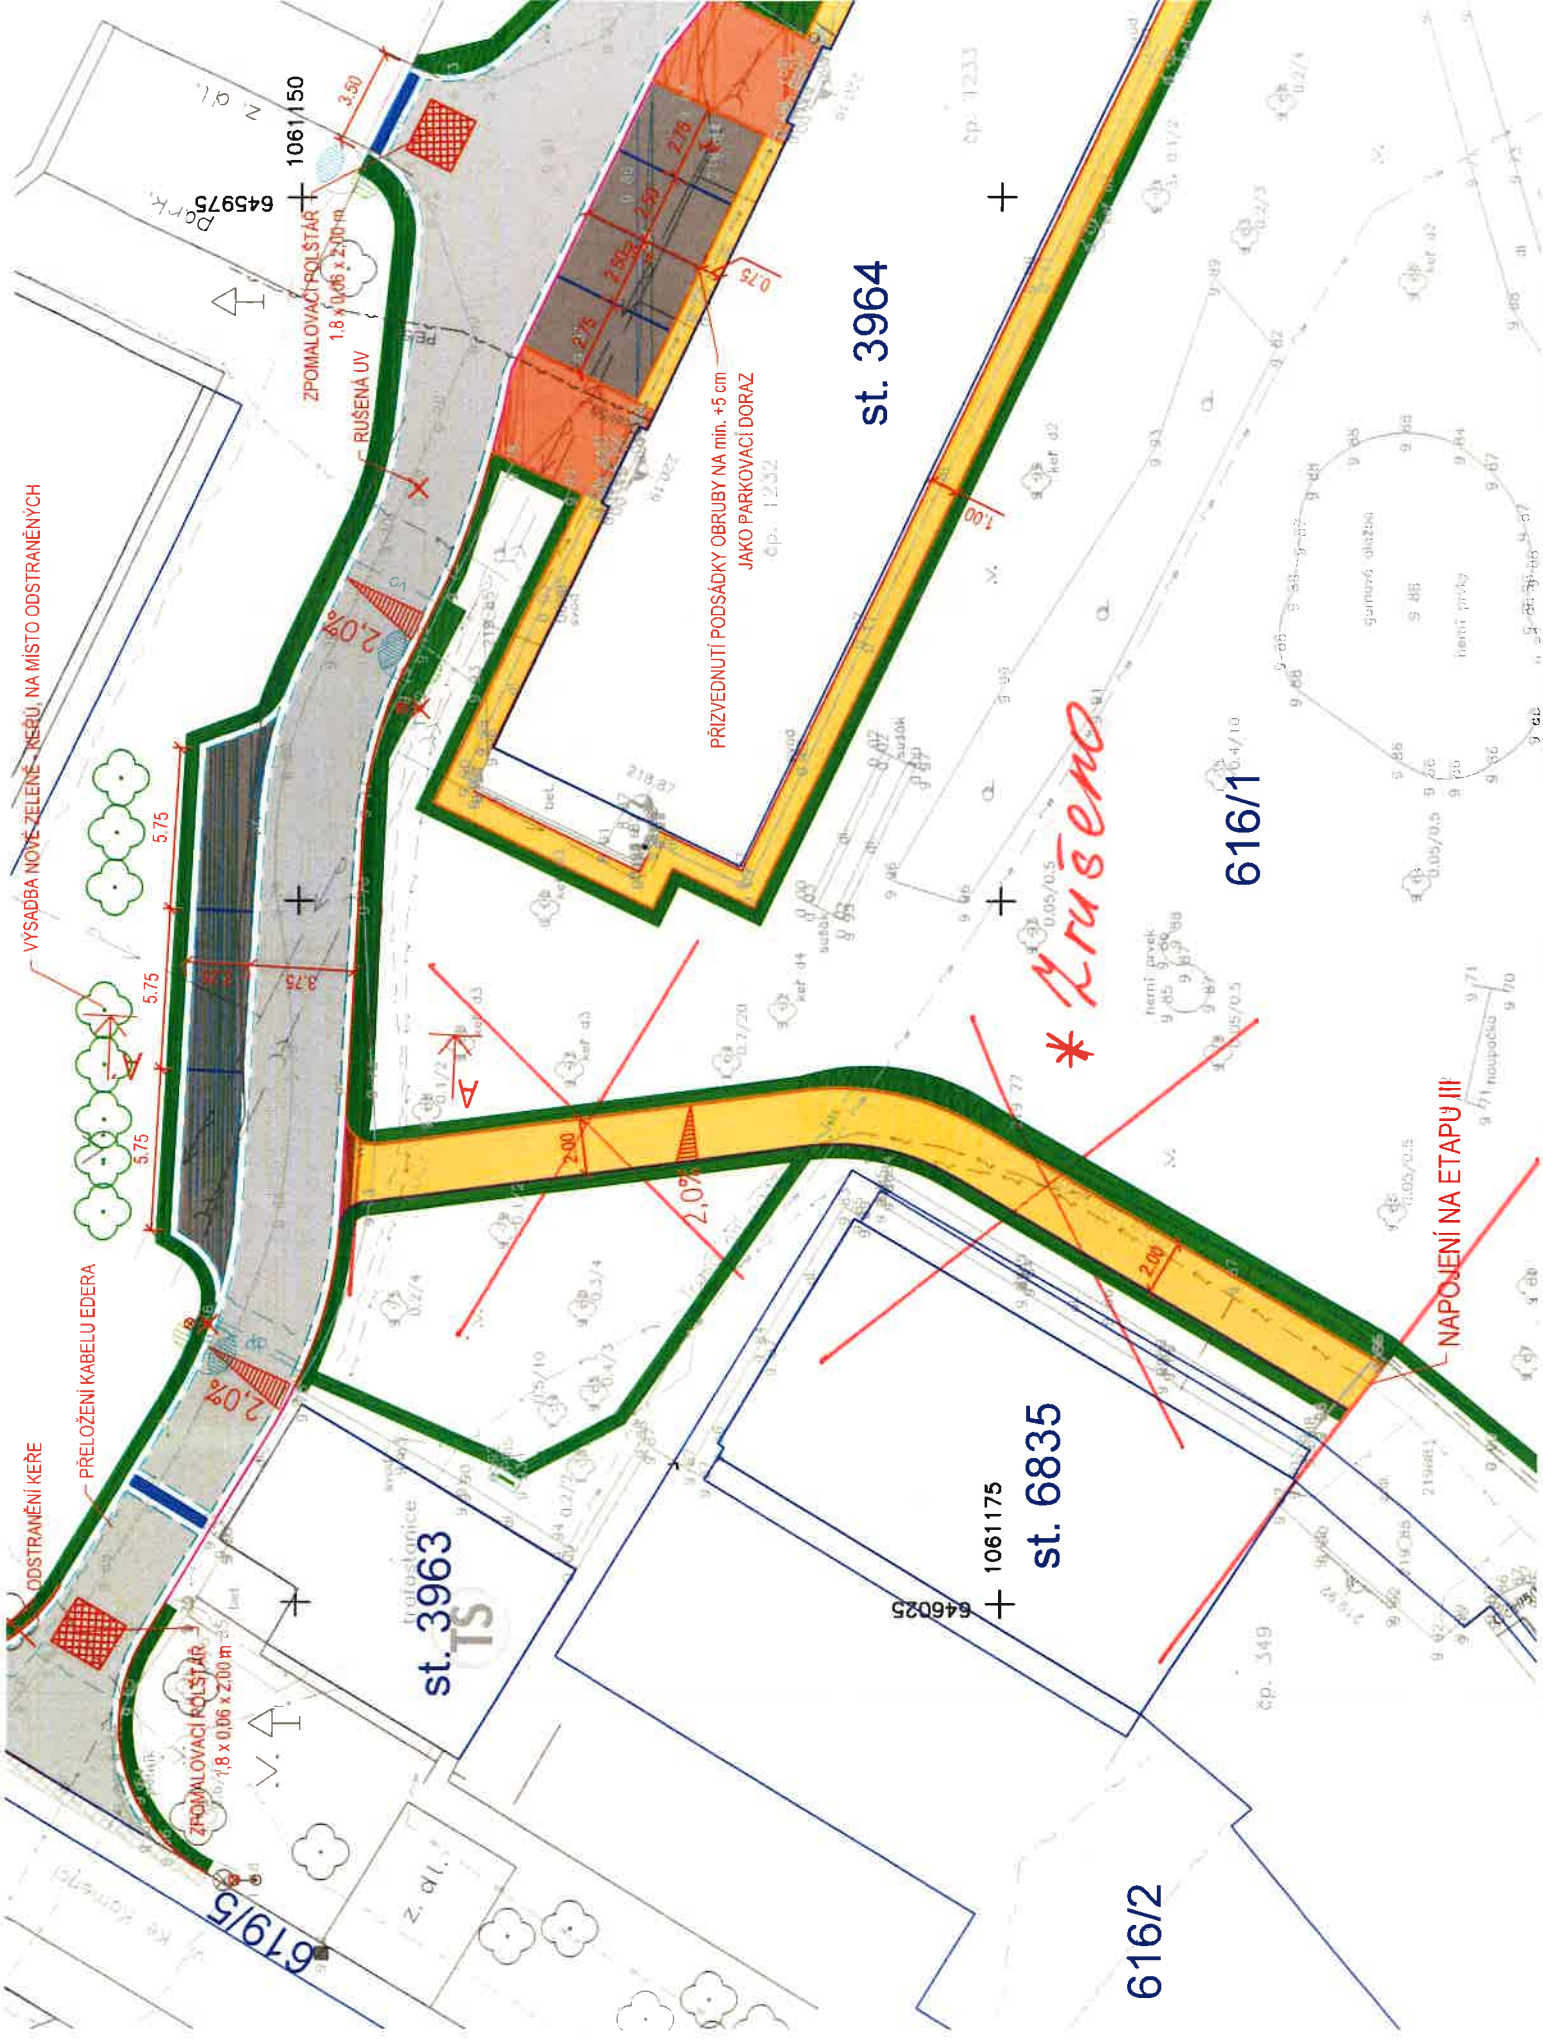

VÝSADBA NOVÉ ZELÉNE - KÉRŮ, NA MÍSTO ODSTRANĚNÝCH

ODSTRANĚNÍ KÉRŮ
PŘELOŽENÍ KABELU EDERA

ZPOMALOVACÍ POJISTĚNÍ
1,8 x 0,06 x 2,70 m

ZPOMALOVACÍ POJISTĚNÍ
1,8 x 0,06 x 2,70 m

RUIŠENÁ UV

PŘÍZVEDNUTÍ PODSÁDKY OBRUBY NA MIN. +5 cm
JAKO PARKOVACÍ DORAZ

* *Rušeno*

NAPOJENÍ NA ETAPU III

619/15
Z. d. l.

1061/150
645975
Park

st. 3963
TS

st. 3964

st. 6835

616/1

616/2

1061175
646025

č.p. 349

č.p. 1233

