

Dodatek č. 1
ke
SMLOUVĚ O DÍLO




č. objednatele: 4668, č. zhotovitele: 230018

uzavřené dne 25.7.2023 dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) mezi smluvními stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1 Objednatel:




Česká republika – Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje

se sídlem: Přílucká 213, 760 01 Zlín
IČO: 70887306
DIČ: CZ70887306
Identifikátor datové schránky: z3paa5u
Zastoupený: plk. Ing. Vítem Rušarem, ředitelem
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 16035881/0710
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Tel.: 

(dále jen „objednatel“)

I.2 Zhotovitel:

SANIZO, spol. s r.o

se sídlem: Zátiší 1958, 688 01 Uherský Brod
zapsána ve veřejném rejstříku, vedeným u Krajského
soudu v Brně oddíl C, vložka 47074
IČO: 26945509
DIČ: CZ 26945509
Identifikátor datové schránky: p2qy4pv
Zastoupená: Antonín Straka, Zdeněk Něnička, jednatelé společnosti
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 35-1323840287/0100
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Tel. / Fax.: 

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely dne 25.7.2023 smlouvu o dílo č. objednatele: 4668, č. zhotovitele: 230018 (dále jen „smlouva“) a v souladu s článkem XI. odst. 6 smlouvy se dohodly na uzavření dodatku č.1 (dále jen „dodatek“), kterým se smlouva mění způsobem uvedeným níže.

II. PŘEDMĚT DODATKU

II.1 Smluvní strany se dohodly, v souladu s bodem XI.6 smlouvy, na změnách díla dle níže uvedeného odůvodnění:

II.1.1 **Demontáže** – Oproti původnímu záměru dojde k demontáži nefunkčních komínů a odvozu suti. Tato změna představuje přípočet k ceně díla (**vícepráce**), tj. **zvýšení ceny díla o 29 600,00 Kč bez DPH, tj. o 35 816,00 Kč vč. DPH**. Tato změna nemá vliv na konečný termín díla.

II.1.2 **Úpravy plechové krytiny** – Změna vyplývající z dohodnutých úprav plechové krytiny – instalace tvarovek pro odvětrání VZT a záměnu sněhových zábran z žebříkového typu na A typ. Tato změna představuje odpočet k ceně díla (**méněpráce**), tj. **snížení ceny díla o 28 800,00 Kč bez DPH, tj. o 34 848,00 Kč vč. DPH**. Tato změna nemá vliv na konečný termín díla.

II.1.3 **Úpravy tesařských konstrukcí** – Změna vyplývající ze zjištění po odhalení nosné konstrukce střechy, kdy konstrukce krokví je v atypickém provedení vyžadující použití většího množství kontralatí. Tato změna představuje přípočet k ceně díla (**vícepráce**), tj. **zvýšení ceny díla o 18 949,00 Kč bez DPH, tj. o 22 928,29 Kč vč. DPH**. Tato změna nemá vliv na konečný termín díla.

II.1.4 **Úpravy prostupových prvků** – Změna vyplývající z bodu II. 1.2 kdy prostupy po vybouraných komínech budou zastřešeny klasicky plošně namísto provádění olemování a izolace prostupů. Tato změna představuje odpočet k ceně díla (**méněpráce**), tj. **snížení ceny díla o 21 800,00 Kč bez DPH, tj. o 26 378,00 Kč vč. DPH**. Tato změna nemá vliv na konečný termín díla.

II.1.5 **Související poplatky** – Změna vyplývající z výše uvedených bodů kdy jednotlivé VCP a MNP generují související poplatky stavby – tzv. Vedlejší Rozpočtové Náklady (VRN) – režijní náklady. Tato změna představuje odpočet k ceně díla (**méněpráce**), tj. **snížení ceny díla o 41,00 Kč bez DPH, tj. o 49,61 Kč vč. DPH**. Tato změna nemá vliv na konečný termín díla.

II.2 Celkový vliv na cenu díla:

navýšení/snížení ceny díla bez DPH		navýšení/snížení ceny díla s DPH	
29 600,00	Kč	35 816,00	Kč
- 28 800,00	Kč	- 34 848,00	Kč
18 949,00	Kč	22 928,29	Kč
- 21 800,00	Kč	- 26 378,00	Kč
- 41,00	Kč	- 49,61	Kč
- 2 092,00	Kč	- 2 531,32	Kč

II.3 Smluvní strany se dále dohodly, že Cena díla, dle bodu V.1 smlouvy o dílo, se tímto dodatkem č. 1 (blíže specifikované v bodu II.1 tohoto dodatku), **snižuje o částku 2 092,00 Kč bez DPH, tj. o 2 531,32 Kč vč. DPH** a v důsledku toho se mění i celková cena předmětu díla dle bodu V.1 smlouvy o dílo.

II.4 Rekapitulace ceny díla:

Cena díla vyplývající ze smlouvy o dílo č. 4668:

Cena bez DPH	625 000,00 Kč
DPH	131 250,00 Kč
Cena vč. DPH	756 250,00 Kč

Nová cena díla:

Cena bez DPH	622 908,00 Kč
DPH	130 810,68 Kč
Cena vč. DPH	753 718,68 Kč

II.5 Smluvní strany se z důvodu povětrnostních podmínek a dešťů trvajících zejména v druhé polovině období 09/23 a k tomu navázanému dokončení a předání řádně zhotoveného díla dohodly na změně termínu zhotovení díla (článek III. odst. 2. smlouvy o dílo) a to nově na 10.11.2023 z původního termínu 31.10.2023

III. SEZNAM PŘÍLOH


III.1 Obě smluvní strany prohlašují, že se za nedílnou součást tohoto dodatku považují tyto přílohy:

Příloha č. 1 – *soupis VCP a MNP*

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

IV.1 Ostatní ustanovení ve smlouvě nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

IV.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

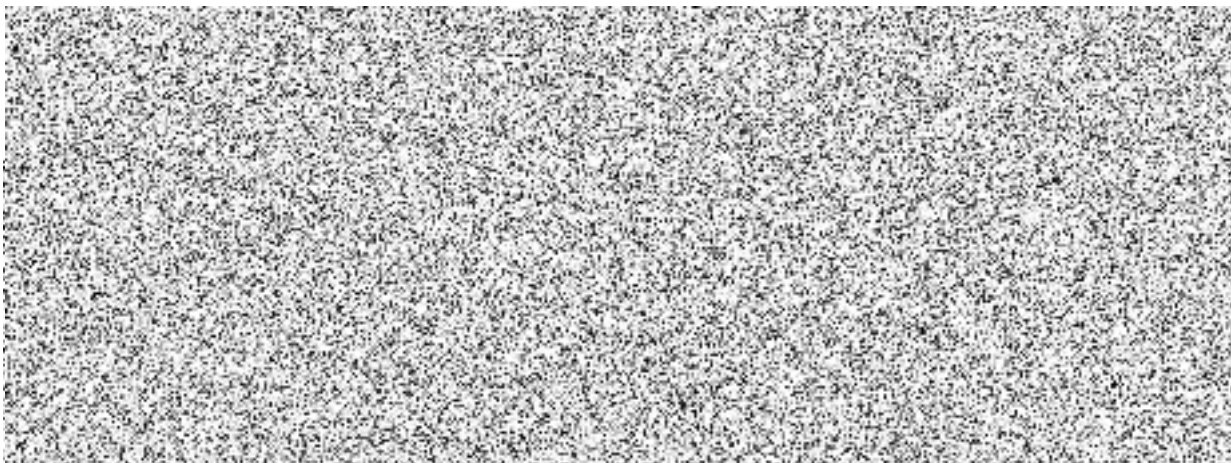

Vícepráce, méněpráce
Oprava střešní krytiny - budova HZS Uh. Brod

Demontáže

Položka	Množ.	Jedn.	Jedn. cena	Celkem
Demontáž komínů	1	kpl	22 400,00 Kč	22 400 Kč
Odvoz a likvidace suti	1	kpl	7 200,00 Kč	7 200 Kč
Celkem				29 600 Kč

Plechová krytina

Položka	Množ.	Jedn.	Jedn. cena	Celkem
Tvarovka odvětrání VZT	2	ks	2 040,0 Kč	4 080 Kč
Sněhová zábrana - žebříková	-48	bm	1 105,0 Kč	-53 040 Kč
Sněhová zábrana plech A	48	bm	420,0 Kč	20 160 Kč
Celkem				-28 800 Kč

Tesařské konstrukce

Položka	Množ.	Jedn.	Jedn. cena	Celkem
Kontralatě 40/60 osazeno po 60 cm	369	m ²	49,0 Kč	18 081 Kč
Zabednění otvorů po komínech	2,5	m ³	347,0 Kč	868 Kč
Celkem				18 949 Kč

Klempířské konstrukce - lakovaný pozink RAL 3011

Položka	Množ.	Jedn.	Jedn. cena	Celkem
Lemování komínů	1000	-1,6 m ²	5 750,0 Kč	-9 200 Kč
Opláštění komínů	1000	-7 m ²	1 800,0 Kč	-12 600 Kč
Celkem				-21 800 Kč

Rekapitulace

Demontáže	29 600,00 Kč
Plechová krytina	-28 800,00 Kč
Tesařské konstrukce	18 948,50 Kč
Klempířské konstrukce - lakovaný pozink RAL 3011	-21 800,00 Kč
VRN - režijní náklady	-41,00 Kč
Celkem	-2 092,00 Kč
DPH 21%	-439,32 Kč
Celkem včetně DPH	-2 531,32 Kč

Pozn.:
