



Úsek B – Svah zpevněný kamenem v km 1,591 – 1,759 – vlevo

Boč	Y	X	výška
1	748490.212	1058940.499	202.451
2	748489.847	1058941.221	202.379
3	748489.668	1058941.506	202.201
4	748489.676	1058941.483	202.201
5	748473.686	1058928.834	202.449
6	748473.274	1058929.332	202.403
7	748473.162	1058929.712	202.104
8	748457.537	1058917.455	202.46
9	748457.211	1058917.827	202.387
10	748457.036	1058918.232	202.016
11	748444.611	1058908.332	202.483
12	748444.357	1058908.666	202.454
13	748444.104	1058908.982	202.011
14	748437.489	1058904.269	202.032
15	748437.965	1058903.560	202.473
16	748437.680	1058903.920	202.454
17	748424.601	1058893.947	202.474
18	748424.280	1058894.357	202.449
19	748424.022	1058894.659	201.896
20	748422.829	1058893.853	201.874
21	748421.471	1058892.951	201.830
22	748419.021	1058891.538	201.880
23	748417.024	1058890.421	201.713
24	748416.309	1058889.997	201.654
25	748416.190	1058889.817	201.637
26	748416.492	1058889.161	201.753
27	748417.377	1058889.695	202.552
28	748417.728	1058889.260	202.610
29	748420.029	1058891.011	202.467
30	748419.762	1058891.307	202.433
31	748421.503	1058892.413	202.472
32	748421.815	1058892.033	202.479
33	748421.893	1058891.939	202.474
34	748422.820	1058893.409	202.461
35	748506.491	1058952.108	202.446
36	748506.147	1058952.613	202.385
37	748505.794	1058953.004	202.151
38	748522.235	1058964.780	202.053
39	748522.536	1058964.326	202.366
40	748522.978	1058963.755	202.437
41	748536.372	1058974.084	202.396
42	748536.753	1058973.499	202.423
43	748536.062	1058974.644	201.966
44	748541.295	1058978.419	201.958
45	748541.752	1058977.993	202.376
46	748542.182	1058977.392	202.424
47	748555.074	1058986.579	202.404
48	748554.443	1058987.121	202.368
49	748554.293	1058987.642	201.917



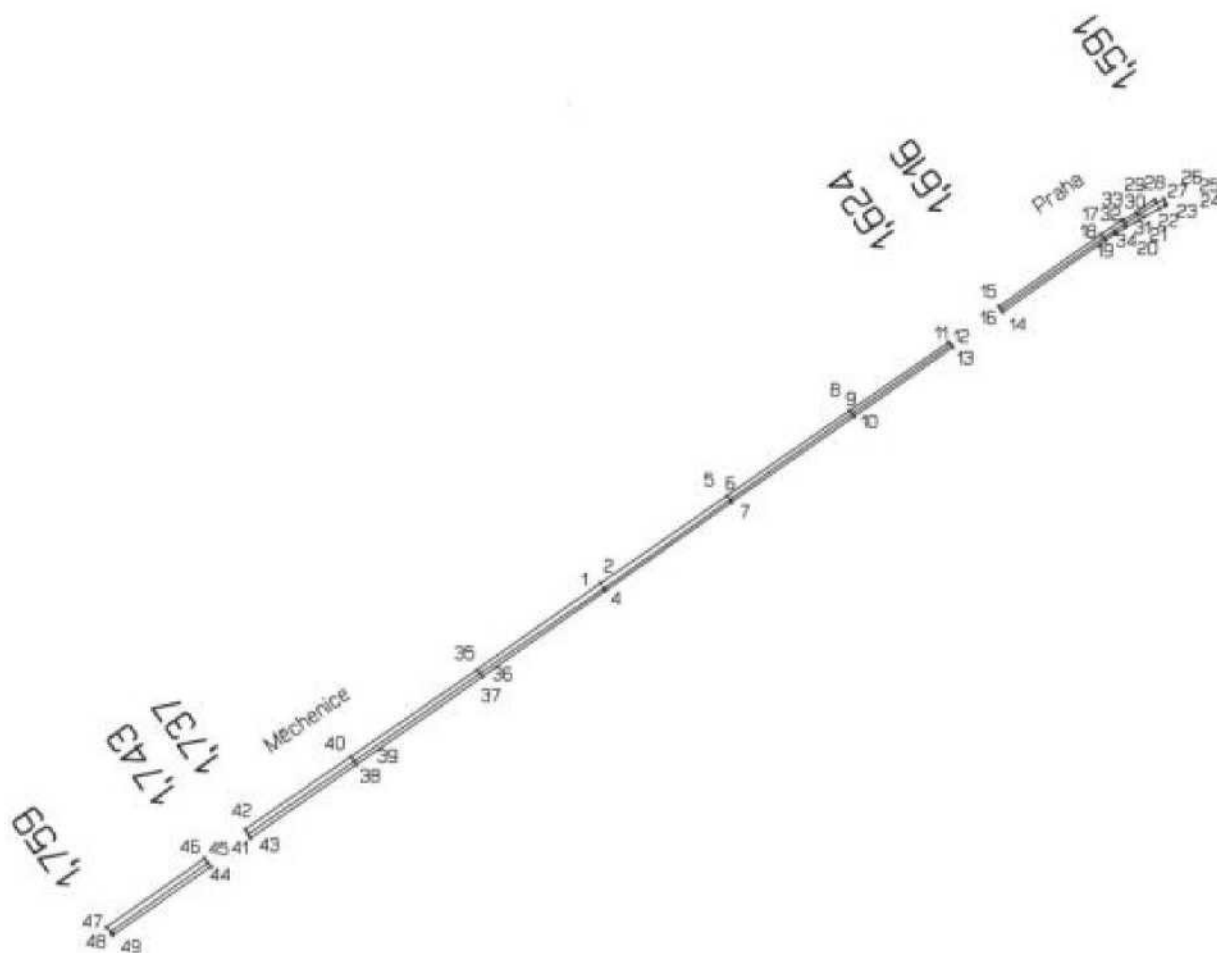

STRABAG a.s. Kačírková 982/41, Praha 5				číslo zakázky							
				ověřil		Ing. S. Bílek					
				datum		28.7.2022					
				číslo ověření							
akce I/102 Hr. HL Města Prahy – Štěchovice, rekonstrukce, etapa I SO 101 – rekonstrukce vozovky, Praha – Měchenice Úsek B – km 1,591 – 1,759 plocha svahů zpevněných kamenem – vlevo							výkres číslo				
						měřítko		1:1000			
zaměřil		Ing. Stanislav Bílek		datum		26.7. 2022		souř. systém		S-JTSK	
kreslil		Ing. Stanislav Bílek		datum		28.8.2022		výšk. systém		Bpv	

STRABAG

Číslo predávacieho protokolu: ŠI 41/2022

Předmět měření: SO 101 – REKONSTRUKCE VOZOVKY, PRAHA – MĚCHENICE
Úsek E, F km 4,350 – 4,842 – vpravo - frézování staré vozovky

frézování asfaltových vrstev	km 4,350 – 4,840	480 x 4,7	2303,0 m ² x 0,105	241,815 m ³
rozfrézování betonové desky	km 4,480 – 4,840	360 x 4,7	1192,5 m ² x 0,180	304,56 m ³
rozebrání dlažebních kostek	km 4,360 – 4,480	120 x 5,1	612 m ²	
recyklace za studena	km 4,480 – 4,840	360 x 4,3	1548 m ²	
čištění krajnice	km 4,350 – 4,840	490 x 1,0	490 m ²	
odstranění nestmeleného kameniva	km 4,360 – 4,480	120 x 5,1	612 m ² x 0,1	61,2 m ³
hloubení jam- výkop	km 4,360 – 4,480	viz. tabulka		416,56 m ³

km	šířka	hloubka
4,360	5,1	0,48
4,380	5,3	0,67
4,400	5,8	0,78
4,420	5,6	0,79
4,440	5,5	0,64
4,460	5,9	0,56
4,480	5,4	0,52

Měření bylo provedeno totální stanicí TOPCON IS305. Dopustné odchylky měření a výpočtu nebyly překročeny.

Souřadnicový systém:	S-JTSK
Výškový systém:	Bpv
Přílohy	seznam souřadnic náčrt

Zaměřil:	7.2022	Ing. S. Bílek
Zpracoval:	28.7.2022	Ing. S. Bílek
Ověřil:	28.7.2022	Ing. S. Bílek

Ověření výsledků zeměměřických činností ve výstavbě
podle §13 odst.1 písm. c) zák. č. 200/1994 Sb.



Stavba: II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, ETAPA I
Dodavatel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Praha 5

Číslo předávacího protokolu: ŠI 50/2022

Předmět měření: SO 101 – REKONSTRUKCE VOZOVKY, PRAHA – MĚCHENICE
Úsek E,F km 4,475 – 4,560 – vpravo


odstranění keřů	km - 4,500 – 4,560	prům. šíře 3,2 m	192,0 m ²
výkop. práce na příkopu	km - 4,560 – 4,750	1,22 m ³ /bm	103,7 m ³
rozprostření ornice	km - 4,475 – 4,560	prům. šíře 3,5 m	227,5 m ²

Měření bylo provedeno totální stanicí TOPCON IS305.
Dopustné odchylky měření a výpočtu nebyly překročeny.

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv
Přílohy seznam souřadnic

Zaměřil:	8.2022	Ing. S. Bílek
Zpracoval:	31.8.2022	Ing. S. Bílek
Ověřil:	31.8.2022	Ing. S. Bílek

Ověření výsledků zeměměřických činností ve výstavbě
podle §13 odst. 1 písm. c) zák. č. 200/1994 Sb



STRABAG

Číslo předávacího protokolu: ŠI 51/2022

Předmět měření: SO 101 – REKONSTRUKCE VOZOVKY, PRAHA – MĚCHENICE
Úsek F km 4,830 – 5,260 – vlevo


odstranění keřů	km - 4,830 – 5,260	prům. šíře 3,5 m	1505,0 m ²
čištění krajnice	km - 4,830 – 5,260	prům. šíře 0,75m	322,5 m ²
odstranění drnu	km - 4,830 – 5,260	prům. šíře 3,5 m	1505,0 m ²
odstranění stávající dlažby	km - 4,830 – 5,060	prům. šíře 2,85 m	655,5 m ²

Měření bylo provedeno totální stanicí TOPCON IS305. Dopustné odchylky měření a výpočtu nebyly překročeny.

Souřadnicový systém:	S-JTSK
Výškový systém:	Bpv
Přílohy	seznam souřadnic

Zaměřil:	8.2022	Ing. S. Bílek
Zpracoval:	31.8.2022	Ing. S. Bílek
Ověřil:	31.8.2022	Ing. S. Bílek

Ověření výsledků zeměměřických činností ve výstavbě
podle §13 odst.1 písm. c) zák. č. 200/1994 Sb



STRABAG

Číslo predávacieho protokolu: ŠI 52/2022

asfaltové vrstvy	- km 4,823 – 5,273	tl. 0,106 m	2070,0 m ²	219,42 m³
frézováni betonové desky	- km 4,825 – 5,271	tl. 0,218 m	2051,6 m ²	447,25 m³
odstranění nestmelených vrstev	- km 4,825 – 5,271	tl. 0,200 m	2051,6 m ²	410,32 m³
hloubení aktivní zony	- km 4,825 – 5,040	tl. 0,500 m	1075,0 m ²	537,50 m³

Souřadnicový systém:	S-JTSK
Výškový systém:	Bpv
Přílohy	seznam souřadnic náčrt

Zaměřil:	8.2022	Ing. S. Bílek
Zpracoval:	31.8.2022	Ing. S. Bílek
Ověřil:	31.8.2022	Ing. S. Bílek

Ověření výsledků zeměměřických činností ve výstavbě
podle §13 odst.1 písm. c) zák. č. 200/1994 Sb



II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, etapa I
SO 101 – Rekonstrukce vozovky, Praha - Měchenice


Úsek F – km 4,823 – 5,273 – vlevo – odstranění původní vozovky

Seznam souřadnic

Bod	Y	X	výška
1	748364.98	1061853.09	201.89
2	748362.19	1061849.60	201.70
3	748373.74	1061839.89	201.64
4	748376.85	1061843.13	201.91
5	748385.03	1061835.00	201.99
6	748382.80	1061830.66	201.67
7	748390.77	1061821.23	201.72
8	748394.23	1061824.11	202.00
9	748401.60	1061813.71	202.05
10	748398.05	1061811.27	201.79
11	748404.77	1061800.52	201.85
12	748408.28	1061802.91	202.09
13	748414.24	1061791.88	202.06
14	748410.42	1061789.72	201.90
15	748415.83	1061778.65	201.92
16	748419.62	1061780.45	202.09
17	748426.93	1061764.23	202.40
18	748427.62	1061762.85	202.38
19	748423.07	1061760.53	202.24
20	748419.84	1061767.59	201.93
21	748346.24	1061867.89	201.95
22	748353.55	1061862.12	201.93
23	748337.27	1061869.12	201.85
24	748325.51	1061878.43	201.87
25	748328.25	1061882.01	202.01
26	748318.54	1061889.71	202.03
27	748321.76	1061881.34	201.92
28	748315.48	1061886.34	201.94
29	748306.20	1061893.60	201.91
30	748308.97	1061897.22	202.05
31	748299.33	1061904.74	202.07
32	748296.33	1061901.19	201.93
33	748286.57	1061908.88	201.99
34	748289.47	1061912.57	202.09
35	748279.85	1061920.10	202.10
36	748276.32	1061916.93	201.96
37	748267.58	1061924.00	201.95
38	748270.17	1061927.81	202.12
39	748243.11	1061948.87	202.01
40	748240.48	1061945.34	201.93
41	748248.00	1061939.54	201.99
42	748250.71	1061943.03	202.02
43	748260.26	1061935.44	202.05
44	748257.78	1061931.85	201.96
45	748221.27	1061966.18	202.00
46	748220.84	1061960.85	202.00
48	748207.78	1061970.80	202.06
50	748211.82	1061973.55	202.02
51	748202.01	1061981.20	202.03
52	748199.12	1061977.42	202.07
54	748188.76	1061985.52	201.92
57	748178.94	1061992.95	202.04
58	748182.42	1061996.33	202.02
59	748172.54	1062003.85	202.00
60	748169.24	1062000.28	202.00
63	748159.68	1062007.61	202.00
64	748162.84	1062011.25	202.02
65	748152.98	1062018.79	202.01
66	748149.77	1062015.04	201.94
69	748139.42	1062022.87	201.97
70	748143.13	1062026.24	202.00
71	748133.31	1062033.84	202.02
72	748130.26	1062029.98	201.94
75	748121.09	1062036.88	202.04
76	748123.55	1062041.25	202.04

77	748113.73	1062048.77	201.98
78	748110.92	1062044.74	202.04
81	748103.24	1062050.67	201.93
82	748101.14	1062052.53	201.87
83	748097.67	1062055.23	202.00
84	748095.38	1062056.97	202.24
85	748098.08	1062060.63	202.34
86	748099.62	1062059.39	202.03



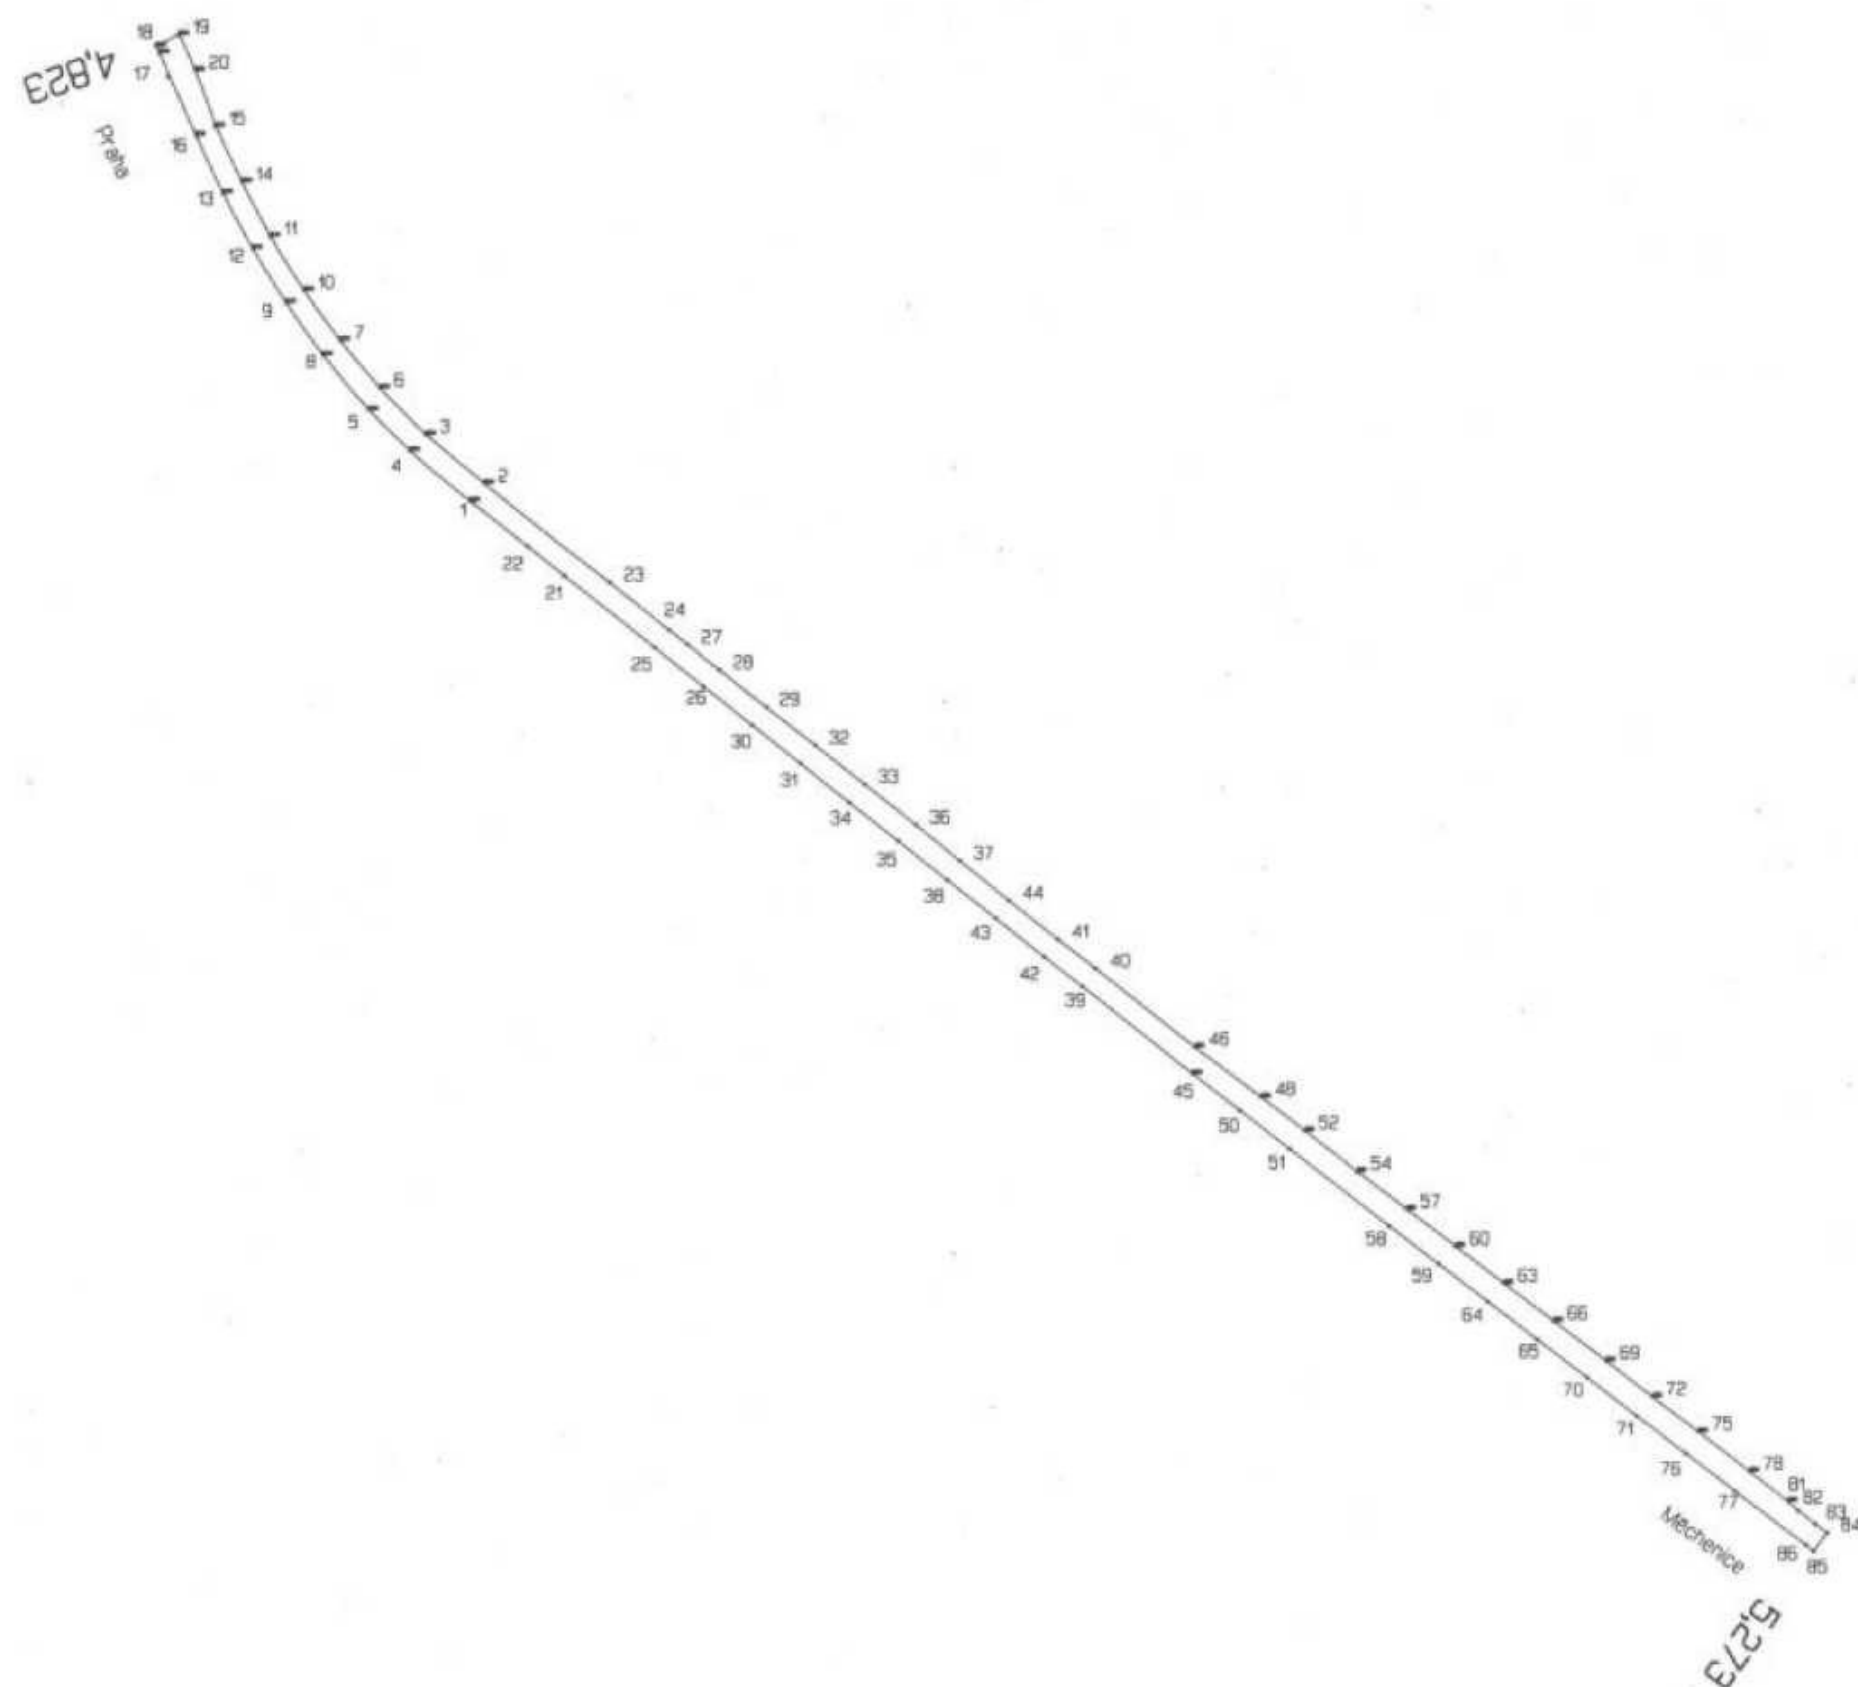

STRABAG a.s. Kačírkova 982/41, Praha 5				číslo zakázky		
				ověřil	Ing. S. Bilek	
				datum	31.8.2022	
				číslo ověření		
akce II/102 Hr. HL. Města Prahy – Stěchovice, rekonstrukce, etapa I SO 101 – rekonstrukce vozovky, Praha – Měchenice Úsek F – km 4,823 – 5,273 – odstranění původní vozovky – vlevo						výkres číslo
					měřítko	
zaměřil	Ing. Stanislav Bilek	datum	8.2022	souř. systém	S-JTSK	
kreslil	Ing. Stanislav Bilek	datum	31.8.2022	výtisk systém	Bav	

Stavba: II/102 HR. HL. MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, ETAPA I
Dodavatel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Praha 5

Číslo předávacího protokolu: ŠI 63/2022

Předmět měření: SO 101 – REKONSTRUKCE VOZOVKY, PRAHA – MĚCHENICE
Úsek B,C km 1,589 – 2,060 – vpravo - odstranění vozovky

čištění krajnice	km 1,589 – 2,060	471,0 m x 1,2 m	565,2 m ²
hloubení krajnice nad drenáží - dlažba	km 1,589 – 2,060	471,0 m x 0,7 x 0,3	98,9 m ³
frézování asfaltových vrstev	km 1,589 – 2,060	2040 m ² x 0,109	222,4 m ³
frézování betonové desky	km 1,591 – 2,060	2031 m ² x 0,190	385,9 m ³
provedení drenáže	km 1,589 – 2,045		456 m
recyklace za studena	km 1,589 – 2,050	461,0 m x 4,4 m	2028,4 m ²

příčné překopy v km 1,620, 1,730, 1,830, 1,930, 2,030


hloubení výkopu	5 x	4,8 x 3,0 x 1,5 m	108,0 m ³
pokládka potrubí DN 150	5 x	4,5 m	22,5 m
zásyp výkopu	5 x	4,8 x 3,0 x 1,2	86,4 m ³
podkladní vrstva ŠD	5 x	4,8 x 3,0	72,0 m ²

Měření bylo provedeno totální stanicí TOPCON IS305.
Dopustné odchylky měření a výpočtu nebyly překročeny,

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv
Přílohy

Zaměřil: 9.2022 Ing. S. Bílek
Zpracoval: 27.9.2022 Ing. S. Bílek
Ověřil: 27.9.2022 Ing. S. Bílek

Ověření výsledků zeměměřických činností ve výstavbě
podle §13 odst.1 písm. c) zák. č. 200/1994 Sb



STRABAG

Číslo predávacieho protokolu: ŠI 68/2022


Úsek B km 1,210 – 1,415 – vlevo – obložení svahu kamenem


km – 1,210 – 1,381	516,2 m ²	x 0,3 m	154,86 m ³
km – 1,391 – 1,415	83,4 m ²	x 0,3 m	25,02 m ³

Souřadnicový systém:	S-JTSK
Výškový systém:	Bpv
Přílohy	seznam souřadnic náčrt

Zaměřil:	26.10.2022	Ing. S. Bilek
Zpracoval:	26.10.2022	Ing. S. Bilek
Ověřil:	26.10.2022	Ing. S. Bilek

Ověření výsledků zeměměřických činností ve výstavbě
podle §13 odst.1 písm. c) zák. č. 200/1994 Sb



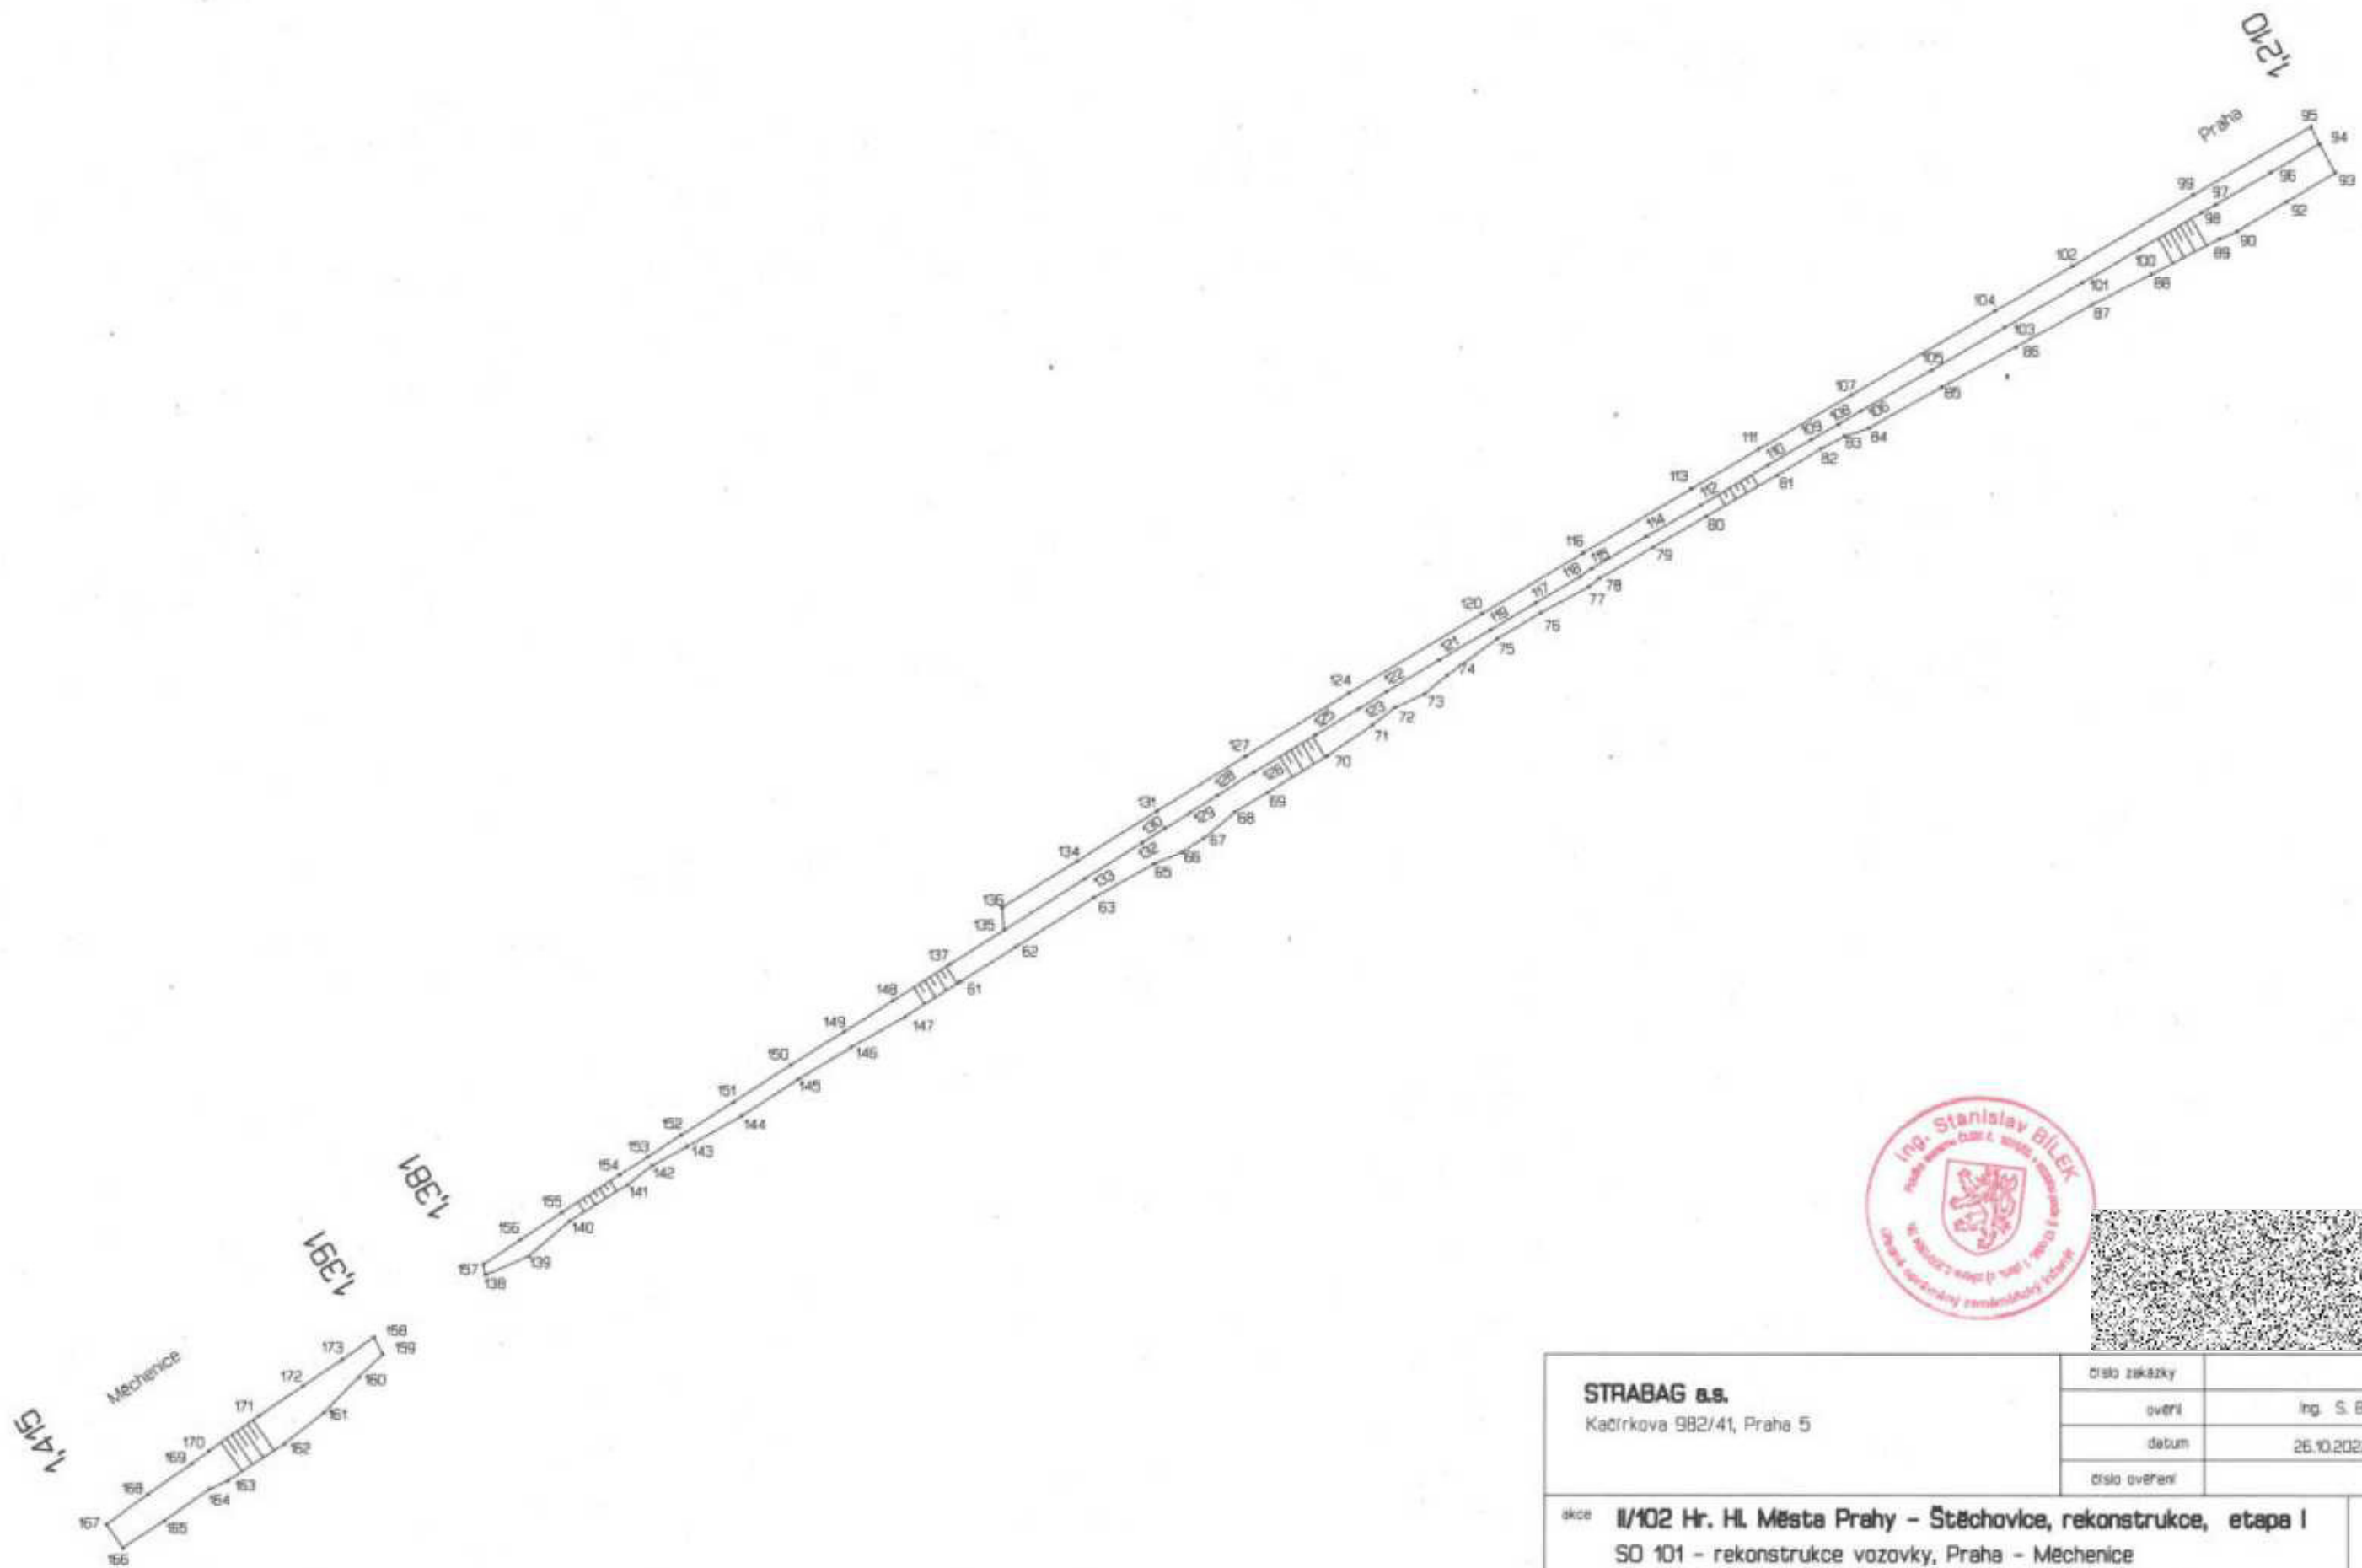

STRABAG a.s. Kačírkova 982/41, Praha 5				číslo zakázky							
				ověřil		Ing. S. Břek					
				datum		26.10.2022					
				číslo ověření							
akce II/102 Hr. Hl. Města Prahy – Štěchovice, rekonstrukce, etapa I								výkres číslo			
SO 101 – rekonstrukce vozovky, Praha – Měchenice											
Úsek B – km 1,210 – 1,415 – vlevo – obložení svahu kamenem											
				měřítko				1:500			
záměřil		Ing. Stanislav Břek		datum		26.10.2022		souř. systém		S-JTSK	
kreslil		Ing. Stanislav Břek		datum		26.10.2022		výřk. systém		BpV	

STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství
direkce TC
Kačírkova 982/4
CZ – 158 00 Praha 5 / Česká republika

STRABAG

Stavba: II/102 HR. HL. MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, ETAPA I
Dodavatel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Praha 5

Číslo předávacího protokolu: ŠI 69/2022

Předmět měření: SO 101 – REKONSTRUKCE VOZOVKY, PRAHA – MĚCHENICE
Úsek B km 1,350 – 1,415 – vlevo – obložení svahu kamenem


km – 1,350 – 1,415 158,1 m² x 0,3 m 47,43 m³

Měření bylo provedeno totální stanicí TOPCON IS305.
Dopustné odchylky měření a výpočtu nebyly překročeny.

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv
Přílohy seznam souřadnic
náčrt


Zaměřil:	31.10.2022	Ing. S. Bilek
Zpracoval:	31.10.2022	Ing. S. Bilek
Ověřil:	31.10.2022	Ing. S. Bilek


Ověření výsledků zeměměřických činností ve výstavbě
podle §13 odst.1 písm. c) zák. č. 200/1994 Sb



Úsek B – km 1,350 – 1,415 – vlevo – obložení svahu kamenem

Bod	Y	X	výška
135	748204.35	1058740.30	202.24
136	748204.52	1058738.52	202.37
137	748208.56	1058742.99	202.21
138	748244.91	1058767.56	201.23
148	748212.96	1058745.86	202.24
149	748216.84	1058748.33	202.22
150	748220.97	1058750.94	202.23
151	748225.41	1058753.84	202.24
152	748229.53	1058756.47	202.22
153	748232.16	1058758.22	202.22
154	748234.31	1058759.61	202.24
155	748238.88	1058762.62	202.22
156	748242.14	1058764.77	202.26
157	748245.06	1058766.73	202.24
158	748253.62	1058772.50	202.26
159	748252.94	1058773.83	200.93
167	748274.41	1058787.30	202.23
168	748271.24	1058784.93	202.21
169	748267.80	1058782.51	202.19
170	748266.48	1058781.49	202.21
171	748262.55	1058778.71	202.21
172	748259.14	1058776.35	202.22
173	748256.09	1058774.30	202.23
174	748245.74	1058768.37	201.17
175	748245.54	1058769.60	200.12
176	748245.79	1058770.91	199.50
177	748248.87	1058772.79	199.65
178	748249.97	1058771.64	200.78
183	748250.74	1058770.58	202.25
184	748250.28	1058770.17	202.25
185	748247.74	1058768.35	202.27
186	748246.85	1058767.72	202.29
187	748246.54	1058767.54	202.27
188	748209.74	1058741.92	202.38
189	748217.62	1058746.96	202.38
190	748223.53	1058750.82	202.37
191	748228.82	1058754.24	202.39
192	748236.35	1058759.12	202.36
193	748241.00	1058762.17	202.37
194	748246.75	1058766.00	202.38
195	748252.05	1058769.57	202.40
196	748258.26	1058773.90	202.38
197	748263.67	1058777.71	202.36
198	748269.76	1058782.01	202.37
199	748275.63	1058786.34	202.38




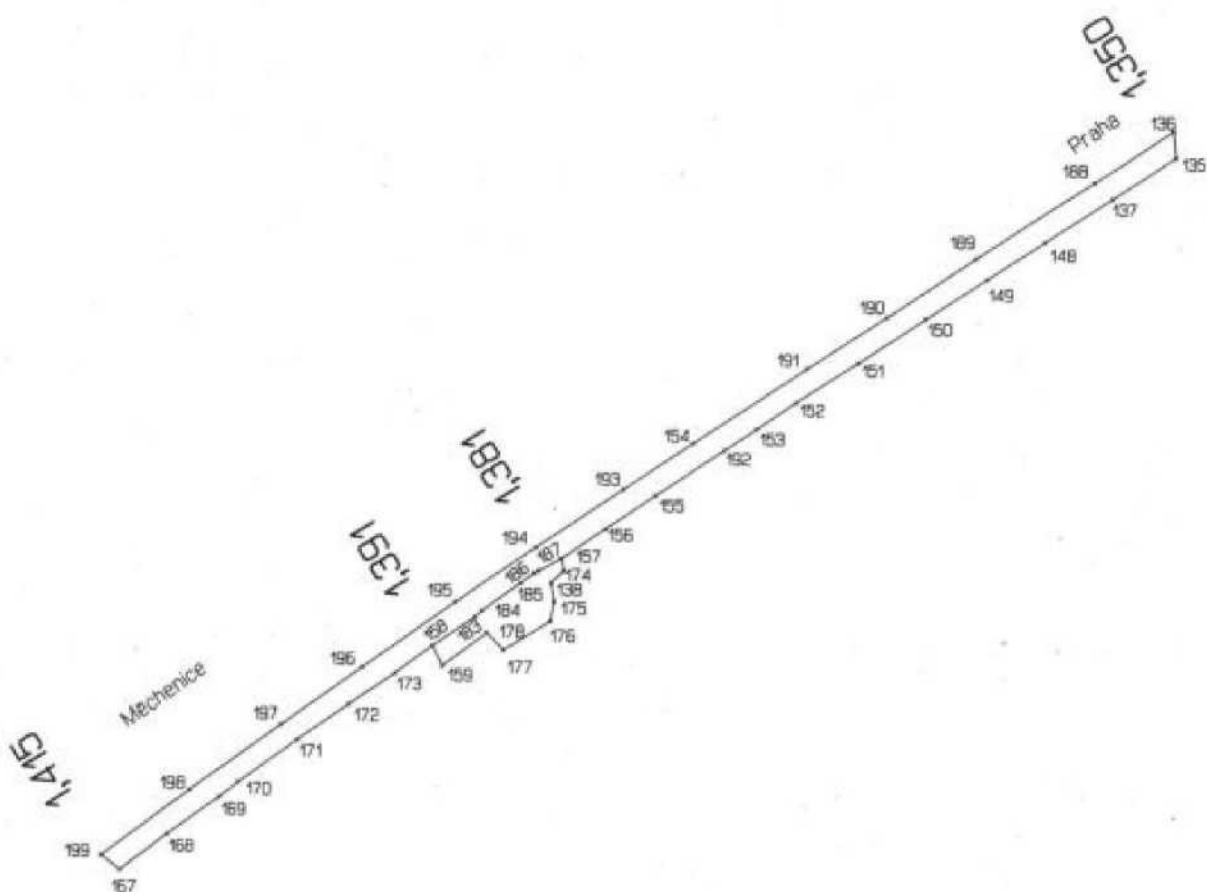

STRABAG a.s. Kačírkova 982/41, Praha 5				číslo zakázky			
				ověřil		Ing. S. Bílek	
				datum		31.10.2022	
				číslo ověření			
akce II/102 Hr. Hl. Města Prahy – Štěchovice, rekonstrukce, etapa I							výkres číslo
SO 101 – rekonstrukce vozovky, Praha – Měchenice							
Úsek B – km 1,350 – 1,415 – vlevo – obložení svahu kamenem							
				měřítko		1:500	
zaměřil	Ing. Stanislav Bílek		datum	31.10.2022	souř. systém	S-JTSK	
kreslil	Ing. Stanislav Bílek		datum	31.10.2022	výšk. systém	Bpv	

STRABAG

Číslo predávacieho protokolu: ŠI 71/2022




Číslo predávacieho protokolu: ŠI 75/2022

frézování asfaltu	tl. 140 mm	1665,5 m ²	233,17 m³
frézování bet.desky s odvozem	tl. 200 mm	425,2 m ²	84,84 m³
rozfrézování bet. desky	tl. 200 mm	1236,1 m ²	247,22 m³
odstranění vrstvy ŠD	72,0 x 4,3 x 0,2 m		61,92 m³
hloubení aktivní zony	64,0 x 4,3 x 0,5 m		137,60 m³
čištění nánosů v krajinici	72,0 x 1,0 x 0,1 m		7,20 m³

Souřadnicový systém:	S-JTSK
Výškový systém:	Bpv
Přílohy	seznam souřadnic náčrt

Zaměřil:	11.2022	Ing. S. Bilek
Zpracoval:	29.11.2022	Ing. S. Bilek
Ověřil:	29.11.2022	Ing. S. Bilek

Ověření výsledků zeměměřických činností ve výstavbě
podle §13 odst.1 písm. c) zák. č. 200/1994 Sb




II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, etapa I

SO 101 – Rekonstrukce vozovky, Praha - Měchenice

Úsek F – km 4,829 – 5,194 – vpravo – odstranění původní vozovky

Seznam souřadnic

Bod	Y	X	výška
1	748389.34	1061836.71	202.31
2	748386.17	1061833.76	202.28
3	748392.97	1061825.77	202.20
4	748396.28	1061828.00	202.34
5	748402.64	1061819.72	202.41
6	748399.30	1061817.07	202.25
7	748405.23	1061807.89	202.27
8	748409.24	1061809.73	202.43
9	748414.04	1061800.99	202.39
10	748410.46	1061798.99	202.30
11	748415.37	1061789.51	202.30
12	748419.35	1061790.98	202.37
13	748423.60	1061782.14	202.40
14	748419.77	1061780.30	202.33
15	748425.37	1061767.91	202.29
16	748428.51	1061769.49	202.31
17	748427.80	1061771.02	202.30
18	748428.43	1061771.17	202.44
23	748384.85	1061841.41	202.28
24	748374.24	1061851.09	202.33
25	748371.27	1061847.91	202.10
26	748378.51	1061841.59	202.15
27	748361.46	1061855.77	202.11
28	748363.96	1061859.29	202.25
29	748355.63	1061866.03	202.28
30	748352.83	1061862.64	202.13
31	748344.75	1061869.00	202.18
32	748347.41	1061872.60	202.20
33	748340.60	1061878.01	202.23
34	748336.65	1061875.34	202.26
35	748323.63	1061885.45	202.28
36	748326.10	1061889.45	202.29
37	748316.14	1061897.18	202.25
38	748312.91	1061894.15	202.25
39	748298.32	1061905.57	202.33
40	748283.91	1061916.89	202.31
41	748265.65	1061931.38	202.33
42	748249.62	1061943.75	202.36
43	748165.77	1062009.25	202.37
44	748168.46	1062012.59	202.47
45	748169.55	1062011.55	202.40
47	748182.13	1062002.66	201.44
48	748185.72	1062000.04	202.00
49	748191.79	1061995.59	202.09
52	748196.87	1061991.71	202.11
57	748207.59	1061983.65	201.97
63	748226.22	1061968.30	202.00
64	748233.05	1061962.99	202.40
65	748240.34	1061957.62	202.52
66	748247.75	1061952.10	202.42
67	748257.56	1061944.66	202.37
68	748264.76	1061938.24	202.35
69	748272.16	1061931.80	202.28
72	748242.43	1061949.30	202.35

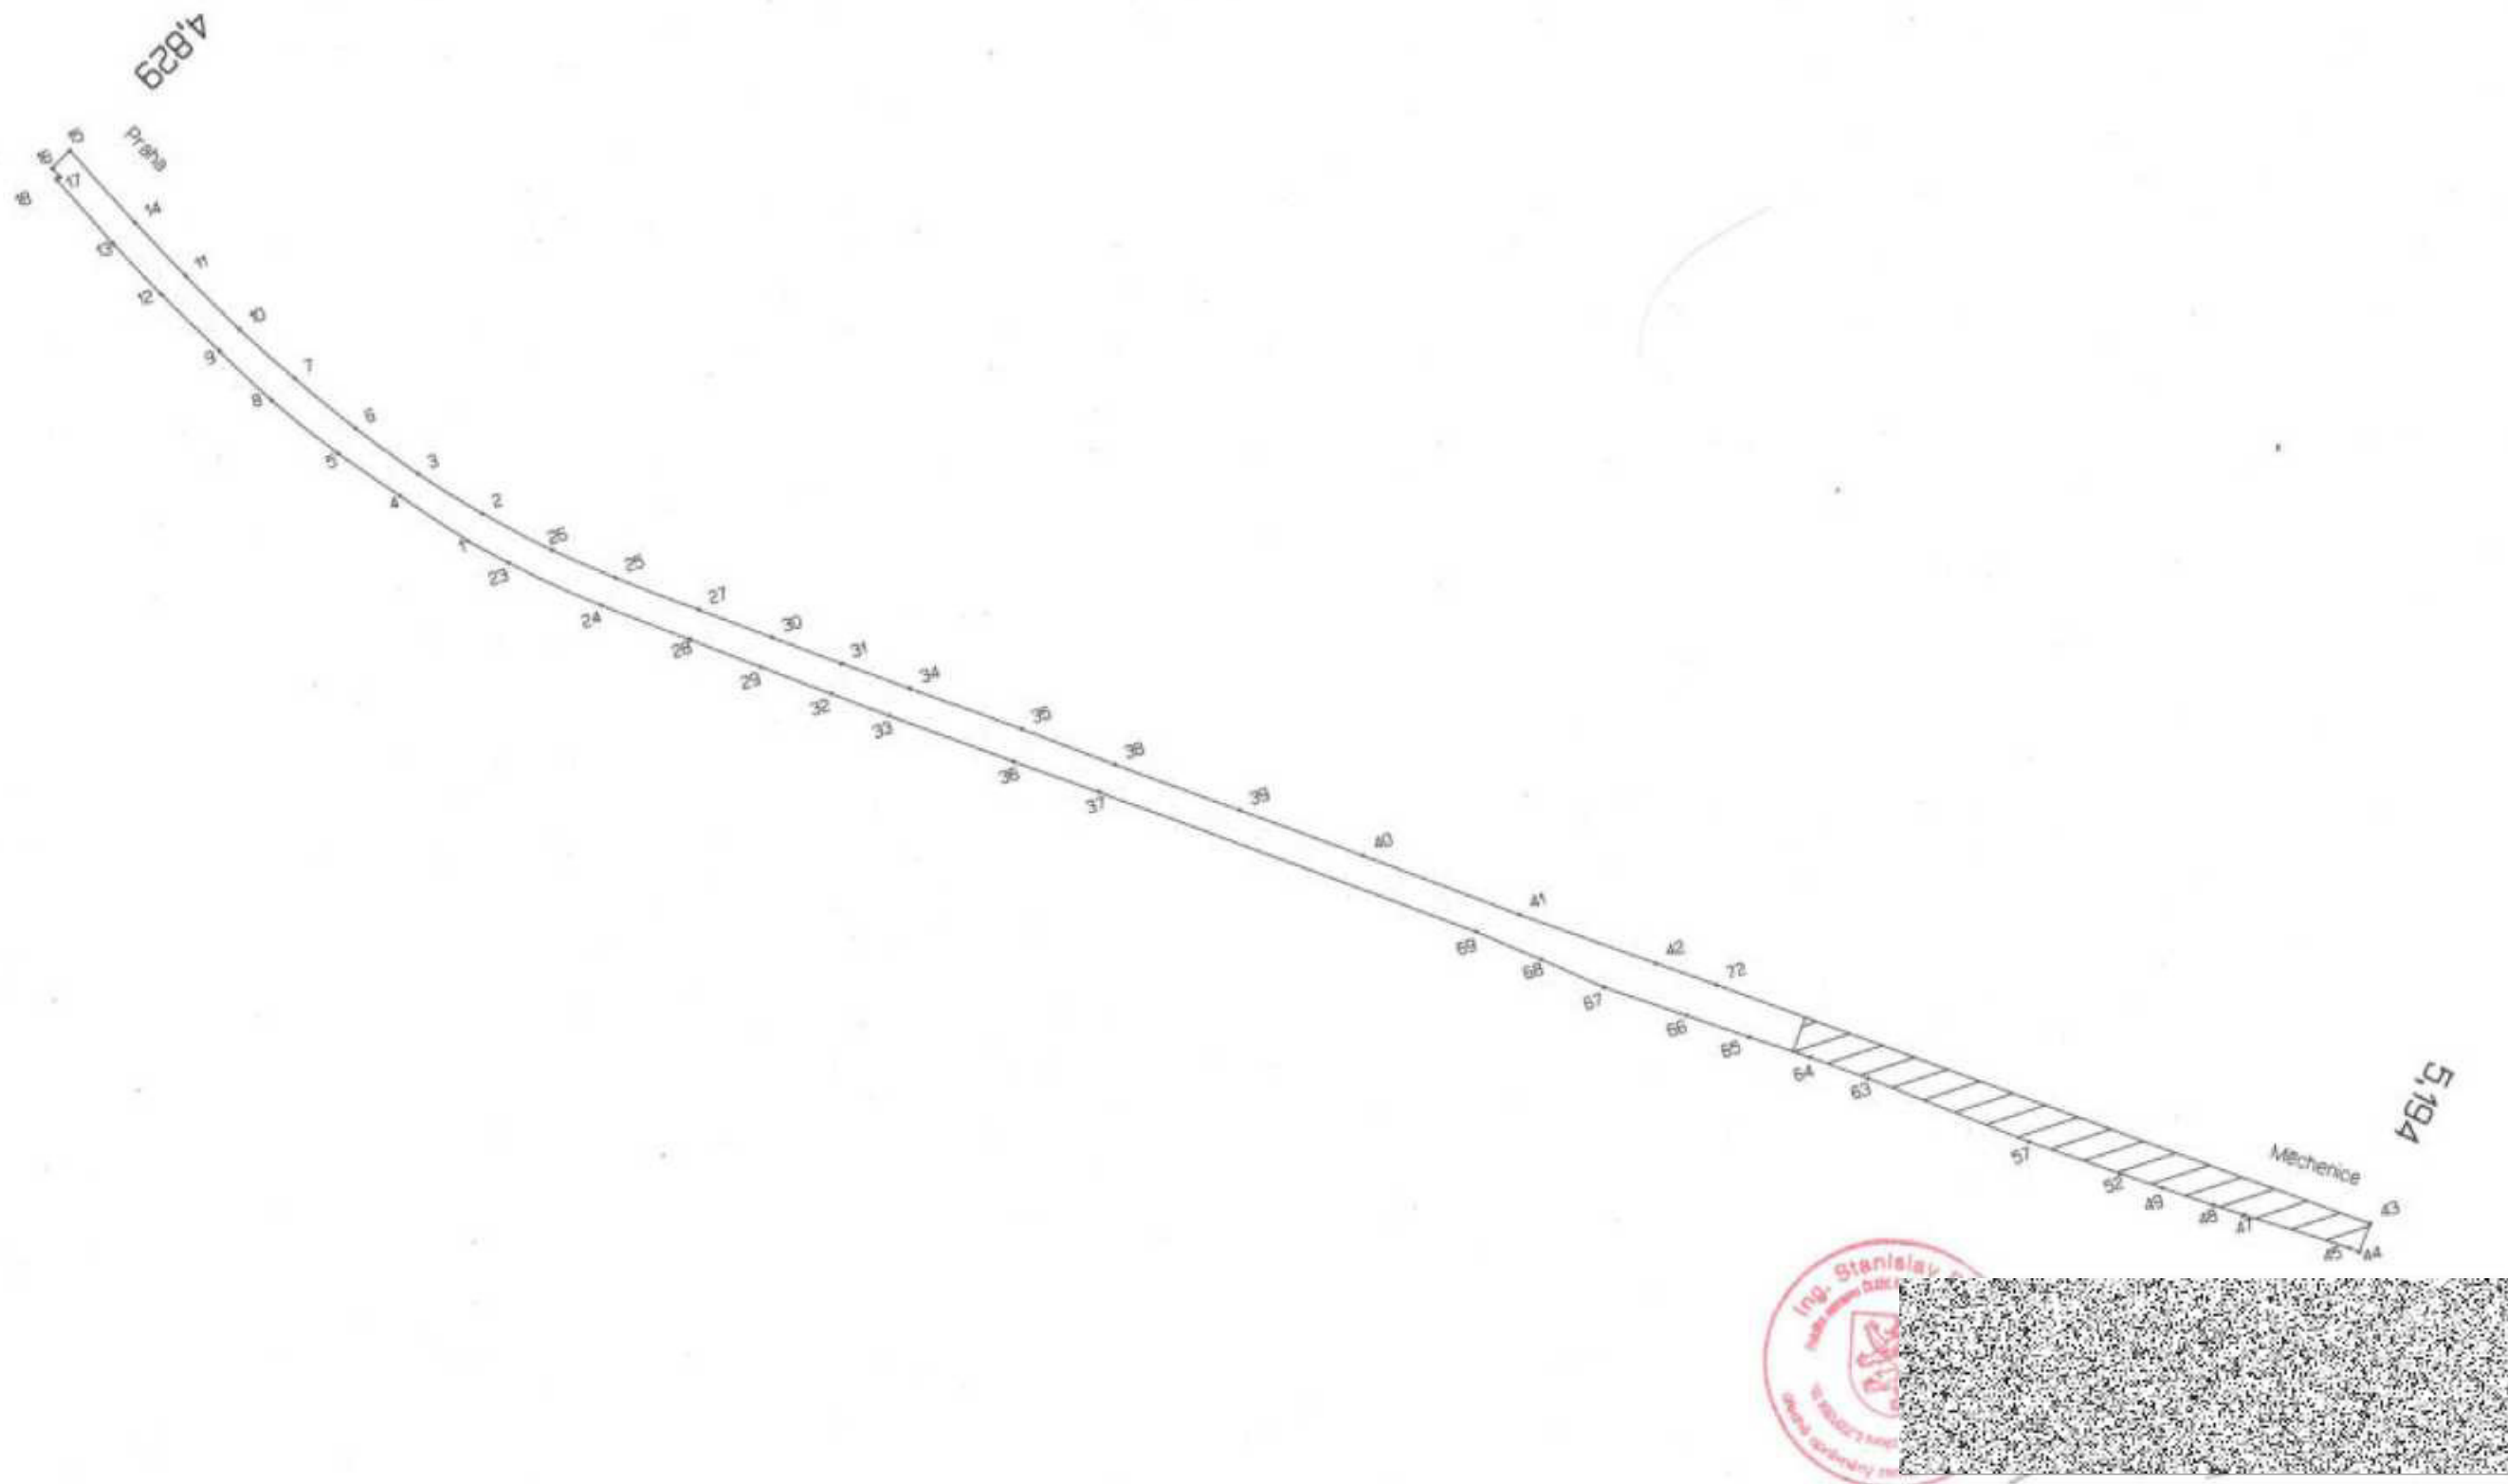

STRABAG a.s. Kačírkova 982/41, Praha 5				číslo zakázky		
				ověřil	Ing. S. Brlek	
				datum	29.11.2022	
				číslo ověření		
akce	II/102 Hr. Hl. Města Prahy – Stěchovice, rekonstrukce, etapa I SO 101 – rekonstrukce vozovky, Praha – Měchenice Úsek F – km 4,829 – 5,194 – vpravo – odstranění původní vozovky					výkres číslo
					měřítko	1:2000
záměřil	Ing. Stanislav Brlek	datum	5. 2022	souř. systém	S-JTSK	
kreslil	Ing. Stanislav Brlek	datum	23.5.2022	výtč. systém	Bpv	


II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, etapa I



SO 101 – Rekonstrukce vozovky, Praha - Měchenice

Úsek B – km 1,208 – 1,592 – vpravo – frézování

Seznam souřadnic

Bod	Y	X	výška
1	748299.37	1058798.65	202.37
2	748302.26	1058795.36	202.37
3	748318.17	1058806.76	202.40
4	748336.88	1058820.14	202.41
5	748334.18	1058824.00	202.37
6	748350.42	1058835.64	202.41
7	748353.25	1058832.12	202.41
8	748364.49	1058840.02	202.38
9	748361.92	1058843.90	202.42
10	748375.35	1058853.56	202.45
11	748392.20	1058865.47	202.46
12	748405.31	1058874.80	202.47
13	748419.70	1058885.42	202.62
14	748420.88	1058886.13	202.56
15	748376.93	1058848.99	202.45
16	748289.90	1058786.49	202.43
17	748281.89	1058780.98	202.38
18	748279.32	1058784.12	202.37
19	748268.78	1058771.56	202.38
20	748266.34	1058774.87	202.41
21	748256.84	1058763.30	202.41
22	748254.16	1058766.44	202.38
23	748233.51	1058752.72	202.38
24	748231.89	1058746.73	202.37
25	748208.61	1058731.86	202.38
26	748206.44	1058735.40	202.41
27	748188.44	1058723.94	202.43
28	748188.18	1058718.87	202.42
29	748170.81	1058708.23	202.39
30	748168.56	1058711.74	202.36
31	748150.17	1058700.69	202.41
32	748152.19	1058697.14	202.42
33	748133.34	1058686.28	202.44
34	748130.32	1058689.14	202.48
35	748111.84	1058673.47	202.53
36	748109.56	1058677.08	202.55
37	748104.44	1058673.47	202.52
38	748106.55	1058670.41	202.57
39	748103.91	1058668.90	202.67
40	748102.04	1058671.95	202.60



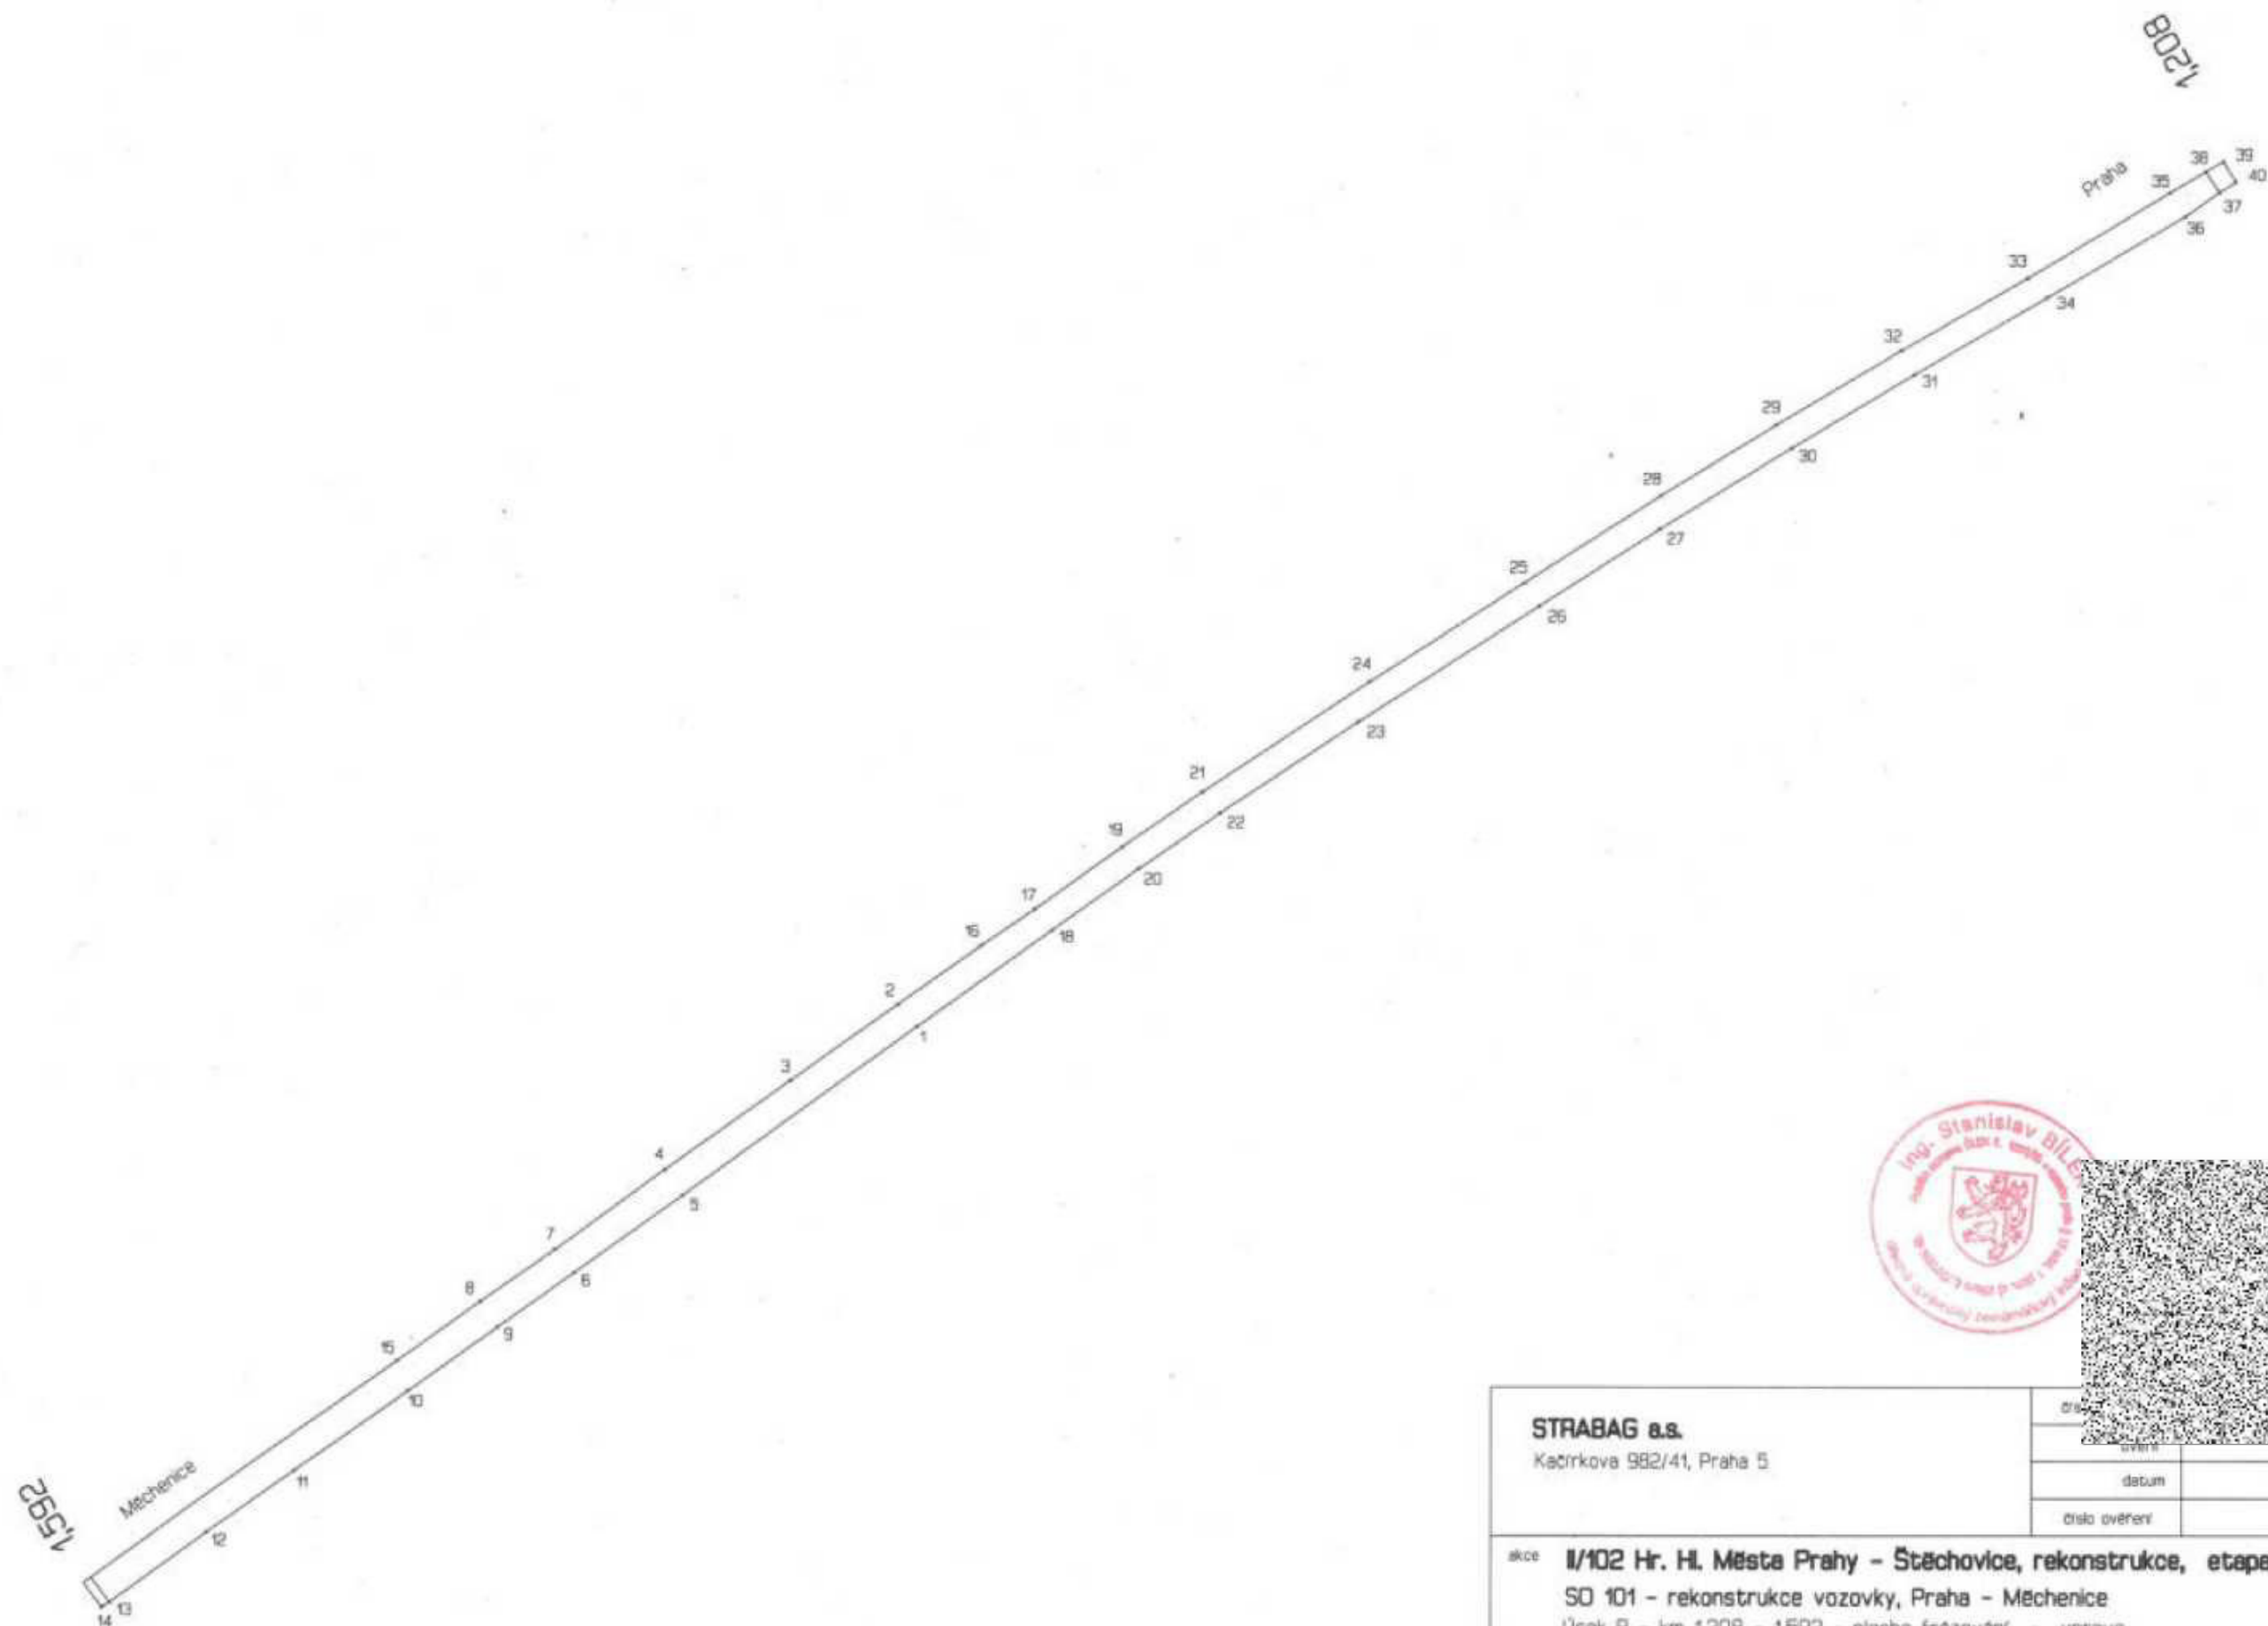

STRABAG a.s. Kačírkova 982/41, Praha 5	číslo		svědčí		
	datum		30.11.2022		
	číslo ověření				
	akce II/102 Hr. Hl. Města Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, etapa I SO 101 - rekonstrukce vozovky, Praha - Měchenice Úsek B - km 1,208 - 1,592 - plocha frézování - vpravo				
		výkres číslo			
			měřítko		1:1000
zaměří	Ing. Stanislav Brlek	datum	11.2022	souř. systém	5-JTSK
kreslí	Ing. Stanislav Brlek	datum	30.11.2022	výšk. systém	Bpv

Stavba: II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, ETAPA I
Dodavatel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Praha 5

Číslo předávacího protokolu: ŠI 83/2022

Předmět měření: SO 101 – REKONSTRUKCE VOZOVKY, PRAHA – MĚCHENICE
Úsek B,C km 1,208 – 1,592 – vpravo – AB vrstvy


ACP	tl. 60 mm	km – 1,208 – 1,5922	1635,2 m ²
ACL	tl. 70 mm	km – 1,208 – 1,592	1616,7 m ²

Měření bylo provedeno totální stanicí TOPCON IS305.
Dopustné odchylky měření a výpočtu nebyly překročeny,

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv
Přílohy seznam souřadnic
náčrt

Zaměřil:	12.2022	Ing. S. Bílek
Zpracoval:	14.12.2022	Ing. S. Bílek
Ověřil:	14.12.2022	Ing. S. Bílek

Ověření výsledků zeměměřických činností ve výstavbě
podle §13 odst.1 písm. c) zák. č. 200/1994 Sb




Úsek B – km 1,208 – 1,592 – vpravo – plocha konstrukčních vrstev

Bod	Y	X	výška	popis
1	748336.560	1058818.529	204.564	ZAKLAD
2	748335.701	1058819.711	204.595	ZAKLAD
3	748333.275	1058823.518	204.442	
4	748345.773	1058832.445	204.451	
5	748348.402	1058828.661	204.579	
6	748360.226	1058837.451	204.584	
7	748357.629	1058841.034	204.476	
8	748365.174	1058839.378	204.597	ZAKLAD
9	748364.434	1058840.473	204.605	ZAKLAD
10	748372.824	1058846.570	204.619	ZAKLAD
11	748370.265	1058850.001	204.495	
12	748385.608	1058860.957	204.499	
13	748387.988	1058857.308	204.640	ZAKLAD
14	748398.957	1058865.074	204.646	ZAKLAD
15	748396.446	1058868.595	204.523	
16	748409.435	1058877.955	204.534	
17	748411.964	1058874.376	204.663	ZAKLAD
18	748421.627	1058881.443	204.639	ZAKLAD
19	748423.447	1058882.715	204.648	ZAKLAD
20	748420.844	1058886.198	204.549	
21	748320.712	1058814.454	204.423	
22	748323.344	1058810.873	204.597	ZAKLAD
23	748307.851	1058799.856	204.583	ZAKLAD
24	748305.333	1058803.173	204.446	
25	748285.692	1058788.992	204.439	
26	748288.402	1058785.819	204.580	ZAKLAD
27	748289.205	1058784.668	204.532	ZAKLAD
29	748272.983	1058774.849	204.541	
30	748270.633	1058778.038	204.437	
31	748258.217	1058769.195	204.478	
33	748260.184	1058765.891	204.609	
36	748255.342	1058762.518	204.617	
44	748248.885	1058756.575	204.531	ZAKLAD
45	748248.071	1058757.692	204.571	ZAKLAD
46	748245.647	1058760.791	204.456	
47	748230.476	1058750.865	204.457	
48	748232.790	1058747.584	204.588	ZAKLAD
49	748217.917	1058738.067	204.586	ZAKLAD
50	748215.659	1058741.382	204.459	
51	748205.188	1058734.646	204.456	
52	748207.701	1058731.529	204.608	ZAKLAD
53	748208.348	1058730.430	204.569	ZAKLAD
54	748197.313	1058724.652	202.571	
55	748195.082	1058728.238	202.478	
56	748179.564	1058718.556	202.495	
57	748181.701	1058714.826	202.573	
58	748164.869	1058704.525	202.590	
59	748162.538	1058708.125	202.506	
60	748150.222	1058700.872	202.505	
61	748152.403	1058697.275	202.632	ZAKLAD
62	748153.037	1058696.191	202.589	ZAKLAD
63	748138.602	1058689.224	202.649	ZAKLAD
64	748136.486	1058692.749	202.513	
65	748122.370	1058684.558	202.503	
66	748124.774	1058681.174	202.658	ZAKLAD
67	748106.489	1058670.418	202.660	ZAKLAD
68	748107.147	1058669.470	202.625	ZAKLAD
69	748103.798	1058668.973	202.676	
70	748101.705	1058672.513	202.576	
71	748090.180	1058661.154	202.666	ZAKLAD
72	748073.387	1058652.505	202.614	ZAKLAD
73	748073.586	1058650.988	202.636	ZAKLAD
74	748057.675	1058645.068	202.568	ZAKLAD
75	748058.230	1058643.896	202.631	ZAKLAD
76	748045.117	1058639.564	202.505	ZAKLAD
77	748045.698	1058638.376	202.632	ZAKLAD
78	748033.339			



STRABAG

Číslo předávacího protokolu: ŠI 87/2022



Úsek F – km 4,817 – 5,188 – vpravo – plocha AB vozovky


Bod	Y	X	výška
1	748225.10	1061968.59	202.47
2	748215.58	1061976.04	202.47
3	748202.93	1061985.88	202.46
4	748190.21	1061995.46	200.30
5	748177.55	1062005.52	202.44
6	748168.19	1062012.59	202.47
7	748165.57	1062009.40	202.37
8	748174.63	1062002.16	202.34
9	748187.61	1061992.15	202.34
10	748203.43	1061979.99	202.3
11	748212.72	1061972.71	202.35
12	748222.02	1061965.55	202.39
13	748230.52	1061958.82	202.38
15	748232.61	1061962.83	202.48
25	748261.11	1061940.31	202.50
26	748251.03	1061942.54	202.39
27	748265.94	1061930.89	202.39
28	748268.65	1061934.34	202.50
29	748280.64	1061924.75	202.51
30	748277.91	1061921.18	202.40
32	748293.91	1061914.16	202.47
33	748291.34	1061910.43	202.38
35	748307.87	1061903.04	202.47
36	748305.16	1061899.88	202.36
38	748318.30	1061894.87	202.44
39	748315.77	1061891.65	202.34
40	748395.22	1061830.99	202.55
41	748394.09	1061830.10	202.60
42	748399.00	1061823.70	202.63
43	748404.69	1061815.34	202.66
44	748409.83	1061806.81	202.67
45	748414.74	1061797.74	202.66
46	748419.31	1061788.91	202.64
47	748424.36	1061778.51	202.53
48	748429.56	1061767.72	202.48
49	748431.19	1061764.29	202.50
50	748427.76	1061762.52	202.38
51	748424.52	1061769.11	202.39
52	748420.72	1061777.47	202.42
53	748416.71	1061786.19	202.45
54	748412.62	1061794.36	202.45
55	748407.95	1061802.77	202.45
56	748402.57	1061811.47	202.42
57	748398.89	1061816.87	202.39
58	748394.69	1061822.74	202.37
59	748391.01	1061827.64	202.38
60	748385.68	1061833.81	202.32
61	748388.38	1061836.68	202.55
62	748375.92	1061843.53	202.32
63	748378.65	1061846.49	202.52
64	748370.75	1061853.44	202.48
65	748368.05	1061850.21	202.29
66	748358.75	1061857.66	202.27
68	748361.46	1061860.98	202.41
69	748353.24	1061867.54	202.40
70	748343.07	1061875.27	202.40
71	748349.49	1061865.09	202.29
72	748340.85	1061871.82	202.29
73	748330.82	1061884.94	202.41

ZAKLAD
ZAKLAD
ZAKLAD
ZAKLAD
ZAKLAD
ZAKLAD
ZAKLAD
ZAKLAD
ZAKLAD
ZAKLAD



STRABAG

Číslo předávacího protokolu: ŠI 90/2022

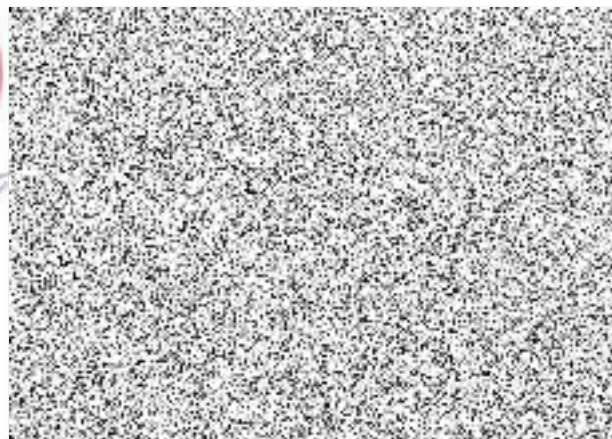


II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, etapa I




SO 101 – Rekonstrukce vozovky, Praha - Měchenice

Úsek B – km 1,264 – 1,519 – vpravo – úprava krajnice

Seznam souřadnic

Bod	Y	X	výška	popis
2	748335.70	1058819.71	204.59	ZAKL
5	748348.40	1058828.66	204.58	KZ
6	748360.23	1058837.45	204.58	KZ
9	748364.43	1058840.47	204.60	ZAKL
26	748288.40	1058785.82	204.58	ZAKL
27	748289.20	1058784.67	204.53	ZAKL
28	748281.77	1058778.09	204.39	HV
29	748272.98	1058774.85	204.54	KZ
32	748264.50	1058766.81	204.42	HV
33	748260.18	1058765.89	204.61	KAM
34	748261.10	1058764.42	204.63	KAM
35	748256.40	1058760.97	204.65	KAM
36	748255.34	1058762.52	204.62	KAM
37	748257.16	1058762.92	204.54	KAM
38	748257.81	1058762.00	204.53	KAM
39	748259.03	1058764.37	204.54	KAM
40	748259.81	1058763.41	204.54	KAM
41	748261.05	1058762.25	205.44	KAM
42	748260.57	1058761.41	205.29	KAM
43	748258.70	1058760.33	205.48	KAM
44	748248.89	1058756.57	204.53	ZAKL
45	748248.07	1058757.69	204.57	ZAKL
52	748207.70	1058731.53	204.61	ZAKL
54	748197.31	1058724.65	202.57	KZ
57	748181.70	1058714.83	202.57	KZ
58	748164.87	1058704.52	202.59	KZ
61	748152.40	1058697.27	202.63	ZAKL
102	748248.62	1058757.06	202.51	
103	748249.06	1058756.38	202.48	
105	748255.75	1058761.92	202.63	
108	748261.51	1058763.94	202.58	
109	748264.27	1058765.74	202.43	
110	748274.64	1058772.50	202.80	
111	748279.84	1058774.83	202.61	
112	748287.43	1058780.21	202.57	
113	748290.34	1058782.65	202.53	
116	748265.26	1058765.90	202.05	VYTOK
117	748264.97	1058766.25	201.98	VYTOK



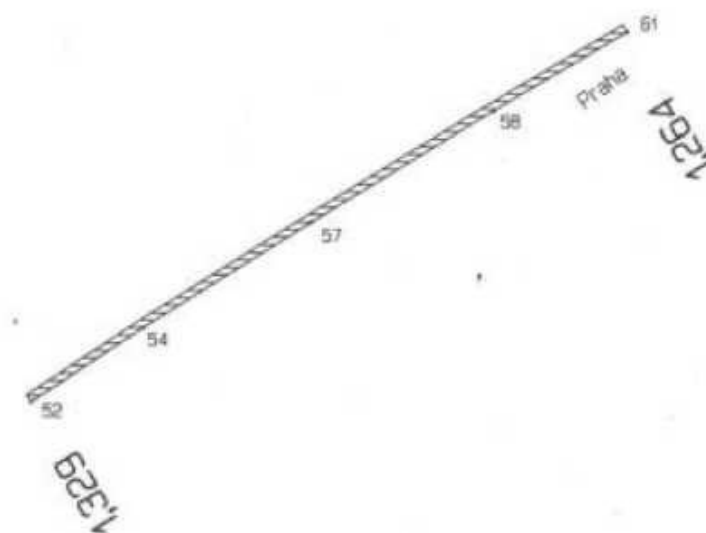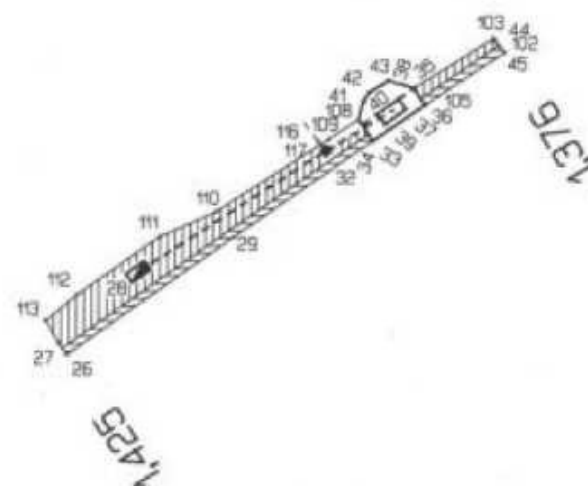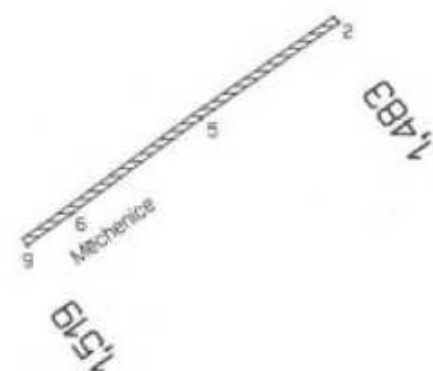

STRABAG a.s. Kačírkova 982/41, Praha 5	číslo zakázky				
	ověřil		Ing. S. Bílek		
	datum		22.12.2022		
	číslo ověření				
akce	II/102 Hr. Hl. Města Prahy – Stěchovice, rekonstrukce, etapa I SO 101 – rekonstrukce vozovky, Praha – Měchenice Úsek B – km 1,264 – 1,519 – vpravo – úprava krajnice				výkres číslo
			měřítko	bez	
zameřil	Ing. Stanislav Bílek	datum	12.2022	souř. systém	S-JTSK
kreslil	Ing. Stanislav Bílek	datum	22.12.2022	výřk. systém	BpV

STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství
direkce TC
Kačírkova 982/4
CZ – 158 00 Praha 5 / Česká republika

STRABAG

Stavba: II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, ETAPA I
Dodavatel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Praha 5

Číslo předávacího protokolu: ŠI 11/2023

Předmět měření: SO 101 – REKONSTRUKCE VOZOVKY, PRAHA – MĚCHENICE
Plocha ACO

km – 1,207 – 3,572 :

ACO - vozovka	20366,2 m ²
sjezd km 1,480 L	58,6 m ²
sjezd km 3,428 P	82,1 m ²
sjezd km 3,490 L	42,3 m ²
krajnice 1124 x 0,75	843,0 m ²
sjezd km 3,428 P	10,1 m ²
geomříže 2365 m x 2	4730 m ²

km – 4,380 – 5,274 :

ACO - vozovka	8448,4 m ²
křižovatka 5,100 L	182,9 m ²
krajnice 4,900 – 5,100 P	326,5 m ²
5,110 P	13,0 m ²
geomříže 894 m x 2	1788 m ²

Měření bylo provedeno totální stanicí TOPCON IS305.
Dopustné odchylky měření a výpočtu nebyly překročeny.

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv
Přílohy

Zaměřil: 4.-5.2023 Ing. S. Bílek
Zpracoval: 2.5.2023 Ing. S. Bílek
Ověřil: 2.5.2023 Ing. S. Bílek

Ověření výsledků zeměměřických činností ve výstavbě
podle §13 odst.1 písm. c) zák. č. 200/1994 Sb



STRABAG

Číslo predávacieho protokolu: ŠI 12/2023

Frézování – tl. 40 mm


zálivky

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv
Přilohy

Zaměřil: 4.-5.2023
Zpracoval: 4.5.2023
Ověřil: 4.5.2023

Ing. S. Bílek
Ing. S. Bílek
Ing. S. Bílek

Ověření výsledků zeměměřických činností ve výstavbě
podle §13 odst.1 písm. c) zák. č. 200/1994 Sb



STRABAG a.s
Kačírkova 982/4,
158 00 Praha 5

Věc: Souhlasné stanovisko k ZBV – Úprava propustků

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace v návaznosti na projednání s TDS a zhotovitelem v rámci akce „II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA I“ **souhlasí** s navrženou a projednanou změnou. Jmenovitě souhlasí s úpravu propustků na základě výsledku prohlídky ze dne 2. 7. 2021. Prohlídkou byl zdokumentován stav ocelového zábradlí propustků (celkem 5 ks). Byla zjištěna nevyhovující výška zábradlí z hlediska bezpečnosti a pokročilý stav koroze. Na základě uvedených skutečností byl zpracován návrh úpravy propustků (odstranění nefunkčního zábradlí, osazení roštů, provedení křídel propustku a reprofilace). Návrh byl odsouhlasen TDS, provozním úsekem, AD. Při vlastní realizaci se ukázalo, že některá navržená opatření by se stala z provozního hlediska nadbytečná. Proto byly provedeny níže uvedené úpravy z 1/3 (položka č. 133, 134) a položka číslo 136 (opěry propustků) se neprovedla.

pol. č. 133 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM

pol. č. 134 REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAC MALTOU DVOUVRST TL DO 50MM

pol. č. 136 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37

Realizovaná změna úpravy propustků umožní bezproblémové odvodnění komunikace a z ekonomického hlediska přispěje k finanční úspoře.

Objednatel souhlasí se změnou původního návrhu úpravy propustků.

Další práce požadujeme provést v koordinaci v souladu s pokyny AD a TDS a v souladu s uzavřenou SOD.

S pozdravem



Ing. Milan Peska
technicko – provozní náměstek

Středočeský kraj

v zastoupení

**Krajské správy a údržby silnic
Středočeského kraje, p.o.**

Ing. Aleš Čermák

Zborovská 11

Praha, 150 00

Čj : PX 2023

V Praze : 2. října 2023

Vyřizuje: Ing. Pavel Hrdina



Akce: II/102 hr. hl. m. Prahy – Štěchovice, rekonstrukce (1. etapa)

Věc: Vyjádření AD č. 82

Vážený pane inženýre,

dne 26.9.2023 obdržel AD návrh ZBV č. 21, které je závěrečný ZBV stavby k SO 101 a řeší z větší části doměrky. K Doměrkům se AD ve smyslu čl. 4 přílohy č. 5 TKP kap. 1 nevyjadřuje.

ZBV č. 21 dále obsahuje:

- a) Nprovedení opravy čel ponechávaných trubních propustků

Jedná se o změnu z požadavku objednatele.

- b) Nprovedení broušení povrchu betonu po frézování před pokládkou SAL

Předmětem činnosti bylo zajištění dostatečné rovinatosti povrchu po frézování s tím, aby byla omezena spotřeba následně pokládané vrstvy SAL nebo její nedostatečná tloušťka. Pokládka vrstvy SAL byla omezena v rámci předchozích ZBV a s ohledem na použitou technologii zhotovitele nebyla nutné před pokládkou vrstvy SAL provést broušení, což bylo ověřeno na kontrolních vývrtech.

- c) Nprovedení odrazek na svodidlech

Jedná se o řetězíci se změnu z předchozích ZBV.

- d) Nprovedení frézování betonových ploch

Položka je vypuštěna s ohledem na zjištěné výšky betonového povrchu.

AD po prostudování s návrhem ZBV č. 21 souhlasí.

S pozdravem za Pontex s.r.o.

Ing. Pavel Hrdina



Naše značka: TD/248/19-120/VM/23

Vaše značka:



KSÚS Středočeského kraje

Ing. Milan PEŠKA

Technicko-provozní náměstek

Zborovská 11

150 21 Praha 5

Stavba: II/102 hr. hl. m Prahy – Štěchovice, rekonstrukce, etapa I.

Věc: Stanovisko TDS k návrhu ZBV č. 21 SO 101+111 Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa.

Zhotovitel stavby dne 25. 9. 2023 předložil TDS návrh ZBV č. 21 SO 101+111 Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa (Závěrečné ZBV).

Návrh změn řeší doměrek položky č. 85 a další změny z průběhu realizace. Tyto změny měly vliv na položky č. 1 až 7, 9 až 27, 31, 33, 35, 37 až 52, 56, 57, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 75, 76, 80 až 84, 87 a položky nové č. 101 a 118.

Další změny z průběhu realizace byly zařazeny do skupiny č. 5. Tyto změny měly vliv na výměry nových položek soupisu prací č. 133, 134, 136.

TDS potvrzuje skutečnosti uvedené v návrhu ZBV č. 21 (101+111/7) SO 101+111 Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa.

Položky oceněného soupisu prací SO 101+111 budou fakturovány na základě skutečně provedených prací doložených měřeními a záznamy ve stavebním deníku.

**Miroslav
Valenta**

Digitálně podepsal
Miroslav Valenta
Datum: 2023.10.04
16:12:26 +02'00'

M. Valenta

Technický dozor investora

Na vědomí: J. Nejdlík

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

II/102 hr. Hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA I, ADA 4388

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):000/2

Vedlejší a ostatní náklady

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

000/2

Číslo ZBV:

22

Objednatel:

Středočeský kraj

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

IČ: 70891095

DIČ: CZ70891095

Zhotovitel:

"Společnost "STRAKELL-BAGER Štěchovice"

Správce společnosti:

STRABAG, a.s.

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

IČ: 60838744

Druhý společník:

KELLER - speciální zakládání, spol. s r.o.

Na Pankráci 1618/30, 140 00 Praha 4

IČ: 49702190

Rekapitulace ZBV č. 22 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
22.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
22.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
22.3	0,00	329 212,08	329 212,08

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
22.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
22.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
22	0,00	329 212,08	329 212,08

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo : 22**

Název Stavby:	II/102 hr. Hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA I, ADA 438t
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 000/2
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	
Vedlejší a ostatní náklady	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
24 775 432,28

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	2 403 369,55	27 178 801,83	2 403 369,55

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	329 212,08	2 732 581,63	11,03%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	27 508 013,91	2 732 581,63	11,03%

Rozpis ocenění Změn položek pro ZBV č. 22													
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. Hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA I, ADA 4388 Číslo a název SO/PS: Vedlejší a ostatní náklady Číslo a název rozpočtu: Vedlejší a ostatní náklady								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								000/2					
								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Nové položky											
19	01460	POPLATKY ZA NÁHRADNÍ VLAKOVOU DOPRAVU	KPL	0,00	1,000	1,000	329 212,08	0,00	0,00	329 212,08	329 212,08	329 212,08	100,00%
		Celkem						0,00	0,00	329 212,08	329 212,08	329 212,08	1,00%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Josef Nejedlyk, (vedoucí projektu)

Datum:

Podpis:

Za Objednatele: Miroslav Valenta, (TDI)

Datum:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby:

II/102 hr. HI. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA I, ADA 4388

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	637 600 766,46
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	624 678 896,95
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	755 861 465,31
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	97,97%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování změny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 %, pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. 3), písm. b)	-11,15%

$6=(3+36)$	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	-11 519 212,46
$7=(6/1)*100$	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	-1,81%
$8=1*0,3$	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	191 280 229,94

$9=(32A/1)*100$	Sledování limitu 50 % Skupina 3	19,80%
$10=(36A/1)*100$	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,13%
$10A=32A+36A$	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	127 077 225,51
$11=1*0,5$	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	318 800 383,23

$12=(1)*0,15$	Limit	95 640 114,97
$13=(36)/(1)$	Sledování limitu (15%)	0,04%
$14=(ABS(37)+(36))$	Hodnota skupiny 5	269 900,71

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38	39=ABS(37)+38
		II/102 hr. HI. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I, ADA 4388	- 71 091 180,26	58 169 310,70	- 12 921 869,50	- 1 719 920,22	120 403,46	0,00	0,00	0,00	0,00	- 71 831 155,30	56 951 552,00	- 12 346 666,98	126 249 770,98	0,00	827 454,53	827 454,53	827 454,53	0,00	269 900,71	269 900,71
101+111	1	Rekonstrukce vozovky a oprava zemního tělesa / RDS (oprava typu svahová, rekonstrukce vozovky, oprava zemního tělesa, oprava stávajících svahových těles)	- 1 230 712,50	445 208,60	- 785 503,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 230 712,50	445 208,60	- 785 503,90	1 675 921,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101+111	2	Rekonstrukce vozovky a oprava zemního tělesa / Propustky v km 4,15; 3,93 a 3,92; záhyb šachty v km 4,25, přechod pro chodce v km 0,13, 366, kavárna pod vozovkou	- 225 219,46	2 260 437,88	2 035 218,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 225 219,46	2 260 437,88	2 035 218,42	2 485 657,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	3	Přeložka kabelů NN u hráze Vrané / RDS (optimalizace vedení NN)	- 139 930,22	132 459,90	- 7 470,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 139 930,22	132 459,90	- 7 470,32	272 360,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	4	Most ev.č.102-007 / změna založení, spodní stavby a přechodové oblasti	- 2 009 738,74	1 492 468,02	- 517 270,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 009 738,74	1 492 468,02	- 517 270,72	3 502 206,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	5	Most ev.č.102-010 / změna založení, spodní stavby a přechodové oblasti	- 1 861 863,36	1 015 127,72	- 846 535,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 861 863,36	1 015 127,72	- 846 535,64	2 876 791,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	6	Opěrné zdi Praha - Měchenice vlevo / RDS (náhrada záporového pažení svahováním, vynesčení těsnicí vrstvy, rozdělení taktování zdi na dilatační úseky dle zvoleného zádržného systému)	- 23 169 457,74	4 147 072,89	- 19 022 384,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 23 169 457,74	4 147 072,89	- 19 022 384,85	27 316 530,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	7	Opěrné zdi Praha Měchenice vlevo / Demolice lávky	0,00	827 454,53	827 454,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 454,53	827 454,53	827 454,53	0,00	0,00	0,00	0,00
251	8	Opěrné zdi Praha Měchenice vlevo / Změna zatížení tloučeni	- 9 914 515,16	4 674 687,69	- 5 239 827,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 9 914 515,16	4 674 687,69	- 5 239 827,47	14 589 202,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	9	Most ev.č.102-008 / změna založení, spodní stavby a přechodové oblasti	- 3 630 475,95	1 170 156,56	- 2 460 319,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3 630 475,95	1 170 156,56	- 2 460 319,39	4 800 632,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	10	Opěrné zdi Praha - Měchenice vlevo / 16a Marina Měchenice (Fregatta), 10b změna zdi pod železničním mostem, 10c prodloužení mikropilot	- 1 237 296,15	3 210 272,68	1 972 976,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 237 296,15	3 210 272,68	1 972 976,53	4 447 568,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	11	Opěrné zdi - vpravo - RDS (náhrada pažerých jam svahováním, zprášení objemu bourání, zprášení objemu zdi a říms, záchytný systém)	- 1 334 695,25	2 098 064,63	763 369,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 334 695,25	2 098 064,63	763 369,38	3 432 759,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	12	Rekonstrukce vozovky a oprava zemního tělesa / oprava projezdu kamenu, opravy útvarů, opravy a dilatační, oprava stávajících těles, opravy svahových těles	- 2 786 823,32	8 403 226,62	5 616 403,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 786 823,32	8 403 226,62	5 616 403,30	11 190 049,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	13	Rekonstrukce vozovky a oprava zemního tělesa / Friezování SO / CB kraj	- 763 271,00	9 122 378,67	8 359 107,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 763 271,00	9 122 378,67	8 359 107,67	9 885 649,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101+111	14	Rekonstrukce vozovky a oprava zemního tělesa / oprava podřízdné výšky v km 4,400, sanace úseku km 6,030 - 6,419 vpravo, oprava konstrukce sjezdů, demolice lávky v km 5,648, oprava konstrukce vozovky 5,580 - 6,030, sanace úseku v km 6,200 - 6,360	- 1 257 648,64	5 265 694,86	4 008 046,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 257 648,64	4 995 794,15	3 738 145,51	6 253 442,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 900,71	269 900,71
000	15	Technická pomoc	0,00	2 403 369,55	2 403 369,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 403 369,55	2 403 369,55	2 403 369,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251/5	16	Opěrné zdi Praha Měchenice vlevo / roz. ocelová, roz. mikropiloty a tlakové stěny, roz. železobetonové stěny, roz. železobetonové stěny, roz. železobetonové stěny	- 590 332,49	753 379,62	163 047,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 590 332,49	753 379,62	163 047,13	1 343 712,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101+111	17	Rekonstrukce vozovky a oprava zemního tělesa / Rekonstrukce stávajících propustků v km 1,368, 4,8594, 4,9319, 4,948, 5,0946, Oprava svahového a vodorovného značení, Oprava množství přesunů stávajících svodidel	0,00	3 286 556,57	3 286 556,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 286 556,57	3 286 556,57	3 286 556,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252/2	18	Mikropiloty	- 147 582,39	55 970,12	- 91 612,27	- 147 582,39	55 970,12	- 91 612,27	0,00	0,00	0,00	- 2 532 936,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202/2	19	Závěrečné ZBV	- 1 226 062,91	0,00	- 1 226 062,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 226 062,91	0,00	- 1 226 062,91	1 226 062,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251/6	20	Závěrečné ZBV	- 4 089 324,93	84 433,34	- 4 024 891,59	- 1 556 388,61	84 433,34	- 1 481 955,27	0,00	0,00	0,00	- 2 532 936,32	0,00	- 2 532 936,32	2 532 936,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101+111	21	Závěrečné ZBV	- 15 476 429,99	7 011 678,17	- 8 464 751,82	- 15 949,22	0,00	- 15 949,22	0,00	0,00	0,00	- 15 387 439,77	7 011 678,17	- 8 375 761,60	22 399 117,94	0,00	0,00	0,00	0,00	- 73 041,00	0,00	73 041,00
000	22	Náhradní vlaková doprava	0,00	329 212,08	329 212,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 212,08	329 212,08	329 212,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	22
Název a evidenční číslo stavby:	II/102 hr. Hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA I, ADA 4388
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Vedlejší a ostatní náklady
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	000/2

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listu)	NE - Uloženo
07 Změnový soupis prací SO 000 po změně 2	2	
08 Rozhodnutí MěÚ Černošice	26	
09 Faktury za náhradní vlakovou dopravu	3	
10 Výpočet ceny položky	1	
11 - Oznámení Zhotovitele	2	
12 - Pokyn Objednatele	1	
13 - Vyjádření TDS	1	
14 - Vyjádření AD	1	
Počet listu celkem	37	

Změnový soupis prací SO 000 po změně 2 pro ZBV 22													
Evidenční číslo a název stavby: ADA 4388, II/102 hr. Hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA I									ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)				
Číslo a název SO/PS: SO 000/2 Vedlejší a ostatní náklady									000/2				
Číslo a název rozpočtu: SO 000/2 Vedlejší a ostatní náklady									Skupina Změn: 3				
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0 Všeobecné konstrukce a práce											
1	00410R	Vedlejší náklady	KPL	1,00	1,00	0,00	345 014,29	345 014,29	0,00	0,00	345 014,29	0,00	0,00%
		obsahují zejména náklady na: - ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními - uvedení stavbou dotčených ploch a staveništní dopravou dotčených komunikací do původního nebo projektovaného stavu - zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí - likvidace přebytečného stavebního materiálu odpovídajícím způsobem - péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování - nutný rozsah stavebního pojištění budovaného díla na předmětné stavbě a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě - zajištění bankovních garancí - všechny další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek											
2	00420R	Ostatní náklady	KPL	1,00	1,00	0,00	172 507,15	172 507,15	0,00	0,00	172 507,15	0,00	0,00%
		obsahují zejména náklady na: - úpravu příslušné dokumentace dle technologických postupů zhotovitele a dle při provádění díla zjištěných skutečností - zpracování Plánu havarijních opatření zařízení staveniště a mechanizace - zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dle § 15, odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP) - zpracování technologických postupů a plánů kontrol - pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů - všechny další nutné činnosti k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek											
3	02520	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU dle TKP	KPL	1,00	1,00	0,00	1 150 047,64	1 150 047,64	0,00	0,00	1 150 047,64	0,00	0,00%
4	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU dle TKP	KPL	1,00	1,00	0,00	115 004,76	115 004,76	0,00	0,00	115 004,76	0,00	0,00%
5	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENYRSKÝCH SÍTÍ vytyčení a ochrana sítí v oblasti zasažené stavbou	KPL	1,00	1,00	0,00	230 009,53	230 009,53	0,00	0,00	230 009,53	0,00	0,00%
6	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,00	1,00	0,00	3 783 656,72	3 783 656,72	0,00	0,00	3 783 656,72	0,00	0,00%
7	029113	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby vč. zákresu do katastrální mapy a její digitalizace	KUS	1,00	1,00	0,00	287 511,91	287 511,91	0,00	0,00	287 511,91	0,00	0,00%
8	029113	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY Vytyčení obvodu stavby	KUS	1,00	1,00	0,00	80 503,33	80 503,33	0,00	0,00	80 503,33	0,00	0,00%
9	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE plán sledování a údržby mostů	KPL	1,00	1,00	0,00	92 003,81	92 003,81	0,00	0,00	92 003,81	0,00	0,00%
10	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE VTD podpěrné skruže NK, VTD pažení ze zápor a štětovic vč. kotvení	KPL	1,00	1,00	0,00	138 005,72	138 005,72	0,00	0,00	138 005,72	0,00	0,00%

11	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS RDS-Z-PDS - pro celou stavbu ZBV 15 Viz doklad 11 - cenové nabídky 2.091.350 Kč +5%+5%+5% režije a zisku	KPL	1,00	1,24	0,243	9 890 409,67	9 890 409,67	0,00	2 403 369,55	12 293 779,22	2 403 369,55	24,30%
12	02944	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ pro celou stavbu	KPL	1,00	1,00	0,00	1 150 047,64	1 150 047,64	0,00	0,00	1 150 047,64	0,00	0,00%
13	02945	OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN Ve 12-ti vyhotoveních	KPL	1,00	1,00	0,00	172 507,15	172 507,15	0,00	0,00	172 507,15	0,00	0,00%
14	02946	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,00	1,00	0,00	57 502,38	57 502,38	0,00	0,00	57 502,38	0,00	0,00%
15	02960	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR Technicko inženýrská činnost projektanta	KPL	1,00	1,00	0,00	230 009,53	230 009,53	0,00	0,00	230 009,53	0,00	0,00%
16	02960	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR Inženýrská činnost pro DIO	KPL	1,00	1,00	0,00	115 004,76	115 004,76	0,00	0,00	115 004,76	0,00	0,00%
17	02991	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	2,00	2,00	0,00	11 500,48	23 000,96	0,00	0,00	23 000,96	0,00	0,00%
18	03100	ZÁŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,00	1,00	0,00	6 742 685,33	6 742 685,33	0,00	0,00	6 742 685,33	0,00	0,00%
		Nové položky											
19	01460	POPLATKY ZA NÁHRADNÍ VLAKOVOU DOPRAVU ZBV 22 Faktury ČD + 5% + 5 % + 5 % 312,437,87*1,15=359303,55	KPL	0,00	1,000	1,000	329 212,08	0,00	0,00	329 212,08	329 212,08	329 212,08	100,00%
		Celkem						24 775 432,28	0,00	2 732 581,63	27 508 013,91	2 732 582,87	11,03%



Městský úřad Černošice

Odbor stavební úřad – oddělení dopravy a správy komunikací

pracoviště Podskalská 19

120 00 Praha 2

Spis. ZN. výst.:60849/2019/Ko

Č.j.: MUCE 69087/2019 OSU

vyřizuje: Olga Konřivová, Podskalská 19, Praha 2

tel./e-mail:

V Praze dne 30.10.2019

Rozhodnutí

Městský úřad Černošice, odbor stavební úřad – oddělení dopravy a správy komunikací, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v řízení o povolení částečné uzavírky komunikace, vydává toto rozhodnutí žadateli:

STRABAG a.s., IČ 60838744, Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, zastoupený

LUSMIA DZ s.r.o., IČO 06904742, V dolínách 1515/1b, 101 00 Praha 10

Podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, **se povoluje úplná uzavírka**

komunikace: **silnice č. II/102**

v úseku: hranice hl.m. Prahy - Měchenice železn. most

z důvodů: oprava komunikace – pokládka asfaltové vrstvy

termín: **od 7.12.2019 do 8.12.2019**

Práce budou probíhat v km staničení 0 -1,8

Investor : *Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.*

Zhotovitel : *STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČO 60838744*

odpovědná osoba : *Josef Nejedlík* **tel. :** 724 147 735

a stanovuje objízdna trasa obousměrně :

z Davle ze sil. II/102 na sil. II/104 Petrov – Jílové u Prahy – dále po místní komunikaci Ke Slunci na sil. II/105 Radlín – Psáry – Jesenice- dále po sil. II/101 Zlatníky – Dolní Břežany- Břežanské údolí – směr Praha a opačně

Vedení pravidelné autobusové dopravy linek PID:

DOČASNÁ ZMĚNA TRAS, ZASTÁVEK A POLOH SPOJŮ PRO LINKY PID 314, 338, 360, 361 A 390, ZAVEDENÍ DOČASNÉ LINKY PID 742 A NÁHRADNÍ VLAKOVÉ DOPRAVY S88

Ve výstupní zastávce Měchenice, žel.st. je třeba umístit nástupní (de facto výstupní) hranu o rozměrech min. 1,30 x 25,0 m.

Linka 314

TRASA

směr Nová Ves p.Pleší

Nastup v zastávce „Měchenice,Žel.st.“ – Hlavní – vpravo Vltavská - dále po své pravidelné trase

směr Praha, Smíchovské nádraží, Měchenice,Žel.st.

Do zastávky „Měchenice, Rozc. k žel. st.“ po své pravidelné trase – Hlavní – do výstupní zastávky „Měchenice,Žel.st.“

ZASTÁVKY**Zřizuje se:**

„Měchenice,Žel.st.“ – výstupní, manipulační – v prostoru před železniční stanicí Měchenice
„Měchenice,Žel.st.“ – nástupní – v pravidelné zast. linky 444
„Měchenice, Samoobsluha“ – ve směru Nová Ves p.Pleší – v pravidelné zast. linky 444

Ruší se:

„Smíchovské nádraží“ – obousměrně
„Lihovar“ – obousměrně
„Zbraslavské náměstí“ – obousměrně
„Most Závodu míru“ – obousměrně
„Na Plácku“ – obousměrně
„Kamenolom Zbraslav“ – obousměrně
„Strnady“ – obousměrně
„Jíloviště,Výzkumný ústav“ – obousměrně
„Měchenice,Žel.st.“ – ve směru Nová Ves p.Pleší
„Měchenice“ – ve směru Nová Ves p.Pleší

Linka 338**TRASA**

Linka je provozována ve dvou variantách trasy:

Varianta A: Smíchovské nádraží – Strnady

po své pravidelné trase

Varianta B: Měchenice,Žel.st. – Hradištko, Pikovice, Most

směr Hradištko, Pikovice, Most:

Nástup v zastávce „Měchenice,Žel.st.“ - Hlavní – Vltavská - dále po své pravidelné trase

směr Měchenice,Žel.st.:

Do zastávky „Měchenice, Rozc. k žel. st.“ po své pravidelné trase – Hlavní – do výstupní zastávky „Měchenice,Žel.st.“

ZASTÁVKY**Zřizuje se:**

„Měchenice,Žel.st.“ – výstupní, manipulační – v prostoru před železniční stanicí Měchenice
„Měchenice,Žel.st.“ – nástupní – v pravidelné zast. linky 444
„Měchenice, Samoobsluha“ – ve směru Hradištko, Pikovice, Most – v pravidelné zast. linky 444

Ruší se:

„Jíloviště,Výzkumný ústav“ – obousměrně
„Měchenice,Žel.st.“ – ve směru Hradištko, Pikovice, Most
„Měchenice“ – ve směru Hradištko, Pikovice, Most

Linka 360**TRASA**

směr Sedlčany,aut.st.

do úrovní Radotínského mostu po své pravidelné trase – Strakonická – silnice I/4 – dálnice D4 – exit č. 27 –Pražská v Dobříši – silnice II/114 – (vybrané spoje vlevo silnice II/102 – vpravo silnice III/10216 a dále po své pravidelné trase) – silnice II/102 a dále po své pravidelné trase

směr Praha, Smíchovské nádraží

do obce Korkyně po své pravidelné trase – silnice II/102 - silnice II/114 (vybrané spoje do zastávky „Korkyně, Křížov“ po své pravidelné trase – silnice III/10216 - silnice II/102 – silnice II/114) – ulice Pražská v Dobříši – vjezd na dálnice D4 (exit č. 27) –silnice I/4 – Strakonická a dále po své pravidelné trase

ZASTÁVKY**Přemísťuje se:**

„Korkyně, Křížov, U Kapličky“ – směrem na Sedlčany,aut.st. – 15 metrů za křižovatku silnic II/102 a III/10216

– směrem na Praha, Smíchovské nádraží – 40 metrů před křižovatku silnic III/10216 a II/102

Zřizuje se:

„Nový Knín“ – obousměrně – v pravidelné zast. linky 361

„Nový Knín, Sudovice“ – obousměrně – v pravidelné zast. linky 361

„Dobříš, Žel. st.“ – směrem na Sedlčany – v pravidelné zast. linky 361

„Dobříš, Žel. st.“ – směrem na Prahu – v pravidelné zast. linky 392

Ruší se:

„Zbraslavské náměstí“ – obousměrně

„Most Závodu míru“ – obousměrně

„Na Plácku“ – obousměrně

„Kamenolom Zbraslav“ – obousměrně

„Strnady“ – obousměrně

„Jíloviště,Výzkumný ústav“ – obousměrně

„Měchenice,Žel.st.“ – obousměrně

„Měchenice“ – obousměrně

„Davle, Na Javorce“ – obousměrně

„Davle, U Pomníku“ – obousměrně

„Davle, Obec“ – obousměrně

„Davle, U Kiliána“ – obousměrně

„Davle, Portus“ – obousměrně

„Štěchovice“ – obousměrně

„Slapy, Na Polesí“ – obousměrně

„Nové Dvory, Porostliny“ – obousměrně

„Nové Dvory, Nová Hospoda“ – obousměrně

Linka 361**TRASA****směr Nový Knín**

Nastup v zastávce „Měchenice,Žel.st.“ – Hlavní – Vltavská – dále po své pravidelné trase

směr Praha, Smíchovské nádraží, Měchenice,Žel.st.

do zastávky „Měchenice, Rozc. k žel. st.“ po své pravidelné trase – Hlavní – do výstupní zastávky „Měchenice,Žel.st.“.

ZASTÁVKY**Zřizuje se:**

„Měchenice,Žel.st.“ – výstupní, manipulační – v prostoru před železniční stanicí Měchenice

„Měchenice,Žel.st.“ – nástupní – v pravidelné zast. linky 444

„Měchenice, Samoobsluha“ – ve směru Nový Knín – v pravidelné zast. linky 444

Ruší se:

„Smíchovské nádraží“ – obousměrně

„Lihovar“ – obousměrně

„Zbraslavské náměstí“ – obousměrně

„Most Závodu míru“ – obousměrně

„Na Plácku“ – obousměrně

„Kamenolom Zbraslav“ – obousměrně

„Strnady“ – obousměrně

„Jíloviště,Výzkumný ústav“ – obousměrně

„Měchenice,Žel.st.“ – ve směru Nový Knín

„Měchenice“ – ve směru Nový Knín

Linka 390**TRASA****směr Rabyně,Měřín**

nastup v zastávce „Měchenice,Žel.st.“ - přímo Hlavní – vpravo Vltavská - dále po své pravidelné trase

směr Praha, Smíchovské nádraží, Měchenice,Žel.st.

do zastávky „Měchenice, Rozc. k žel. st.“ po své pravidelné trase – Hlavní – do výstupní zastávky „Měchenice,Žel.st.“.

ZASTÁVKY**Zřizuje se:**

„Měchenice,Žel.st.“ – výstupní, manipulační – v prostoru před železniční stanicí Měchenice

„Měchenice,Žel.st.“ – nástupní – v pravidelné zast. linky 444

„Měchenice, Samoobsluha“ – ve směru Rabyně,Měřín – v pravidelné zast. linky 444

Ruší se:

„Smíchovské nádraží“ – obousměrně

„Lihovar“ – obousměrně

„Zbraslavské náměstí“ – obousměrně

„Most Závodu míru“ – obousměrně

„Na Plácku“ – obousměrně

„Kamenolom Zbraslav“ – obousměrně

„Strnady“ – obousměrně

„Jíloviště,Výzkumný ústav“ – obousměrně

„Měchenice,Žel.st.“ – ve směru Rabyně,Měřín

„Měchenice“ – ve směru Rabyně,Měřín

Linka 742

zavádí se dočasná linka 742

TRASA**směr Vrané n.Vlt.,Žel.st.**

nástup – Nádražní – Strakonická – Lahovický most – Strakonická – rampy Radotínského mostu (směr Zbraslav) – na OK 3. výjezdem směr Zbraslav – U Národní galerie – Zbraslavské náměstí – Žitavského – Most Závodu míru – K Vranému – Nádražní – výstup

manipulačně: v kruhovém objezdu v křížení ulic Nádražní a U Elektrárny

směr Praha, Smíchovské nádraží

nástup – Nádražní – K Vranému – Most Závodu míru - Žitavského – Zbraslavské náměstí – U Národní galerie – rampy Radotínského mostu – Strakonická – Lahovický most – Strakonická – Nádražní – výstup

ZASTÁVKY

Zřizuje se:

„Smíchovské nádraží“ – obousměrně – v pravidelné zast. linky 338

„Lihovar“ – obousměrně – v pravidelné zast. linky 338

„Zbraslavské náměstí“ – obousměrně – v pravidelné zast. linky 338

„Most Závodu míru“ – obousměrně – v pravidelné zast. linky 338

„Vrané n.Vlt.,Žel.st.“ – obousměrně – v pravidelné zast. linky 445

Linka S88

zavádí se vložené spoje v úseku Vrané nad Vltavou – Měchenice (bez obsluhy zastávky Skochovice) jako náhradní vlaková doprava

Přestupní vazby

- mezi linkami 314, 338, 361, 390 v zastávce „Měchenice,Žel.st“ a linkou S88 jsou realizovány **pěším přesunem – vzdálenost cca 50 m, cca 2 minuty**
- mezi linkou 742 v zastávce „Vrané n.Vlt.,Žel.st.“ a linkou S88 jsou realizovány **pěším přesunem – vzdálenost cca 30 m, cca 2 minuty**

Toto rozhodnutí se vydává za podmínek:

- Dopravní značení bude provedeno v reflexním provedení, dle vyhlášky MDS č. 294/2015 Sb., v souladu se Zásadami pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích č. TP 66 ČSN 018020, dle stanovení přechodné úpravy provozu na komunikacích č.j. MUCE 68888/2019 OSU vydané Opatřením obecné povahy č. 195/2019 a odsouhlasené situace DIO.
- Po celou dobu uzavírky bude pracovní místo řádně označeno a zabezpečeno z hlediska bezpečnosti silničního provozu a pohybu osob, dopravní značení bude kontrolováno, případně doplněno. Za předepsané značení odpovídá zhotovitel po celou dobu uzavírky.
- Žadatel v případě časového zkrácení prací zajistí úpravu dopravního značení a zařízení dle nového dopravního režimu a bude informovat OSÚ- oddělení dopravy a správy komunikací MěÚ Černošice.
- Za průběh uzavírky zodpovídá zhotovitel.
- Pokud si to vyžádá veřejný zájem, může Městský úřad Černošice, odbor stavební úřad, oddělení dopravy a správy komunikací podmínky tohoto rozhodnutí doplnit nebo pozměnit.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
LUSMIA DZ s.r.o., V dolínách 1515/b, Praha 10

Odůvodnění

Žadatel v souladu s § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a § 39 odst. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, podal dne 24.9.2019 žádost o povolení úplné uzavírky sil. II/102 v úseku hranice s hl.m. Praha – Měchenice z důvodů provádění rekonstrukce silnice II/102 – asfaltování povrchu.

Silniční správní úřad žádost podle § 39 odst. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, posoudil a podle § 24 odst. 8 zákona o pozemních povolil uzavírku komunikace za podmínek stanovených ve výroku tohoto rozhodnutí, protože byly

splněny zákonné podmínky pro vydání tohoto rozhodnutí a na základě předchozího souhlasu Policie ČR, DI Praha venkov – JIH ze dne 29.10.2019 a Města Jílového u Prahy ze dne 29.10.2019 pro vedení objízdné trasy po místní komunikaci.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Město Jílové u Prahy, Městys Davle, Obec Měchenice, Obec Petrov, Obec Psáry, Město Jesenice, Obec Zlatníky – Hodkovice, Obec Dolní Břežany

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání podle ustanovení § 81 a § 83 zákona č. 500 / 2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, a to podáním prostřednictvím odboru dopravy Městského úřadu Černošice.

V souladu s § 24 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, vylučuje se případnému odvolání podle § 85 odst. 2 zákona 500/2004 Sb., správní řád, odkladný účinek.

Proti tomuto rozhodnutí o vyloučení odkladného účinku odvolání se nelze odvolat.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Nedodržení termínů nebo dalších podmínek uvedených v rozhodnutí opravňuje správní orgán zahájit řízení o přestupku s možností uložení pokuty do 500 000 Kč.

Olga Kopřivová v.r.
referent oddělení dopravy a správy
komunikací OSU
"otisk razítka"

Obdrží :

účastníci

LUSMIA DZ s.r.o., IDDS: em74d38

sídlo: V dolínách č.p. 1515/1b, Praha 10-Michle, 101 00 Praha 101

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx

sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov

dotčené správní orgány :

Městys Davle, IDDS: aeypbn5

sídlo: Na náměstí č.p. 63, 252 06 Davle

Obec Měchenice, IDDS: gt2aspx

sídlo: Hlavní č.p. 4, Měchenice, 252 06 Davle

Obec Petrov, IDDS: e5mauud

sídlo: Hlavní č.p. 30, 252 81 Petrov

Město Jílové u Prahy, IDDS: bmwb8if

sídlo: Masarykovo náměstí č.p. 194, 254 01 Jílové u Prahy

Obec Psáry, IDDS: rvhbuxe

sídlo: Pražská č.p. 137, Dolní Jirčany, 252 44 Psáry

Obec Zlatníky - Hodkovice, IDDS: iqybycp

sídlo: Náves sv. Petra a Pavla č.p. 113, Zlatníky-Hodkovice, Zlatníky, 252 41 Dolní

Břežany

Město Jesenice, IDDS: 3nzb42m

sídlo: Budějovická č.p. 303, 252 42 Jesenice u Prahy

Obec Dolní Břežany, IDDS: 9h6berv

sídlo: 5. Května č.p. 78, 252 41 Dolní Břežany

na vědomí :

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Praha venkov-JIH, DI, IDDS: 2dtai5u

sídlo: Masarykovo nám. č.p. 708, 251 64 Mnichovice

Regionální organizátor pražské integrované dopravy (ROPID), IDDS: ku79q7n

sídlo: Rytířská č.p. 406/10, 110 00 Praha 1 - Staré Město

Městys ŠTĚCHOVICE, IDDS: i5tbbbm

sídlo: Hlavní č.p. 3, 252 07 Štěchovice

Obec Bojanovice, IDDS: bxqak97

sídlo: Bojanovice č.p. 12, 252 06 Davle

Obec Bratřínov, IDDS: dxgajiv

sídlo: Bratřínov č.p. 12, 252 05 Hvozdnice

Obec Buš, IDDS: eg7azin

sídlo: Buš, Buš, 252 08 Slapy nad Vltavou

Obec Hradištko, IDDS: fxtbd3h

sídlo: Chovatelů č.p. 500, 252 09 Hradištko

Obec Hvozdnice, IDDS: mnpatc5

sídlo: Hvozdnice č.p. 160, 252 05 Hvozdnice

Obec Slapy, IDDS: hrfbxt6

sídlo: Slapy č.p. 72, 252 08 Slapy nad Vltavou

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, IDDS: dz4aa73

sídlo: Jana Palacha č.p. 1970, 272 01 Kladno 1

Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: wmjmahj

sídlo: Vančurova č.p. 1544, 272 01 Kladno 1



Městský úřad Černošice

Odbor stavební úřad – oddělení dopravy a správy komunikací

pracoviště Podskalská 19

120 00 Praha 2

Spis. ZN.

výst.:7977/2020/Ko

V Praze dne 24.3.2020

Č.j.:

MUCE 20909/2020 OSU

vyřizuje:

tel./e-mail:



Rozhodnutí

Městský úřad Černošice, odbor stavební úřad – oddělení dopravy a správy komunikací, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v řízení o povolení úplné uzavírky komunikace, vydává toto rozhodnutí žadateli :

STRABAG a.s., IČ 60838744, Kačírkova 982/4, 150 00 Praha 5, zastoupený

LUSMIA DZ s.r.o., IČO 06904742, V dolinách 1515/1b, 101 00 Praha 10

Podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, **se povoluje úplná uzavírka**

komunikace:

silnice č. II/102

v úseku:

hranice hl.m. Prahy (Strnady) - Měchenice železn. most

z důvodů:

oprava komunikace – pokládka asfaltové vrstvy

termín:

od 13.6.2020 do 14.6.2020

Práce budou probíhat v km staničení 0 -1,8

Investor : *Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.*

Zhotovitel : STRABAG a.s.

odpovědná osoba : Ing. Záruba

tel. : 739 580 589

a stanovuje se objízdna trasa obousměrně :

z Davle ze sil. II/102 na sil. II/104 Petrov – Jílové u Prahy – dále po místní komunikaci Ke Slunci na sil. II/105 Radlík – Psáry – Jesenice- dále po sil. II/101 Zlatníky – Dolní Břežany- Břežanské údolí – směr Praha a opačně

Vedení pravidelné autobusové dopravy linek PID:

**DOČASNÁ ZMĚNA TRAS, ZASTÁVEK A POLOH SPOJŮ PRO LINKY PID 314, 338, 360, 361
A 390, ZAVEDENÍ DOČASNÉ LINKY PID 742 A NÁHRADNÍ VLAKOVÉ DOPRAVY S88**

Ve výstupní zastávce Měchenice, žel.st. je třeba umístit nástupní (de facto výstupní) hranu o rozměrech min. 1,30 x 25,0 m.

Linka 314

TRASA

směr Nová Ves p.Pleší

Nastup v zastávce „Měchenice,Žel.st.“ – Hlavní – vpravo Vltavská - dále po své pravidelné trase

směr Praha, Smíchovské nádraží, Měchenice, Žel.st.

Do zastávky „Měchenice, Rozc. k žel. st.“ po své pravidelné trase – Hlavní – do výstupní zastávky „Měchenice, Žel.st.“

ZASTÁVKY**Zřizuje se:**

„Měchenice, Žel.st.“ – výstupní, manipulační – v prostoru před železniční stanicí Měchenice

„Měchenice, Žel.st.“ – nástupní – v pravidelné zast. linky 444

„Měchenice, Samoobsluha“ – ve směru Nová Ves p.Pleší – v pravidelné zast. linky 444

Ruší se:

„Smíchovské nádraží“ – obousměrně

„Lihovar“ – obousměrně

„Zbraslavské náměstí“ – obousměrně

„Most Závodu míru“ – obousměrně

„Na Plácku“ – obousměrně

„Kamenolom Zbraslav“ – obousměrně

„Strnady“ – obousměrně

„Jíloviště, Výzkumný ústav“ – obousměrně

„Měchenice, Žel.st.“ – ve směru Nová Ves p.Pleší

„Měchenice“ – ve směru Nová Ves p.Pleší

Linka 338**TRASA**

Linka je provozována ve dvou variantách trasy:

Varianta A: Smíchovské nádraží – Strnady

po své pravidelné trase

Varianta B: Měchenice, Žel.st. – Hradištko, Pikovice, Most

směr Hradištko, Pikovice, Most:

Nástup v zastávce „Měchenice, Žel.st.“ - Hlavní – Vltavská - dále po své pravidelné trase

směr Měchenice, Žel.st.:

Do zastávky „Měchenice, Rozc. k žel. st.“ po své pravidelné trase – Hlavní – do výstupní zastávky „Měchenice, Žel.st.“

ZASTÁVKY**Zřizuje se:**

„Měchenice, Žel.st.“ – výstupní, manipulační – v prostoru před železniční stanicí Měchenice

„Měchenice, Žel.st.“ – nástupní – v pravidelné zast. linky 444

„Měchenice, Samoobsluha“ – ve směru Hradištko, Pikovice, Most – v pravidelné zast. linky 444

Ruší se:

„Jíloviště, Výzkumný ústav“ – obousměrně

„Měchenice, Žel.st.“ – ve směru Hradištko, Pikovice, Most

„Měchenice“ – ve směru Hradištko, Pikovice, Most

Linka 360**TRASA**

směr Sedlčany, aut.st.

do úrovní Radotínského mostu po své pravidelné trase – Strakonická – silnice I/4 – dálnice D4 – exit č. 27 – Pražská v Dobříši – silnice II/114 – (vybrané spoje vlevo silnice II/102 – vpravo silnice III/10216 a dále po své pravidelné trase) – silnice II/102 a dále po své pravidelné trase

směr Praha, Smíchovské nádraží

do obce Korkyně po své pravidelné trase – silnice II/102 - silnice II/114 (vybrané spoje do zastávky „Korkyně, Křížov“ po své pravidelné trase – silnice III/10216 - silnice II/102 – silnice II/114) – ulice Pražská v Dobříši – vjezd na dálnice D4 (exit č. 27) – silnice I/4 – Strakonická a dále po své pravidelné trase

ZASTÁVKY**Přemísťuje se:**

„Korkyně, Křížov, U Kapličky“ – směrem na Sedlčany, aut.st. – 15 metrů za křižovatku silnic II/102 a III/10216

– směrem na Praha, Smíchovské nádraží – 40 metrů před křižovatku silnic III/10216 a II/102

Zřizuje se:

„Nový Knín“ – obousměrně – v pravidelné zast. linky 361

„Nový Knín, Sudovice“ – obousměrně – v pravidelné zast. linky 361

„Dobříš, Žel. st.“ – směrem na Sedlčany – v pravidelné zast. linky 361

„Dobříš, Žel. st.“ – směrem na Prahu – v pravidelné zast. linky 392

Ruší se:

„Zbraslavské náměstí“ – obousměrně

„Most Závodu míru“ – obousměrně

„Na Plácku“ – obousměrně

„Kamenolom Zbraslav“ – obousměrně

„Strnady“ – obousměrně

„Jíloviště, Výzkumný ústav“ – obousměrně

„Měchenice, Žel.st.“ – obousměrně

„Měchenice“ – obousměrně

„Davle, Na Javorce“ – obousměrně

„Davle, U Pomníku“ – obousměrně

„Davle, Obec“ – obousměrně

„Davle, U Kiliána“ – obousměrně

„Davle, Portus“ – obousměrně

„Štěchovice“ – obousměrně

„Slapy, Na Polesí“ – obousměrně

„Nové Dvory, Porostliny“ – obousměrně

„Nové Dvory, Nová Hospoda“ – obousměrně

Linka 361**TRASA****směr Nový Knín**

Nastup v zastávce „Měchenice, Žel.st.“ – Hlavní – Vltavská – dále po své pravidelné trase

směr Praha, Smíchovské nádraží, Měchenice, Žel.st.

do zastávky „Měchenice, Rozc. k žel. st.“ po své pravidelné trase – Hlavní – do výstupní zastávky „Měchenice, Žel.st.“

ZASTÁVKY**Zřizuje se:**

„Měchenice,Žel.st.“ – výstupní, manipulační – v prostoru před železniční stanicí Měchenice
„Měchenice,Žel.st.“ – nástupní – v pravidelné zast. linky 444
„Měchenice, Samoobsluha“ – ve směru Nový Knín – v pravidelné zast. linky 444

Ruší se:

„Smíchovské nádraží“ – obousměrně
„Lihovar“ – obousměrně
„Zbraslavské náměstí“ – obousměrně
„Most Závodu míru“ – obousměrně
„Na Plácku“ – obousměrně
„Kamenolom Zbraslav“ – obousměrně
„Strnady“ – obousměrně
„Jíloviště,Výzkumný ústav“ – obousměrně
„Měchenice,Žel.st.“ – ve směru Nový Knín
„Měchenice“ – ve směru Nový Knín

Linka 390**TRASA**

směr Rabyně,Měřín

nastup v zastávce „Měchenice,Žel.st.“ - přímo Hlavní – vpravo Vltavská - dále po své pravidelné trase

směr Praha,Smíchovské nádraží, Měchenice,Žel.st.

do zastávky „Měchenice, Rozc. k žel. st.“ po své pravidelné trase – Hlavní – do výstupní zastávky „Měchenice,Žel.st.“.

ZASTÁVKY**Zřizuje se:**

„Měchenice,Žel.st.“ – výstupní, manipulační – v prostoru před železniční stanicí Měchenice
„Měchenice,Žel.st.“ – nástupní – v pravidelné zast. linky 444
„Měchenice, Samoobsluha“ – ve směru Rabyně,Měřín – v pravidelné zast. linky 444

Ruší se:

„Smíchovské nádraží“ – obousměrně
„Lihovar“ – obousměrně
„Zbraslavské náměstí“ – obousměrně
„Most Závodu míru“ – obousměrně
„Na Plácku“ – obousměrně
„Kamenolom Zbraslav“ – obousměrně
„Strnady“ – obousměrně
„Jíloviště,Výzkumný ústav“ – obousměrně
„Měchenice,Žel.st.“ – ve směru Rabyně,Měřín
„Měchenice“ – ve směru Rabyně,Měřín

Linka 742

zavádí se dočasná linka 742

TRASA

směr Vrané n.Vlt.,Žel.st.

nástup – Nádražní –Strakonická – Lahovický most – Strakonická – rampy Radotínského mostu (směr Zbraslav) – na OK 3. výjezdem směr Zbraslav – U Národní galerie – Zbraslavské náměstí –Žitavského – Most Závodu míru – K Vranému – Nádražní – výstup

manipulačně: v kruhovém objezdu v křížení ulic Nádražní a U Elektrárny

směr Praha, Smíchovské nádraží

nástup – Nádražní – K Vranému – Most Závodu míru - Žitavského – Zbraslavské náměstí – U Národní galerie – rampy Radotínského mostu – Strakonická – Lahovický most – Strakonická – Nádražní – výstup

ZASTÁVKY

Zřizuje se:

„Smíchovské nádraží“ – obousměrně – v pravidelné zast. linky 338

„Lihovar“ – obousměrně – v pravidelné zast. linky 338

„Zbraslavské náměstí“ – obousměrně – v pravidelné zast. linky 338

„Most Závodu míru“ – obousměrně – v pravidelné zast. linky 338

„Vrané n.Vlt.,Žel.st.“ – obousměrně – v pravidelné zast. linky 445

Linka S88

zavádí se vložené spoje v úseku Vrané nad Vltavou – Měchenice (bez obsluhy zastávky Skochovice) jako náhradní vlaková doprava

Přestupní vazby

- mezi linkami 314, 338, 361, 390 v zastávce „Měchenice,Žel.st“ a linkou S88 jsou realizovány **pěším přesunem – vzdálenost cca 50 m, cca 2 minuty**
- mezi linkou 742 v zastávce „Vrané n.Vlt.,Žel.st.“ a linkou S88 jsou realizovány **pěším přesunem – vzdálenost cca 30 m, cca 2 minuty**

Toto rozhodnutí se vydává za podmínek:

- Dopravní značení bude provedeno v reflexním provedení, dle vyhlášky MDS č. 294/2015 Sb., v souladu se Zásadami pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích č. TP 66 ČSN 018020, dle stanovení přechodné úpravy provozu na komunikacích č.j. MUCE 20893/2020 OSU vydané Opatřením obecné povahy č. 31/2020 a odsouhlasené situace DIO.
- Po celou dobu uzavírky bude pracovní místo řádně označeno a zabezpečeno z hlediska bezpečnosti silničního provozu a pohybu osob, dopravní značení bude kontrolováno, případně doplněno. Za předepsané značení odpovídá zhotovitel po celou dobu uzavírky.
- Žadatel v případě časového zkrácení prací zajistí úpravu dopravního značení a zařízení dle nového dopravního režimu a bude informovat OSÚ- oddělení dopravy a správy komunikací MěÚ Černošice.
- Za průběh uzavírky zodpovídá zhotovitel.
- Pokud si to vyžádá veřejný zájem, může Městský úřad Černošice, odbor stavební úřad, oddělení dopravy a správy komunikací podmínky tohoto rozhodnutí doplnit nebo pozměnit.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Praha 5

Odůvodnění

Žadatel v souladu s § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a § 39 odst. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, podal dne 31.1.2020 žádost o povolení úplné uzavírky sil. II/102 v úseku hranice s hl.m. Praha – Měchenice z důvodů provádění rekonstrukce silnice II/102 – definitivní pokládka asfaltové vrstvy v místě opravených úseků.

Silniční správní úřad žádost podle § 39 odst. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, posoudil a podle § 24 odst. 8 zákona o pozemních povolil

uzavírku komunikace za podmínek stanovených ve výroku tohoto rozhodnutí, protože byly splněny zákonné podmínky pro vydání tohoto rozhodnutí a na základě předchozího souhlasu Policie ČR, DI Praha venkov – JIH ze dne 29.10.2019 a Města Jílového u Prahy ze dne 29.10.2019 pro vedení objízdné trasy po místní komunikaci.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Město Jílové u Prahy, Městys Davle, Obec Měchenice, Obec Petrov, Obec Psáry, Město Jesenice, Obec Zlatníky – Hodkovice, Obec Dolní Břežany

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání podle ustanovení § 81 a § 83 zákona č. 500 / 2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, a to podáním prostřednictvím odboru dopravy Městského úřadu Černošice.

V souladu s § 24 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, vylučuje se případnému odvolání podle § 85 odst. 2 zákona 500/2004 Sb., správní řád, odkladný účinek.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Nedodržení termínů nebo dalších podmínek uvedených v rozhodnutí opravňuje správní orgán zahájit řízení o přestupku s možností uložení pokuty do 500 000 Kč.

Olga Kopřivová v.r.
referent oddělení dopravy a správy
komunikací OSU
"otisk razítka"

Obdrží :

účastníci

LUSMIA DZ s.r.o., IDDS: em74d38

sídlo: V dolínách č.p. 1515/1b, Praha 10-Michle, 101 00 Praha 101

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmX

sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov

dotčené správní orgány :

Městys Davle, IDDS: aeypbn5

sídlo: Na náměstí č.p. 63, 252 06 Davle

Obec Měchenice, IDDS: gt2aspx

sídlo: Hlavní č.p. 4, Měchenice, 252 06 Davle

Obec Petrov, IDDS: e5mauud

sídlo: Hlavní č.p. 30, 252 81 Petrov

Město Jílové u Prahy, IDDS: bmwb8if

sídlo: Masarykovo náměstí č.p. 194, 254 01 Jílové u Prahy

Obec Psáry, IDDS: rvhbuxe

sídlo: Pražská č.p. 137, Dolní Jirčany, 252 44 Psáry

Obec Zlatníky - Hodkovice, IDDS: iqybycp

sídlo: Náves sv. Petra a Pavla č.p. 113, Zlatníky-Hodkovice, Zlatníky, 252 41 Dolní

Břežany

Město Jesenice, IDDS: 3nzb42m

sídlo: Budějovická č.p. 303, 252 42 Jesenice u Prahy

Obec Dolní Břežany, IDDS: 9h6berv

sídlo: 5. Května č.p. 78, 252 41 Dolní Břežany

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Praha venkov-JIH, DI, IDDS: 2dtai5u

sídlo: Masarykovo nám. č.p. 708, 251 64 Mnichovice

na vědomí :

Regionální organizátor pražské integrované dopravy (ROPID), IDDS: ku79q7n

sídlo: Rytířská č.p. 406/10, 110 00 Praha 1 - Staré Město

Městys ŠTĚCHOVICE, IDDS: i5tbbbm

sídlo: Hlavní č.p. 3, 252 07 Štěchovice

Obec Bojanovice, IDDS: bxqak97

sídlo: Bojanovice č.p. 12, 252 06 Davle

Obec Bratřínov, IDDS: dxgajiv

sídlo: Bratřínov č.p. 12, 252 05 Hvozdnice

Obec Buš, IDDS: eg7azin

sídlo: Buš, Buš, 252 08 Slapy nad Vltavou

Obec Hradištko, IDDS: fxtbd3h

sídlo: Chovatelů č.p. 500, 252 09 Hradištko

Obec Hvozdnice, IDDS: mnpatc5

sídlo: Hvozdnice č.p. 160, 252 05 Hvozdnice

Obec Slapy, IDDS: hrfbxt6

sídlo: Slapy č.p. 72, 252 08 Slapy nad Vltavou

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, IDDS: dz4aa73

sídlo: Jana Palacha č.p. 1970, 272 01 Kladno 1

Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: wmjmahj

sídlo: Vančurova č.p. 1544, 272 01 Kladno 1



Městský úřad Černošice

Odbor stavební úřad – oddělení dopravy a správy komunikací

Podskalská 19
120 00 Praha 2

Spis. ZN. výst.:121295/2021/Kou
Č.j.: MUCE 141429/2021 OSU
vyřizuje:
tel./e-mail:

V Praze dne 1.9.2021



ROZHODNUTÍ

POVOLENÍ UZAVÍRKY

Městský úřad Černošice, odbor stavební úřad – oddělení dopravy a správy komunikací, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v řízení o povolení částečné uzavírky komunikace, na základě žádosti ze dne 3.8.2021, kterou podal:

**STRABAG a.s., odštěpný závod Praha, oblast MOSTY, IČO: 60838744, Na Bělidle
198/21, 150 00 Praha,**

v zastoupení

Lukáš Balcárek, IČO: 48122050, Cyprichova 701/11, 149 00 Praha 4

vydává

podle ustanovení **§ 24 zákona č. 13/1997 Sb.**, o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí, kterým povoluje **uzavírku** v úseku mezi **Městskou částí Praha-Zbraslav a Měchenicemi**

komunikace: silnice č. II/102

v úseku: v km staničení cca 2,600 – 4,500

z důvodů: „Rekonstrukce sil. II/102 Praha – Štěchovice“

termín: od 10.9.2021 20:00 hod. do 12.9.2021 23:59hod.

Objízdná trasa pro osobní dopravu do 3,5t obousměrně se nařizuje:

Štěchovice - II/104 Petrov – III/00315 - Libeň - Dolní Břežany II/101 - Zbraslav a opačně

Objízdná trasa pro nákladní dopravu nad 3,5t obousměrně se nařizuje:

Štěchovice - II/104 - Petrov – II/105 - Psáry – II/603 Jesenice a opačně

**DOČASNÁ ZMĚNA TRAS, ZASTÁVEK A SPOJŮ LINEK PID 314, 338, 360,
361, 390 A 440, ZAVEDENÍ DOČASNÉ LINKY PID X390 A NÁHRADNÍ
VLAKOVÉ DOPRAVY S88**

Linka 314

TRASA

směr Nová Ves pod Pleší

Nástup v zast. „Měchenice, žel. st.“ – přímo Hlavní – vlevo Přístavní – vpravo Vltavská – dále po své pravidelné trase.

směr Praha, Smíchovské nádraží Měchenice, žel. st.

Do zastávky „Davle, Na Javorce“ po své pravidelné trase – přímo II/102 – na konci obce Měchenice vlevo Hlavní – do výstupní zastávky „Měchenice, žel. st.“

ZASTÁVKY**Zřizuje se:**

„Měchenice, žel. st.“ – výstupní, manipulační – v prostoru před železniční stanicí Měchenice

„Měchenice, žel. st.“ – nástupní – v pravidelné zast. linky 444

„Měchenice, samoobsluha“ – ve směru Nová Ves p.Pleší – v původní zast. linky 444

Ruší se:

„Smíchovské nádraží“ – nástupní, výstupní

„Lihovar“ – obousměrně

„Zbraslavské náměstí“ – obousměrně

„Most Závodu míru“ – obousměrně

„Na Plácku“ – obousměrně

„Kamenolom Zbraslav“ – obousměrně

„Strnady“ – obousměrně

„Jiloviště, výzkumný ústav“ – obousměrně

„Měchenice, rozc. k žel. st.“ – obousměrně

Linka 338**TRASA**

Linka je provozována ve dvou variantách trasy:

Varianta A: Smíchovské nádraží – Strnady

po své pravidelné trase

Varianta B: Měchenice, žel. st. – Hradištko, Pikovice, most

směr Hradištko, Pikovice, most:

Nástup v zastávce „Měchenice, žel. st.“ - přímo Hlavní – vlevo Přístavní – vpravo Vltavská - dále po své pravidelné trase.

směr Měchenice, žel. st.:

Do zastávky „Davle, Na Javorce“ po své pravidelné trase – přímo II/102 – na konci obce Měchenice vlevo Hlavní – do výstupní zastávky „Měchenice, žel. st.“

ZASTÁVKY**Zřizuje se:**

„Měchenice, žel. st.“ – výstupní, manipulační – v prostoru před železniční stanicí Měchenice

„Měchenice, žel. st.“ – nástupní – v pravidelné zast. linky 444

„Měchenice, samoobsluha“ – ve směru Hradištko, Pikovice, most – v původní zast. linky 444

Ruší se:

„Jiloviště, výzkumný ústav“ – obousměrně

„Měchenice, rozc. k žel. st.“ – obousměrně

Linka 360

TRASA**směr Sedlčany, aut. st.**

do úrovně Radotínského mostu po své pravidelné trase – přímo Strakonická – přímo silnice I/4 – přímo dálnice D4 – vpravo exit č. 27 – přímo Pražská v Dobříši – vlevo silnice II/114 – vlevo silnice II/102 – vpravo silnice III/10216 a dále po své pravidelné trase

směr Praha, Smíchovské nádraží

do zastávky „Korkyně, Křížov“ po své pravidelné trase – přímo silnici III/10216 – vlevo silnice II/102 – vpravo silnice II/114 – vpravo ulice Pražská v Dobříši – vpravo vjezd na dálnice D4 (exit č. 27) – přímo silnice I/4 – přímo Strakonická a dále po své pravidelné trase

ZASTÁVKY**Přemísťuje se:**

„Korkyně, Křížov, U Kapličky“ – směr Sedlčany, aut. st. – 15 metrů za křižovátku silnic II/102 a III/10216

– směr Praha, Smíchovské nádraží – 40 metrů před křižovátku silnic III/10216 a II/102

Zřizuje se:

„Nový Knín“ – obousměrně – v pravidelné zast. linky 361

„Nový Knín, Sudovice“ – obousměrně – v pravidelné zast. linky 361

„Dobříš, žel. st.“ – směr Sedlčany – v pravidelné zast. linky 361

„Dobříš, žel. st.“ – směr Praha, Smíchovské nádr. – v pravidelné zast. linky 392

Ruší se:

„Zbraslavské náměstí“ – obousměrně

„Most Závodu míru“ – obousměrně

„Na Plácku“ – obousměrně

„Kamenolom Zbraslav“ – obousměrně

„Strnady“ – obousměrně

„Jiloviště, výzkumný ústav“ – obousměrně

„Měchenice, rozc. k žel. st.“ – obousměrně

„Měchenice“ – obousměrně

„Davle, Na Javorce“ – obousměrně

„Davle, u pomníku“ – obousměrně

„Davle, obec“ – obousměrně

„Davle, U Kiliána“ – obousměrně

„Davle, Portus“ – obousměrně

„Štěchovice“ – obousměrně

„Slapy, Na Polesí“ – obousměrně

„Nové Dvory, Porostliny“ – obousměrně

„Nové Dvory, Nová Hospoda“ – obousměrně

Linka 361**TRASA****směr Nový Knín**

Nastup v zast. „Měchenice, žel. st.“ – přímo Hlavní – vlevo Přístavní – vpravo Vltavská – dále po své pravidelné trase.

směr Praha, Smíchovské nádraží, Měchenice, žel. st.

Do zastávky „Davle, Na Javorce“ po své pravidelné trase – přímo II/102 – na konci obce Měchenice vlevo Hlavní – do výstupní zastávky „Měchenice, žel. st.“

ZASTÁVKY**Zřizuje se:**

„Měchenice, žel. st.“ – výstupní, manipulační – v prostoru před železniční stanicí Měchenice

„Měchenice, žel. st.“ – nástupní – v pravidelné zast. linky 444

„Měchenice, samoobsluha“ – ve směru Nový Knín – v původní zast. linky 444

Ruší se:

„Smíchovské nádraží“ – nástupní, výstupní

„Lihovar“ – obousměrně

„Zbraslavské náměstí“ – obousměrně

„Most Závodu míru“ – obousměrně

„Na Plácku“ – obousměrně

„Kamenolom Zbraslav“ – obousměrně

„Strnady“ – obousměrně

„Jíloviště, výzkumný ústav“ – obousměrně

„Měchenice, rozc. k žel. st.“ – obousměrně

Linka 390**TRASA****směr Rabyně, Měřín**

Nastup v zast. „Měchenice, žel. st.“ – přímo Hlavní – vlevo Přístavní – vpravo Vltavská – dále po své pravidelné trase.

směr Praha, Smíchovské nádraží, Měchenice, žel. st.

Do zastávky „Davle, Na Javorce“ po své pravidelné trase – přímo II/102 – na konci obce Měchenice vlevo Hlavní – do výstupní zastávky „Měchenice, žel. st.“

ZASTÁVKY**Zřizuje se:**

„Měchenice, žel. st.“ – výstupní, manipulační – v prostoru před železniční stanicí Měchenice

„Měchenice, žel. st.“ – nástupní – v pravidelné zast. linky 444

„Měchenice, samoobsluha“ – ve směru Rabyně, Měřín – v původní zast. linky 444

Ruší se:

„Smíchovské nádraží“ – nástupní, výstupní

„Lihovar“ – obousměrně

„Zbraslavské náměstí“ – obousměrně

„Most Závodu míru“ – obousměrně

„Na Plácku“ – obousměrně

„Kamenolom Zbraslav“ – obousměrně

„Strnady“ – obousměrně

„Jíloviště, Výzkumný ústav“ – obousměrně

„Měchenice, rozc. k žel. st.“ – obousměrně

Linka X390

zavádí se dočasná linka **X390** v trase **Praha, Smíchovské nádraží - Vrané n. Vlt., žel. st.**

TRASA

směr Vrané n. Vlt., žel. st.

nástup – přímo Nádražní – vlevo Moulíkova – vpravo Strakonická – Lahovický most – Strakonická – vpravo rampy Radotínského mostu (směr Zbraslav) – na okružní křižovatce 3. výjezdem směr Zbraslav – U Národní galerie – Zbraslavské náměstí – vlevo Žitavského – vlevo Most Závodu míru – vpravo K Vranému – přímo Nádražní – výstup

manipulačně: v kruhovém objezdu v křížení ulic Nádražní a U Elektrárny

směr Praha, Smíchovské nádraží

nástup – přímo Nádražní – přímo K Vranému – vlevo Most Závodu míru - vpravo Žitavského – Zbraslavské náměstí – vpravo U Národní galerie – rampy Radotínského mostu – vpravo Strakonická – Lahovický most – Strakonická – vlevo Moulíkova – vpravo Nádražní - výstup

manipulačně: v prostoru severní manipulační plochy Smíchovského nádraží

ZASTÁVKY

Zřizuje se:

„Smíchovské nádraží“ – nástupní, výstupní – v pravidelné zast. linky 338

„Lihovar“ – obousměrně – v přemístěné zast. linky 338

„Zbraslavské náměstí“ – obousměrně – v pravidelné zast. linky 338

„Most Závodu míru“ – obousměrně – v pravidelné zast. linky 338

„Vrané n. Vlt., žel. st.“ – nástupní, výstupní – v pravidelné zast. linky 445

Linka S88


zavádí se vložené spoje v úseku Vrané nad Vltavou – Měchenice (bez obsluhy zastávky Skochovice) jako náhradní vlaková doprava

Přestupní vazby

- mezi linkami 314, 338, 361, 390 v zastávce „Měchenice, žel. st.“ a linkou S88 jsou realizovány **pěším přesunem – vzdálenost cca 50 m, cca 2 minuty**
- mezi linkou X390 v zastávce „Vrané n. Vlt., žel. st.“ a linkou S88 jsou realizovány **pěším přesunem – vzdálenost cca 30 m, cca 2 minuty**

TARIFNÍ OPATŘENÍ

na všech spojích linek 338 (pouze v úseku Smíchovské nádraží – Strnady) a X390 **platí nástup do autobusu všemi dveřmi bez kontroly jízdních dokladů** řidičem.



Toto rozhodnutí se vydává za podmínek:

- Dopravní značení bude použito v základní velikosti s reflexním povrchem dle vyhlášky MDS č. 294/2015 Sb., v souladu se Zásadami pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích č. TP 66 ČSN 018020, dle stanovení přechodné úpravy provozu na komunikacích vydané MěÚ Černošice, odborem stavební úřad, oddělením dopravy a správy komunikací č.j. MUCE 141423/2021 OSU Opatřením obecné povahy č. 224/2021 a dle stanovení přechodné úpravy provozu na komunikacích vydané Magistrátem hl.m. Prahy, odborem pozemních komunikací a drah, oddělením silničního správního úřadu č.j. MHMP-1367947/2021/O4/Nj ze dne 1.9.2021 a odsouhlasených situací DIO vypracované firmou LUSMIDA DZ, s.r.o. s datem 26.7.2021.
- Po celou dobu úplné uzavírky bude pracovní místo řádně označeno a zabezpečeno z hlediska bezpečnosti silničního provozu a pohybu osob, dopravní značení bude kontrolováno, případně doplněno. Za schválené osazené dopravní značení odpovídá zhotovitel po celou dobu uzavírky.
- Stavební materiál nebude ukládán na tělese pozemní komunikace ani jejích součástech mimo místa s dopravním opatřením.
- Budou dodrženy podmínky správce komunikace KSUS Středočeského kraje, p.o. dané vyjádřením ze dne 6.8.2021 zn. 6050/21/KSUS/KLT/JRC.
- Při realizaci prací bude postupováno tak, aby nedošlo k poškození nebo znečištění silnice, jejích součástí a příslušenství mimo úsek stavby. Pokud však ke škodě přesto dojde, je žadatel povinen poškození oznámit správci silnic – KSUS Středočeského kraje, p.o. a bezodkladně s nimi projednat způsob odstranění poškození.
- Žadatel v případě časového zkrácení prací zajistí úpravu dopravního značení a zařízení dle dopravního režimu platného před uzavírkou.
- Za průběh uzavírky zodpovídá zhotovitel.
- Pokud si to vyžádá veřejný zájem, může Městský úřad Černošice, odbor stavební úřad, oddělení dopravy a správy komunikací podmínky tohoto rozhodnutí doplnit nebo pozměnit.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

STRABAG a.s., odštěpný závod Praha, oblast MOSTY, Na Bělidle 198/21, 150 00
Praha

Odůvodnění:

Žadatel v souladu s § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a § 39 odst. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, podal dne 3.8.2021 žádost o povolení úplné uzavírky silnice č. II/102 v úseku mezi Městskou částí Praha–Zbraslav a Měchenicemi z důvodů provádění stavebních prací na silnici č. II/102 v rámci akce: „Rekonstrukce silnice II/102 Praha – Štěchovice“ v km staničení cca 2,600 – 4,500.

Silniční správní úřad oznámil zahájení řízení a seznámil účastníky řízení a dotčené správní úřady s podklady do rozhodnutí s možností se k nim vyjádřit svým opatřením ze dne 19.8.2021 č.j. MUCE 121295/2021 OSU.

Silniční správní úřad žádost podle § 39 odst. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, posoudil a podle § 24 odst. 1 a 2 zákona o pozemních komunikacích a § 39 odst. 4 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích povolil úplnou uzavírku komunikace silnice č. II/102 za podmínek stanovených ve výroku tohoto rozhodnutí, protože byly splněny zákonné podmínky pro vydání tohoto rozhodnutí, kterými je předchozí souhlas Policie ČR, DI Praha venkov – JIH ze dne 9.8.2021 č.j. KRPS-189366-1/ČJ-2021-011406, Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, p.o. ze dne 6.8.2021 zn. 6050/21/KSUS/KLT/JRC a Magistrátu hl.m. Prahy, odborem pozemních komunikací a drah, oddělením silničního správního úřadu stanovením přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci č.j. MHMP-1367947/2021/O4/Nj ze dne 1.9.2021.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Město Jílové u Prahy, Obec Měchenice, Obec Petrov, Obec Libeň, Obec Psáry, Obec Dolní Břežany.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání podle ustanovení § 81 a § 83 zákona č. 500 / 2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, a to podáním prostřednictvím stavebního úřadu, oddělení dopravy a správy komunikací Městského úřadu Černošice.

V souladu s § 24 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, vylučuje se případnému odvolání podle § 85 odst. 2 zákona 500/2004 Sb., správní řád, odkladný účinek.

Proti tomuto rozhodnutí o vyloučení odkladného účinku odvolání se nelze odvolat.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Nedodržení termínů nebo dalších podmínek uvedených v rozhodnutí opravňuje správní orgán zahájit řízení o přestupku s možností uložení pokuty do 500 000 Kč.

Karla Koupá
referent oddělení dopravy OSU
Městský úřad Černošice
"otisk úředního razítka"

Příloha: situace dopravního značení

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdržel :

Účastníci :

Lu

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgm
sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov

Město Jílové u Prahy, IDDS: bmwb8if

sídlo: Masarykovo náměstí č.p. 194, 254 01 Jílové u Prahy

Obec Dolní Břežany, IDDS: 9h6berv

sídlo: 5. Května č.p. 78, 252 41 Dolní Břežany

Obec Libeň, IDDS: 2xcbmtm

sídlo: Libeň č.p. 35, 252 41 Dolní Břežany

Obec Měchenice, IDDS: gt2aspx

sídlo: Hlavní č.p. 4, Měchenice, 252 06 Davle

Obec Petrov, IDDS: e5mauud

sídlo: Hlavní č.p. 30, 252 81 Petrov

OBEC PSÁRY, IDDS: rvhbuxe

sídlo: Pražská č.p. 137, Dolní Jirčany, 252 44 Psáry.

Dotčené orgány státní správy :


Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor Praha - venkov JIH, DI, IDDS: 2dtai5u

sídlo: Masarykovo nám. č.p. 708, 251 64 Mnichovice

Magistrát hl.m. Prahy, Odbor pozemních komunikací a drah, oddělení silničního správního úřadu, IDDS: 48ia97h

sídlo: Jungmannova č.p. 35/29, 110 00 Praha 10

Neovědomí :

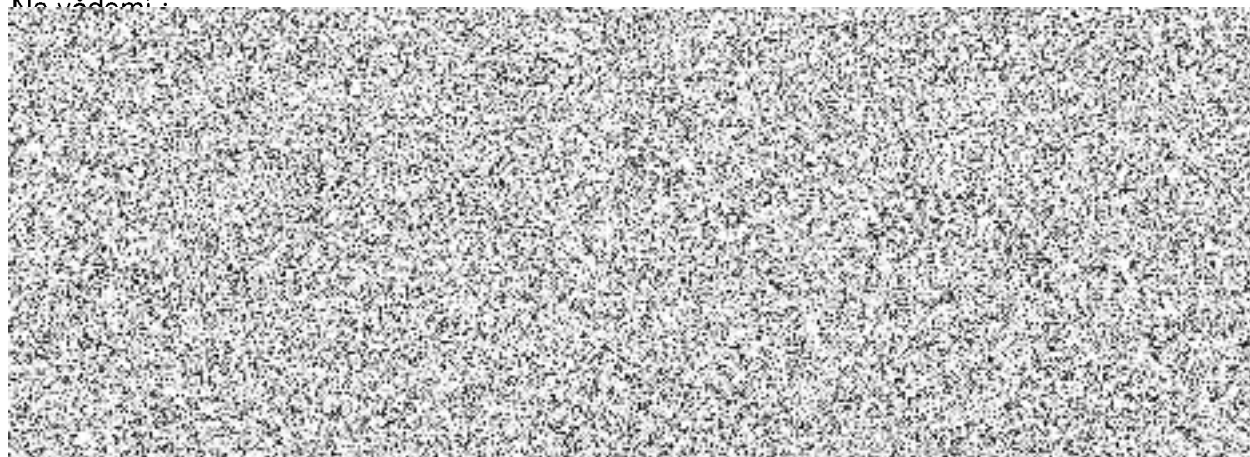



Městský úřad Černošice

Odbor stavební úřad – oddělení dopravy a správy komunikací

Podskalská 19
120 00 Praha 2

Spis. ZN.

výst.: 29512/2023/Kou

V Praze dne 21.03.2023

Č.j.:

MIJCE 49853/2023.OSU

vyřizuje:

tel./e-mail:



ROZHODNUTÍ

POVOLENÍ ÚPLNÉ UZAVÍRKY

Městský úřad Černošice, odbor stavební úřad – oddělení dopravy a správy komunikací, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v řízení o povolení úplné uzavírky komunikace, na základě žádosti ze dne 4.2.2023, kterou podal:

**STRABAG a.s odštěpný závod Praha, oblast MOSTY, IČO 60838744, Na Bělidle
198/21, 150 00 Praha,**

v zastoupení na základě plné moci

Lukáš Balcárek, IČO 48122050, Cyprichova 701/11, 149 00 Praha,

vydává

podle ustanovení **§ 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích**, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí, kterým povoluje **úplnou uzavírku mezi Strnady a Měchenicemi,**

komunikace: silnice č. II/102

v úseku: v km staničení cca 1,000 – 5,300

z důvodů: pokládka asfaltového povrchu komunikace v celé šíři

termín: od 22.04.2023 (01:00hod) do 23.04.2023 (23:59hod)

od 29.04.2023 (01:00hod) do 01.05.2023 (23:59hod)

Objízdná trasa pro veškerou dopravu obousměrně pro úplnou uzavírku se nařizuje:

Měchenice II/102 – Davle – II/104 Petrov – Jílové u Prahy místní komunikace – II/105 Psáry – Jesenice – II/603 - II/101 Dolní Břežany – Praha Zbraslav zpět na II/102 a opačně.

VEDENÍ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY:

DOTČENÉ LINKY

314 Praha – Davle – Nová Ves pod Pleší

338 Praha – Štěchovice – Hradištko, Pikovice

360 Praha – Štěchovice – Chotilsko – Sedlčany

361 Praha – Štěchovice – Nový Knín

390 Praha – Štěchovice – Neveklov, Jablonná

440 Štěchovice – Štěchovice, Masečín

688 Mníšek pod Brdy – Nový Knín

OBJÍZDNÉ TRASY

Linky 314, 338, 361 a 390

Linky jsou ve směru od Davle do Měchenice vedeny po sil. II/102, u Fregatty vlevo ul. Přístavní, vpravo ul. Hlavní do náhradní zastávky „Měchenice,žel.st.“, kde jsou ukončeny. V opačném směru po stejné trase.

Linka 338

Kromě úseku Měchenice – Hradištko je na lince zachován provoz v samostatném úseku „Smíchovské nádraží – Strnady“. Autobusy se otočí na sil. II/102 v prostoru křižovatky u zastávky „Strnady“.

Linka 360

Linka je v úseku „Lihovar – Korkyně, Křížov, u kapličky“ obousměrně odkloněna po Strakonické, D4 a v Dobříši ul. Pražská, II/114 a II/102.

Náhradní vlaková doprava

Zavádí se náhradní vlaková doprava v úseku Vrané n.Vlt. – Měchenice.

Linky 440 a 688

Dochází k časovým posunům spojů z provozních důvodů a návazností.

Linka X390

Zavádí se náhradní autobusová linka v trase „Smíchovské nádraží – Vrané n.Vlt., žel.st.“. Linka je v úseku „Smíchovské nádraží – Most závodu míru“ vedena po pravidelné trase linky 338 a dále přes most Závodu míru, ul. Závist, sil. III/1043, ve Vraném n.Vlt. ul. Nádražní do výstupní zastávky „Vrané n.Vlt., žel.st.“ Autobusy se otočí na okružní křižovatce ul. U Elektrárny a Nádražní. V opačném směru po stejné trase.

ZMĚNY ZASTÁVEK

Ruší se:

„Jíloviště, výzkumný ústav“ – obousměrně

„Měchenice, rozc. k žel.st.“ – obousměrně

„Měchenice“ – obousměrně

Zřizuje se:

„Měchenice, žel.st.“ – nástupní, výstupní, před nádražní budovou, zajistí IDSK

„Měchenice, samoobsluha“ – v ul. Hlavní v původních zastávkách

Investor : KSÚS Středočeského kraje, p.o.

odpovědná osoba: Miroslav Valenta tel.: 724 370 591

Zhotovitel : STRABAG a.s.

odpovědná osoba : Ing. Jiří Záruba tel.: 739 580 589

Odpovědná osoba za DZ: Lukáš Balcárek tel.: 607 825 896

Toto rozhodnutí se vydává za podmínek:

1. Dopravní značení bude použito v základní velikosti s reflexním povrchem dle vyhlášky MDS č. 294/2015 Sb., v souladu se Zásadami pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích č. TP 66 ČSN 018020, dle stanovení přechodné úpravy provozu na komunikacích č.j. MUCE 49838/2023 OSU vydané Opatřením obecné povahy č. 45/2023 a odsouhlasených situací DIO vypracované firmou LUSMIDA DZ, s.r.o.
2. Po celou dobu provádění prací bude pracovní místo řádně označeno a zabezpečeno z hlediska bezpečnosti silničního provozu a pohybu osob, dopravní značení bude kontrolováno, případně doplněno. Za schválené osazené značení odpovídá zhotovitel po celou dobu uzavírky.
3. Stavební materiál nebude ukládán na tělese pozemní komunikace ani jejích součástech mimo místa s dopravním opatřením.
4. Při realizaci prací bude postupováno tak, aby nedošlo k poškození nebo znečištění silnice, jejích součástí a příslušenství mimo úsek stavby. Pokud však ke škodě přesto dojde, je žadatel povinen poškození oznámit správci silnic – KSÚS Středočeského kraje, p.o. a bezodkladně s nimi projednat způsob odstranění poškození
5. Žadatel v případě časového zkrácení prací zajistí úpravu dopravního značení a zařízení dle dopravního režimu platného před uzavírkou.
6. Za průběh uzavírky zodpovídá zhotovitel.
7. Pokud si to vyžádá veřejný zájem, může Městský úřad Černošice, odbor stavební úřad, oddělení dopravy a správy komunikací podmínky tohoto rozhodnutí doplnit nebo pozměnit.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

STRABAG a.s., IČO: 60838744, Kačírkova 982/4, 150 00 Praha 5

Odůvodnění

Žadatel v souladu s § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a § 39 odst. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, podal dne 4.2.2023 žádost o povolení úplné uzavírky silnice č. II/102 z důvodů provádění asfaltového povrchu v celé šíři komunikace po provedené rekonstrukci komunikace silnice č. II/102 mezi Strnady a Měchenicemi v km staničení cca 1,000 – 5,300 v rámci akce: „Rekonstrukce silnice II/102 Praha – Štěchovice“ fáze 31., 1. úsek.

Silniční správní úřad (dále jen „SSÚ“) oznámil zahájení řízení účastníkům řízení a dotčeným orgánům svým opatřením ze dne 13.2.2023 č.j. MUCE 32749/2023 OSU a svolal jednání, které proběhlo 28.2.2023 v 10:00 hod. na MěÚ Černošice, OSÚ oddělení dopravy a správy komunikací, Podskalská 19, Praha 2 za účasti zástupců Městysu Davle, Obce Petrov, MHMP PKD, LUSMIA DZ s.r.o., STRABAG, a.s. a IDSK. Účastníci řízení byli seznámeni s podklady do rozhodnutí a zhotovitel dále seznámil účastníky s průběhem prací v době uzavírky. Dále bylo projednáno vedení objízdné trasy a koordinace s plánovanými uzavírkami v dané oblasti.

Silniční správní úřad žádost podle § 39 odst. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, posoudil a podle § 24 odst. 1 a 2 zákona o pozemních komunikacích a § 39 odst. 4 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích povolil úplnou uzavírku komunikace silnice č. II/102 za podmínek stanovených ve výroku tohoto rozhodnutí, protože byly splněny zákonné podmínky pro vydání tohoto rozhodnutí, kterými je předchozí souhlas Policie ČR, DI Praha venkov – JIH ze dne 20.2.2023, Města Jílové u Prahy ze dne 28.2.2023 a Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, p.o. ze dne 6.2.2023 zn. 941/23/KSUS/KLT/JRC.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Město Jesenice, Město Jílové u Prahy, Městys Davle, Obec Petrov, Obec Dolní Břežany, Obec Psáry, Obec Měchenice, Městská část Praha Zbraslav

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání podle ustanovení § 81 a § 83 zákona č. 500 / 2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, a to podáním prostřednictvím stavebního úřadu, oddělení dopravy a správy komunikací Městského úřadu Černošice.

V souladu s § 24 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, vylučuje se případnému odvolání podle § 85 odst. 2 zákona 500/2004 Sb., správní řád, odkladný účinek.

Proti tomuto rozhodnutí o vyloučení odkladného účinku odvolání se nelze odvolat.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Nedodržení termínů nebo dalších podmínek uvedených v rozhodnutí opravňuje správní orgán zahájit řízení o přestupku s možností uložení pokuty do 500 000 Kč.



Kana Koupá

referent oddělení dopravy
a správy komunikací OSU
Městský úřad Černošice
"otisk úředního razítka"

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží :

Lukáš Balcárek, IDDS: h2ztgg6

sídlo: Cyprichova č.p. 701/11, Praha 4-Háje, 149 00 Praha 415

zastoupení pro: STRABAG a.s., odštěpný závod Praha, oblast MOSTY, Na Bělidle
198/21, 150 00 Praha

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmX

sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov

Město Jesenice, IDDS: 3nzb42m

sídlo: Budějovická č.p. 303, 252 42 Jesenice u Prahy

Město Jílové u Prahy, IDDS: bmwb8if

sídlo: Masarykovo náměstí č.p. 194, 254 01 Jílové u Prahy

Městská část Praha-Zbraslav, IDDS: zcm6w

sídlo: Zbraslavské náměstí č.p. 464, Praha 5-Zbraslav, 156 00 Praha 516

Městys Davle, IDDS: aeybpn5

sídlo: Na náměstí č.p. 63, 252 06 Davle

Obec Dolní Břežany, IDDS: 9h6berv

sídlo: 5. Května č.p. 78, 252 41 Dolní Břežany

Obec Měchenice, IDDS: gt2aspx

sídlo: Hlavní č.p. 4, Měchenice, 252 06 Davle

Obec Petrov, IDDS: e5maud

sídlo: Hlavní č.p. 30, 252 81 Petrov

OBEC PSÁRY, IDDS: rvhbuxe

sídlo: Pražská č.p. 137, Dolní Jirčany, 252 44 Psáry

dotčené správní úřady:

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor Praha - venkov ZÁPAD, DI, IDDS:
2dtai5u

sídlo: Zborovská č.p. 13, 150 00 Praha 5

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Praha venkov-JIH, DI, IDDS:
2dtai5u

sídlo: Masarykovo nám. č.p. 708, 251 64 Mnichovice

Magistrát hl.m. Prahy, Odbor pozemních komunikací a drah, oddělení silničního správního
úřadu, IDDS: 48ia97h

sídlo: Jungmannova č.p. 35/29, 110 00 Praha 10

na vědomí:

Městys ŠTĚCHOVICE, IDDS: i5tbbbm

sídlo: Hlavní č.p. 3, 252 07 Štěchovice

Obec Hradištko, IDDS: fxtbd3h

sídlo: Ve Dvoře č.p. 1, 252 09 Hradištko

Obec Hvozdnice, IDDS: mnpac5

sídlo: Hvozdnice č.p. 160, 252 05 Hvozdnice

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, IDDS: dz4aa73

sídlo: Jana Palacha č.p. 1970, 272 01 Kladno 1

Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: wmjmahj

sídlo: Vančurova č.p. 1544, 272 01 Kladno 1

Regionální organizátor pražské integrované dopravy (ROPID), IDDS: ku79q7n

sídlo: Rytířská č.p. 406/10, 110 00 Praha 1-Staré Město

Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: pdrwknv

sídlo: Sokolovská č.p. 100/94, Praha 8-Karlín, 186 00 Praha 86

Dodavatel

Obchodní firma:

České dráhy, a.s.

Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222

PSČ 110 15

"zapsány v obchodním rejstříku vedeném

u Městského soudu v Praze v odd. B, vložce č. 8039"

IČ: 70994226

DIČ: CZ70994226

Organizační jednotka:

České dráhy, a.s.

RP ZAP Praha

Ulice: Trocnovská 1/2


Obec: Praha 3

PSČ: 130 00

RC-KST-CZ-841-JZRC

26-06-2020

DOŠLO DNE



Variabilní symbol: 4016101072
 Konstantní symbol: 0308
 KS - obj. číslo: 2020/ZOGS/0

Peněžní ústav: KB PRAHA 1
 Číslo účtu: 000000-0133904011
 Kód banky: 0100
 SWIFT: KOMBCZPP
 IBAN: CZ5401000000000133904011

Datum splatnosti: 19.07.2020
 Forma úhrady: Bankovní převod
 Datum vystavení: 19.06.2020
 Datum usk. zdan. pln.: 14.06.2020

Odběratel

Obchodní firma:

STRABAG a.s.

Ulice: Kačírkova 982/4, Jinonice

Obec: Praha 5

PSČ: 158 00

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Konečný příjemce

Obchodní firma:

STRABAG a.s.

Ulice: Kačírkova 982/4, Jinonice

Obec: Praha 5

PSČ: 158 00

IČ: 60838744

Rozsah a předmět zdanitelné plnění	Jedn.cena bez DPH	Množství	MJ	Hodnota bez DPH	% DPH
zast.vlaků 13.6.a 14.6.20	0,00	0,000		53.538,83	21%

Fakturuje Vám na základě Vaší objednávky č. 2020/ZOGS/0017 za zajištění náhradní vlakové dopravy
 Měchenice. Částka 53.538,83 Kč cena bez DPH. Příloha je nedílnou součástí daňového dokladu.

Zdanitelné plnění celkem	Sazba DPH 21%	Základ 53.538,83	DPH 11.243,15	Celkem 64.781,98
--------------------------	------------------	---------------------	------------------	---------------------

Údaje daňového dokladu :	Sazba DPH	Základ daně	DPH	K úhradě
(Rekapitulace):		53.538,83	11.243,15	64.781,98 Kč

Vystavil(a): Petra Jelinková
 Telefon: +420725708047

Období zaúčtování:
 FC / Nákladové středisko: /
 Ověřené dne:
 Platební podmínky:
 Zádržné (P1) % Kč Splatné do:
 Zádržné (P2) % Kč Splatné do:
 K úhradě:
 Uznáno: Ekonom:



Razítko a podpis

19.06.2020
 11.06.2020
 10.06.2020



CZR00UCB

2021

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTURA

číslo: 4016101086

Dodavatel

Obchodní firma:

České dráhy, a.s.
Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222
PSČ 110 15
"zapsány v obchodním rejstříku vedeném
u Městského soudu v Praze v odd. B, vložce č. 8039"

IČ: 70994226

DIČ: CZ70994226

Organizační jednotka:

České dráhy, a.s.
RP ZAP Praha

Ulice: Trocnovská 1/2

Obec: Praha 3

PSČ: 130 00

Variabilní symbol: 4016101086

Konstantní symbol: 0308

KS - obj.číslo: 2021/ZOGS/0

Datum splatnosti: 29.10.2021

Forma úhrady: Bankovní převod

Datum vystavení: 14.09.2021

Datum usk.zdaň.pln.: 12.09.2021

Odběratel

Obchodní firma:

STRABAG a.s.
Ulice: Kačírkova 982/4, Jinonice
Obec: Praha 5
PSČ: 158 00

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Konečný příjemce

Obchodní firma:

STRABAG a.s.
Ulice: Kačírkova 982/4, Jinonice
Obec: Praha 5
PSČ: 158 00

IČ: 60838744

Rozsah a předmět zdanitelné plnění	Jedn.cena bez DPH	Množství	MJ	Hodnota bez DPH	% DPH
náhradní vlaková doprava	0,00	0,000		64.061,18	21%

Fakturujeme Vám náhradní vlakovou dopravu v úseku Vrané nad Vltavou - Měchenice dle objednávky č. 2021/ZOGS/0024 ze dne 31.8.2021. Příloha je neoddílnou součástí daňového dokladu.

Zdanitelné plnění celkem	Sazba DPH 21%	Základ 64.061,18	DPH 13.452,85	Celkem 77.514,03
Údaje daňového dokladu :	Sazba DPH	Základ daně	DPH	K úhradě
(Rekapitulace):		64.061,18	13.452,85	77.514,03 Kč

Vystavil(a): M
Telefon: +420



Razítko a peč.

České dráhy,
Nábřeží L. Svob.
110 15 Praha 1
Centrum služeb
Chodovská 1475
IČ: 70994226

2023

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTURA

číslo: 4016101057

Dodavatel

Obchodní firma:

České dráhy, a.s.
Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222
PSČ 110 15
"zapsány v obchodním rejstříku vedeném
u Městského soudu v Praze v odd. B, vložce č. 8039"

IČ: 70994226

DIČ: CZ70994226

Organizační jednotka:

České dráhy, a.s.
RP ZAP Praha

Ulice: Trocnovská 1/2

Obec: Praha 3

PSČ: 130 00

Variabilní symbol: 4016101057

Konstantní symbol: 0308

KS - obj.číslo: 2023/ZOGS/0

Datum splatnosti: 18.06.2023

Forma úhrady: Bankovní převod

Datum vystavení: 04.05.2023

Datum usk.zdaň.pln.: 02.05.2023

Odběratel

Obchodní firma:

STRABAG a.s.
Ulice: Kačírkova 982/4, Jinonice
Obec: Praha 5
PSČ: 158 00

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Konečný příjemce

Obchodní firma:

STRABAG a.s.
Ulice: Kačírkova 982/4, Jinonice
Obec: Praha 5
PSČ: 158 00

IČ: 60838744

Rozsah a předmět zdanitelného plnění	Jedn.cena bez DPH	Množství	MJ	Hodnota bez DPH	% DPH
náhradní vlaková doprava	0,00	0,000		168.671,36	21%

Fakturuje Vám náhradní vlakovou dopravu v úseku Vrané nad Vltavou - Měchenice dle objednávky č. 2023/ZOGS/0002 ze dne 1.3.2023. Příloha je nedílnou součástí daňového dokladu.

	Sazba DPH	Základ	DPH	Celkem
Zdanitelné plnění celkem	21%	168.671,36	35.420,99	204.092,35

Údaje daňového dokladu :	Sazba DPH	Základ daně	DPH	K úhradě
(Rekapitulace):		168.671,36	35.420,99	204.092,35 Kč

	2020	53 538,83
	2021	64 061,18
	2022	-
	2023	168 671,36
		286 271,37 Kč
Režije	1,15	329 212,08 Kč



TDI

STRABAG, a. s., Kačírkova 982/4, 158 00, Praha 5,
zapsaná v obchod. rejstříku Městského soudu v Praze, spis. značka B 7634,
IČ: 60838744,
DIČ: CZ60838744

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
Zborovská 11
150 21 Praha 5
p. Ing. Milan Fiala, p. Ing. Milan Peška
TDS: p. Miroslav Valenta
AD: p. Ing. David Dvořáček

Vyřizuje:
Josef Nejedlík



Naše značka:
Náhradní vlaková doprava

29.05.2023

Předmět: Oznámení o zjištění skutečnosti

Název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA I.

V souladu se smlouvou o dílo č. S-0656/DOP/2019, články 8.11 až 8.14 Vás informujeme o následující zjištěné skutečnosti.


Při provádění celkových uzavírek v letech 2020, 2021 a 2023 pro pokládku finální obrusné vrstvy dle PDPS v celé šíři vozovky, byla nařízena dle rozhodnutí MěÚ Černošice Náhradní vlaková doprava mezi obcemi Měchenice - Vrané nad Vltavou.

Tyto práce nejsou zasmluvněny v uzavřené SoD.

S ohledem na zjištěnou skutečnost a navrženou RDS stavby, Vás tímto žádáme v souladu se smlouvou o dílo o písemný pokyn, jak v realizaci díla pokračovat. Tento požadavek bude mít vliv na změnu soupisu prací a vytvoření ZBV stavby.

S přátelským pozdravem

Josef Nejedlík



STRABAG a.s
Kačírkova 982/4,
158 00 Praha 5

Věc: Souhlasné stanovisko k ZBV – poplatky za náhradní vlakovou dopravu

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace v návaznosti na projednání s TDS a zhotovitelem v rámci akce „II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA I“ **souhlasí** s navrženou a projednanou změnou. Jmenovitě souhlasí s realizací náhradní vlakové dopravy v úseku Vrané nad Vltavou – Měchenice na základě rozhodnutí městského úřadu Černošice z důvodu celkové uzavírky komunikace za účelem dodržení podmínek PDPS.

Další práce požadujeme provést v koordinaci v souladu s pokyny AD a TDS a v souladu s uzavřenou SOD.

S pozdravem



technicko – provozní náměstek

Naše značka: TD/228/19-120/VM/23

Vaše značka:



KSÚS Středočeského kraje

**Ing. Milan PEŠKA
Technicko-provozní náměstek**

**Zborovská 11
150 21 Praha 5**

Stavba: II/102 hr. hl. m Prahy – Štěchovice, rekonstrukce, etapa I.

Věc: Stanovisko TDS k návrhu ZBV č. 22 SO 000 Vedlejší a ostatní náklady.

Zhotovitel stavby dne 4. 8. 2023 předložil TDS návrh ZBV č. 22 (000/2) SO 000 Vedlejší a ostatní náklady. Návrh řeší úhradu poplatků za náhradní vlakovou dopravu v době celkových uzavírek silnice II/102.

Řešení PDPS 9/2017 nepředpokládalo v době úplných uzavírek silnice II/102 zavedení náhradní vlakové dopravy.

Změna byla vyvolána rozhodnutím MěÚ Černošice – oddělení dopravy a správy komunikací o zavedení náhradní vlakové dopravy po dobu uzavírek:

- 13. 6. 2020 – 14. 6. 2020
- 10. 9. 2021 – 12. 9. 2021
- 22. 4. 2023 – 23. 4. 2023
- 29. 4. 2023 – 01. 5. 2023

Vzhledem k tomu, že zavedení náhradní vlakové dopravy nekladlo žádné nároky na administrativní ani jinou činnost zhotovitele, považujeme nárok na úhradu 15 % za nedůvodný.

**Miroslav
Valenta**
M. Valenta
Technický dozor investora

Digitálně podepsal
Miroslav Valenta
Datum: 2023.09.13
11:50:54 +02'00'

Na vědomí: p. Josef. Nejedlík

KSÚS Středočeského kraje
Ing. Milan Peška
Zborovská 81/11
150 00 Praha 5

Č. j.: Px 4940/2023/DDv
Datum: 20. 9. 2023
Vyřizuje: Ing. David Dvořáček,



II/102 hr. hl. m. Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, I. etapa
Vyjádření autorského dozoru č. 81 - ZBV č. 20 a 22

Obdrželi jsme návrh ZBV č. 20 a 22.

Posoudili jsme zaslané podklady a k předloženým ZBV nemáme připomínky.

S pozdravem

Ing. David Dvořáček,
hlavní inženýr projektu



Pontex, spol. s r.o.
Bezová 1658/1
147 00 Praha 4-Braník

Na vědomí (zasláno pouze elektronicky):

