

DODATEK Č. 5 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 186/OVZ/PV/2022

Univerzita Palackého v Olomouci

veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů

se sídlem: Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc

IČO: 61989592

DIČ: CZ61989592

osoba oprávněná

k podpisu smlouvy:

prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D., rektor

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc

číslo účtu:

osoba oprávněná jednat ve věcech realizace Smlouvy: [REDACTED]

osoba oprávněná jednat ve věcech technických (technický dozor stavebníka):
[REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

E.PROXIMA, s.r.o.

se sídlem: Holická 1099/31, 772 00 Olomouc

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 18014

IČO: 25395602

DIČ: CZ25395602

osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Jan Bukovjan, jednatel

bankovní spojení:

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně dále též jako „smluvní strany“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 186/OVZ/PV/2022 ze dne 22. 11. 2022:

I.

1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 22. 11. 2022 Smlouvu o dílo č. 186/OVZ/PV/2022 (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal za podmínek dále uvedených v této Smlouvě provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele Dílo, jehož rozsah a obsah a parametry je smluvními stranami dohodnut a popsán v této Smlouvě, a Objednatel se zavázal Dílo převzít, poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost a zaplatit za dodané výkony sjednanou cenu za Dílo. Dílem dle Smlouvy se rozumí zhotovení stavby „Víceúčelový objekt pro výuku a osvětovou činnost PřF UPOL“ v souladu s Technickými podmínkami, Společným povolením č.j. S-SMOL/094674/2021/OS ze dne 20.08.2021, dokumentací pro provádění stavby, vše jako součást této Smlouvy v příloze č. 1, včetně výkonu inženýrské činnosti, a to v rozsahu dle Smlouvy.

2. Účelem tohoto dodatku je náprava administrativní chyby v psaní a počtech, ke které došlo v Dodatku č. 4.

II.

1. Za účelem nápravy administrativní chyby v psaní a počtech, ke kterému došlo v Dodatku č. 4, je předmětem tohoto dodatku provedení nepodstatné změny závazku ze Smlouvy za podmínek dle § 222 odst. 4 ZZVZ:
 - v TLZ č. 11 smluvní strany opravují částku víceprací z původního přepisu 22.485,25 Kč na **22.438,25 Kč**;
 - celková cena za dílo činí po nápravě administrativní chyby v psaní a počtech **26.398.173,03 Kč bez DPH.**

III.

1. Ostatní obsah Smlouvy, nedotčený tímto dodatkem, se nemění.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnému uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění Objednatel v registru smluv v souladu s výše zmíněným zákonem.
4. Tento dodatek se pořizuje v elektronické podobě.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří:
Příloha č. 1 – „TLZ č. 11 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně popisu změn a technických listů změn, včetně rekapitulace k tomuto dodatku“

V Olomouci dne 07.11.2023
Za Objednatele:

V Olomouci dne 06.11.2023
Za Zhotovitele:

prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.
rektor Univerzity Palackého v Olomouci


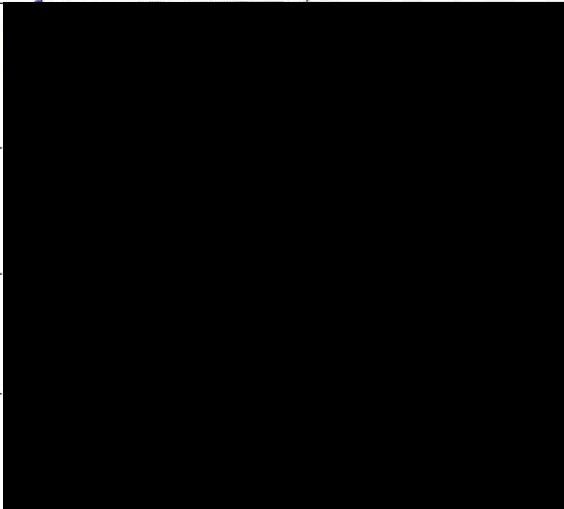



Jan Bukovjan
jednatel společnosti E.PROXIMA, s.r.o.

Technický list změny (TLZ 11)

| | |
|---|---|
| TLZ č./verze: | 11/ver1 |
| Datum předložení TLZ: | Zhotovitel předložil 5. 10. 2023 |
| Smlouva o dílo (SoD) č.: | 186/OVZ/PV/2022 |
| Projekt registrační číslo: | |
| Stavba: | VÍCEÚČELOVÝ OBJEKT PRO VÝUKU A OSVĚTOVOU ČINNOST PŘF UPOL - II. |
| Objekt: | |
| Název změny: | VO + přívod NN ke stávající budově |
| Důvod změny a identifikace původce změny: | |
| <p>Vícepráce vyvolané nutností provést přeložku kabelu NN vedoucí z HDS ke stávajícímu objektu v areálu Botanické zahrady PŘF UPOL, který se v prostoru Stavby neměl nacházet.</p> <p>Dále tento změnový list obsahuje náklady spojené s přeložením veřejného osvětlení (VO), neboť při zahájení prací na přeložení byl ze strany Technických služeb města Olomouce, a.s. (TSMO) vznesen požadavek, aby stávající hliníkový kabel mezi jednotlivými svítidly VO, vedený v areálu Botanické zahrady PŘF UPOL, byl nahrazen měděným kabelem včetně nového zemního pásu s tím, že TSMO dodá stožáry a svítidla VO, které budou i nadále v jejich správě. Tato práce byly provedeny, abychom v budoucnu eliminovali další rekonstrukce a zásahy na VO, které by poté narušili provoz objektů v areálu Botanické zahrady PŘF UPOL.</p> <p>Jedná se o změny, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 4).</p> | |
| Popis změny: | |
| <p>Těmito vyvolanými změnami a požadavky vznikla vícepráce ve výši 22 438,25 Kč</p> <p>Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 4). Hodnota změny nepřekročí 15% původní hodnoty závazku dle § 222 ZZVZ, odst. 4.</p> | |
| Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): | |
| <p>Projektant souhlasí s navrženou optimalizací projekčního řešení stavby, uvedené řešení je v souladu s dodržáním původního návrhu stavby technicky a technologicky nezbytné provést.</p> | |
| Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): | |
| <p>Změna nemá vliv do žádných navazujících profesí.</p> | |
| Přílohy: | |

Příloha č. 1 – Změnový list č. 11 – VO + přívod NN ke stávající budově

| | | |
|---|-------------------|--------------|
| Časový dopad oproti původnímu řešení: | Bez dopadu | |
| Orientační cenový dopad: | Odpočet: | 0 Kč |
| | Přípočet: | 22 438,25 Kč |
| | Celkem: | 22 438,25 Kč |
| Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.: | 1 | |

| | Jméno a příjmení | Datum | Podpis | Razítko |
|--------------------------|---|----------------|--|----------------|
| Za objednavatele: |  Univerzita Palackého v Olomouci – PŘF | 31.10. 2023 |  | |
| Za TDI: |  | | | |
| Za projektanta: |  Atelier Polách & Bravenec s.r.o. | | | |
| Za zhotovitele: |  E.PROXIMA, s.r.o. | | | |

ROZPOČET

Stavba: Víceúčelový objekt pro výuku a OČ PŘF UPOL - II

Objekt: Dodatek č.4

Část: ZL č.11 - VO + přívod NN ke stávající budově

Objednatel: Univerzita Palackého Olomouc

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o.

Místo: Olomouc

Zpracoval: XXXXXXXXXX

Datum: 5. 10. 2023

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

PSV Práce a dodávky PSV 22 438,25 0,000

11 Zemní práce pro nové stožáry 6 480,00 0,000

| | | | | | | | |
|---|-----------|--|-----|-------|----------|----------|-------|
| 1 | 460050704 | Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině tř 4 | kus | 2,000 | 700,00 | 1 400,00 | 0,000 |
| 2 | 460070255 | Základové patky pro osazení stožáru | kus | 2,000 | 980,00 | 1 960,00 | 0,000 |
| 3 | 28611335 | Trubka kanalizace plastová KGEM-250x1000 mm SN8 - D+M | kus | 2,000 | 1 560,00 | 3 120,00 | 0,000 |

111 Přeložení přívodu NN pro stávající objekt 4 434,00 0,000

| | | | | | | | |
|---|-----------|--|----|-------|--------|----------|-------|
| 4 | 132251101 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 | m3 | 3,200 | 980,00 | 3 136,00 | 0,000 |
| 5 | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 3,200 | 25,00 | 80,00 | 0,000 |
| 6 | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 2,000 | 145,00 | 290,00 | 0,000 |
| 7 | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny | m3 | 1,000 | 220,00 | 220,00 | 0,000 |
| 8 | 58337344 | šterkopisek frakce 0/32 | t | 2,000 | 354,00 | 708,00 | 0,000 |

741 Elektroinstalace - veřejné osvětlení 7 327,43 0,000

| | | | | | | | |
|----|---------------|--|-----|--------|----------|----------|-------|
| 9 | 741375833 | Demontáž svítidla průmyslového výbojkového venkovního na stožáru přes 3 m se zachováním funkčnosti | kus | 2,000 | 386,97 | 773,94 | 0,000 |
| 10 | 741373002 | Montáž svítidlo výbojkové na výložník / stožár | kus | 2,000 | 435,34 | 870,68 | 0,000 |
| 11 | 35416011150 | drát D 10mm FeZn - pro 2 stožáry | kg | 4,000 | 80,30 | 321,20 | 0,000 |
| 12 | 748719211 | Montáž stožár osvětlení ostatní ocelový samostatně stojící do 12m | kus | 2,000 | 580,46 | 1 160,92 | 0,000 |
| 13 | 748741000 | Montáž elektrovýzbroj stožáru 1 okruh | kus | 2,000 | 290,23 | 580,46 | 0,000 |
| 14 | 741410003 | Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm na povrchu - pro 2 stožáry | m | 6,000 | 29,02 | 174,12 | 0,000 |
| 15 | 741122611.12 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY) ve sloupu pro 3 světla | m | 20,000 | 30,96 | 619,20 | 0,000 |
| 16 | 34103000175.1 | kabel CYKY-J 3x1,5 ve sloupu pro 3 světla | m | 20,000 | 15,48 | 309,60 | 0,000 |
| 17 | | Příložkové oko 50 | kš | 3,000 | 96,05 | 288,15 | 0,000 |
| 18 | | Trubka monoflex 1432 ve stožárech | m | 6,000 | 13,56 | 81,36 | 0,000 |
| 19 | | Montáž trubky monoflex ve stožárech | m | 6,000 | 11,30 | 67,80 | 0,000 |
| 20 | Pol4 | dmtž stávajících stožárů | ks | 2,000 | 1 040,00 | 2 080,00 | 0,000 |

venkovního osvětlení z důvodu zabezpečení

D2 osvětlení Zamenhofovy ul 4 196,82 0,000

| | | | | | | |
|----|---------------------------|-----|-------|--------|----------|-------|
| 21 | Montážní práce | hod | 6,000 | 386,46 | 2 318,76 | 0,000 |
| 22 | Krabice Scabox 240x190x90 | ks | 2,000 | 256,51 | 513,02 | 0,000 |
| 23 | kabelová vývodka M32 | ks | 4,000 | 36,16 | 144,64 | 0,000 |
| 24 | svorkovnice Hlak 25-4/8 | ks | 2,000 | 327,70 | 655,40 | 0,000 |
| 25 | podružný materiál | ks | 1,000 | 565,00 | 565,00 | 0,000 |

Celkem 22 438,25 0,000

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Víceúčelový objekt pro výuku a OČ PŘF UPOL - II

Objednatel: Univerzita Palackého Olomouc

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o.

Místo: Olomouc

| Kód | Zakázka | Cena bez DPH | Milník č. 5 | Milník č.6 |
|--------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| Dodatek č.4 | Dodatek č.4 | 178 141,52 | 61 570,87 | 116 570,65 |
| 07 | ZL č.7 - elektroinstalace - změny rozvaděč RE, RH, topné kabely.. | 80 743,90 | 80 743,90 | |
| 08 | ZL č.8 - přípojka optokabelu | 26 443,00 | | 26 443,00 |
| 09 | ZL č.9 - odstranění pařezů | 43 990,00 | | 43 990,00 |
| 10 | ZL č.10 - vodoměrná šachta | 13 168,00 | | 13 168,00 |
| 11 | ZL č.11 - VO + přívod NN ke stávající budově | 22 438,25 | | 22 438,25 |
| 12 | ZL č.12 - úprava uličního oplocení a u vitrín | 41 928,32 | | 41 928,32 |
| 13 | ZL č.13 - branka k venkovnímu schodišti | 5 175,00 | | 5 175,00 |
| 14 | ZL č.14 - kazetový podhled | -14 199,03 | -14 199,03 | |
| 15 | ZL č.15 - neprováděné práce | -41 545,92 | -4 974,00 | -36 571,92 |
| | Celkem | 178141,52 | 0,00 | 0,00 |
