

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

na zhotovení stavby „na zhotovení stavby „Rekonstrukce trafostanice a náhradního zdroje DA – dodávka a servis“

kterou podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník uzavřely 13.4.2023 tyto smluvní strany:

Název: **Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace**
Sídlo: Purkyňova 235/36, Nosálovice, 682 01 Vyškov
Zastoupený: JUDr. Zdeňkem Horákem, MBA – ředitelem Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace ve věcech smluvních.
IČO: 00839205
DIČ: CZ00839205
(dále jen „objednatel“)

Název: **PRONIX s.r.o.**
Sídlo: Praha 3, U Kněžské louky 28 č.p. 2145, PSČ 130 00
Zastoupený: Lenkou Vachatovou, MBA, prokuristkou
IČO: 48027944
DIČ: CZ48027944
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, v odd. C, č. vl. 14430

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Předmět dodatku

1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 13.4.2023 Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“ nebo „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je mimo jiné rekonstrukce stávající trafostanice a stávajícího náhradního zdroje v areálu Nemocnice Vyškov p.o. (dále též jen „dílo“), a to dle dokumentace vyhotovené společností ENERGOPRO s.r.o, Na výhoně 475, 664 52 Sokolnice, IČ: 293 62 776, (dále jen „projektová dokumentace“).

1. Smluvní strany uzavírají v souladu s ustanovením odst. 4 § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“ nebo „dodatek č. 1“).

Zdůvodnění: Z důvodů na straně objednatele se smluvní strany dohodly na těchto změnách uzavřené smlouvy o dílo spočívajících ve změně předmětu smlouvy o dílo z toho vyplývající změny ceny za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy, včetně změny dílčích termínů plnění předmětu smlouvy:

- a) Změna předmětu smlouvy spočívající v těchto změnách plnění ve smlouvě dohodnutého díla podrobně popsanych v těchto změnových listech, které tvoří přílohu č.1 této smlouvy:

ZL 1	170.824,00 Kč bez DPH
ZL 2	43.306,30 Kč bez DPH
ZL 3	21.110,00 Kč bez DPH
ZL 4	31.300,00 Kč bez DPH
ZL 5	99.463,02 Kč bez DPH
ZL 6	5.280,00 Kč bez DPH
ZL 7	- 51.354,80 Kč bez DPH - méněpráce

- b) Změna ceny za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle uzavřené smlouvy. V souvislosti se změnami předmětu smlouvy uvedenými pod písm. a) tohoto bodu se ruší ustanovení bodu č. 1 článku „VI. Cena“ uzavřené smlouvy a nahrazuje se takto:

Nové znění bodu č. 1 článku VI. Cena

1. **Cena za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy se sjednává na částku 14.501.831,52 Kč bez DPH.**

Sazba DPH 21 % Cena DPH 3.045.384,62 Kč.

II.

Závěrečná ujednání

1. Všechna ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany tímto prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo nemá za následek podstatnou změnu závazku z uzavřené smlouvy o dílo.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že je dodatek podepisován smluvními stranami v různém čase, nabývá platnosti dnem podpisu té smluvní strany, která ho podepíše později.
4. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede objednatel.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění postupem dle zákona o registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek zveřejněn do tří měsíců ode dne, kdy byl uzavřen, platí, že je zrušen od počátku.
6. Smluvní strany se s obsahem tohoto dodatku smlouvy seznámily a souhlasí s ním.

Příloha č. 1 dodatku smlouvy:

- Změnový list ZL_01
- Změnový list ZL_02
- Změnový list ZL_03
- Změnový list ZL_04
- Změnový list ZL_05
- Změnový list ZL_06
- Změnový list ZL_07

Ve Vyškově dne 5. 11. 2023

Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
Purkyňova 36, 682 01 Vyškov
DIČ: CZ00839205
tel: +420 517 315 118 | 195

za Nemocnicí Vyškov p.o.
JUDr. Zdeněk Horák MBA,
ředitel nemocnice

V Praze dne 2. 11. 2023




zhotovitel
za PRONIX s.r.o.
Lenka Vachatová, MBA
prokurista

PRONIX s.r.o.
Office park Hrochův, budova D
Poděbránská 55/190, Praha 3, 198 00
Tel: +420 244 610 256-9 | DIČ: CZ 18027944
Fax: +420 246 314 117 | www.pronix.cz

Více než 30 let

Má zkušenost

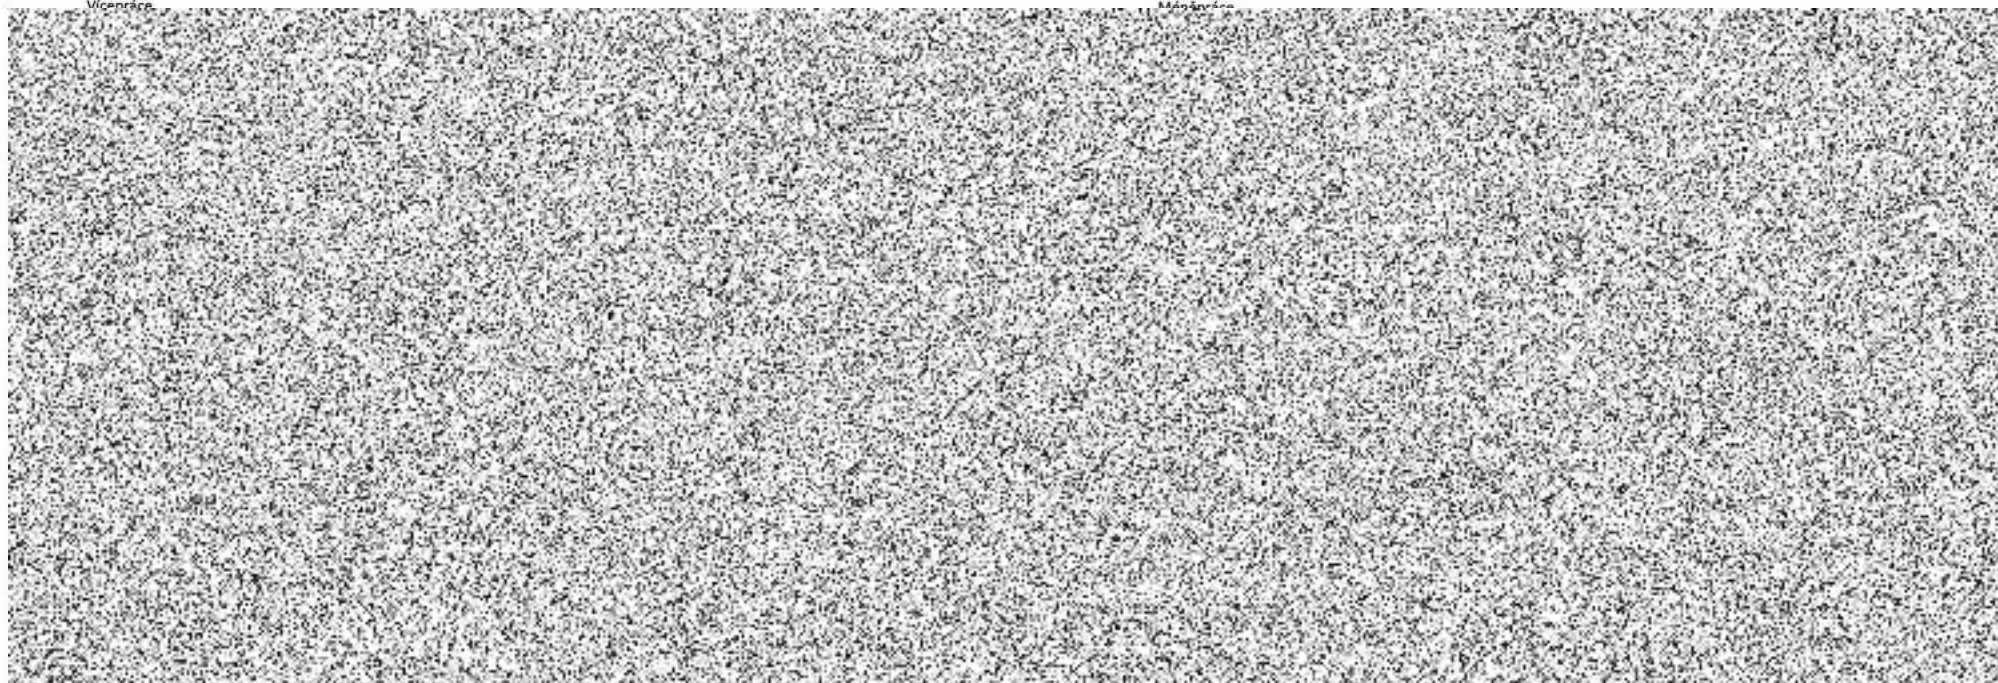

PRONIX s.r.o.
Office park Hloubětín, budova D
Peděbradská 55/58, Praha 9, 198 00
Tel: +420 284 510 254-9 DČ: CZ 4607944
Fax: +420 226 314 117 | www.pronix.cz

Projekt:	Rekonstrukce trafostanice a výměna DA	
Objednatel:	Nemocnice Vyškov, p.o.	
Předmět:	Změnový list	001

Komu: Nemocnice Vyškov, p.o.

Od: PRONIX S.R.O.

Stavební Objekt: Hlavní trafostanice

Předmět změny: Vícepráce v rámci rekonstrukce trafostanice a výměna DA

Zádost o změnu vznesl: PRONIX S.R.O.


Důvod změny: Vyžádané práce mimo rozpočet v rámci realizace zakázky "Rekonstrukce trafostanice a výměny DA"

Časové ohodnocení: Bez dopadu do času **Dopad do celkových termínů:** NE

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

PRÁCE PROVEDENÉ NAD RAMEC ROZPOCTU

Montáže RHP - montáže a demontáže v rámci
přepojovacích prací hod
Rozdíl NSGAFOU 1x240 (42m), vč. pokládky - rozdíl délek m
oproti VV m
Pokládka kabeláže NSGAFOU 1x240 pro jednotlivé etapy m
připojení RHP. Je účtována pouze pokládka za sníženou
cenu.



Celková předpokládaná cena

Celková cena díla dle SOD bude tímto ZL překročena.

Oznámil za zhotovitele



Převzal z



Datum a podpis:

7.11.23

PRONIX S.R.O.

Datum a podpis:

Office park Hrozbetín, budova 17
Předbrzdská 55/90 Praha 3, 198 00
Tel: +420 284 810 258-9 DIČ: CZ 48027914
Fax: +420 2 6 314 117 | www.pronix.cz

Projekt:	Rekonstrukce trafostanice a výměna DA	
Objednatel:	Nemocnice Vyškov, p.o.	
Předmět:	Změnový list	002

Komu: Nemocnice Vyškov, p.o.

Od: PRONIX S.R.O.

Stavební Objekt: Hlavní trafostanice

Předmět změny: Vícepráce v rámci rekonstrukce trafostanice a výměna DA

Zádost o změnu vznesl: PRONIX S.R.O.


Důvod změny: Vyžádané práce mimo rozpočet v rámci realizace zakázky "Rekonstrukce trafostanice a výměny DA"

Časové ohodnocení: Bez dopadu do času **Dopad do celkových termínů:** NE

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

PRACE PROVEDENE NAD RÁMEC ROZPOCTU

Opravy omítek - trafokobky	m2	119
Nátěry, odrezivění, odmaštění dveří trafokobek	m2	36
Oprava vrat, vč. výměny zámků + klik	ks	2
Venkovní světlo nad trafokobkou, vč. montáže, vypínače	ks	2
Nátěr stávajících konstrukcí v trafokobkách, vč. barvy	kpl	1



Celková předpokládaná cena

Celková cena díla dle SOD bude tímto ZL překročena.

Oznámil za zhotovitele



Datum a podpis: 7. 11. 23

PRONIX S.R.O.
 Office park Hloubětín, budova D
 Tel: +420 284 510 254-5 | DIČ: CZ 41027944
 Fax: +420 284 314 112 | www.pronix.cz



	Projekt:	Rekonstrukce trafostanice a výměna DA	
	Objednatel:	Nemocnice Vyškov, p.o.	
	Předmět:	Změnový list	003

Komu: Nemocnice Vyškov, p.o.

Od: PRONIX S.R.O.

Stavební Objekt: Hlavní trafostanice

Předmět změny: Vícepráce v rámci rekonstrukce trafostanice a výměna DA

Zádost o změnu vznesl: PRONIX S.R.O.


Důvod změny: Vyžádané práce mimo rozpočet v rámci realizace zakázky "Rekonstrukce trafostanice a výměny DA"

Casové ohodnocení: Bez dopadu do času **Dopad do celkových termínů:** NE

SPECIFIKACE ZMENY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

PRÁCE PROVEDENÉ NAD RAMEC ROZPOCTU

Dočasná konfigurace MG	kpl	1
PHM (Dodávka - srpen 2023)	l	500



Celková předpokládaná cena

Celková cena díla dle SOD bude tímto ZL překročena.

Oznámil za zhotovitele



Datum a podpis: 7. 11. 23

PRONIX
 Office park Hloubětín, budova D
 152 00 Praha 5 - Břevnov
 Tel: +420 264 610 234-9 E-mail: cz.pronix@prn.cz
 Fax: +420 266 316 112 | www.pronix.cz



	Projekt:	Rekonstrukce trafostanice a výměna DA	
	Objednatel:	Nemocnice Vyškov, p.o.	
	Předmět:	Změnový list	004

Komu: Nemocnice Vyškov, p.o.

Od: PRONIX S.R.O.

Stavební Objekt: Hlavní trafostanice

Předmět změny: Vícepráce v rámci rekonstrukce trafostanice a výměna DA

Žádost o změnu vnesl: PRONIX S.R.O.

Důvod změny: Vyžádané práce mimo rozpočet v rámci realizace zakázky "Rekonstrukce trafostanice a výměny DA"

Časové ohodnocení: Bez dopadu do času **Dopad do celkových termínů:** NE

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

PRÁCE PROVEDENE NAD RAMEC ROZPOCTU

Změna pole měření VN - dle požadavku investora s ohledem na budoucí instalaci FVE - je ve fázi nacenění dodavatelem technologie.

kpl 1



Celková předpokládaná cena

Celková cena díla dle SOD bude tímto ZL překročena.

Oznámil za zhotovitele



Pre



Datum a podpis: 7. 11. 23

PRONIX
 s.r.o.
 Pěchábrdská 55/56, Praha 9, 190 00
 Tel: +420 284 510 258-9, DYC: CZ 18027944
 Fax: +420 226 314 117 | www.pronix.cz

Da

Projekt:	Rekonstrukce trafostanice a výměna DA	
Objednatel:	Nemocnice Vyškov, p.o.	
Předmět:	Změnový list	005

Komu: Nemocnice Vyškov, p.o.

Od: PRONIX S.R.O.

Stavební Objekt: Hlavní trafostanice

Předmět změny: Vícepráce v rámci rekonstrukce trafostanice a výměna DA

Zádost o změnu vznesl: PRONIX S.R.O.


Důvod změny: Vyžádané práce mimo rozpočet v rámci realizace zakázky "Rekonstrukce trafostanice a výměny DA"

Casové ohodnocení: Bez dopadu do času **Dopad do celkových termínů:** NE

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

PRÁCE PROVEDENE NAD RAMEC ROZPOČTU

Zápůjčka MG při odstávce EG.D, vč. dopravy, obsluhy a trvalého dohledu	kpl	1
Doplnění PHM 663I po odstávce EG.D (listopad 2023) - doplnění do 93% stavu nádrže	I	663



Celková předpokládaná cena

Celková cena díla dle SOD bude tímto ZL překročena.

Oznámil za zhotovitele



Datum a podpis: 7.11.23

PRONIX S.R.O.
 Office: park Hloučebín, budova D
 Průmyslová 500, 682 01 Vyškov
 Tel: +420 284 810 254-9 | DIC: CZ 406279-41
 Fax: +420 284 814 117 | www.pronix.cz



Projekt:	Rekonstrukce trafostanice a výměna DA	
Objednatel:	Nemocnice Vyškov, p.o.	
Předmět:	Změnový list	006

Komu: Nemocnice Vyškov, p.o.

Od: PRONIX S.R.O.

Stavební Objekt: Hlavní trafostanice

Předmět změny: Vícepráce v rámci rekonstrukce trafostanice a výměna DA

Zádst o změnu vznesl: PRONIX S.R.O.

Důvod změny: Vyžádané práce mimo rozpočet v rámci realizace zakázky "Rekonstrukce trafostanice a výměny DA"

Casové ohodnocení: Bez dopadu do času **Dopad do celkových termínů:** NE

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

PRÁCE PROVEDENÉ NAD RAMEC ROZPOCTU

Připojení kabelů (rezerv) pro objekt polikliniky hod 8

Celková předpokládaná cena

Celková cena díla dle SOD bude tímto ZL překročena.

Oznámil za zhotovitele

Datum a podpis:

7.11.23

PRONIX
 Office park Hloubětín, budova D
 Pstolná ul. 2178, Praha 2, 108 00
 Tel: +420 284 510 229-9 (přímá linka)
 Fax: +420 226 319 112 | www.pronix.cz

Podpis zhotovitele

	Projekt:	Rekonstrukce trafostanice a výměna DA	
	Objednatel:	Nemocnice Vyškov, p.o.	
	Předmět:	Změnový list	007

Komu: Nemocnice Vyškov, p.o.

Od: PRONIX S.R.O.

Stavební Objekt: Hlavní trafostanice

Předmět změny: Méněpráce v rámci rekonstrukce trafostanice a výměna DA

Zádost o změnu vznesl: PRONIX S.R.O.

Důvod změny: Nerealizované položky z VV

Casové ohodnocení: Bez dopadu do času **Dopad do celkových termínů:** NE

SPECIFIKACE ZMENY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

PRÁCE PROVEDENÉ NAD RAMEC ROZPOCTU

33 Pojezdové kolejnice pod transformátory-	ks	4
30 Pojezdové kolejnice pod transformátory-montáž:	kg	187,6

Celková předpokládaná cena

Celková cena díla dle SOD NEBUDE tímto ZL překročena.

Oznámil za zhotovitele

Datum a podpis: 7. 11. 25

PRONIX s.r.o.
 Office park Hloubětín, budova D
 Praha 10, ul. Hloubětínská 100, 100 00
 Tel: +420 284 810 256-9 | DIČ: CZ 48022944
 Fax: +420 226 314 317 | www.pronix.cz
