



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje				
EVIDENCE SMLUV				
HMSK	SML	poř. číslo	rok	dobu plnění
Ev. číslo v SSD				

### I. Smluvní strany

#### Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Zastoupený: brig. gen. Ing. Radimem Kuchařem, ředitelem HZS Moravskoslezského kraje

IČO: 70884561

DIČ: CZ70884561 (není plátcem DPH)

Bankovní spojení: ČNB Ostrava, číslo účtu: 1933881/0710

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

mail:

(dále jen „objednatel“)

a

#### IPS Třinec, a.s.

Sídlo: Frýdecká 225, 739 61 Třinec

IČO: 28618891

DIČ: CZ28618891

Zastoupená:

Bankovní spojení: KB, a.s., Ostrava, č. účtu: 8903781/0100

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. B, vl. 4287

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel“)

### II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 16.11.2022 smlouvu o dílo (ev. č. objednatele HMSK/SML/493/2022), ve znění dodatku č. 1 ze dne 03.07.2023, jejímž předmětem je výstavba Integrovaného výjezdového centra Kopřivnice (dále jen „IVC Kopřivnice“) včetně dalších navazujících stavebních objektů, technického a technologického zařízení podle projektové dokumentace a dalších podkladů (dále jen „smlouva o dílo“).
2. V návaznosti na zjištění, že v závazném stanovisku Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství pro realizaci díla je požadováno rozproštění ornice, které nebylo ve smlouvě o dílo zahrnuto, zhotovitel provede rozproštění ornice na pozemky parc. č. 812/21 a 812/26 v k. ú. Vlčovice v celkovém objemu 2 416,988 m<sup>3</sup>, jak je specifikováno ve změnovém listu č. 6 v příloze č. 1 tohoto dodatku. Dále bylo zjištěno, že část navržených železobetonových konstrukcí sloupů v 1. NP přesahuje výšku 4 m, ačkoli ve smlouvě o dílo bylo počítáno s bedněním sloupů pouze do výšky 4 m, proto bylo původní



bednění sloupů nahrazeno bedněním sloupů nad 4 m a provedena s tím spojená demontáž bednění (viz změnový list č. 7 v příloze č. 1 tohoto dodatku). Z důvodu zjištěné absence výkresu výztuže v projektové dokumentaci díla došlo k celkové aktualizaci výkresů tvarů a výztuže jímky a pracovní spáry byly doplněny řízenými pracovními spárami opatřenými těsnicím plechem, jak vyplývá ze změnového listu č. 9 v příloze č. 1 tohoto dodatku. Na základě provozních zkušeností objednatele a současně z důvodu úspory finančních prostředků byla provedena změna v provedení soklu podlah prováděných epoxidovou stěrkou ve všech takto provedených prostorách objektu SO01 (viz změnový list č. 14 v příloze č. 1 tohoto dodatku). Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), se jedná o změny závazku ze smlouvy podle § 222 odst. 4 ZZVZ. Dále bylo zjištěno, že je nutná změna technologie napojení prodloužení plynu IO 12.1. na stávající STL plynovod DN225 – PE, jak vyplývá ze změnového listu č. 8 v příloze č. 1 tohoto dodatku, přičemž dle ZZVZ se jedná o změnu podle § 222 odst. 5 ZZVZ. V souvislosti se zjištěním reálné hladiny spodní vody při výkopu automatických čerpacích stanic a zvýšeného nátoků srážek do výkopu jámy budou původně navrhované plastové nádrže a odlučovače lehkých kapalin nahrazeny prefabrikovanými (viz změnový list č. 10 v příloze č. 1 tohoto dodatku). Z důvodu provádění bednění železobetonových hlavic v objektu SO01 je potřeba doplnit podkladní betony, na které bude provedeno bednění hlavic, a v návaznosti na provádění železobetonové stropní konstrukce I.NP v ose R-M a nutnosti provést stojky celoplošného bednění, které nemohou být umístěny na násypy, byla doplněna podkladní betonová deska, jak vyplývá ze změnového listu č. 11 v příloze č. 1 tohoto dodatku. Z důvodu zachování navrhované tloušťky stropních panelů a v souladu s požadavky na statickou nosnost konstrukce byly volné konce stropních panelů objektu SO01 podpořeny ocelovou konstrukcí (viz změnový list č. 12 v příloze č. 1 tohoto dodatku). Poslední změnou je změna dimenze potrubí plynové přípojky a HUP skříňně v návaznosti na zjištění, že původní projektové řešení je pro zásobování plynu objektu SO01 a SO02 nedostatečné, jak vyplývá ze změnového listu č. 13 v příloze č. 1 tohoto dodatku. Z pohledu ZZVZ se jedná o změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ.

- Vzhledem k tomu, že změny dle odst. 2 tohoto bodu jsou nutné k řádnému provedení díla, dohodly se smluvní strany na provedení dodatečných stavebních prací (víceprací) a současně na rozsahu prací uvedených ve smlouvě, které nebudou provedeny (méněpráce), které jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku. V tomto rozsahu se mění také smlouva o dílo a specifikace díla v této smlouvě uvedená.
- Vzhledem k ceně víceprací a méněprací specifikovaných v příloze č. 1 tohoto dodatku se mění celková cena díla uvedená v bodu VI. odst. 1 smlouvy o dílo, který nově zní takto:

**Cena za provedené dílo podle projektové dokumentace a dalších podkladů podle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:**

<b>Cena bez DPH</b>	<b>190 514 568,39 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>40 008 059,38 Kč</b>
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>230 522 627,77 Kč</b>

- V návaznosti na nutné provedení rozprostření ornice v souladu se změnovým listem č. 6 příloze č. 1 tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu plnění o 15 dnů nutných k uzavření dohody s vlastníky dotčených pozemků. S ohledem na nahrazení



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

původně navrhovaných plastových nádrží a odlučovačů lehkých kapalin prefabrikovanými dle změnového listu č. 10 v příloze č. 1 tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu plnění o 30 dnů, neboť provedená záměna musela být posouzena a potvrzena odborem životního prostředí včetně zpracování podkladu pro záměnu. S ohledem na provedení změny dimenze potrubí plynové přípojky a HUP skříně v souladu se změnovým listem č. 13 v příloze č. 1 tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu plnění o 15 dnů. Celkové prodloužení termínu plnění na základě změn uvedených v tomto odstavci činí 60 dnů. Smluvní strany se proto v této souvislosti dohodly na změně odst. 3 v bodě V. smlouvy o dílo, který nově zní takto:

**Zhotovitel je povinen realizovat dílo nejpozději do 01.02.2024.**

6. Z důvodu změny termínu plnění se smluvní strany rovněž dohodly na změně harmonogramu stavebních prací, přičemž jeho aktuální podoba je uvedena v příloze č. 2 tohoto dodatku.
7. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

### III. Ostatní ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující tento dodatek jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsaný dodatek druhé smluvní straně.
2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jeho uveřejněním v plném rozsahu. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany uzavírají tento dodatek v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou použity pouze pro účely plnění tohoto dodatku a při uveřejnění dodatku budou anonymizovány.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – změnové listy ZL 06 - 14 a soupisy víceprací a méněprací a příloha č. 2 - harmonogram stavebních prací.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR


Podpisy smluvních stran:

za objednatele



bríg. gen. Ing. Radim Kuchař  
ředitel  
HZS Moravskoslezského kraje

za zhotovitele

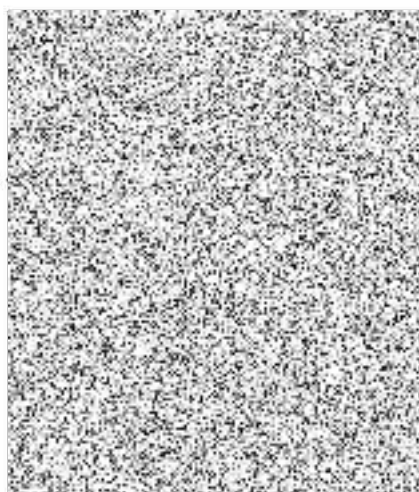

**Změnový list**  
**pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace**

<b>Změnový list číslo</b>	ZL 06
<b>Identifikace akce:</b>	
Název akce:	<b>Integrované výjezdové centrum Kopřivnice</b>
Číslo akce EDS/SMVS:	CZ.06.6.127 /0 .0/0.0/21_119/00168 18
Objednatel:	Česká republika – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh
Zhotovitel:	IPS Třinec, a.s., Frýdecká 225, 739 61 Třinec
Projektant:	PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Opavská 6230/29 A, Ostrava-Poruba
<b>Předmět změnového listu:</b>	
Rozproštění ornice na pozemky parc. č. 812/21 a 812/26 v k.ú. Vlčovice.	
<b>Část díla dotčená změnovým listem:</b>	
IO11 Sadové a terénní úpravy, mobiliář	
<b>Popis změny, popis technického řešení:</b>	
<b>Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:</b>	
Na základě závazného stanoviska Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, Krajského úřadu v Ostravě č.j. MSK 174155/2019 je požadováno rozproštění ornice o celkovém objemu 2 500 m <sup>3</sup> na parc. č. 812/21 a 812/26 v k.ú. Vlčovice.	
<b>Nové řešení:</b>	
Zhotovitel provede rozproštění ornice na pozemky parc. č. 812/21 a 812/26 v k.ú. Vlčovice v celkovém objemu 2 416,988 m <sup>3</sup> .	
<b>Zdůvodnění změny prováděné v souladu s odst. 4 § 222 ZZVS:</b>	
Rozproštění ornice není v rozpočtu smlouvy o dílo a je podmínkou závazného stanoviska pro realizaci díla. Tato změna bude mít vliv 15 dní na termín dokončení díla z důvodu uzavření dohody s vlastníky pozemku na parc. č. 812/21 a 812/26 v k.ú. Vlčovice.	
<b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci:</b>	
NE	
<b>Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:</b>	
ANO	
<b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:</b>	
Vliv na termín: ANO, 15 dní	
Vliv na kvalitu díla: Ne	
Vliv na cenu: ANO	
<b>Původní hodnota zaměňovaných položek díla bez DPH:</b>	0,00 Kč
<b>Nová hodnota položek díla bez DPH:</b>	220 912,70 Kč
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>	220 912,70 Kč
<b>DPH:</b>	46 391,67 Kč
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:</b>	267 304,37 Kč

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
<b>IPS Třinec, a.s.</b>	<b>PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.</b>	<b>Flagro a.s.</b>
<b>Vedoucí projektu</b>	<b>Autorský dozor a hl. projektant</b>	<b>Technický dozor Investora</b>
Za zhotovitele:	Za investora:	
<b>IPS Třinec, a.s.</b>	<b>ČR – HZS MSZK</b>	
<b>Stavbyvedoucí</b>	<b>Zástupce Investora</b>	
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Integrované výjezdové centrum Kopřivnice

Objekt:

IO11 Sadové a terénní úpravy, mobiliář

Soupis:

**ZR06 Rozprostření ornice**

KSO:

Místo: Kopřivnice

CC-CZ:

Datum: 26.4.2023

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje

IČ: 70884561

DIČ: CZ70884561

Zhotovitel:

IPS Třinec, a.s.

IČ: 28618891

DIČ: CZ28618891

Projektant:

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

IČ: 27787443

DIČ: CZ27787443

Zpracovatel:

IPS Třinec, a.s.

IČ: 28618891

DIČ: CZ28618891

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>220 912,70</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	220 912,70	21,00%	46 391,67
snížená	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>267 304,37</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Integrované výjezdové centrum Kopřivnice

Objekt: IO11 Sadové a terénní úpravy, mobiliář

Soupis: **ZR06 Rozproštění ornice**

Místo: Kopřivnice

Datum: 26.4.2023.

Zadavatel: Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje

Projektant: PROJEKTSTUDIO  
EUCZ, s.r.o.

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s.

Zpracovatel: IPS Třinec, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**220 912,70**

111 - Sadové úpravy

220 912,70

---

111\_1 - Příprava ploch, založení trávníku:

220 912,70

---



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Integrované výjezdové centrum Kopřivnice

Objekt:

IO11 Sadové a terénní úpravy, mobiliář

Soupis:

**ZR06 Rozprostření ornice**

Místo:

Kopřivnice

Datum:

26.4.2023.

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje

Projektant:

PROJEKTSTUDIO  
EUCZ, s.r.o.

Zhotovitel:

IPS Třinec, a.s.

Zpracovatel:

IPS Třinec, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**220 912,70**

D 111

Sadové úpravy

220 912,70

D 111\_1

Příprava ploch, založení trávníku:

220 912,70

2	K	181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	16 113,253	13,71	220 912,70
---	---	-----------	--	----	------------	-------	------------

PP

Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

VV

2416,988/0,15

16 113,253

VV

Součet

16 113,253

## Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

<b>Změnový list číslo</b>	ZL 07
<b>Identifikace akce:</b>	
Název akce:	<b>Integrované výjezdové centrum Kopřivnice</b>
Číslo akce EDS/SMVS:	CZ.06.6.127 /0 .0/0.0/21_119/00168 18
Objednatel:	Česká republika – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh
Zhotovitel:	IPS Třinec, a.s., Frýdecká 225, 739 61 Třinec
Projektant:	PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Opavská 6230/29 A, Ostrava-Poruba
<b>Předmět změnového listu:</b>	
Změna bednění sloupů SO01	
<b>Část díla dotčená změnovým listem:</b>	
SO01 Objekt IVC	
<b>Popis změny, popis technického řešení:</b>	
<b>Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:</b>	
Část navržených železobetonových konstrukcí sloupů v 1.NP jsou rozměrově nad 4 m. Rozpočet smlouvy o dílo obsahuje pouze bednění sloupů do 4 m.	
<b>Nové řešení:</b>	
Bylo provedeno přepočítání bednění sloupů železobetonové konstrukce sloupů v 1.NP a bednění sloupů do 4m nahrazeno bedněním sloupů nad 4 m a s ním spojené demontáž bednění.	
<b>Zdůvodnění změny prováděné v souladu s odst. 4 § 222 ZZVS:</b>	
Bednění sloupů nad 4 m není obsahem rozpočtu smlouvy o dílo a nedopovídá požadavku plynoucí s projektové dokumentace na výšku sloupů nad 4 m.	
<b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci:</b>	
NE	
<b>Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:</b>	
ANO	
<b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:</b>	
Vliv na termín: NE	
Vliv na kvalitu díla: Ne	
Vliv na cenu: ANO	
<b>Původní hodnota zaměňovaných položek díla bez DPH:</b>	618 321,80 Kč
<b>Nová hodnota položek díla bez DPH:</b>	953 089,30 Kč
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>	334 767,50 Kč
<b>DPH:</b>	70 301,18 Kč
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:</b>	405 068,68 Kč

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
IPS Třinec, a.s.	PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.	Flaora a.s.
Vedoucí projektu	Autorský dozor a hl. projektant	Technický dozor Investora
Za zhotovitele:	Za investora:	
IPS Třinec, a.s.	ČR – HZS MSZK	
Stavbyvedoucí	Zástupce Investora	
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Integrované výjezdové centrum Kopřivnice

Objekt:

SO01 Objekt IVC

Soupis:

**ZR07 Změna bednění sloupů SO01 nad 4 m**

KSO:

Místo: Kopřivnice

CC-CZ:

Datum: 26.4.2023.

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje

IČ: 70884561

DIČ: CZ70884561

Zhotovitel:

IPS Třinec, a.s.

IČ: 28618891

DIČ: CZ28618891

Projektant:

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

IČ: 27787443

DIČ: CZ27787443

Zpracovatel:

IPS Třinec, a.s.

IČ: 28618891

DIČ: CZ28618891

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>334 767,50</b>
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		334 767,50	21,00%	70 301,18
snižená		0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>405 068,68</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Integrované výjezdové centrum Kopřivnice

Objekt:

SO01 Objekt IVC

Soupis:

**ZR07 Změna bednění sloupů SO01 nad 4 m**

Místo:

Kopřivnice

Datum:

26.4.2023.

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje

Projektant:

PROJEKTSTUDIO  
EUCZ, s.r.o.

Zhotovitel:

IPS Třinec, a.s.

Zpracovatel:

IPS Třinec, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**334 767,50**

HSV - Práce a dodávky HSV

334 767,50

---

3 - Svislé a kompletní konstrukce

334 767,50

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Integrované výjezdové centrum Kopřivnice

Objekt:

SO01 Objekt IVC

Soupis:

ZR07 Změna bednění sloupů SO01 nad 4 m

Místo:

Kopřivnice

Datum:

26.4.2023.

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje

Projektant:

PROJEKTSTUDIO  
EUCZ, s.r.o.

Zhotovitel:

IPS Třinec, a.s.

Zpracovatel:

IPS Třinec, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**334 767,50**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				334 767,50
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				334 767,50

1	K	331351121	Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzeprání průřezu pravouhého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 zřízení	m2	-681,752	765,70	-522 017,51
---	---	-----------	--	----	----------	--------	-------------

PP Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzeprání průřezu pravouhého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 zřízení

2	K	331351122	Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzeprání průřezu pravouhého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 odstranění	m2	-681,752	141,26	-96 304,29
---	---	-----------	---	----	----------	--------	------------

PP Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzeprání průřezu pravouhého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 odstranění

3	K	331351321	Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v přes 4 do 6 m průřezu přes 0,08 do 0,16 m2	m2	681,752	1 280,00	872 642,56
---	---	-----------	--	----	---------	----------	------------

PP Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v přes 4 do 6 m průřezu přes 0,08 do 0,16 m2

vv	R1				21,008		
vv	(0,6+0,4)*2*4,04*1+(0,4+0,4)*2*4,04*2						
vv	R2				111,888		
vv	(0,8+0,4)*2*4,88*3+(0,4+0,4)*2*5,33*9						
vv	R3				40,480		
vv	(0,8+0,4)*2*4,88*2+(0,4+0,4)*2*5,33*2						
vv	R4				50,088		
vv	(0,8+0,4)*2*4,88*1+(0,4+0,4)*2*5,33*3+(0,8+0,4)*2*5,33*1						
vv	R5				39,040		
vv	(0,4+0,4)*2*5,33*2+(0,4+0,4)*2*4,58*3						
vv	R6				30,744		
vv	(0,6+0,4)*2*4,38*1+(0,4+0,4)*2*4,58*3						
vv	R7				97,488		
vv	(0,8+0,4)*2*4,38*3+(0,4+0,4)*2*4,58*9						
vv	R8				31,144		
vv	(0,4+0,6)*2*4,58*1+(0,4+0,4)*2*4,58*3						
vv	R9				29,312		
vv	(0,4+0,4)*2*4,58*4						
vv	R10				29,312		
vv	(0,4+0,4)*2*4,58*4						
vv	R11				0,000		
vv	0						
vv	R12				25,856		
vv	(0,4+0,4)*2*4,04*4						
vv	R13				39,040		
vv	(0,4+0,4)*2*5,33*2+(0,4+0,4)*2*4,58*3						
vv	R14				63,200		
vv	(0,4+0,4)*2*4,58*5+(0,4+0,4)*2*4,15*4						
vv	R15				73,152		
vv	(0,4+0,4)*2*5,33*2*2+(0,8+0,4)*2*4,88*2+(0,4+0,4)*2*4,88*2				681,752		
vv	Mezisoučet				681,752		
vv	Součet				681,752		

4	K	331351322	Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v přes 4 do 6 m průřezu přes 0,08 do 0,16 m2	m2	681,752	118,00	80 446,74
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

PP Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v přes 4 do 6 m průřezu přes 0,08 do 0,16 m2

**Změnový list**  
**pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace**

<b>Změnový list číslo</b>	ZL 08
<b>Identifikace akce:</b>	
Název akce:	<b>Integrované výjezdové centrum Kopřivnice</b>
Číslo akce EDS/SMVS:	CZ.06.6.127 /0 .0/0.0/21_119/00168 18
Objednatel:	Česká republika – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh
Zhotovitel:	IPS Třinec, a.s., Frýdecká 225, 739 61 Třinec
Projektant:	PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Opavská 6230/29 A, Ostrava-Poruba
<b>Předmět změnového listu:</b>	
Změna technologie napojení prodloužení plynu IO 12.1. na stávající STL plynovod DN225 - PE.	
<b>Část díla dotčená změnovým listem:</b>	
IO12 Prodloužení plynovodu a plynovodní přípojka	
<b>Popis změny, popis technického řešení:</b>	
<b>Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:</b>	
Napojení mělo být provedeno vsazením odbočky/ redukce T-kus 225/90 do stávajícího STL plynovodu D222 mm. Napojení je řešeno při zachování průtoku ve stávajícím plynovodu, kdy byl proveden na stávajícím potrubí bypass potrubí dimenze D 90 mm.	
<b>Nové řešení:</b>	
Navrtání stávajícího STL plynovodu pomocí navrtávký, přes navrtávací objímku 225/110 se vsazeným zemním šupětem DN 100 S PE konci. Napojení je řešeno při zachování průtoku ve stávajícím plynovodu.	
<b>Zdůvodnění změny prováděné v souladu s odst. 5 § 222 ZZVS:</b>	
Navržená změna byla schválena správcem STP plynovodu D225 - PE a nedojde k přerušení dodávky plynu odběratele. Navržené změna bylo provedena s důvodu úspory a nebyl zhoršeny technické ani technologické vlastnosti.	
<b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci:</b>	
NE	
<b>Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:</b>	
ANO	
<b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:</b>	
Vliv na termín: NE	
Vliv na kvalitu díla: Ne	
Vliv na cenu: ANO	
<b>Původní hodnota zaměňovaných položek díla bez DPH:</b>	242 708,81 Kč
<b>Nová hodnota položek díla bez DPH:</b>	185 240,00 Kč
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>	-57 468,81 Kč
<b>DPH:</b>	-12 068,45 Kč
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:</b>	-69 537,26 Kč

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
<b>IPS Třinec, a.s.</b>	<b>PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.</b>	<b>Flagro a.s.</b>
[redacted]	[redacted]	[redacted]
<b>Vedoucí projektu</b>	<b>Autorský dozor a hl. projektant</b>	<b>Technický dozor Investora</b>
Za zhotovitele:	Za investora:	
<b>IPS Třinec, a.s.</b>	<b>ČR – HZS MSZK</b>	
[redacted]	[redacted]	
<b>Stavbyvedoucí</b>	<b>Zástupce Investora</b>	
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Integrované výjezdové centrum Kopřivnice

Objekt:

IO12 Prodloužení plynovodu a plynovodní přípojky

Soupis:

**ZR08 - Změna technologie napojení plynovodu**

KSO:

Místo: Kopřivnice

CC-CZ:

Datum: 27.09.2023.

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje

IČ:

70884561

DIČ:

CZ70884561

Zhotovitel:

IPS Třinec, a.s.

IČ:

28618891

DIČ:

CZ28618891

Projektant:

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

IČ:

27787443

DIČ:

CZ27787443

Zpracovatel:

IPS Třinec, a.s.

IČ:

28618891

DIČ:

CZ28618891

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>-57 468,81</b>
DPH základní	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
snížená	-57 468,81	21,00%		-12 068,45
	0,00	15,00%		0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>-69 537,26</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Integrované výjezdové centrum Kopřivnice  
Objekt: IO12 Prodloužení plynovodu a plynovodní přípojky  
Soupis: **ZR08 - Změna technologie napojení plynovodu**

Místo: Kopřivnice  
Zadavatel: Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje  
Zhotovitel: IPS Třinec, a.s.

Datum: 27.09.2023.  
Projektant: PROJEKTSTUDIO  
EUCZ, s.r.o.  
Zpracovatel: IPS Třinec, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**-57 468,81**

23-M - Montáže potrubí

**-57 468,81**

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Integrované výjezdové centrum Kopřivnice

Objekt:

IO12 Prodloužení plynovodu a plynovodní přípojky

Soupis:

**ZR08 - Změna technologie napojení plynovodu**

Místo:

Kopřivnice

Datum:

27.09.2023.

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje

Projektant:

PROJEKTSTUDIO  
EUCZ, s.r.o.

Zhotovitel:

IPS Třinec, a.s.

Zpracovatel:

IPS Třinec, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-57 468,81**

D	23-M	Montáže potrubí					-57 468,81
1	K	230201326.11	Vsazení odbočky - red. T-kus 225/90 do stávajícího STL plynovodu D225 mm (provozní tlak 300 kPa)	soubor	-1,000	242 708,81	-242 708,81
	PP		Vsazení odbočky - red. T-kus 225/90 do stávajícího STL plynovodu D225 mm (provozní tlak 300 kPa)				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
	VV		1*1 'Přepočtené koeficientem množství		-1,000		
2	K	230201326.11-R	Propojení nové větve STL plynovodu PE d90 do stávajícího STL plynovodu D225 mm (provozní tlak 300 kPa)	soubor	1,000	185 240,00	185 240,00
	PP		Vsazení odbočky - red. T-kus 225/90 do stávajícího STL plynovodu D225 mm (provozní tlak 300 kPa)				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		



návrat k tradici

## KALKULAČNÍ VZOREC

**Stavba:** Integrované výjezdové centrum Kopřivnice

**Objednatel:** Česká republika – HZS Moravskoslezského kraje  
Výškovická 40, 700 30 Ostrava - Zábřeh

**Zhotovitel:** IPS Třinec, a.s.  
Frýdecká 225, 739 61 Třinec

**Číslo cenové nabídky IPS Třinec, a.s.:** ZL08

**Název cenové nabídky IPS Třinec, a.s.:** Změna technologie napojení prodloužení plynu IO 12.1. na stávající STL

**Název dodavatele:** Plynstav s.r.o.

**Číslo cenové nabídky dodavatele:** ZR01

**Cenová nabídka dodavatele ze dne:** 15.5.2023.

### Kalkulované položky:

Č.	KCN	Kód položky	Popis
2	R	230201326.11-R	Propojení nové větve STL plynovodu PE d90 do stávajícího STL plynovodu D225 mm (provozní tlak 300 kPa)

### Poznámka:

Výše uvedené položky nelze účtovat podle nákladů dle položkové rozpočtu ani použitím sborníku URS nebo RTS, neboť t kalkulačního vzorce.
