



## HRADEC KRÁLOVÉ

STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

### DODATEK č. 8

č. zhotovitele:

č. objednatele: CES 2021/2197

#### Smluvní strany:

1. **Objednatel:** **statutární město Hradec Králové**  
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové  
Zastoupený: Mgr. et Mgr. Pavlínou Springerovou, Ph.D., primátorkou města  
IČO: 00268810  
DIČ: CZ00268810  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové  
č. účtu: 426 511/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

- Ing. Michal Jandík - vedoucí investičního odboru  
- tel. 495 707 680; 725 644 264  
- e-mail: [Michal.Jandik@mmhk.cz](mailto:Michal.Jandik@mmhk.cz)  
Gabriela Aubusová - investiční technik  
- tel. 495 707 683; 731 131 162  
- e-mail: [Gabriela.Aubusova@mmhk.cz](mailto:Gabriela.Aubusova@mmhk.cz)

*dále jen „objednatel“*

a

2. **Zhotovitel:** **VALC, s.r.o.**  
Sídlo: Pražská třída 13/84, 500 04 Hradec Králové  
Zastoupený: Ing. Pavlem Valcem, jednatelem  
IČO: 45537151  
DIČ: CZ45537151  
Spisová značka: C 1677 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové  
ze dne 17. března 1992  
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Hradec Králové  
číslo účtu: 336268/0300

*dále jen „zhotovitel“*

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na tomto dodatku č. 8 ke Smlouvě o dílo ze dne 23.12.2021, ve znění dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a dodatku č. 7 (dále jen „smlouva o dílo“):

## „Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – SO 05, SO 06 a SO 07“

### I.

#### Odůvodnění dodatku

1. Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. II. odst. 5. a čl. V. odst. 3. a 4. smlouvy o dílo, v souladu se Směrnicí Zastupitelstva města Hradec Králové a primátora města č. 1/2019, kterou se stanoví postup města Hradec Králové při zadávání veřejných zakázek, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona na realizaci změny závazku ze smlouvy o dílo, tj. na provedení těchto víceprací a méněprací, které nemění celkovou povahu zakázky, které jsou blíže specifikovány ve změnových listech č. 55, 56, 57 a 58, a které jsou přílohou tohoto dodatku:
  - ZL č. 55 – 1) Na základě upřesnění provozu jednotlivých objektů a dále z důvodu etapizace a možnosti odstavení jednotlivých stavebních objektů od páteřní sítě topení a pitné vody došlo k doplnění uzavíracích armatur. Tím bude umožněn nekonfliktní provoz objektu SO 05 v době rekonstrukce dalších stavebních objektů v rámci školy. 2) Z důvodu kolize umístění radiátorů s projektem interiérů došlo k přesunu instalovaných otopných těles včetně nových rozvodů.
  - ZL č. 56 – Na základě požadavku provozovatele, prostřednictvím investora, došlo ke změně vybavení sociálních místností (WC, koupelny a sprchové kabiny).
  - ZL č. 57 – Z důvodu etapizace projektu a nerušeném provozu stávajících objektů, které nyní neprochází rekonstrukcí nebo jsou již v provozu po rekonstrukci, nebylo možné zajistit funkční a bezpečný vstup na staveniště do objektu SO 05. Z tohoto důvodu a také z následujících provozních důvodů školy budou osazeny nové vchodové dveře do místnosti č. 103 (sklad) v 1.NP v objektu SO 05.
  - ZL č. 58 – Na základě požadavku provozovatele, prostřednictvím investora, nebudou generálním dodavatelem dodány šatní skříně a lavice pro objekt SO 07. Dodání šatních skříní a lavice bude ve vlastní režii provozovatele.
2. Vzhledem k tomu, že předmět díla byl zadán na základě zadávacího řízení v otevřeném nadlimitním řízení pod názvem „Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – SO 05, SO 06 a SO 07“, posoudil objednatel změnu závazku dle tohoto dodatku č. 8 rovněž podle příslušných ustanovení § 222 zákona.
3. Změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku popsané výše v odstavci 1 tohoto dodatku považují smluvní strany za nepodstatné, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jejich hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. **Hodnota změny závazku realizovaná tímto dodatkem dle ust. § 222 odst. 4 zákona činí 111.186,40 Kč bez DPH jako vícepráce, tj. 0,15 % původní hodnoty závazku a dále -77.139,00 Kč bez DPH jako méněpráce, tj. 0,10 % původní hodnoty závazku.**
4. Hodnota změny závazku realizovaná tímto dodatkem dle ust. § 222 odst. 4 zákona pak činí 0,25 % původní hodnoty závazku. Hodnota změny realizovaná tímto dodatkem je nižší než 15 % původní hodnoty závazku a v součtu se změnou realizovanou dle ust. § 222 odst. 4 zákona dodatkem č. 1 (0,09 %), dodatkem č. 2 (0,04 %), dodatkem č. 3

(1,74 %), dodatkem č. 4 (1,71 %), dodatkem č. 5 (0,85 %), dodatkem č. 6 (1,19 %) a dodatkem č. 7 (0,46 %) představuje 6,33 % původní hodnoty závazku.

## II. Předmět dodatku

- V návaznosti na shora specifikované změny závazku se strany dohodly na zrušení odst. 1 v čl. V. smlouvy o dílo „Cena za dílo“ a jeho nahrazení novým úplným zněním takto

*„1. Strany se dohodly, že cena za dílo je stanovena dle položkového rozpočtu z nabídky zhotovitele a činí:*

*Celková cena bez DPH 79.855.864,82 Kč*

*(slovy: sedmdesát devět milionů osm set padesát pět tisíc osm set šedesát čtyři korun českých a osmdesát dva haléřů)*

*DPH ve 21 % 16.769.731,61 Kč*

*Celková cena s DPH 96.625.596,43 Kč*

*Plátce DPH Statutární město Hradec Králové, jako příjemce plnění (objednatel), které je předmětem smlouvy a které odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2015, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty.*

*V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH, Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit poskytovatel plnění, tj. zhotovitel.*

*Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.“*

	Vícepráce	méněpráce	zohlednění inflace v Kč bez DPH	celkem v Kč bez DPH
Smlouva o dílo				76.166.055,66 Kč
Dodatek č. 1	2.328.848,45 Kč	-2.437.731,73 Kč		-108.883,28 Kč
Dodatek č. 2	951.856,77 Kč	-415.557,85 Kč		536.298,92 Kč
Dodatek č. 3	1.177.470,81 Kč	-868.345,88 Kč		309.124,93 Kč
Dodatek č. 4			1.300.000 Kč	1.300.000,00 Kč
Dodatek č. 5	1.227.127,31 Kč	-376.532,61 Kč		850.594,70 Kč
Dodatek č. 6	1.520.780,18 Kč	-1.257.425,58 Kč		263.354,60 Kč
Dodatek č. 7	1.142.141,29 Kč	-636.869,40 Kč		505.271,89 Kč
Dodatek č. 8	111.186,40 Kč	-77.139,00 Kč		34.047,40 Kč
Celkem bez DPH	8.459.411,21 Kč	-6.069.602,05 Kč	1.300.000 Kč	79.855.864,82 Kč

### III.

#### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v dosud platném znění.
2. Uzavření tohoto Dodatku č. 8 schválilo Zastupitelstvo města Hradec Králové dne 07.11.2023 usnesením č. ZM/2023/501.
3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
4. Smluvní strany prohlašují, že na dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
5. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
6. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění. Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
7. Přílohou tohoto dodatku č. 8 jsou změnové listy č. 55, 56, 57 a 58. S ohledem na rozsah této přílohy nebudou tvořit nedílnou součást tohoto dodatku č. 8.
8. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:
  - identifikace smluvních stran:  
statutární město Hradec Králové,  
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové  
IČO: 00268810  
ID datové schránky: bebb2in  
a  
VALC, s.r.o.,  
Pražská třída 13/84, 500 04, Hradec Králové,  
IČO: 45537151  
ID datové schránky: d5t9nnu
  - vymezení předmětu dodatku: Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo – „Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – SO 05, SO 06 a SO 07“ – vícepráce a méněpráce, změna ceny díla
  - cena: + 34.047,40 Kč bez DPH
  - datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranoupovažují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.
9. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.


10. Smluvní strany tímto prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

**Příloha**


Změnové listy č. 55, 56, 57, 58

29. 11. 2023

V Hradci Králové dne .....




.....  
za objednatele  
Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.  
primátorka města





22. 11. 2023

V Hradci Králové dne .....



za zhotovitele  
Ing. Pavel Valc  
jednatel společnosti





WILLIAM S. BERRY  
BERRY & BERRY  
ATTORNEYS AT LAW  
1000 BROADWAY  
NEW YORK, N.Y. 10018

STATE OF NEW YORK  
COUNTY OF NEW YORK  
JULY 10 1972  
RECEIVED  
CLERK OF THE SUPREME COURT  
1000 BROADWAY  
NEW YORK, N.Y. 10018

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 55
Název projektu:	Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – So 05, SO 06 a SO 07	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové	
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, Hradec Králové	
Změnový list vystavil:	[redacted]	
Datum:	09.10.2023	
Předmět změny:	Doplnění ZTI a přesun ÚT	
<p><b>Projekční (původní) řešení:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Projektová dokumentace nepočítala s možností oddělení (odstavení) jednotlivých stavebních objektů od pátevní sítě.</li> <li>2) Projektant nedisponoval projektem interiérů.</li> </ol> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Na základě upřesnění provozu jednotlivých objektů a dále z důvodu etapizace a možnosti odstavení jednotlivých stavebních objektů od pátevní sítě topení a pitné vody došlo k doplnění uzavíracích armatur. Tím bude umožněn nekonfliktní provoz objektu SO 05 v době rekonstrukce dalších stavebních objektů v rámci školy.</li> <li>2) Z důvodu kolize umístění radiátorů s projektem interiérů došlo k přesunu instalovaných otopných těles včetně nových rozvodů.</li> </ol> <p><b>Přílohy změnového listu:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rozpočet</li> <li>- cenová nabídka</li> <li>- stanovisko A.D.</li> </ul> <p>Změna je realizována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění dle ust. § 222 odst. 4.</p>		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
(-) 0,00 Kč	(+) 41.216,80 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
(+) 41.216,80 Kč	Bez změn	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatel:	Za zhotovitele:	
[redacted]	[redacted]	
Datum: 14.10.2023	Datum: 14.10.2023	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
[redacted]	[redacted]	
Datum: 17.10.2023	Datum: 17.10.2023	

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	ZUŠ Střezina - dodatek č.8	JKSO	
Název objektu	Taneční pavilon, Krytá chodba	EČO	
Název části	ZL55 - Přesun UT a ZTI	Místo	Luční č.p.838 Hradec Králové parc.č. 1993/1 1693/3
Objednatel	Statutární město Hradec Králové	IČO	00268810
Projektant	BKN, spol.s r.o.Vladislavova 29/1,566 01Vysoké Mýto	DIČ	CZ00268810
Zhotovitel	VALC, s.r.o. Pražská 13, 500 04 Hradec Králové		15028909
Zpracoval			CZ15028909
			45537151
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
Dne	30.09.2023	CZ-CPA	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	41 216,80	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		41 216,80	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	<b>D</b>	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>41 216,80</b>	
	DPH	%	Základ daně	DPH celkem
	snížená	15,0	0,00	0,00
	základní	21,0	41 216,80	8 655,53
	<b>Cena s DPH</b>		<b>49 872,33</b>	
Projektant, Zhotovitel, Objednatel	<b>E</b>	<b>Přípočty a odpočty</b>		
	Dodá zadavatel		0,00	
	Klouzavá doložka		0,00	
	Zvýhodnění		0,00	



## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZUŠ Střezina - dodatek č.8

Objekt: Taneční pavilon, Krytá chodba

Část: ZL55 - Přesun UT a ZTI

Objednatel: Statutární město Hradec Králové

Zhotovitel: VALC, s.r.o. Pražská 13, 500 04 Hradec Králové

Místo: Luční č.p.838 Hradec Králové parc.č. 1993/1 1693/3

Zpracoval:

Datum: 30. 9. 2023


Č.	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				41 216,80	
	D	733	Ústřední vytápění				41 216,80	
1	K	R001	D+M přesunu UT a ZTI - viz cenová nabídka	kpl	1,000	41 216,80	41 216,80	CN
			<b>Celkem</b>				<b>41 216,80</b>	

# CENOVÁ NABÍDKA

Stavba: ZUŠ Střezina - přesun UT a ZTI

22.09.2023

Č	Popis	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>topný kanál - uzávěry</b>				
<b>UT</b>				<b>34 600,00</b>
1	mezipřírubová klapka DN 80	2	5 550,00	11 100,00
2	přírubový spoj DN 80	4	2 140,00	8 560,00
3	redukce 159/89	2	4 430,00	8 860,00
4	redukce 133/89	2	3 040,00	6 080,00
<b>Vodovod</b>				<b>1 965,60</b>
5	uzávěr PPR 63	1	1 351,2	1 351,20
6	uzávěr PPR 40	1	614,4	614,40
<b>úpravy radiátorů</b>				<b>1 645,20</b>
7	zaslepení vývodů 15	2	100,8	201,60
8	přeřezání potrubí	2	168	336,00
9	vysazení T kusu 15	2	158,4	316,80
10	přípojka radiátoru	4	110,4	441,60
11	potrubí 15 + tl.zkouška	1	292,8	292,80
12	izolace 15/13	1	56,4	56,40
<b>dětský koutek</b>				<b>3 006,00</b>
13	přípojka radiátoru	2	110,4	220,80
14	potrubí 15 + tl.zkouška	7	292,8	2 049,60
15	izolace 15/13	7	56,4	394,80
16	nápojení na stávající potrubí	2	170,4	340,80
<b>Cena Celkem</b>				<b>41 216,80 Kč</b>



<b>ZMĚNOVÝ LIST – PŘÍLOHA AD</b>		<i>číslo ZL: 55</i>
Název projektu:	Obnova ZUŠ Sítěžina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – So 05, SO 06 a SO 07	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové	
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, Hradec Králové	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	09.10.2023	
Předmět změny:	Doplnění ZTI a přesun ÚT	
<b>Stanovisko projektanta stavby BKN spol s r.o.</b>		
1) Dodatečný provozní požadavek na doplnění uzavíracích armatur. 2) Nutné úpravy dle následně zpracovaného projektu interiéru.		
S navrženými úpravami souhlasím.		
Jméno:	[REDAKCE] AD	[REDAKCE]
		<b>BKN spol s r.o.</b>

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 56	
Název projektu:	Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – So 05, SO 06 a SO 07		
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové		
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, Hradec Králové		
Změnový list vystavil:	[redacted]		
Datum:	09.10.2023		
Předmět změny:	Změna sanitárního zařízení (vybavení WC, koupelen a sprchových kabin) v objektu SO 05 a SO 07		
<p><b>Projekční (původní) řešení:</b> Projektová dokumentace počítala s dodáním zařizovacích předmětů v daném standardu.</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Na základě požadavku provozovatele, prostřednictvím investora, došlo ke změně vybavení sociálních místností (WC, koupelny a sprchové kabiny).</p> <p><b>Přílohy změnového listu:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rozpočet</li> <li>- cenová nabídka</li> <li>- stanovisko A.D.</li> </ul> <p>Změna je realizována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění dle ust. § 222 odst. 4.</p>			
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:		
(-) 36.903,00 Kč	(+) 32.969,60 Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
(-) 3.933,40 Kč	Bez změn		
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:			
Za obj. [redacted]	Za zhotovitele: [redacted]		
Datum: [redacted]	Datum: 17.10.2023		
Za autorský dozor: [redacted]	Za technický dozor stavebníka: [redacted]		
Datum: 17.10.2023	Datum: 17.10.2023		

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	<b>ZUŠ Střezina - dodatek č.8</b>	JKSO	
Název objektu	<b>Taneční pavilon</b>	EČO	
Název části	<b>ZL56 - Změna zařizovacích předmětů</b>	Místo	Luční č.p.838 Hradec Králové parc.č. 1993/1 1693/3
Objednatel	<b>Statutární město Hradec Králové</b>	IČO	DIČ
Projektant		00268810	CZ00268810
Zhotovitel		15028909	CZ15028909
Zpracoval		45537151	CZ45537151
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
		CZ-CPA	
	<b>30.09.2023</b>		

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	-26 998,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	23 064,60	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-3 933,40	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>	<b>D Celkem bez DPH</b>	<b>-3 933,40</b>
	<b>DPH</b>	<b>% Základ daně DPH celkem</b>
	snížená	15,0 0,00 0,00
	základní	21,0 -3 933,40 -826,01
	<b>Cena s DPH</b>	<b>-4 759,41</b>
	<b>E Přípočty a odpočty</b>	
	Dodá zadavatel	0,00
	Klouzavá doložka	0,00
	Zvýhodnění	0,00

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZUŠ Střezina - dodatek č.8

Objekt: Taneční pavilon

Část: ZL56 - Změna zařizovacích předmětů

Objednatel: Statutární město Hradec Králové

Zhotovitel: VALC, s.r.o. Pražská 13, 500 04 Hradec Králové

Místo: Luční č.p.838 Hradec Králové parc.č. 1993/1 1693/3






Zpracoval:









Datum: 30. 9. 2023

Č.	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
<b>D PSV Práce a dodávky PSV</b>								<b>-3 933,40</b>
1	K	R001	D+M - Zařizovací předměty - viz cenová nabídka	kpí	1,000	32 969,60	32 969,60	CN
<b>D 725 SO07 - zařizovací předměty</b>								<b>-9 905,00</b>
2	K	725291611X111	Doplňky zařízení koupelen a záchodů dávkovač tekutého mýdla	soubor	1,000	-1 200,00	-1 200,00	SOD
					1	*X11 viz.přílohy PD : D.1.3.1.12	1,000	
3	K	725291621X01	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů	soubor	2,000	-275,00	-550,00	SOD
					1+1	*X12 viz.přílohy PD : D.1.3.1.12	2,000	
4	K	725291631X01	Doplňky zařízení koupelen a záchodů zásobník papírových ručníků	soubor	1,000	-914,00	-914,00	SOD
					1	*X11 viz.přílohy PD : D.1.3.1.12	1,000	
5	K	725291651X101	Doplňky zařízení koupelen a záchodů trojvěšák nerez včetně montáže	kus	1,000	-670,00	-670,00	SOD
					1	*X10 viz.přílohy PD : D.1.3.1.12	1,000	
6	K	725291661X102	Doplňky zařízení koupelen a záchodů odkládací police nerez včetně montáže	kus	1,000	-400,00	-400,00	SOD
					1	*X10 viz.přílohy PD : D.1.3.1.12	1,000	
7	K	725291823X123	Doplňky zařízení koupelen a záchodů koš kulatý závěsný nerez včetně montáže dle příloh PD : D.1.3.1.12 ozn.X12	soubor	2,000	-1 192,00	-2 384,00	SOD
					2	*X12 viz.přílohy PD : D.1.3.1.12	2,000	
8	K	725291824X114	Doplňky zařízení koupelen a záchodů koš na papírové ručníky závěsný včetně montáže dle příloh PD : D.1.3.1.12 ozn.X11	soubor	1,000	-2 331,00	-2 331,00	SOD
					1	*X11 viz.přílohy PD : D.1.3.1.12	1,000	
9	K	725291825X123	Doplňky zařízení koupelen a záchodů zásobník na hygienické sáčky závěsný nerez včetně montáže dle příloh PD : D.1.3.1.12 ozn.X12	soubor	2,000	-728,00	-1 456,00	SOD
					2	*X12 viz.přílohy PD : D.1.3.1.12	2,000	
<b>D 767 SO05 - zařizovací předměty</b>								<b>-26 998,00</b>
10	K	767429034X01	Vybavení hygienické kabiny, materiál nerez - kompletní dodávka a montáž viz X05 - D.1.1.1.19	kus	2,000	-5 219,00	-10 438,00	SOD
					0+2	*viz X05 - D.1.1.1.19	2,000	
11	K	767429035X01	Vybavení hygienické kabiny, materiál nerez - kompletní dodávka a montáž viz X06 - D.1.1.1.19	kus	2,000	-7 019,00	-14 038,00	SOD
					0+2	*viz X06 - D.1.1.1.19	2,000	
12	K	767429037X01	Příslušenství sprchových kabin, materiál nerez - kompletní dodávka a montáž viz X07 - D.1.1.1.19	kus	2,000	-1 261,00	-2 522,00	SOD
					0+2	*viz X07 - D.1.1.1.19	2,000	
<b>Celkem</b>								<b>-3 933,40</b>









Dodavatel: <b>Merida Hradec Králové, s.r.o.</b> <b>Zemědělská 898</b> <b>500 03 Hradec Králové</b>  IČ: 49815288 DIČ: CZ49815288 Telefon: 495 545 924 www.merida.cz		Odběratel: IČ: 45537151 DIČ: CZ45537151  <b>VALC, s.r.o.</b> <b>Pražská třída 13/84</b> <b>500 04 Hradec Králové</b>  Tel.: Fax:	
Nabídka č.: 1631000360 Datum zápisu: 25.9.2023 Platno do:		Konečný příjemce: VALC, s.r.o. Pražská třída 13/84 500 04 Hradec Králové	



cenová nabídka sanitárního zařízení včetně dopravy a montáže na akci ZUŠ Střezina Hradec Králové pro Lukáše Plevku

Obrázek	Kód	Název	Množství	M.j.	J.cena	Cena bez DPH	%DPH
X05							
	DTN101	Dávkovač mýdla MERIDA TOP - na dolévání	2	ks	921,22	1 842,44	21%
	ATN101	Zásobník na jedn. ručnky MERIDA TOP - MAXI	2	ks	869,62	1 739,24	21%
		Zrcadlo 550x900mm	2	ks	969,90	1 939,80	21%
	B2A	Koš drátěný bílý na pap. ručníky 47 l	2	ks	514,96	1 029,92	21%
	BTN101	Zásobník na toal. papír MERIDA TOP MAXI	2	ks	661,00	1 322,00	21%
	V00-1	WC souprava plastová,	2	ks	82,35	164,70	21%

Obrázek	Kód	Název	Množství	M.j.	J.cena	Cena bez DPH	%DPH
<b>X06</b>							
	<b>DTN101</b>	Dávkovač mýdla MERIDA TOP - na dolévání	2	ks	921,22	1 842,44	21%
	<b>BTN101</b>	Zásobník na toal. papír MERIDA TOP MAXI	2	ks	661,00	1 322,00	21%
	<b>V00-1</b>	WC souprava plastová,	2	ks	82,35	164,70	21%
	<b>GTB002</b>	Zásobník hygienických sáčků Merida TOP	2	ks	397,48	794,96	21%
	<b>B8A</b>	Koš s víkem hranatý plastový bílý 9 l	2	ks	196,54	393,08	21%
	<b>ATN101</b>	Zásobník na jedn. ručníky MERIDA TOP - MAXI	2	ks	869,62	1 739,24	21%
	<b>B2A</b>	Koš drátěný bílý na pap. ručníky 47 l	2	ks	514,96	1 029,92	21%
		Zrcadlo 550x900mm	2	ks	969,90	1 939,80	21%
<b>X07</b>							
	<b>MHW12</b>	Věšák L300 se 4 háčky	2	ks	998,45	1 996,90	21%
		Zrcadlo 550x900	2	ks	969,90	1 939,80	21%
Ekonomický a informační systém POHODA					Strana 2 dokladu 1631000360		



Obrázek	Kód	Název	Množství	M.j.	J.cena	Cena bez DPH	%DPH
	<b>MHA13</b>	Mýdlenka košíček	2	ks	1 606,59	3 213,18	21%
X10							
	<b>MHW12</b>	Věšák L300 se 4 háčky	1	ks	998,45	998,45	21%
	<b>MHA13</b>	Mýdlenka košíček	1	ks	1 606,59	1 606,59	21%
X11							
	<b>DTN101</b>	Dávkovač mýdla MERIDA TOP - na dolévání	1	ks	921,22	921,22	21%
	<b>ATN101</b>	Zásobník na jedn. ručníky MERIDA TOP - MAXI	1	ks	869,62	869,62	21%
		Zrcadlo 500x900mm	1	ks	969,90	969,90	21%
	<b>B2A</b>	Koš drátěný bílý na pap. ručníky 47 l	1	ks	514,96	514,96	21%
X12							
	<b>BTN101</b>	Zásobník na toal. papír MERIDA TOP MAXI	2	ks	661,00	1 322,00	21%
	<b>V00-1</b>	WC souprava plastová,	2	ks	82,35	164,70	21%

Obrázek	Kód	Název	Množství	M.j.	J.cena	Cena bez DPH	%DPH
	GTB002	Zásobník hygienických sáčků Merida TOP	2	ks	397,48	794,96	21%
	B8A	Koš s víkem hranatý plastový bílý 9 l	2	ks	196,54	393,08	21%

Součet položek

Celkem bez DPH: 32 969,60

Celkem DPH: 6 923,62

Celkem vč. DPH: 39 893,22

**CELKEM K ÚHRADĚ**

**39 893,22**

Vystavil:



<b>ZMĚNOVÝ LIST – PŘÍLOHA AD</b>		<b>číslo ZL: 56</b>
Název projektu:	Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – So 05, SO 06 a SO 07	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové	
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, Hradec Králové	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	09.10.2023	
Předmět změny:	Změna sanitárního zařízení (vybavení WC, koupelen a sprchových kabin) v objektu SO 05 a SO 07	
<b>Stanovisko projektanta stavby BKN spol s r.o.</b>		
1) Úpravy navrženého vybavení WC, koupelen a sprchových kabin dle požadavku provozovatele školy.		
S navrženými úpravami souhlasím.		
Jméno:	[REDAKCE] - AD	[REDAKCE]
		<b>BKN spol s r.o.</b>

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 57	
Název projektu:	Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – So 05, SO 06 a SO 07		
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové		
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, Hradec Králové		
Změnový list vystavil:	[redacted]		
Datum:	09.10.2023		
Předmět změny:	Nové vchodové dveře v objektu SO 05		
<p><b>Projekční (původní) řešení:</b> V projektové dokumentaci nebyly „provozní“ vchodové dveře do místnosti č 103 (sklad) v 1.NP v objektu SO 05 obsaženy.</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Z důvodu etapizace projektu a nerušeném provozu stávajících objektů, které nyní neprochází rekonstrukcí nebo jsou již v provozu po rekonstrukci, nebylo možné zajistit funkční a bezpečný vstup na staveniště do objektu SO 05. Z tohoto důvodu a také z následujících provozních důvodů školy budou osazeny nové vchodové dveře do místnosti č. 103 (sklad) v 1.NP v objektu SO 05.</p> <p><b>Přílohy změnového listu:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rozpočet</li> <li>- cenová nabídka</li> <li>- stanovisko A.D.</li> </ul> <p>Změna je realizována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění dle ust. § 222 odst. 4</p>			
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:		
(-) 0,00 Kč	(+) 37.000,00 Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
(+) 37.000,00 Kč	Bez změn		
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:			
Za objednatele:	Za zhotovitele:		
[redacted]	[redacted]		
Datum: 14.10.2023	Datum: 17.10.2023		
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:		
[redacted]	[redacted]		
Datum: 17.10.2023	Datum: 17.10.2023		

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	<b>ZUŠ Střezina - dodatek č.8</b>	JKSO	
Název objektu	<b>Taneční pavilon, Krytá chodba</b>	EČO	
Název části	<b>ZL57 - Nové vchodové boční dveře</b>	Místo	Luční č.p.838 Hradec Králové parc.č. 1993/1 1693/3
Objednatel	Statutární město Hradec Králové	IČO	00268810
Projektant	BKN, spol.s r.o.Vladislavova 29/1,566 01Vysoké Mýto	DIČ	CZ00268810
Zhotovitel	VALC, s.r.o. Pražská 13, 500 04 Hradec Králové		15028909 CZ15028909
Zpracoval			45537151 CZ45537151
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		10.10.2023	
			CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	37 000,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		37 000,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>	<b>D Celkem bez DPH 37 000,00</b>																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>37 000,00</td> <td>7 770,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Cena s DPH</b></td> <td><b>44 770,00</b></td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	37 000,00	7 770,00	<b>Cena s DPH</b>			<b>44 770,00</b>
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snížená	15,0	0,00	0,00														
základní	21,0	37 000,00	7 770,00														
<b>Cena s DPH</b>			<b>44 770,00</b>														
	<b>E Přípočty a odpočty</b>																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																
Klouzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZUŠ Střezina - dodatek č.8

Objekt: Taneční pavilon, Krytá chodba

Část: ZL57 - Nové vchodové boční dveře

Objednatel: Statutární město Hradec Králové

Zhotovitel: VALC, s.r.o. Pražská 13, 500 04 Hradec Králové

Místo: Luční č.p.838 Hradec Králové parc.č. 1993/1 1693/3

Zpracoval:

Datum: 10. 10. 2023


Č.	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				37 000,00	
	D	766	Konstrukce truhlářské				37 000,00	
1	K	766R001	D+M vchodových bočních dveří včetně stavebních úprav a prací spojených s montáží dveří	kpl	1,000	37 000,00	37 000,00	CN
<b>Celkem</b>							<b>37 000,00</b>	

**Nabídky OFR-23-36365**  
**18/08/2023**

MATOKNA (CZE) M.A.T. OKNA A  
DVERE S.R.O.  
VSESTARY 173  
503 12 VSESTARY  
CZECHY  
DPH: CZ-07195702  
Telefon: [REDACTED]

Vase referencie: ZUS St fezina dodatečné dveře v SO 05

Pol. 001	Množ : 1	SYSTEM : GEALAN 8000	Komentář : šedá Gr.II ext.. RAL 7001
<b>Komentář</b>			
POHLAD Z VNUTRA, OTVARAVE DO VNUTRA KLIKA/GULA, ROZVORA OTVARAV KLICEM ELEKTROZACZEP BEZ PRAHU, VYPLN 44 MM  DVA SNIMACE CIPU - NIE ROBIMY			

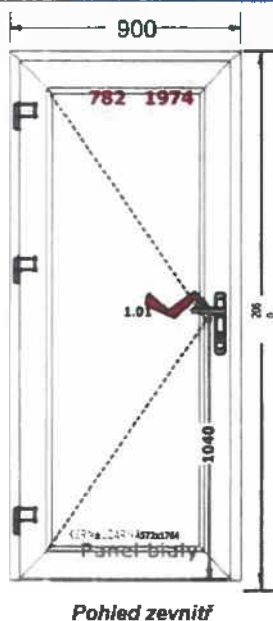

<b>Rám</b>	3001 - Rám 74mm Gealan
<b>Stránkování</b>	šedá Gr.II ext.. RAL 7001
<b>Barva uvnitř</b>	Bílá
<b>barva těsnění ramu</b>	černá
<b>ostatní těsnění Automatický výběr</b>	Ano
<b>barva těsnění křídla</b>	černá
<b>barva těsnění zasklívací lišty</b>	černá
<b>Automatický výběr</b>	Ne
<b>Druh oceli</b>	zavřeno
<b>Tloušťka oceli</b>	2.0 mm
<b>Tloušťka oceli</b>	2.0 mm
<b>profil pod práh/rok prahu</b>	
<b>podokenní lišta</b>	brak
<b>přepavní rukojeť</b>	Ne
<b>Zasklívací lišty</b>	Zaoblené
<b>Křídlo</b>	8076 - dveře otvírave dovnitř Z126mm
<b>Zasklívací lišty</b>	Zaoblené
<b>speciální funkce</b>	8076
<b>Panel</b>	Panel SZARY RAL 7001/ BIAŁY (gr.44mm)
<b>Kován</b>	OTVÍRÁNÍ dveří
<b>=&gt; OKUCIE &lt;=</b>	
<b>Typ kliky</b>	klika - gula SATURN 32MM
<b>barva kliky</b>	vhodná
<b>barva pantů</b>	vhodná
<b>Výrobce espagnolette</b>	Standard
<b>Typ uzamčení</b>	klicem/vložkou
<b>vložka zámku</b>	primární (nikel)
<b>Používejte háčky?</b>	Ano
<b>Rozvora</b>	Standard
<b>Elektrozaczep</b>	Ano
<b>Zprávy</b>	
<b>Rám: GEA-8001</b>	DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWE
<b>Sovčinitel prostupu tepla</b>	Zobrazení
<b>Jednotková hmotnos</b>	52,5 Kg
<b>Obvod</b>	5,9 m
<b>Akcesoria</b>	Množ

Nabidky OFR-23-36365  
18/08/2023

<b>Aksesoria</b>	<b>Množ</b>
Komplet klamko-gaiko drzewiowa na długim szyldzie MEDOS Saturn 32mm Biały/Srebrny	1.000


1.01	Panel SZARY RAL 7001/ BIAŁY (gr.44mm)	<b>Rozmery</b>
		602 x 1794
	<b>Cena okna</b>	<b>33.400,-</b>

Cena Oken			
Cena Okna		33.400,-	
Montaż		2.600,-	
Purenit		1.000,-	
<b>Cena bez Dph</b>		<b>37.000,-</b>	

Suma współczynnika termicznego						
Pot.	Množ	Uw	Technika 1	Powierzchnia całkowita	Množ x Uw x Technika 1	Komentář
001	1		1,854 m <sup>2</sup>	1,854 m <sup>2</sup>		Zobrazeni

**Waga całkowita: 52,5 Kg**

**Obwód całkowity: 5,9 m**





<b>ZMĚNOVÝ LIST – PŘÍLOHA AD</b>		<i>číslo ZL: 57</i>
Název projektu:	Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – So 05, SO 06 a SO 07	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové	
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, Hradec Králové	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	09.10.2023	
Předmět změny:	Nové vchodové dveře v objektu SO 05	
<b>Stanovisko projektanta stavby BKN spol s r.o.</b>		
<p>Osazení nových vchodových dveří v objektu SO 05 bylo dodatečným požadavkem uživatele, z provozních důvodů školy. Dveře umožní případnou dopravu vybavení z a do objektu SO 05 přímo z venkovního prostoru</p> <p>S navrženou úpravou souhlasím.</p>		
Jméno:	[REDAKCE] AD	[REDAKCE]
		<b>BKN spol s r.o.</b>

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 58	
Název projektu:	Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – So 05, SO 06 a SO 07		
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové		
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, Hradec Králové		
Změnový list vystavil:	[redacted]		
Datum:	09.10.2023		
Předmět změny:	Šatní skříň a lavice v objektu SO 07		
<p><b>Projekční (původní) řešení:</b> Projektová dokumentace řešila dodání nových šatních skříní a lavice v objektu SO 07</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Na základě požadavku provozovatele, prostřednictvím investora, nebudou generálním dodavatelem dodány šatní skříň a lavice pro objekt SO 07. Dodání šatních skříní a lavice bude ve vlastní režii provozovatele.</p> <p><b>Přílohy změnového listu:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rozpočet</li> <li>- stanovisko A.D.</li> </ul> <p>Změna je realizována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění dle ust. § 222 odst. 4.</p>			
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:		
(-) 40.236,00 Kč	(+) 0,00 Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
(-) 40.236,00 Kč	Bez změn		
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:			
Za objednatel	[redacted]	Za zhotovitele:	[redacted]
Datum:	[redacted]	Datum:	17.10.2023
Za autorský dozor:	[redacted]	Za technický dozor stavby:	[redacted]
Datum:	17.10.2023	Datum:	17.10.2023

## KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	<b>ZUŠ Střezina - dodatek č.8</b>	JKSO	
Název objektu	<b>Taneční pavilon, Krytá chodba</b>	EČO	
Název částí	<b>ZL58 - Nedodání truhlářských výrobků</b>	Místo	Luční č.p.838 Hradec Králové parc.c. 1993/1 1693/3
Objednatel	Statutární město Hradec Králové	IČO	DIČ
Projektant	BKN, spol.s r.o.Vladislavova 29/I,566 01Vysoké Mýto	00268810	CZ00268810
Zhotovitel	VALC, s.r.o. Pražská 13, 500 04 Hradec Králové	15028909	CZ15028909
Zpracoval		45537151	CZ45537151
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	09.10.2023	CZ-CPA	

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C			
Základní rozp. náklady		Doplnkové náklady		Náklady na umístění stavby			
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00	
2	Montáž	0,00	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00	
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00	
4	Montáž	-40 236,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00	
5	"M" Dodávky	0,00			17 Jiné VRN	0,00	
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)	-40 236,00	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00	
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00	
<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>						<b>D Celkem bez DPH</b>	<b>-40 236,00</b>
						<b>DPH</b>	<b>% Základ daně DPH celkem</b>
						snížená	15,0 0,00 0,00
						základní	21,0 -40 236,00 -8 449,56
						<b>Cena s DPH</b>	<b>-48 685,66</b>
						<b>E Přípočty a odpočty</b>	
						Dodá zadavatel	0,00
						Klouzavá doložka	0,00
						Zvýhodnění	0,00

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZUŠ Střezina - dodatek č.8

Objekt: Taneční pavilon, Krytá chodba

Část: ZL58 - Nedodání truhlářských výrobků

Objednatel: Statutární město Hradec Králové

Zhotovitel: VALC, s.r.o. Pražská 13, 500 04 Hradec Králové

Místo: Luční č.p.838 Hradec Králové parc.č. 1993/1 1693/3

Zpracoval:

Datum: 9. 10. 2023

Č.	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-40 236,00	
D	766		Konstrukce truhlářské				-40 236,00	
1	K	766821220T04	Šatnová skříňka včetně montáže rozmístění a likvidace obalu dle přílohy PD : D.1.3.1.10 ozn.T04	kus	-8,000	4 441,00	-35 528,00	
2	K	766821221T05	Šatnová lavice včetně montáže umístění a likvidace obalu dle přílohy PD : D.1.3.1.10 ozn.T05	kus	-1,000	4 708,00	-4 708,00	
<b>Celkem</b>							<b>-40 236,00</b>	

**ZMĚNOVÝ LIST – PŘÍLOHA AD**

číslo ZL: 58

Název projektu:	Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – So 05, SO 06 a SO 07
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, Hradec Králové
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]
Datum:	09.10.2023
Předmět změny:	Šatní skříně a lavice v objektu SO 07

**Stanovisko projektanta stavby BKN spol s r.o.**

Na základě požadavku provozovatele nebudou generálním dodavatel dodány šatní skříně a lavice pro objekt SO 07.

S navrženými řešení souhlasím.

Jméno: [REDAKCE] - AD

[REDAKCE]  
BKN spol s r.o.
