

Změnový list pro změny dle § 222 odst. 5 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Most, G001, Zapova, Zapova, P5 – stavební údržba	Číslo SO/PS/číslo změny SO/PS 1	Číslo ZBV : 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Stavba není rozdělena na objekty		

Strany smlouvy o dílo - díčí smlouvy **3/22/4056/015** na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 1. 3. 2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Veletřní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice

Zhotovitel: **Stavební a běžná údržba mostů – BM + OK-BE, U Klubu 1741/5, 143 00 Praha 4 - Modřany**

Přílohy Změnového listu: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>1. Rozpis ocenění změn položek</td><td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">strana</td></tr> <tr><td>2. Přehled změn stavby</td><td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">strana</td></tr> <tr><td>3. Soupis prací po změnách</td><td style="text-align: center;">2</td><td style="text-align: center;">strany</td></tr> <tr><td>4. Zápisy ze SD</td><td style="text-align: center;">9</td><td style="text-align: center;">stran</td></tr> <tr><td>5. Zápisy z KD</td><td style="text-align: center;">15</td><td style="text-align: center;">stran</td></tr> <tr><td>6. Fotodokumentace</td><td style="text-align: center;">3</td><td style="text-align: center;">strany</td></tr> <tr><td>7. Vyjádření AD</td><td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">strana</td></tr> <tr><td>8. Vyjádření TDS</td><td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">strana</td></tr> <tr><td>9. Řez zadání, řez RDS</td><td style="text-align: center;">2</td><td style="text-align: center;">strany</td></tr> </table>	1. Rozpis ocenění změn položek	1	strana	2. Přehled změn stavby	1	strana	3. Soupis prací po změnách	2	strany	4. Zápisy ze SD	9	stran	5. Zápisy z KD	15	stran	6. Fotodokumentace	3	strany	7. Vyjádření AD	1	strana	8. Vyjádření TDS	1	strana	9. Řez zadání, řez RDS	2	strany	Příjemce <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Objednatel</td><td style="text-align: right;">Paré č. 1</td></tr> <tr><td>Zhotovitel</td><td style="text-align: right;">Paré č. 2</td></tr> </table>	Objednatel	Paré č. 1	Zhotovitel	Paré č. 2
1. Rozpis ocenění změn položek	1	strana																														
2. Přehled změn stavby	1	strana																														
3. Soupis prací po změnách	2	strany																														
4. Zápisy ze SD	9	stran																														
5. Zápisy z KD	15	stran																														
6. Fotodokumentace	3	strany																														
7. Vyjádření AD	1	strana																														
8. Vyjádření TDS	1	strana																														
9. Řez zadání, řez RDS	2	strany																														
Objednatel	Paré č. 1																															
Zhotovitel	Paré č. 2																															

Iniciátor Změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění změny:

Název (díličí) Změny: Popis a zdůvodnění Změny: <p>Stávající betonová vrstva - při odbourávání stávající římsy byla odhalena stávající betonová vrstva z velmi pevného betonu, na KD bylo rozhodnuto, že beton bude částečně ubourán a vyspádován dle sklonu chodníku – viz příčné řezy v příloze a viz zápisy ze SD. Z těchto důvodů změny vrstev v chodníku bylo nutné provést sanační vrstvy pod izolací. Týká se to položek č. 2, 87, 90, 107, 108, 116, 117, 118, 174, 185, N 201. - příloha č. 9 - Řez ze zadávací dokumentace, Řez - RDS-skutečnost. Zápisy ve SD - Příloha č. 4 a zápisy z KD - Příloha č. 5</p> <p>Kabelový kanálek - v chodníku probíhají kabely (v řezu označeny jako "stávající kolektor"), bylo rozhodnuto na KD č. 2 dne 19. 9. 2023, že budou umístěny do otočeného kabelového žlabu a ten bude přikotven ke stávající betonové vrstvě v chodníku. Týká se to položek č. 62, N203-N 207. Zápisy ve SD - Příloha č. 4 a zápisy z KD - Příloha č. 5</p> <p>Zmenšený výkop ve vozovce a zmenšená výměra vozovky - bylo rozhodnuto na kontrolním dni č. 5 ze dne 10. 10. 2023, že bude menší výkop ve vozovce, z důvodu vedení STL plynového vedení, že výkop bude proveden pouze po linii tohoto vedení, tzn bude zmenšen výkop a vozovky oproti zadávací dokumentaci, kde byl výkop ne dně pod drenáží široký 1,5 m, při provádění je výkop pod drenáží široký pouze 1,0 m. V položkách 51, 87, 90, 96, 97, 99, 100 a N 202 jsou spočítány skutečné výměry bourání na nových konstrukcích vozovky. Zápisy z KD - Příloha č. 5</p>

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu změny na cenu stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	-412 658,16	507 561,72	94 903,56


Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změnách závazku:


Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV - pověřený zaměstnanec	jméno	<div style="background-color: black; width: 100%; height: 20px;"></div>	podpis	<div style="background-color: black; width: 100%; height: 20px;"></div>
Ředitel úseku správy mostních a speciálních objektů TSK hl. m. Prahy	jméno	<div style="background-color: black; width: 100%; height: 20px;"></div>	podpis	<div style="background-color: black; width: 100%; height: 20px;"></div>

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na v ýše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.


Objednatel: (TSK hl. m. Prahy) Místopředseda představenstva TSK hl. m. Prahy	jméno	Ing. Josef Richtr	podpis	Ing. Josef Richtr <small>Digitálně podepsal Ing. Josef Richtr Datum: 2023.10.27 14:58:40 +02'00'</small>
Zhotovitel: Stavební a běžná údržba mostů – BM + OK-BE jednatel a ředitel společnosti	jméno	<div style="background-color: black; width: 100%; height: 20px;"></div>	podpis	<div style="background-color: black; width: 100%; height: 20px;"></div>


Číslo paré:

















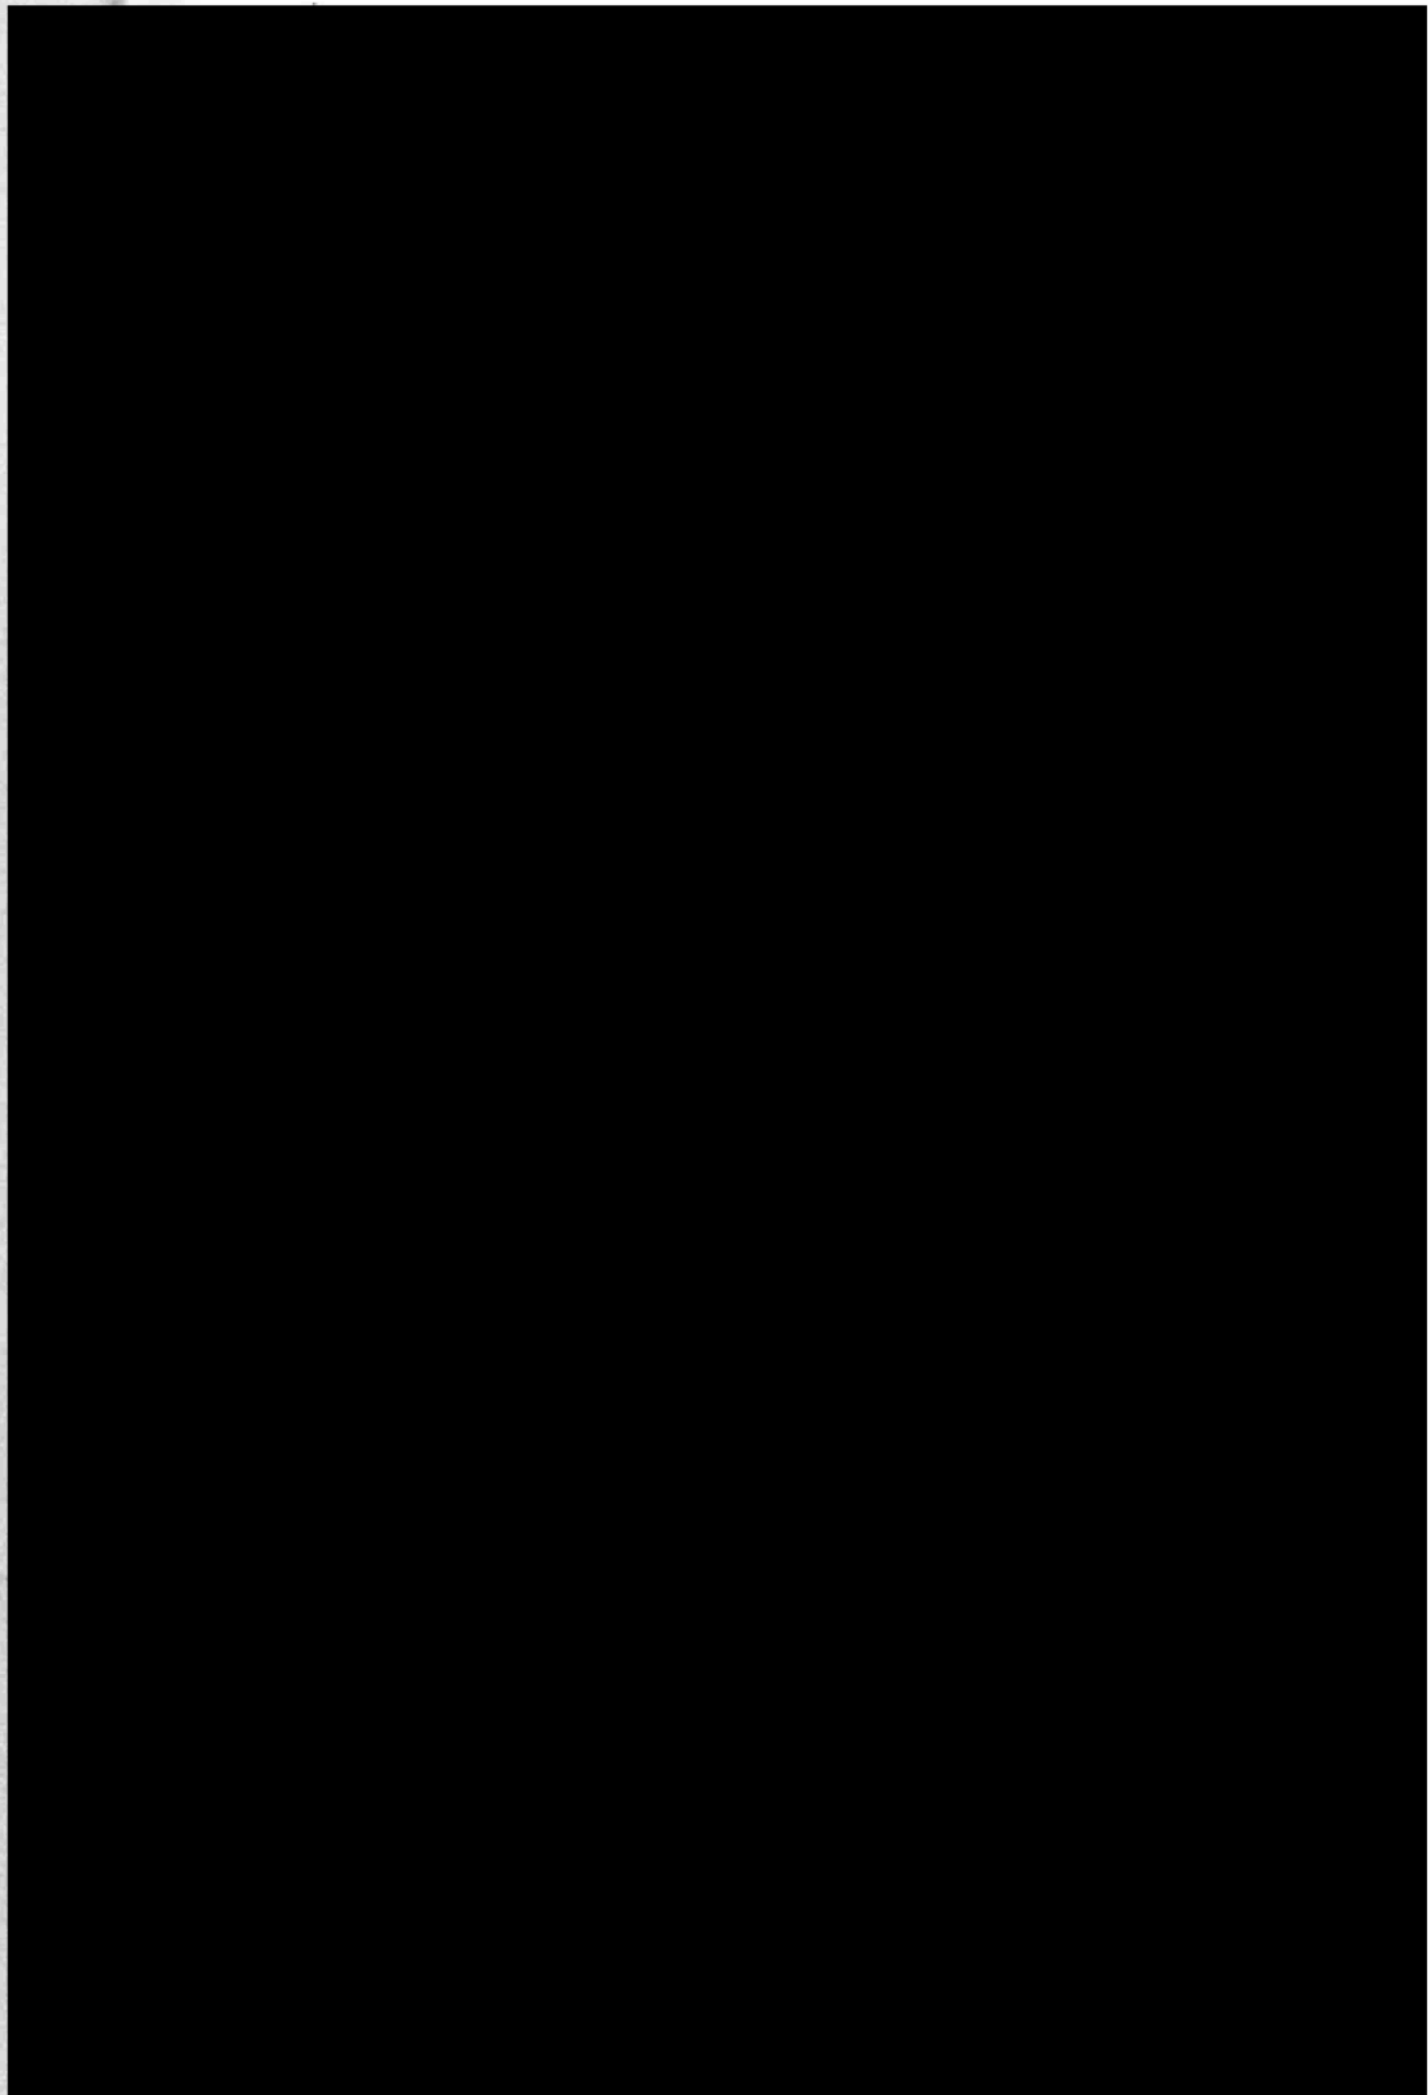

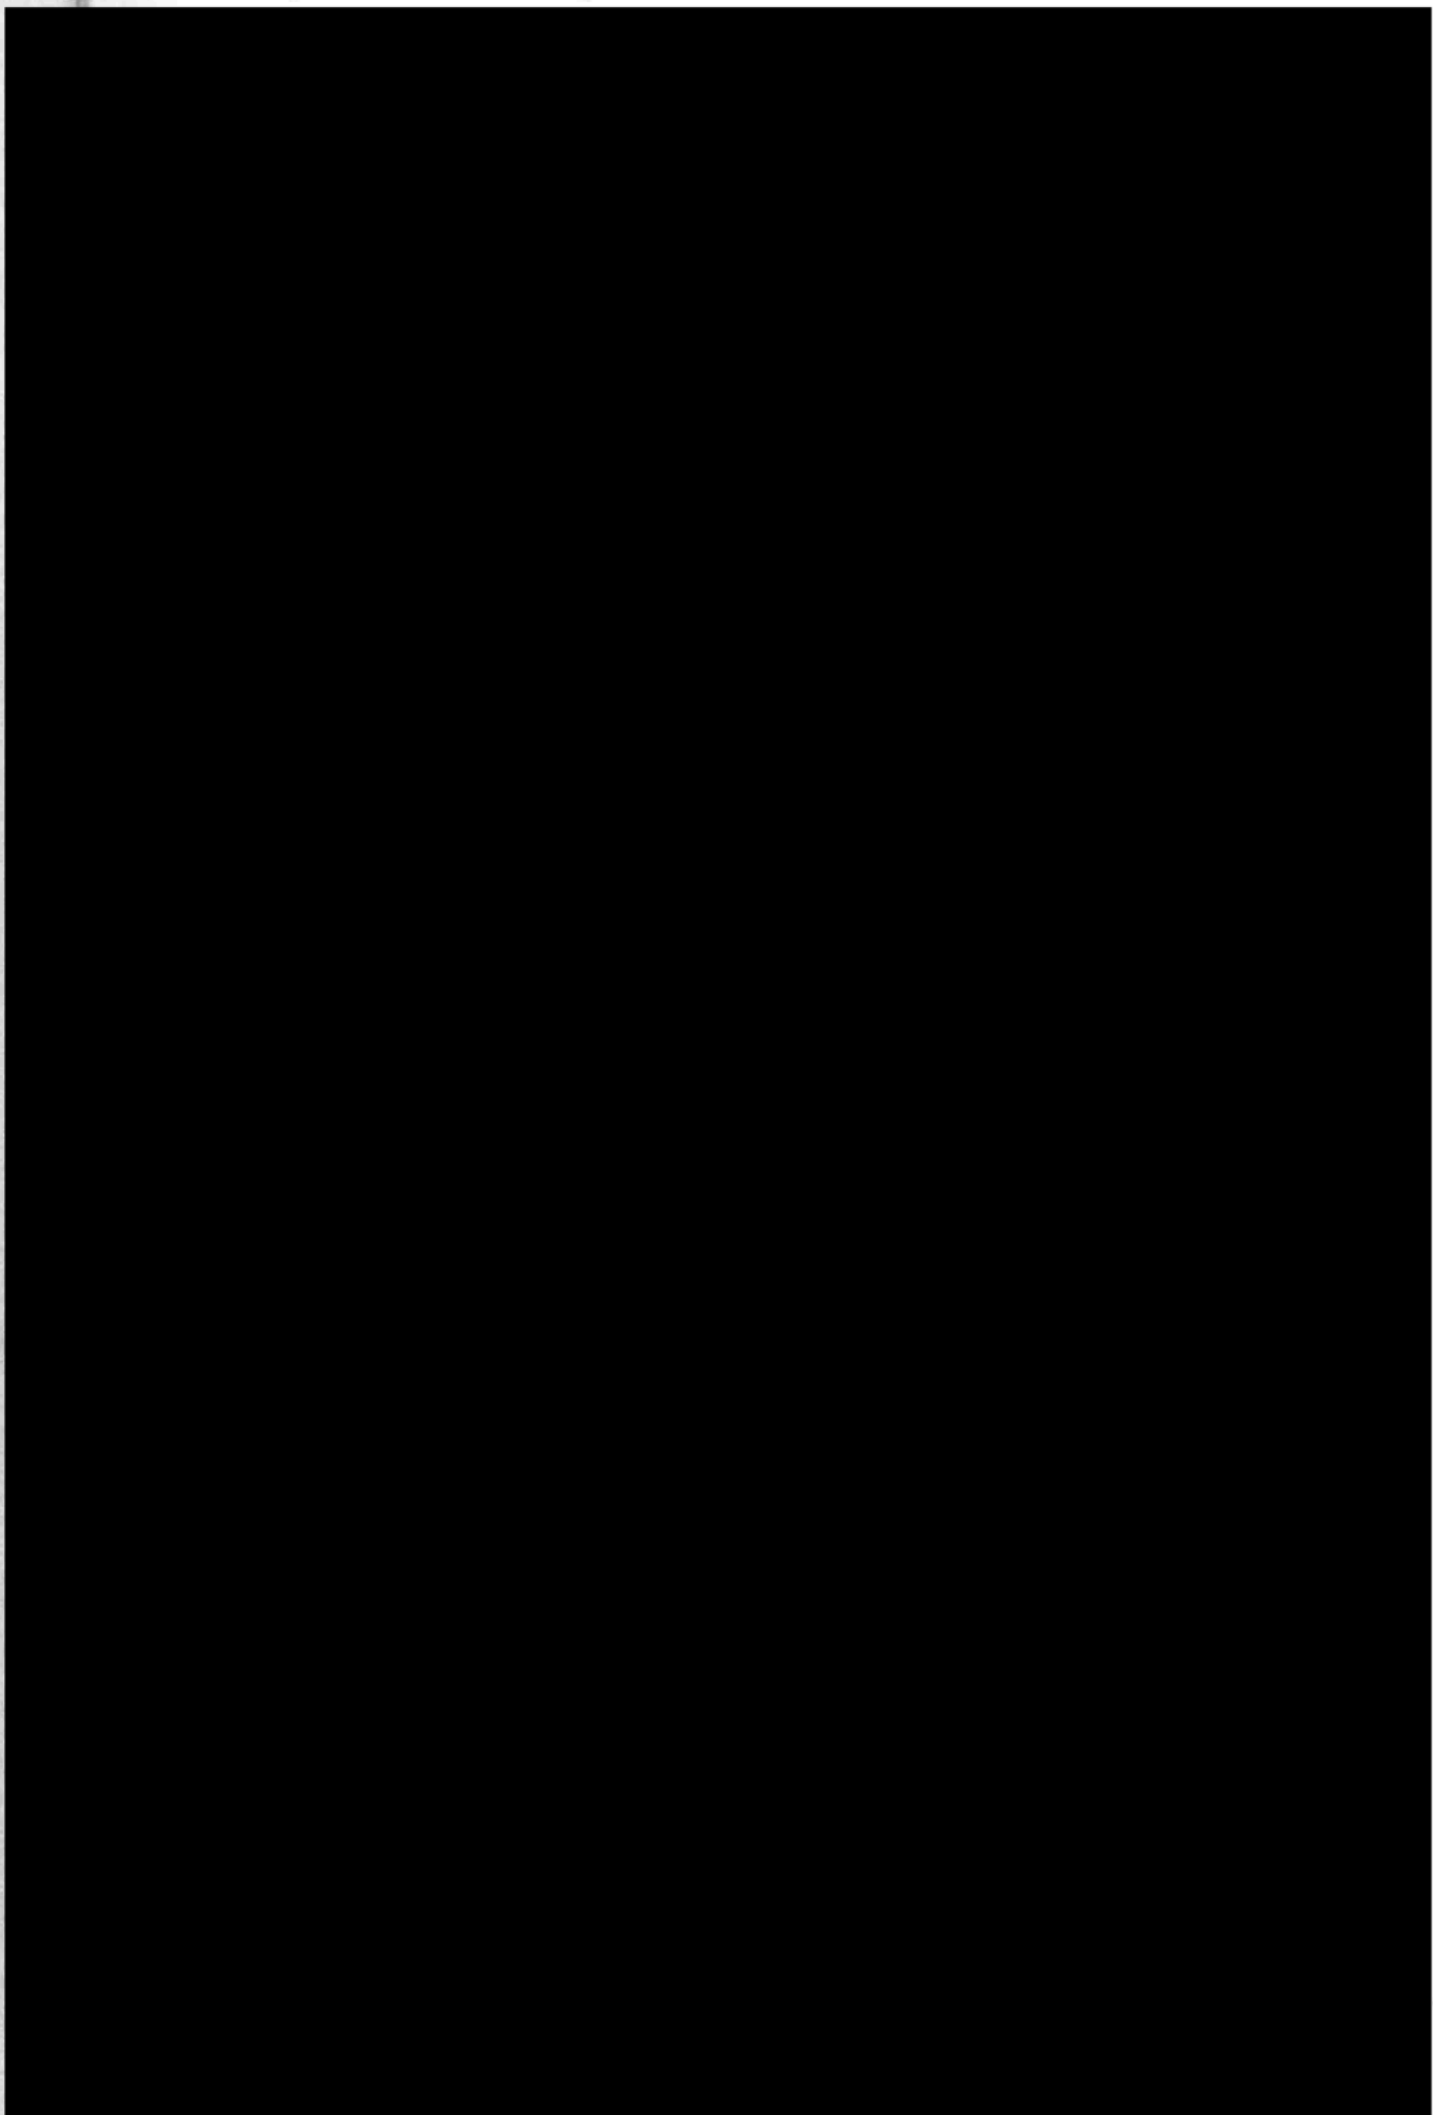

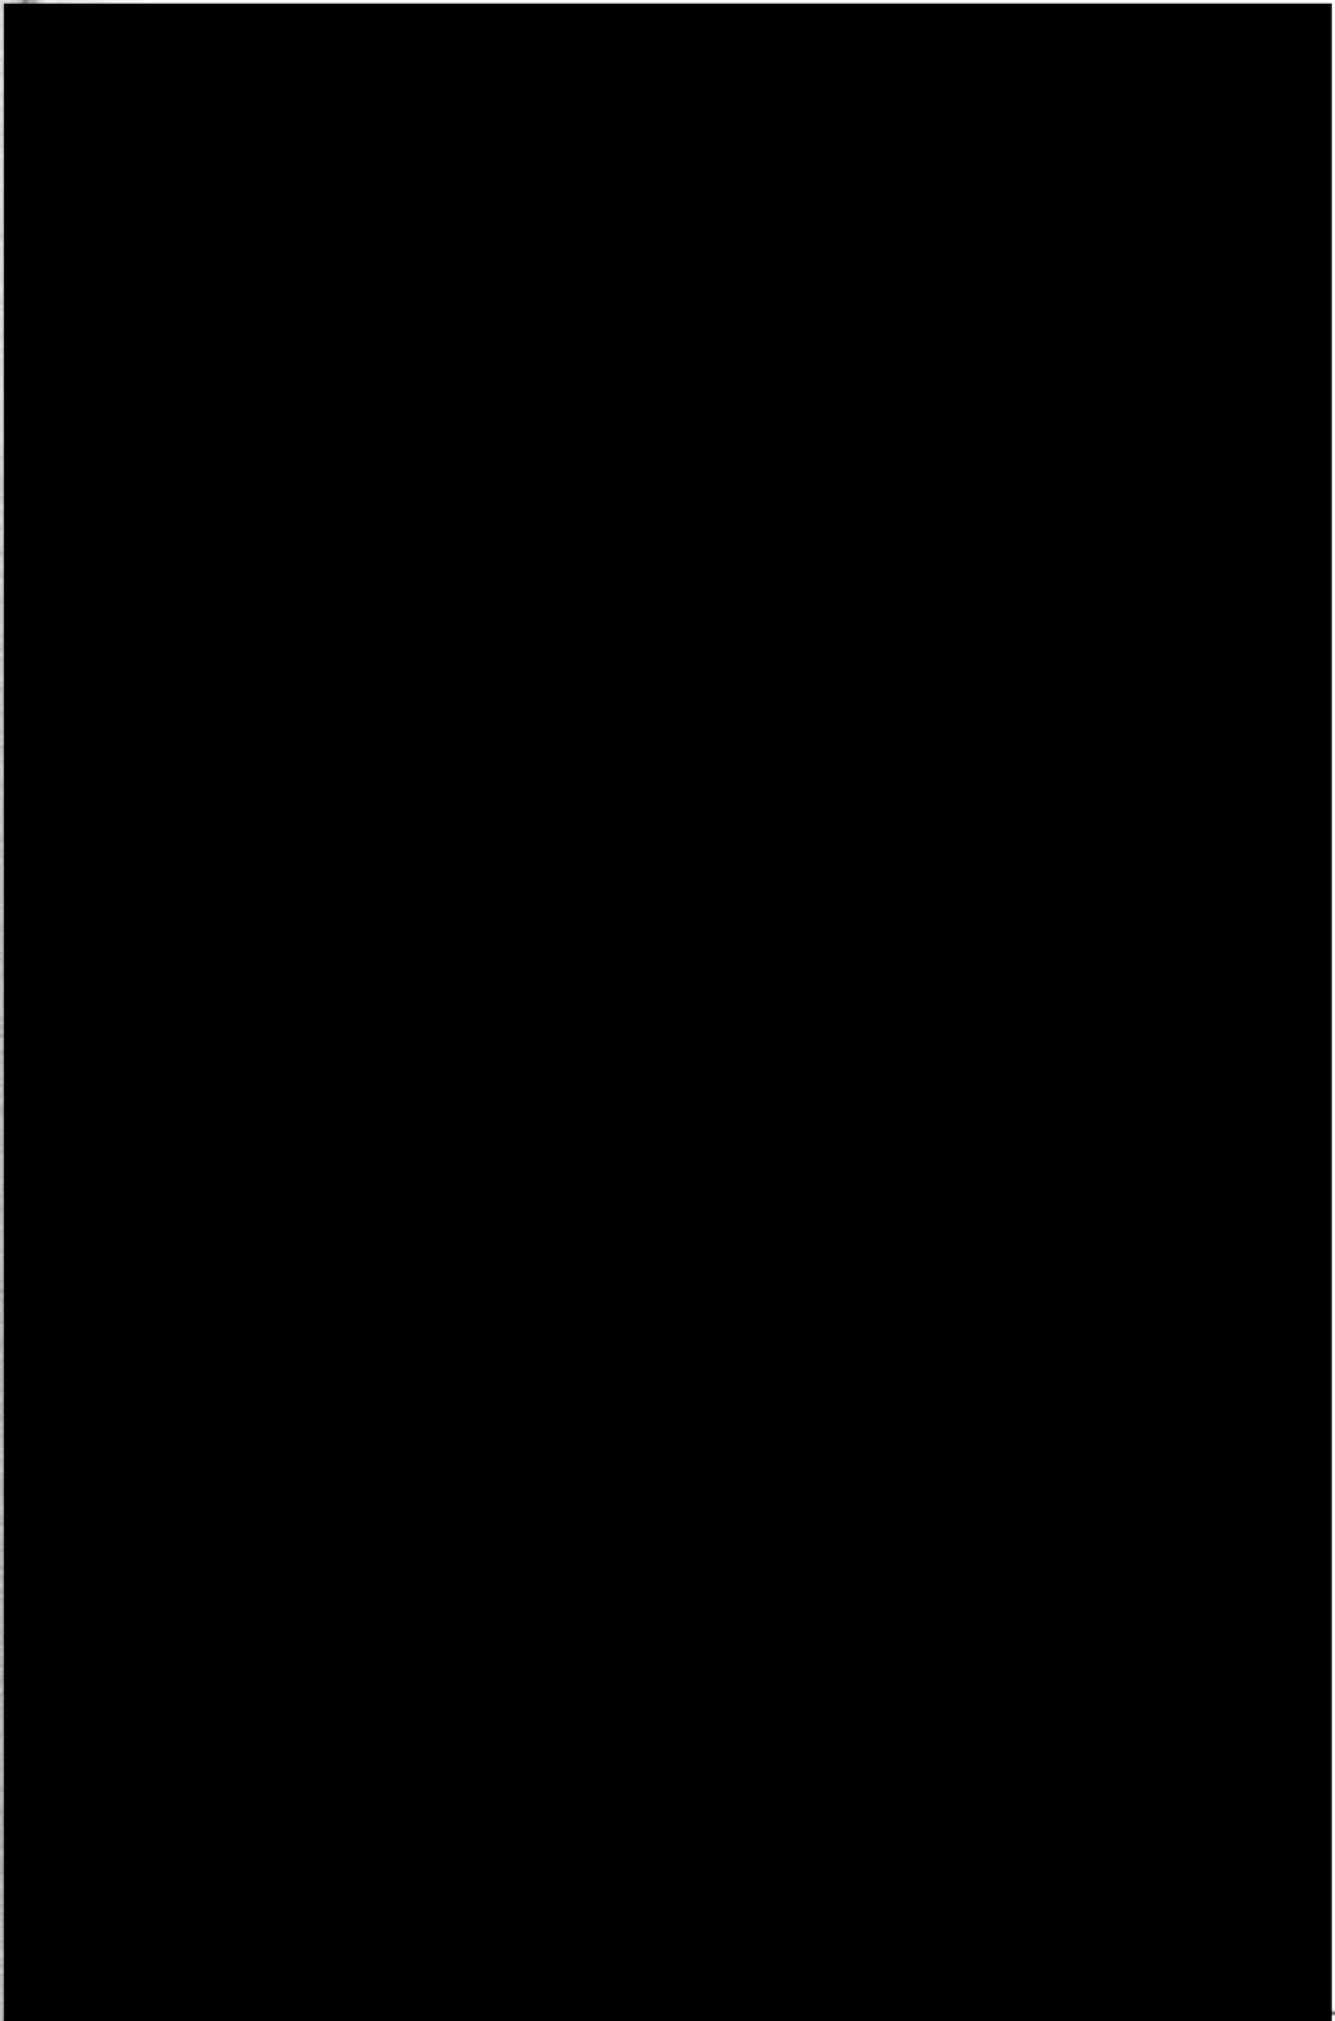

Handwritten scribbles or marks at the bottom right corner of the page, possibly indicating a signature or initials.

