

Smluvní strany se mohou dohodnout na změně prvku závazku založeného smlouvou, např. lhůtě k plnění. Zákon neobsahuje žádné kogentní ustanovení, které by takové dohodě bránilo, a to ani v případě, kdy původně ujednaná lhůta k plnění již uběhla. Dle § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je obecně přípustné uzavřít dodatek, kterým bude dohodnut pozdější termín pro splnění povinností smluvních stran, i když původní termín plnění již marně uplynul, nedojde-li uplynutím původně sjednaného termínu plnění k zániku smlouvy, (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, např. sp.zn. 23 Cdo 5457/2014, sp.zn. 23 Cdo 2126/2018). Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 1285/2011 v důsledku takové novace není možné uplatnit nárok na zaplacení smluvní pokuty z důvodu prodlení či úroků z prodlení za období od původního data plnění do uzavření dohody o změně lhůty k plnění, jelikož dochází k odstranění právního důvodu takového nároku, tedy prodlení dlužníka a takový nárok vůbec nevznikne. Na základě výše uvedeného je přípustné uzavřít Dodatek č. 3, který bezprostředně nenavazuje na termín původně sjednaný ve Smlouvě, aniž by Objednateli vznikl nárok na smluvní pokutu.

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na změně Čl. 3 odst. 3.7 Smlouvy a Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací.

U shora uvedené skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s Čl. 5. odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy č. Objednatele E618-S-819/2023, č. Zhotovitele: 1-01-23-002-GDCJ takto:

1) Čl. 3 – PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- ruší se stávající text Čl. 3 odst. 3.7 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

3.7 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 2.1.1 Přílohy č. 2 b) Smlouvy.

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 24 měsíců a 5 dnů (06.04.2025) ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **18 měsíců a 5 dnů (06.10.2024)** ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **6 měsíců** ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

2) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram postupu prací

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací. Ruší se znění Přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 3, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 3 (současně Přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

1. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 3 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 3 zůstávají platnosti beze změn.
4. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven **v jednom (1)** vyhotovení v elektronické podobě.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 je tato příloha:
Příloha č. 1 (současně Příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram postupu prací – *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 3*

V Praze

22.01.2024 10:01
Podepsáno elektronicky

Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

V Ústí nad Labem

Digitálně podepsal

Datum: 2024.01.15
09:37:10 +01'00'

Ing. Jakub Svoboda

předseda představenstva
STRABAG Rail a.s.

Digitálně podepsal


Datum: 2024.01.10
11:51:58 +01'00'

Ing. Luboš Tomášek


člen představenstva
STRABAG Rail a.s.

PŘÍLOHA č. 1 (současně PŘÍLOHA č. 5 Smlouvy)

Harmonogram postupu prací

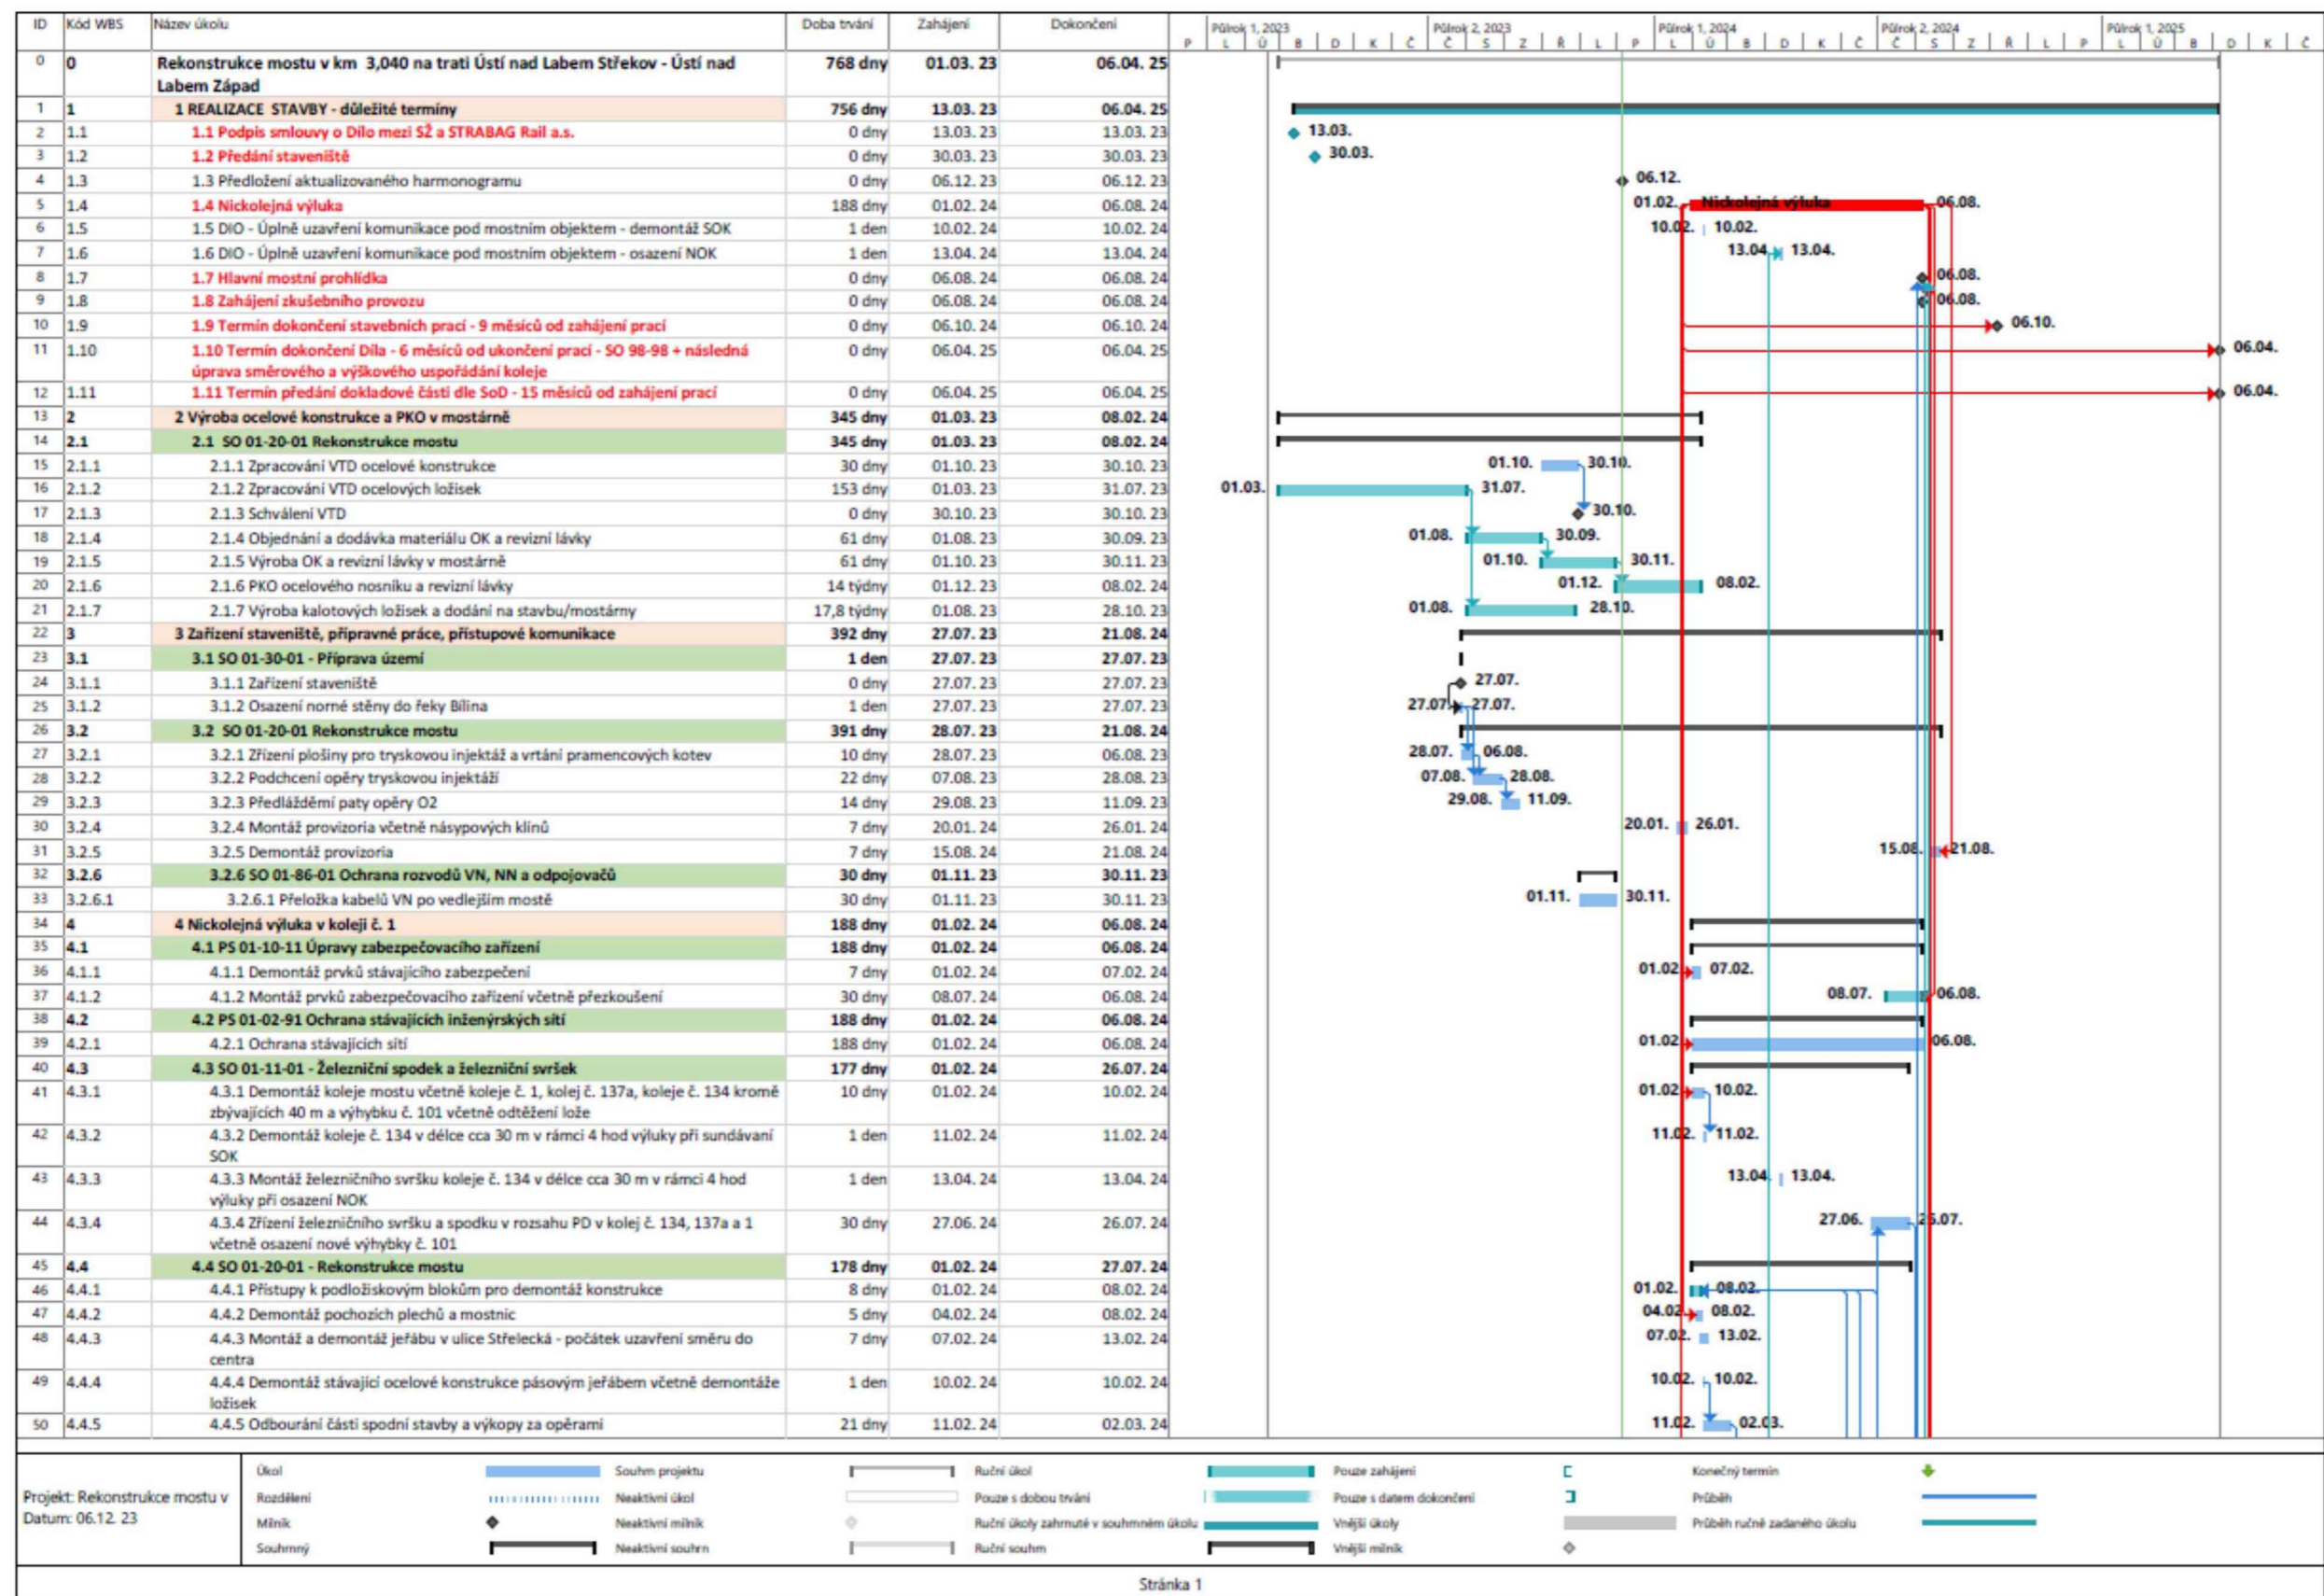

| ID | Kód WBS | Název úkolu | Doba trvání | Zahájení | Dokončení | Přiblížení 1, 2023 | | | | | | | Přiblížení 2, 2023 | | | | | | | Přiblížení 1, 2024 | | | | | | | Přiblížení 2, 2024 | | | | | | | Přiblížení 1, 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|--|----------------|------------------|------------------|--------------------|---|---|---|---|---|---|--------------------|---|---|---|---|--------|--------|--------------------|---|---|---|---|---|---|--------------------|---|---|---|---|---|---|--------------------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | P | L | Ú | B | D | K | Č | Č | S | Z | Ř | L | P | L | Ú | B | D | K | Č | Č | S | Z | Ř | L | P | L | Ú | B | D | K | Č | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | 4.4.6 | 4.4.6 Armování, bednění a betonáž nových částí spodní stavby | 30 dny | 03.03. 24 | 01.04. 24 | | | | | | | | | | | | | 03.03. | 01.04. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | 4.4.7 | 4.4.7 Čištění a sanace rubů O1 a O2 a aplikace SVI | 21 dny | 26.03. 24 | 15.04. 24 | | | | | | | | | | | | | 26.03. | 15.04. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | 4.4.8 | 4.4.8 Odvodnění, přechodové oblasti | 20 dny | 16.04. 24 | 05.05. 24 | | | | | | | | | | | | | 15.04. | 05.05. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | 4.4.9 | 4.4.9 OK - přesun a svaření na stavbě, PKO montážních styků | 18 dny | 23.03. 24 | 09.04. 24 | | | | | | | | | | | | | 23.03. | 09.04. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 4.4.10 | 4.4.10 Osazení NOK do mostního otvoru | 1 den | 10.04. 24 | 10.04. 24 | | | | | | | | | | | | | 10.04. | 10.04. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 4.4.11 | 4.4.11 Bednění, armování a betonáž spřažených desek | 30 dny | 11.04. 24 | 10.05. 24 | | | | | | | | | | | | | 11.04. | 10.05. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | 4.4.12 | 4.4.12 Podliti a aktivace ložisek | 7 dny | 11.05. 24 | 17.05. 24 | | | | | | | | | | | | | 11.05. | 17.05. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | 4.4.13 | 4.4.13 Osazení podélného odvodnění | 14 dny | 18.05. 24 | 31.05. 24 | | | | | | | | | | | | | 18.05. | 31.05. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | 4.4.14 | 4.4.14 Bednění, armování a betonáž železobetonových říms | 25 dny | 18.05. 24 | 11.06. 24 | | | | | | | | | | | | | 18.05. | 11.06. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | 4.4.15 | 4.4.15 Případné opravy PKO OK nosniku | 14 dny | 12.06. 24 | 25.06. 24 | | | | | | | | | | | | | 12.06. | 25.06. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | 4.4.16 | 4.4.16 Sanace spodní stavby | 45 dny | 28.05. 24 | 11.07. 24 | | | | | | | | | | | | | 28.05. | 11.07. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | 4.4.17 | 4.4.17 SVI mostovky + antivibrační rohože | 15 dny | 12.06. 24 | 26.06. 24 | | | | | | | | | | | | | 12.06. | 26.06. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | 4.4.18 | 4.4.18 Revizní lávka a schodiště, terenní úpravy, zábradlí | 40 dny | 28.05. 24 | 06.07. 24 | | | | | | | | | | | | | 28.05. | 06.07. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | 4.4.19 | 4.4.19 Statická zátěžovací zkouška | 1 den | 27.07. 24 | 27.07. 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | 4.5 | 4.5 SO 01-81-01 Úpravy trakčního vedení | 158 dny | 01.02. 24 | 07.07. 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | 4.5.1 | 4.5.1 Demontáž TV, troleje a sloupů TV | 10 dny | 01.02. 24 | 10.02. 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 67 | 4.5.2 | 4.5.2 Montáž sloupů TV, troleje a TV | 30 dny | 08.06. 24 | 07.07. 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | 4.6 | 4.6 SO 01-84-01 Elektrický ohřev výhybky | 185 dny | 01.02. 24 | 03.08. 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | 4.6.1 | 4.6.1 Odstranění stávajícího EOV | 7 dny | 01.02. 24 | 07.02. 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | 4.6.2 | 4.6.2 Montáž EOV | 3 dny | 01.08. 24 | 03.08. 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | 4.7 | 4.7 SO 01-86-01 Ochrana rozvodů VN, NN a odpojovačů | 188 dny | 01.02. 24 | 06.08. 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72 | 4.7.1 | 4.7.1 Odpojení kabelu u UO 401 a smotání | 7 dny | 01.02. 24 | 07.02. 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 73 | 4.7.2 | 4.7.2 Ochrana inženýrských sítí pod mostem | 188 dny | 01.02. 24 | 06.08. 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74 | 4.7.3 | 4.7.3 Obnova NN | 11 dny | 12.07. 24 | 22.07. 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | 4.8 | 4.8 SO 01-87-01 Ukolojnění kovových konstrukcí | 16 dny | 07.07. 24 | 22.07. 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76 | 4.8.1 | 4.8.1 Ukolojnění kovových konstrukcí | 16 dny | 07.07. 24 | 22.07. 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 77 | 5 | 5 Dokončovací práce | 25 dny | 07.08. 24 | 31.08. 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 78 | 5.1 | 5.1 Dokončovací práce na mostě a v jeho okolí | 25 dny | 07.08. 24 | 31.08. 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 5.2 | 5.2 Likvidace zařízení staveniště | 25 dny | 07.08. 24 | 31.08. 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

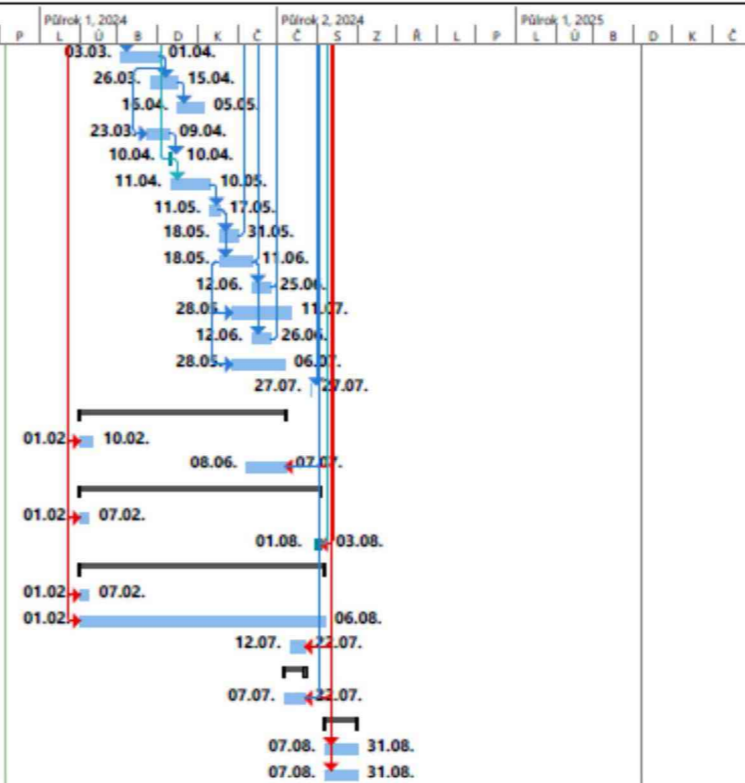

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|------|------------------|-----------------|--|------------|-------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|--|
| Projekt: Rekonstrukce mostu v Datum: 06.12. 23 | | Úkol | | Souhrn projektu | | Ruční úkol | | Pouze zahájení | | Konečný termín | |
| | Rozdělení | | Neaktivní úkol | | Pouze s dobou trvání | | Pouze s datem dokončení | | Průběh | | |
| | Mílník | | Neaktivní mílník | | Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu | | Vnější úkoly | | Průběh ručně zadaného úkolu | | |
| | Souhrnný | | Neaktivní souhrn | | Ruční souhrn | | Vnější mílník | | | | |
