

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „**občanský zákoník**“) mezi:

### **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov  
IČO: 00066001  
DIČ: CZ00066001  
zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem  
nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem  
ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022  
č. smlouvy: **S-1604/00066001/2021**

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

### **HOCHTIEF CZ a.s.**

se sídlem: Plzeňská 16/3217, 150 00, Praha 5  
IČO: 466 78 468  
DIČ: CZ46678468  
zastoupená: Jiřím Duškem, ředitelem divize Dopravní stavby, za základě plné moci  
a  
Ing. Janem Potůčkem, obchodním ředitelem divize Dopravní stavby, na  
základě plné moci  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6229  
č. smlouvy: **D50324/INV/2021/5**

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“)

### **Preambule:**

1. Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 08. 07. 2021 uzavřely smlouvu o dílo jejímž předmětem je provedení stavebních prací na veřejné zakázce s názvem: „**II/245 Mochov, most ev. č. 245-009 přes dálnici D11 za obcí Mochov - stavební práce**“ (dále jen „**Smlouva o dílo**“). Na základě dohody smluvních stran a ve vazbě na čl. 15. Závěrečná ustanovení odst. 15.14. Smlouvy o dílo, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek č. 1**“).

2. V důsledku rozdělení výstavby do 2 stavebních sezón došlo k přerušení prací po dobu zimní technologické přestávky (ZTP 1.12. 2021 - 3. 4. 2022 vč., tj. 124 dnů), tato doba se do doby pro dokončení a předání Díla nezapočítává. Práce dále pokračovaly od 4. 4. 2022. do 4. 12. 2022.

Díky následnému zastižení nepředvídatelných fyzických (geotechnických) podmínek vůči předpokladu v PDPS (zejména vyšší třídy těžitelnosti materiálů), změnám v POV a v návaznosti na provádění víceprací (oprava zámkových dlažeb) došlo ke změně doby pro dokončení Díla. Doba výstavby se oproti smluvnímu HMG prodloužila o 18 dnů.

### **Článek 1.**

#### **Předmět Dodatku č. 1**

1. Čl.4 Doba a místo plnění odst. 4.1 Smlouvy o dílo se mění a nově zní:

*Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat objednateli do 8 měsíců a 18 dnů.*

### **Článek 2.**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek č. 1 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodující.
6. Přílohy dodatku č.1:

Příloha č. 1: Harmonogram prací

Příloha č. 2: Vyjádření AD

Příloha č. 3: Vyjádření TDS

V Říčanech

---

Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, příspěvková  
organizace

V Praze

---

HOCHTIEF CZ a.s.  
Ing. Jan Potůček  
obchodní ředitel divize Dopravní stavby  
na základě plné moci


V Praze


---

HOCHTIEF CZ a.s.  
Jiří Dušek  
ředitel divize Dopravní stavby  
na základě plné moci

## Příloha č. 1:

## II/245 Mochov, most ev. č. 245-009 přes dálnici D11 za obcí Mochov – stavební práce

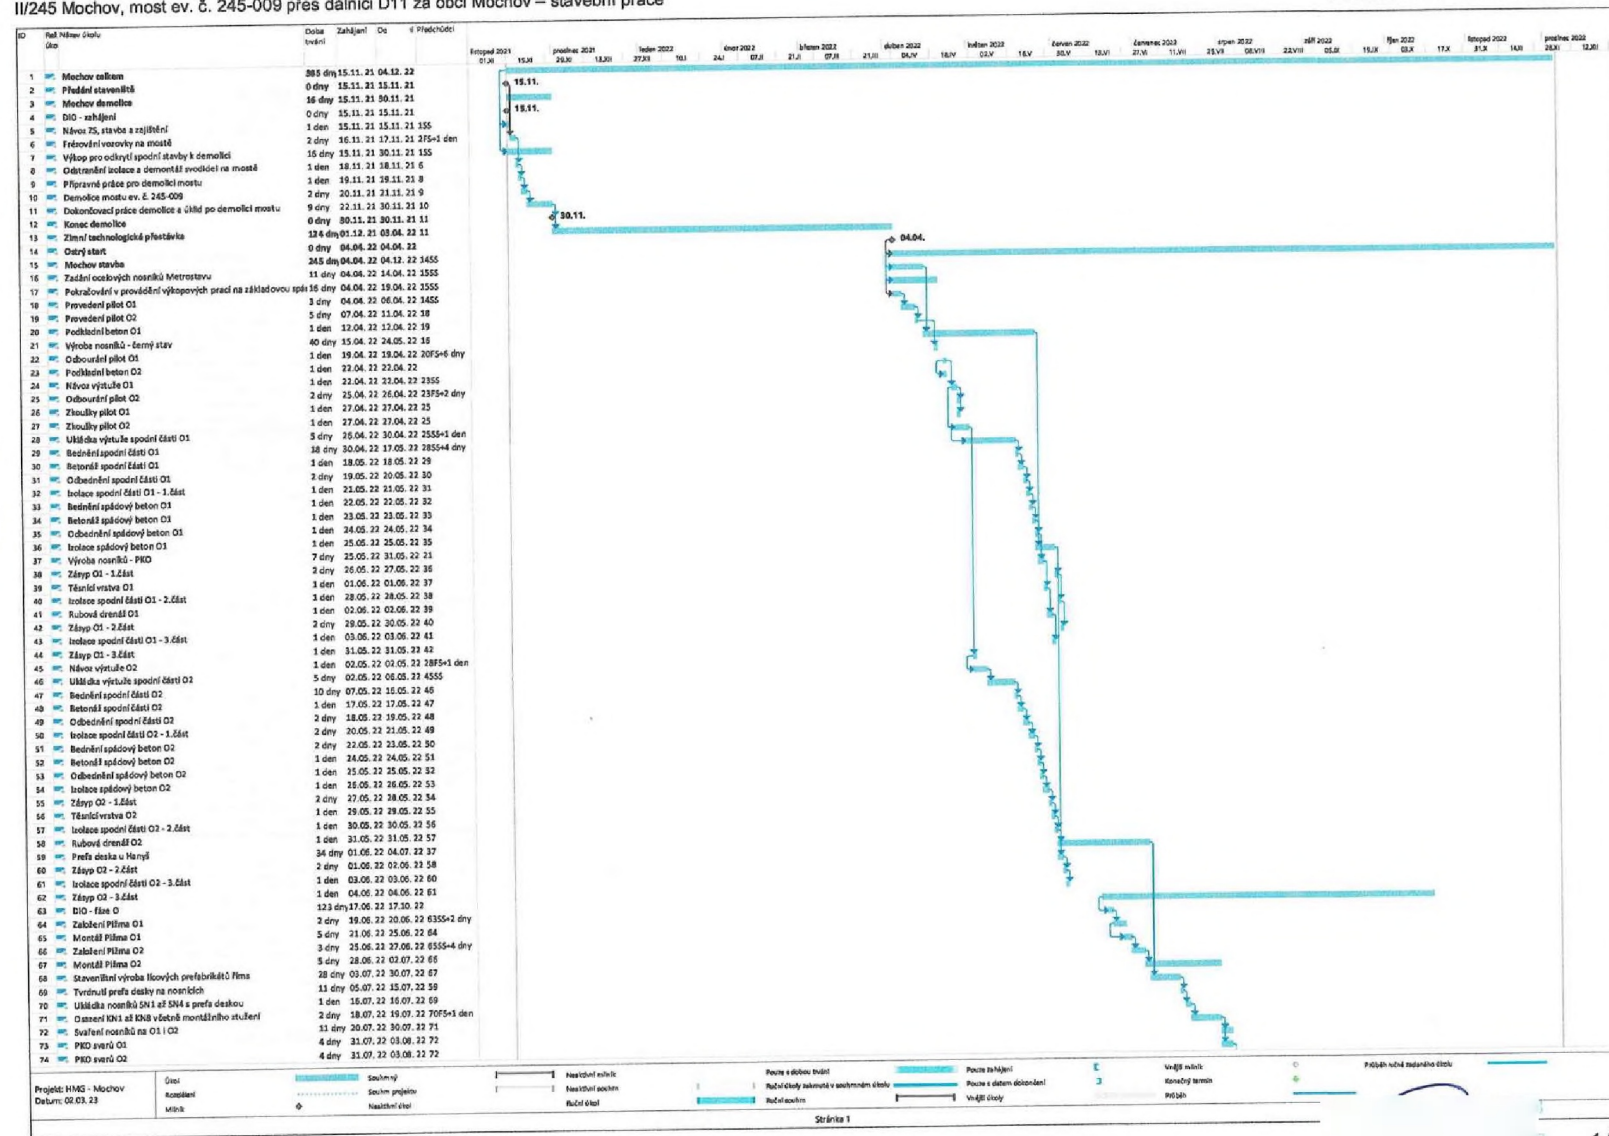

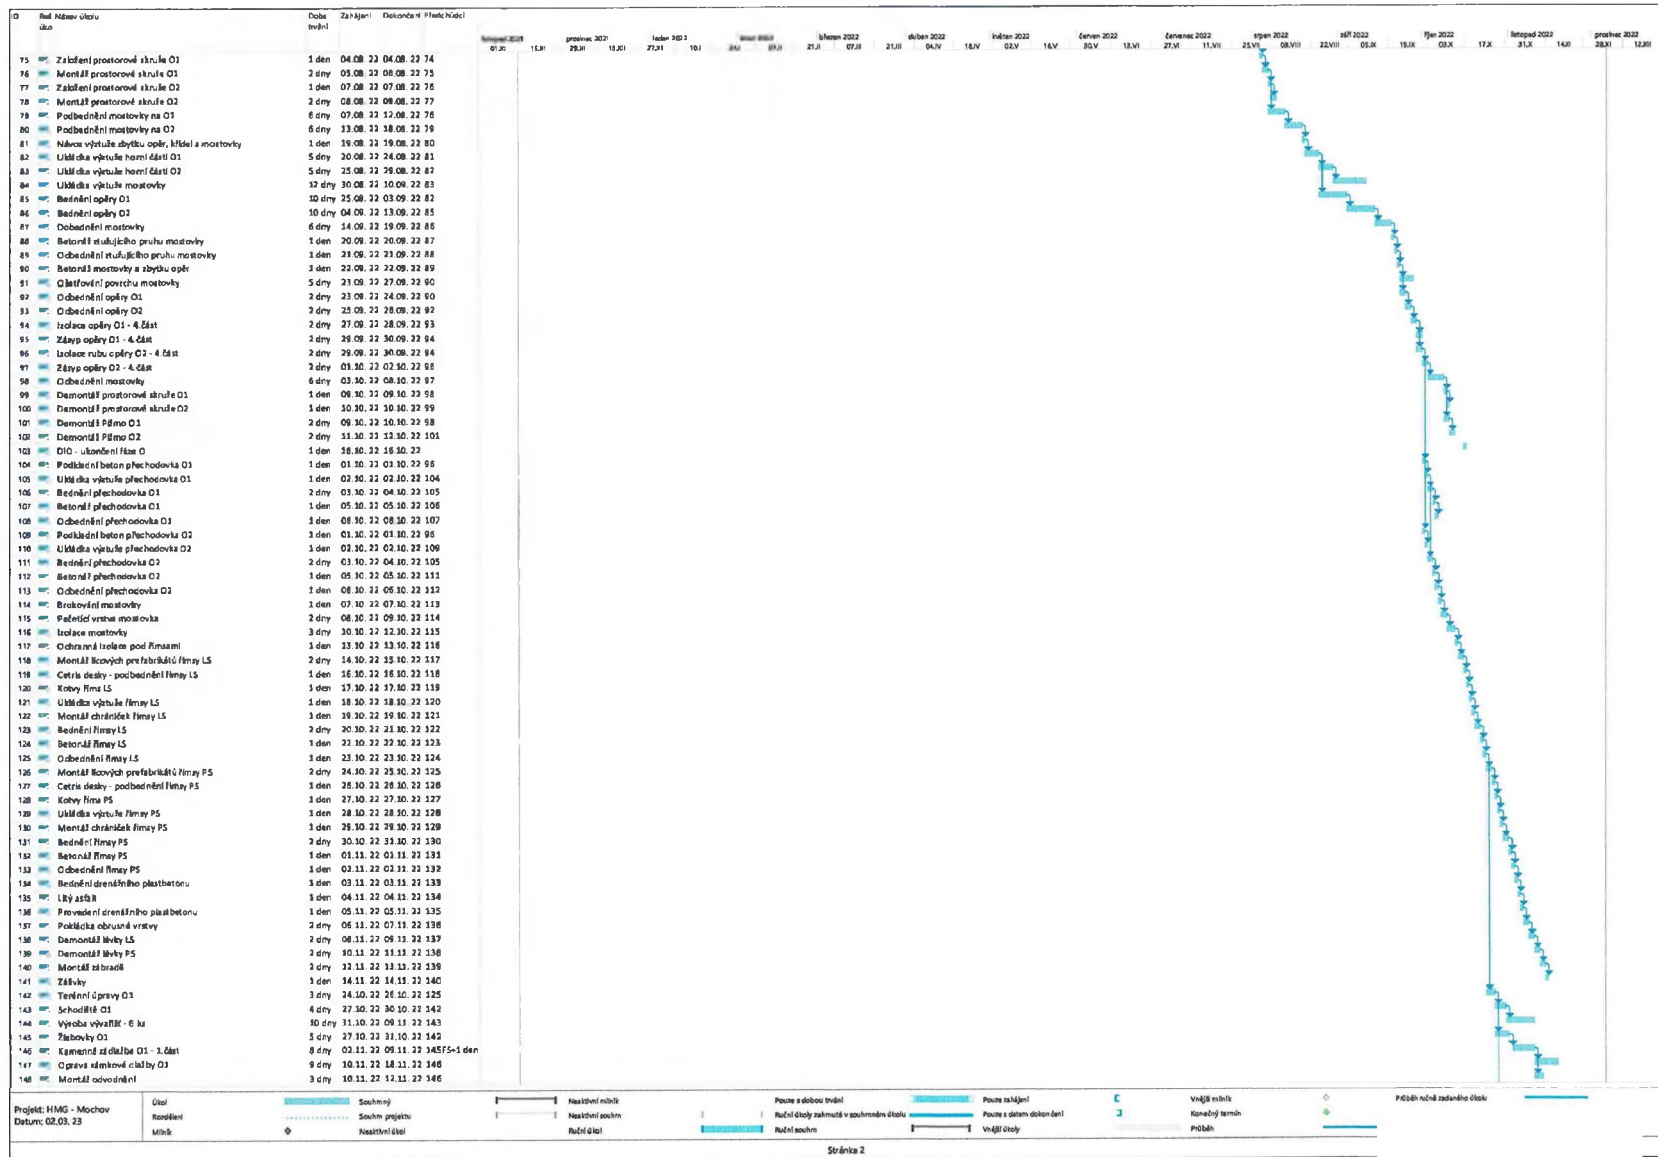



Příloha č. 2:



**PUDIS a.s.**

Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

## **VYJÁDŘENÍ AUTORSKÉHO DOZORU**

**Stavba: II/245 Mochov, most ev. č. 245-009 přes dálnici D11 za obcí Mochov**

**Vyjádření projektanta PD PDPS k předloženému návrhu „ŽÁDOST O UZAVŘENÍ DOHODY O NAROVNÁNÍ z důvodu prodloužení doby výstavby“ zhotovitelem stavby ze dne 03.03.2023:**

Autorský dozor souhlasí s prodloužením výstavby z původně deklarovaných 8 měsíců (tj. 243 dnů) o dalších 18 dnů na finálních 261 dnů.

**Vyjádření AD se vztahují k technickému řešení bez zohlednění dopadu na cenu.**

V Praze dne: **03.03.2023**

Za AD (PUDIS a.s.) : Ing. **Ludvík Kolpaský, Ph.D.**

Příloha č. 3:



Vyřizuje: P. Burger

V Kladně dne: 3.března 2023

KSSÚ Středočeského kraje  
Zborovská 11  
150 00 Praha 5

**Věc: II/245 Mochov, most ev. č. 245-009 přes dálnici D11 za obcí Mochov**

#### **Vyjádření TDS**

##### **Předmětem změny je: Prodloužení doby výstavby**

V důsledku rozdělení výstavby do 2 stavebních sezón a přerušení prací po dobu zimní technologické přestávky, provádění víceprací došlo k časovému prodloužení doby výstavby oproti smluvnímu HMG.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti, technický dozor objednatele s předloženými navrhovanými prodloužením doby výstavby o 18 dnů, na konečných 261 dnů **souhlasí**, a považuje je za oprávněné.

Z návrhu změn vyplývá, že byly nezbytné pro realizaci stavby.

**Za IBH s.r.o.**

**Petr Burger**
