

## Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

**III/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

**Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice**

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

**102/12**

Číslo ZBV:

**37**

Objednatel:

**Krajská správa a údržba Středočeského kraje, příspěvková organizace**

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

IČ: 00066001

DIČ: CZ00066001

Zhotovitel:

**STRABAG a. s.**

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

## Rekapitulace ZBV č. 37 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 37.1        | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                                       |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 37.2        | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                                       |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 37.3        | -86 929,80                          | 1 684 180,84                       | 1 597 251,04                                               |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 37.4        | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                                       |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 37.5        | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                                       |

| Suma ZBV<br>č. | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
|----------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>37</b>      | <b>-86 929,80</b>                   | <b>1 684 180,84</b>                | <b>1 597 251,04</b>                                        |

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.  
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy  
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

**1**

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

102/12

Číslo ZBV:

37

Strany smlouvy o dílo č. S-468/00066001/2020 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 3.3.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: STRABAG a. s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

## Přílohy Změnového listu:

|                                             |    |             |
|---------------------------------------------|----|-------------|
| 1. Krycí list                               | 1  | počet listů |
| 2. Změnový list                             | 1  | počet listů |
| 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací | 1  | počet listů |
| 4. Rozpis ocenění Změn položek              | 1  | počet listů |
| 5. Přehled zařazení změn do skupin          | 2  | počet listů |
| 6. Přehled dalších dokladů                  | 1  | počet listů |
| Další doklady dle přehledu dokladů          | 96 | počet listů |

Paré č.

Příjemce

|   |                                         |
|---|-----------------------------------------|
| 1 | Objednatel                              |
| 2 | Zhotovitel                              |
| 3 | Projektant (AD)                         |
| 4 | Stavební dozor                          |
| 5 | Supervize (Regionální dotační kancelář) |

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

**Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / lokální opravy CB desek SAL, zábradlí propustek**

## 1) Vrstva SAL:

Změna během výstavby řeší skutečně provedené množství asfaltové vrstvy proti šíření trhlin SAL, oproti předpokladu PDPS na stavebním objektu SO 102. Vrstva byla položena v úsecích, kde po odfrézování stávajících AB vrstev byla zachována podkladní CB deska s příčnými a podélnými spárami, nebo byla změněna niveleta vozovky a konstrukce upravena po dohodě s projektantem RDS a TDI na skladbu 130 mm, kde podkladní vrstvu tvoří SAL. Změnu množství dokládáme přiloženými měřičskými protokoly z provedených úseků a zápisy ve stavebních denících úseku SO 102. Dále dokládáme vyjádření AD č. 69 (příl. č. 14) a souhlasné stanovisko objednatel. Změna se týká pol. č. 39 a 44 cenové navýšení činí 1 596 621,07 Kč.

## 2) Zábradlí na vtoku propustku km 12,925

V PDPS bylo uvažováno s vybouráním kamenného propustu a jeho nahrazením novým propustem DN 1000 délky 15 m s odlážděním vtoku s šikmými čely z lomového kamene do betonového lože. Po odstranění vegetace a vybourání starého propustu byl zřízen nový s tím, že byl dodlážděn celý vtok dle skutečného přilehlého terénu a dodatečně na stavbě dohodnuto s projektantem a TDI zřídit kolem zpevněného vtoku z důvodu bezpečnosti chodců (v blízkosti jsou nemovitosti) ocelové atypické zábradlí (viz. vyjádření AD č. 67 - příl. č. 15). Toto dodatečně naprojektoval projektant RDS (viz výkres). S tímto bezpečnostním zařízením souhlasil objednatel. Změna se týká pol. č. 15, 16, 18, 19, 61, 62, 157, 158 a 225 cenové výši 1 704,25 Kč.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle § 5, odst.1 písm. c), resp. podle § 10 Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazena do **skupiny 3** jako změna z nepředvídaných důvodů. Zároveň se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a to z důvodu nepředvídaných fyzických podmínek vzniklých na stavbě v průběhu realizace a hodnota těchto dodatečných stavebních prací nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku.

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem | Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných |
|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| -86 929,80                       | 1 684 180,84                    | 1 597 251,04                                            | 1 771 110,64                                             |

Technická pomoc Objednatel

jméno

Ing. Lubomír Smetana

datum

podpis

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Zhotovitel (stavbyvedoucí): STRABAG a.s.

jméno

Ing. Karel Šimek

datum

podpis

Projektant (autorský dozor):  
Pontex, spol. s.r.o.

jméno

Ing. David Dvořáček

datum

podpis

Stavební dozor: Pragoprojekt, a. s.

jméno

Miroslav Valenta

datum

podpis

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                                        |       |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|-------|-------------|
| Supervize (Regionální dotační kancelář)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | jméno |                                        | datum | podpis      |
| Zástupce Objednatele: KSÚS SK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | jméno | Ing. Milan Peška                       | datum | podpis      |
| Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | jméno | Ing. Jaroslava Jurková                 | datum | podpis      |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. |       |                                        |       |             |
| Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | jméno | Ing. Jan Fidler, DiS.                  | datum | podpis      |
| Zhotovitel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | jméno | Ing. Martin Bašár<br>Ing. Karel Klofáč | datum | podpis      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                                        |       | Číslo paré: |

# ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 37**

|                                                             |                                                                      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Název Stavby:</b>                                        | <b>II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II</b> |
| <b>Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:</b>                     | <b>102/12</b>                                                        |
| <b>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</b> | <b>Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice</b>                       |

Údaje v Kč bez DPH

|                               |
|-------------------------------|
| <b>Cena SO/PS dle Smlouvy</b> |
| <b>1 - zadat</b>              |
| <b>113 362 946,56</b>         |

**Cena SO/PS v předchozích ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

|                         | Cena všech Změn<br>záporných v<br>předchozích<br>Změnách na SO/PS | Cena všech Změn<br>kladných v<br>předchozích<br>Změnách na SO/PS | Cena SO/PS po<br>všech předchozích<br>Změnách | Rozdíl ceny SO/PS po<br>všech předchozích<br>Změnách a ve<br>Smlouvě |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>2</b>                | <b>3 - zadat</b>                                                  | <b>4 - zadat</b>                                                 | <b>5=1+3+4</b>                                | <b>6=5-1</b>                                                         |
| stavební/montážní práce | -6 629 024,10                                                     | 16 645 920,33                                                    | 123 379 842,79                                | 10 016 896,23                                                        |

**Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

|                         | Cena navrhovaných<br>Změn záporných na<br>SO/PS | Cena navrhovaných<br>Změn kladných na<br>SO/PS | Cena všech Změn<br>kladných na SO/PS<br>(předchozích a<br>navrhovaných) | Cena všech Změn<br>kladných na SO/PS k<br>ceně SO/PS dle<br>Smlouvy v % |
|-------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>7</b>                | <b>8 - zadat</b>                                | <b>9 - zadat</b>                               | <b>10=4+9</b>                                                           | <b>11=10/1</b>                                                          |
| stavební/montážní práce | -86 929,80                                      | 1 684 180,84                                   | 18 330 101,17                                                           | 16,17%                                                                  |

**Cena SO/PS po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

|                         | Cena všech Změn<br>záporných na SO/PS<br>(předchozích a<br>navrhovaných) | Cena SO/PS po této<br>Změně | Rozdíl ceny SO/PS<br>po této Změně oproti<br>ceně SO/PS dle<br>Smlouvy | Rozdíl ceny SO/PS po<br>této Změně oproti ceně<br>SO/PS dle Smlouvy v<br>% |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>12</b>               | <b>13=3+8</b>                                                            | <b>14=1+13+10</b>           | <b>15=14-1</b>                                                         | <b>16=15/1</b>                                                             |
| stavební/montážní práce | -6 715 953,90                                                            | 124 977 093,83              | 11 614 147,27                                                          | 10,25%                                                                     |



| Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo 37                                                                                                                                                                                                     |             |                                                                          |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II<br>Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice<br>Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice |             |                                                                          |      |                     |                   |                  |                   | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                          |      |                     |                   |                  |                   | 102                         |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                          |      |                     |                   |                  |                   | Skupina změn 3              |                    |                   |                           |                        |                      |
| Poř. č. pol.                                                                                                                                                                                                                                       | Kód položky | Název položky                                                            | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                  | 2           | 3                                                                        | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                 | 11                | 12                        | 13                     | 14                   |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                 | 131203101   | Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3      | M3   | 0,315               | 2,865             | 2,550            | 4 417,49          | 1 391,51                    | 0,00               | 11 264,60         | 12 656,11                 | 11 264,60              | 809,52%              |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                 | 162701105   | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4    | M3   | 15 023,840          | 15 026,390        | 2,550            | 504,88            | 7 585 236,34                | 0,00               | 1 287,44          | 7 586 523,78              | 1 287,44               | 0,02%                |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                 | 171201201   | Uložení sypaniny na skládky                                              | M3   | 10 725,990          | 10 728,540        | 2,550            | 16,70             | 179 124,03                  | 0,00               | 42,58             | 179 166,61                | 42,58                  | 0,02%                |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                 | 171201211   | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)           | T    | 22 695,246          | 22 700,091        | 4,845            | 138,17            | 3 135 802,14                | 0,00               | 669,43            | 3 136 471,57              | 669,43                 | 0,02%                |
| 39                                                                                                                                                                                                                                                 | 565125000R  | Asfaltová vrstva se zvýšenou odolností proti šíření trhlin SAL tl. 30 mm | M2   | 13 995,000          | 20 155,500        | 6 160,500        | 246,93            | 3 455 785,35                | 0,00               | 1 521 212,27      | 4 976 997,62              | 1 521 212,27           | 44,02%               |
| 44                                                                                                                                                                                                                                                 | 573231106   | Postřík živičný spojovací ze silniční emulze modif v množství 0,30 kg/m2 | M2   | 40 367,809          | 46 528,309        | 6 160,500        | 12,24             | 494 101,98                  | 0,00               | 75 404,52         | 569 506,50                | 75 404,52              | 15,26%               |
| 61                                                                                                                                                                                                                                                 | 911121111   | Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu      | M    | 10,000              | 0,000             | -10,000          | 863,54            | 8 635,40                    | -8 635,40          | 0,00              | 0,00                      | -8 635,40              | -100,00%             |
| 62                                                                                                                                                                                                                                                 | 55391534    | zábradelní systém Pz s výplní ze svislých ocelových tyčí ZSNH4/H2        | M    | 10,000              | 0,000             | -10,000          | 7 829,44          | 78 294,40                   | -78 294,40         | 0,00              | 0,00                      | -78 294,40             | -100,00%             |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |             | NOVÉ POLOŽKY                                                             |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 157                                                                                                                                                                                                                                                | 275313711   | Základové patky z betonu tř. C 20/25                                     | M3   | 0,000               | 2,250             | 2,250            | 4 160,00          | 0,00                        | 0,00               | 9 360,00          | 9 360,00                  | 9 360,00               | 100,00%              |
| 158                                                                                                                                                                                                                                                | 911111111   | Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného                                 | M    | 0,000               | 20,000            | 20,000           | 192,00            | 0,00                        | 0,00               | 3 840,00          | 3 840,00                  | 3 840,00               | 100,00%              |
| 225                                                                                                                                                                                                                                                | 74910606    | zábradlí městské obloukové bezpečnostní lakovaný povrch 2000x1000mm      | KUS  | 0,000               | 10,000            | 10,000           | 6 110,00          | 0,00                        | 0,00               | 61 100,00         | 61 100,00                 | 61 100,00              | 100,00%              |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |             | Celkem                                                                   |      |                     |                   |                  |                   | 14 938 371,15               | - 86 929,80        | 1 684 180,84      | 16 535 622,19             | 1 597 251,04           | 10,69%               |

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.  
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Karel Šimek, (vedoucí projektu)

Datum:

Podpis:

Za Objednatele: Miroslav Valenta, (TDI)

Datum:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

|                                 |                                                                                            |                |                                                               |                                                           |                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|
| Název a evidenční číslo Stavby: |                                                                                            |                | II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II |                                                           |                |
| 1                               | Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH                                                   | 377 812 002,59 | 6=32+36                                                       | Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4 | 16 040 229,89  |
| 2=1+19+20                       | Aktuální smluvní částka (cena stavby)                                                      | 393 089 965,13 | 7=(6/1)*100                                                   | Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4      | 4,25%          |
|                                 | Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH                                           | 475 638 857,81 | 8=1*0,3                                                       | Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4              | 113 343 600,78 |
| 3=(2/1)*100                     | Procento změny Přijaté smluvní částky                                                      | 104,04%        |                                                               |                                                           |                |
| 4=(25/1)*100                    | Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)                                                     | 0,00%          |                                                               |                                                           |                |
| 5=(28/1)*100                    | Sledování záměny položek (Skupina 2)                                                       | 0,00%          |                                                               |                                                           |                |
| 40=(19/1)*100                   | Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b) | -5,25%         |                                                               |                                                           |                |

|                |                                                                                  |                |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 9=(32A/1)*100  | Sledování limitu 50 % Skupina 3                                                  | 12,25%         |
| 10=(36A/1)*100 | Sledování limitu 50 % Skupina 4                                                  | 1,24%          |
| 10A=32A+36A    | Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4 | 50 974 159,05  |
| 11=1*0,5       | Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4                                     | 188 906 001,30 |

|                 |                                 |                |
|-----------------|---------------------------------|----------------|
| 12=(37/1)*100   | Sledování limitu (15%)          | 1,05%          |
| 13=37           | Sledování limitu 137 366 000 Kč | 3 998 392,61   |
| 14=137366000-37 |                                 | 133 367 607,39 |

|        |        |                                                                                                                               |                                            |                      |                | - 1 -                                                       |              | - 2 -                                                      |                                            |              |                                     | - 3 -                                                          |               |                                     |                                                        | - 4 -                                                      |              |                                     |                                                        | - 5 -                                             |               |
|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|
|        |        |                                                                                                                               |                                            |                      |                | Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.) |              | Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.) |                                            |              |                                     | Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.) |               |                                     |                                                        | Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.) |              |                                     |                                                        | Změny de minimis                                  |               |
| SO     | ZBV č. | Název SO/PS / předmět Změny                                                                                                   | Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus) | Změny kladné         | Hodnota ZBV    | Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)                  | Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných                        | Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus) | Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)                     | Změny kladné  | Suma Změn záporných a Změn kladných | Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných | Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)                 | Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných | Změny de minimis (15% nebo limit 137 366 000,- Kč | limit 15 %    |
| 16     | 17     | 18                                                                                                                            | 19=23+26+29+33                             | 20=24+27+30+34+37+39 | 21=19+20       | 23                                                          | 24           | 25=23+24                                                   | 26                                         | 27           | 28=26+27                            | 29                                                             | 30            | 32=29+30                            | 32A=ABS(29)+30                                         | 33                                                         | 34           | 36=33+34                            | 36A=ABS(33)+34                                         | 37                                                | 38=(37/1)*100 |
|        |        | II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II                                                                 | - 19 847 294,56                            | 35 125 257,10        | 15 277 962,54  | 0,00                                                        | 0,00         | 0,00                                                       | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | - 17 404 410,90                                                | 28 893 116,79 | 11 488 705,89                       | 46 297 527,69                                          | - 62 553,68                                                | 4 614 077,68 | 4 551 524,00                        | 4 676 631,36                                           | 3 998 392,61                                      | 1,05%         |
| 103    | 1      | Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / úprava poklopů a vodoznaků                                                       | 0,00                                       | 124 942,66           | 124 942,66     | 0,00                                                        | 0,00         | 0,00                                                       | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                           | 0,00          | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                                       | 124 942,66   | 124 942,66                          | 124 942,66                                             | 0,00                                              | 0,00%         |
| 103/2  | 2      | Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / přeložka vodovodní přípojky km 14,815-14,895, kolize s kabelem CETIN             | 0,00                                       | 158 202,22           | 158 202,22     | 0,00                                                        | 0,00         | 0,00                                                       | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                           | 158 202,22    | 158 202,22                          | 158 202,22                                             | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                              | 0,00%         |
| 103/3  | 3      | Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / odstranění žulových kostek                                                       | - 147 928,60                               | 470 739,23           | 322 810,63     | 0,00                                                        | 0,00         | 0,00                                                       | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | - 147 928,60                                                   | 470 739,23    | 322 810,63                          | 618 667,83                                             | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                              | 0,00%         |
| 103/4  | 4      | Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / oprava objízdné trasy Masečín                                                    | 0,00                                       | 514 671,37           | 514 671,37     | 0,00                                                        | 0,00         | 0,00                                                       | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                           | 0,00          | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                                       | 514 671,37   | 514 671,37                          | 514 671,37                                             | 0,00                                              | 0,00%         |
| 103/5  | 5      | Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / kolize kabelů s kanalizací a novým profilem vozovky                              | 0,00                                       | 1 072 447,19         | 1 072 447,19   | 0,00                                                        | 0,00         | 0,00                                                       | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                           | 1 072 447,19  | 1 072 447,19                        | 1 072 447,19                                           | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                              | 0,00%         |
| 102    | 6      | Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / zvýšené množství odstraňování křovin                                                | - 62 553,68                                | 2 301 662,61         | 2 239 108,93   | 0,00                                                        | 0,00         | 0,00                                                       | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                           | 0,00          | 0,00                                | 0,00                                                   | - 62 553,68                                                | 2 301 662,61 | 2 239 108,93                        | 2 364 216,29                                           | 0,00                                              | 0,00%         |
| 901    | 7      | Provizorní most přes Kočábu / změna založení mostního provizoria                                                              | - 535 759,98                               | 1 068 988,13         | 533 228,15     | 0,00                                                        | 0,00         | 0,00                                                       | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                           | 0,00          | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                   | 1 604 748,11                                      | 0,42%         |
| 207    | 8      | Most ev.č.102-017 / Zajištění skálního svahu                                                                                  | 0,00                                       | 728 985,00           | 728 985,00     | 0,00                                                        | 0,00         | 0,00                                                       | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                           | 728 985,00    | 728 985,00                          | 728 985,00                                             | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                              | 0,00%         |
| 207/2  | 9      | Most ev.č.102-017 / odstranění vrstvy žulových kostek + podkladní vrstva pod OP1                                              | 0,00                                       | 75 186,27            | 75 186,27      | 0,00                                                        | 0,00         | 0,00                                                       | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                           | 75 186,27     | 75 186,27                           | 75 186,27                                              | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                              | 0,00%         |
| 102/2  | 10     | Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice/ frézování a doplnění konstrukčních vrstev vozovky                                    | 0,00                                       | 43 669,94            | 43 669,94      | 0,00                                                        | 0,00         | 0,00                                                       | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                           | 0,00          | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                                       | 43 669,94    | 43 669,94                           | 43 669,94                                              | 0,00                                              | 0,00%         |
| 103/6  | 11     | Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi / předláždění chodníků, obrubry, úprava plotové zidky u křižovatky Hlavní a Školní | 0,00                                       | 671 285,54           | 671 285,54     | 0,00                                                        | 0,00         | 0,00                                                       | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                           | 0,00          | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                                       | 671 285,54   | 671 285,54                          | 671 285,54                                             | 0,00                                              | 0,00%         |
| 102/3  | 12     | Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / odvodňovací proužek                                                                 | - 1 844 570,00                             | 549 074,50           | - 1 295 495,50 | 0,00                                                        | 0,00         | 0,00                                                       | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                |                                                                |               | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                   | 2 393 644,50                                      | 0,63%         |
| 102/4  | 13     | Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / Úprava svahu dlažbou z lomového kamene km 10,360-10,840 L.S.                        | 0,00                                       | 5 693 724,53         | 5 693 724,53   | 0,00                                                        | 0,00         | 0,00                                                       | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                           | 5 693 724,53  | 5 693 724,53                        | 5 693 724,53                                           | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                              | 0,00%         |
| 253    | 14     | Opěrné zdi - Davle - Štěchovice - vlevo / sanace základové spáry v založení SO 253, zeď č. 61 vlevo                           | 0,00                                       | 277 190,48           | 277 190,48     | 0,00                                                        | 0,00         | 0,00                                                       | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                           | 277 190,48    | 277 190,48                          | 277 190,48                                             | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                              | 0,00%         |
| 102/5  | 15     | Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / Km 13,200-13,700 svodidlo, krajnice, žulové kostky                                  | 0,00                                       | 881 187,01           | 881 187,01     | 0,00                                                        | 0,00         | 0,00                                                       | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                           | 881 187,01    | 881 187,01                          | 881 187,01                                             | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                              | 0,00%         |
| 334    | 16     | Kanalizace ve Štěchovicích / zaslepení nefunkční dešťové kanalizace                                                           | 0,00                                       | 587 837,86           | 587 837,86     | 0,00                                                        | 0,00         | 0,00                                                       | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                           | 587 837,86    | 587 837,86                          | 587 837,86                                             | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                              | 0,00%         |
| 102/6  | 17     | Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice /Změna množství odfrézovaných vrstev AB                                               | - 784 390,50                               | 1 450 696,44         | 666 305,94     | 0,00                                                        | 0,00         | 0,00                                                       | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | - 784 390,50                                                   | 1 450 696,44  | 666 305,94                          | 2 235 086,94                                           | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                              | 0,00%         |
| 334/2  | 18     | Kanalizace ve Štěchovicích / Kolize s kabelem ČEZ                                                                             | 0,00                                       | 39 769,75            | 39 769,75      | 0,00                                                        | 0,00         | 0,00                                                       | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                           | 39 769,75     | 39 769,75                           | 39 769,75                                              | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                              | 0,00%         |
| 204    | 19     | Most ev.č. 102-012 / Změna spodní stavby, dobetonávky k původním opěrám                                                       | - 13 158,52                                | 158 423,56           | 145 265,04     | 0,00                                                        | 0,00         | 0,00                                                       | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | - 13 158,52                                                    | 158 423,56    | 145 265,04                          | 171 582,08                                             | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                              | 0,00%         |
| 102/7  | 20     | Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / Úprava v kraji vozovky km 13,15-13,202 vlevo                                        | 0,00                                       | 210 681,35           | 210 681,35     | 0,00                                                        | 0,00         | 0,00                                                       | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                           | 210 681,35    | 210 681,35                          | 210 681,35                                             | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                              | 0,00%         |
| 102/8  | 21     | Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / Změna tloušťek AB vrstev                                                            | - 685 017,85                               | 2 326 749,68         | 1 641 731,83   | 0,00                                                        | 0,00         | 0,00                                                       | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | - 685 017,85                                                   | 2 326 749,68  | 1 641 731,83                        | 3 011 767,53                                           | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                              | 0,00          |
| 334/3  | 22     | Kanalizace ve Štěchovicích / Štěrbínové žlaby, vpusti, žlaby                                                                  | - 848 332,68                               | 893 335,27           | 45 002,59      | 0,00                                                        | 0,00         | 0,00                                                       | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | - 848 332,68                                                   | 893 335,27    | 45 002,59                           | 1 741 667,95                                           | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                              | 0,00          |
| 102/9  | 23     | Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / Změna podkladní vrstvy                                                              | - 3 315 045,75                             | 4 872 115,58         | 1 557 069,83   | 0,00                                                        | 0,00         | 0,00                                                       | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | - 3 315 045,75                                                 | 4 872 115,58  | 1 557 069,83                        | 8 187 161,33                                           | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                              | 0,00          |
| 103/7  | 24     | Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / Ochrana proti ostříku                                                            | 0,00                                       | 386 957,63           | 386 957,63     | 0,00                                                        | 0,00         | 0,00                                                       | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                           | 386 957,63    | 386 957,63                          | 386 957,63                                             | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                              | 0,00          |
| 253/2  | 25     | Opěrné zdi - Davle - Štěchovice - vlevo / změna zařídění hornin                                                               | - 11 482 675,35                            | 4 065 440,24         | - 7 417 235,11 | 0,00                                                        | 0,00         | 0,00                                                       | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | -11 482 675,35                                                 | 4 065 440,24  | -7 417 235,11                       | 15 548 115,59                                          | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                              | 0,00          |
| 102/10 | 26     | Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / zvýšené množství odstraňování křovin                                                | 0,00                                       | 893 825,06           | 893 825,06     | 0,00                                                        | 0,00         | 0,00                                                       | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                           | 0,00          | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                                       | 893 825,06   | 893 825,06                          | 893 825,06                                             | 0,00                                              | 0,00          |
| 102/11 | 27     | Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / lokální opravy CB desek                                                             | 0,00                                       | 439 876,30           | 439 876,30     | 0,00                                                        | 0,00         | 0,00                                                       | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                           | 439 876,30    | 439 876,30                          | 439 876,30                                             | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                              | 0,00          |
| 103/8  | 28     | Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / úpravy v km 14,915, 14,950 a 15,070                                              | 0,00                                       | 337 421,30           | 337 421,30     | 0,00                                                        | 0,00         | 0,00                                                       | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                           | 337 421,30    | 337 421,30                          | 337 421,30                                             | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                              | 0,00          |
| 000/1  | 29     | Vedlejší a ostatní náklady/ RDS vypracování změn                                                                              | 0,00                                       | 1 879 064,84         | 1 879 064,84   | 0,00                                                        | 0,00         | 0,00                                                       | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                           | 1 879 064,84  | 1 879 064,84                        | 1 879 064,84                                           | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                              | 0,00          |
| 331/1  | 30     | Přeložka kanalizace u mostu 102-012/ doplnění šoupátek                                                                        | 0,00                                       | 41 604,72            | 41 604,72      | 0,00                                                        | 0,00         | 0,00                                                       | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                           | 41 604,72     | 41 604,72                           | 41 604,72                                              | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                              | 0,00          |

|         |    |                                                                                           |             |              |              |      |      |      |      |      |      |             |              |              |              |      |           |           |           |      |      |
|---------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|-------------|--------------|--------------|--------------|------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| 332/1   | 31 | Přeložka kanalizace u mostu 102-013 / doplnění šoupátek                                   | 0,00        | 41 604,72    | 41 604,72    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 41 604,72    | 41 604,72    | 41 604,72    | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 333/1   | 32 | Přeložka kanalizace u mostu 102-014 / doplnění šoupátek                                   | 0,00        | 41 604,72    | 41 604,72    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 41 604,72    | 41 604,72    | 41 604,72    | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 341/1   | 33 | Přeložka vodovodu u mostu 102-012 / doplnění šoupátek                                     | - 13 643,95 | 26 030,02    | 12 386,07    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 13 643,95 | 26 030,02    | 12 386,07    | 39 673,97    | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 342/1   | 34 | Přeložka vodovodu u mostu 102-013 / doplnění šoupátek                                     | - 13 643,95 | 26 030,02    | 12 386,07    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 13 643,95 | 26 030,02    | 12 386,07    | 39 673,97    | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 343/1   | 35 | Přeložka vodovodu u mostu 102-014 / doplnění šoupátek                                     | - 13 643,95 | 26 030,02    | 12 386,07    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 13 643,95 | 26 030,02    | 12 386,07    | 39 673,97    | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 181.2/1 | 36 | Přechodné dopravní značení / posunutí semaforu                                            | 0,00        | 64 020,50    | 64 020,50    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 64 020,50 | 64 020,50 | 64 020,50 | 0,00 | 0,00 |
| 102/12  | 37 | Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / lokální opravy CB desek SAL, zábradlí propustek | - 86 929,80 | 1 684 180,84 | 1 597 251,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 86 929,80 | 1 684 180,84 | 1 597 251,04 | 1 771 110,64 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|         |    |                                                                                           |             |              |              |      |      |      |      |      |      |             |              |              |              |      |           |           |           |      |      |

## Přehled dalších dokladů

|                                                        |                                                                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Číslo ZBV:                                             | 37                                                                   |
| Název a evidenční číslo stavby:                        | <b>II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II</b> |
| Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS): | Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice                              |
| Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:                       | 102/12                                                               |

| Doklad                                                | Součást dokumentace ZBV |              |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|
|                                                       | ANO<br>(počet listů)    | NE - Uloženo |
| 07 Změnový soupis prací SO 102 po změně 12 pro ZBV 37 | 22                      |              |
| 08 Oznámení zhotovitele o nové skutečnosti            | 1                       |              |
| 09 Stanovisko KSÚSSK a pokyn ke zpracování ZBV        | 1                       |              |
| 10 Listy SD - SAL                                     | 15                      |              |
| 11 Geodetické protokoly - SAL                         | 42                      |              |
| 12 Vyjádření AD SAL                                   | 1                       |              |
| 13 Výkres - zábradlí                                  | 1                       |              |
| 14 Vyjádření AD č. 69 - SAL                           | 1                       |              |
| 15 Vyjádření AD č. 67 - zábradlí                      | 1                       |              |
| 16 Listy SD - zábradlí                                | 1                       |              |
| 17 Fotodokumentace - zábradlí                         | 1                       |              |
| 18 Zápis Ing. Klofáče do obch. rejstříku              | 2                       |              |
| 19 Zápis Ing. Bašára do obch. rejstříku               | 6                       |              |
| 20 Stanovisko TDS                                     | 1                       |              |
|                                                       |                         |              |
|                                                       |                         |              |
|                                                       |                         |              |
| Počet listů celkem                                    | 96                      |              |

[illegible]

| Změnový soupis prací SO 102 po změně 12 pro ZBV 37                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                     |                   |                  |                   | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) |                    |                   |                           |                        |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II<br>Číslo a název SO/PS:    SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice<br>Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                     |                   |                  |                   | 102                         |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                     |                   |                  |                   | Celkem                      |                    |                   |                           |                        |                      |
| Poř. č.<br>pol.                                                                                                                                                                                                                                       | Kód položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                     | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                 | 11                | 12                        | 13                     | 14                   |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                     | 113154334   | Frézování živčního krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase<br><br>Frézování živčního podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm<br><br>SoD<br>13995 asf. beton v tl. 60 mm - odhad dle situace 13995 řezů=13 995,000 [A]<br>2160 asf. beton tl. 100 mm - dle situace 13995 řezů v km 13,2 - 13,7 vlevo, vč. reprofilace příčného sklonu=2 160,000 [B]<br>11027 asf.beton tl.60mm - bourání celkové konstrukce vozovky - dle situace 13995 řezů=11 027,000 [C]<br>549.6 odfrézování nájezdových klínů=549,600 [D]<br>Celkem: 13995+2160+11027+549.6=27 731,600 [E]<br><br>ZBV ZBV č. 10<br>dle zaměření tl. 40 mm   60,3=60,300 [A]<br>dle zaměření tl. 60 mm   42,1=42,100 [B]<br>A+B=102,400 [C]<br><br>ZBV č. 17 dle geodetických protokolů<br>km 12,822 - 12,846 vpravo protokol Š II 51/2021 prům. tl. 46 mm - bez odpočtu plochy 105,6 m2<br>km 12,846 - 13,201 vpravo protokol Š II 51/2021 prům. tl. 162 mm - odpočet plochy -1530,8 m2=-1 530,800 [A]<br>km 10,360 - 10,840 vpravo protokol Š II 63/2021 prům. tl. 128 mm - odpočet plochy -2374,1 m2=-2 374,100 [B]<br>km 13,199 - 13,696 vlevo protokol Š II 88/2021 prům. tl. 133 mm - odpočet plochy -2272,6 m2=-2 272,600 [C]<br>km 10,550 - 10,680 vlevo protokol Š II 32/2021 prům. tl. 129 mm - odpočet plochy -595,5 m2=- 595,500 [D]<br>km 10,680 - 10,840 vlevo protokol Š II 32/2021 prům. tl. 99 mm - bez odpočtu plochy 790,4 m2<br>km 10,360 - 10,550 vlevo protokol Š II 26/2021 prům. tl. 135 mm - odpočet plochy -851,1 m2=- 851,100 [E]<br>km 12,820 - 13,200 vlevo protokol Š II 23/2021 prům. tl. 207 mm - odpočet plochy -1411,0 m2=-1 411,000 [F]<br>km 12,820 - 13,200 vlevo protokol Š II 23/2021 prům. tl. 103 mm - odpočet plochy -190 m2=- 190,000 [G]<br>km 12,820 - 13,200 vlevo protokol Š II 23/2021 prům. tl. 40 mm -bez odpočtu plochy 17 m2<br>km 13,199 - 13,696 vpravo protokol Š II 101/2021 prům. tl. 89 mm - bez odpočtu plochy 2042,5 m2<br>km 13,396 - 13,427 vpravo protokol Š II 101/2021 dodatečné dofrézování prům. tl. 62 mm - připočet plochy 125,6 m2=125,600 [H]<br>km 12,440 - 12,850 vlevo protokol D 8/2020 prům. tl. 186 mm - odpočet plochy     -1654 m2=-1 654,000 [I]<br>km 10,250 - 10,360 vpravo protokol D 6/2020 prům. tl. 40 mm - odpočet plochy     -580,5 m2=- 580,500 [J]<br>km 10,250 - 10,360 vlevo protokol D 3/2020 prům. tl. 100 mm - bez odpočtu plochy 595 m2<br>km 12,440 - 12,720 vpravo protokol Š II 5/2022 prům. tl.140 mm - odpočet plochy -1302 m2=-1 302,000 [K]<br><del>km 12,720 - 12,848 vpravo protokol Š II 5/2022 prům. tl.181 mm     459 m2=459,000 [L]</del> | M2   | 27 731,600          | 14 739,000        | -12 992,600      | 59,90             | 1 661 122,84                | -784 390,50        | 6 133,76          | 882 866,10                | -778 256,74            | -46,85%              |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                     | 113154335   | Frézování živčního krytu tl 200 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase<br><br>Frézování živčního podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 200 mm<br><br>SoD<br>5501+8015 asf. beton tl. 150 mm - bourání v místě změny příčného sklonu - odhad dle situace 13516 řezů=13 516,000 [A]<br><br>ZBV č. 17 dle geodetických protokolů<br>km 12,846 - 13,201 vpravo protokol Š II 51/2021 prům. tl. 162 mm 1530,8 m2=1 530,800 [A]<br>km 10,360 - 10,840 vpravo protokol Š II 63/2021 prům. tl. 128 mm   2374,1 m2=2 374,100 [B]<br>km 13,199 - 13,696 vlevo protokol Š II 88/2021 prům. tl. 133 mm   2272,6 m2=2 272,600 [C]<br>km 10,550 - 10,680 vlevo protokol Š II 32/2021 prům. tl. 129 mm   595,5 m2=595,500 [D]<br>km 10,360 - 10,550 vlevo protokol Š II 26/2021 prům. tl. 135 mm   851,1 m2=851,100 [E]<br>km 12,820 - 13,200 vlevo protokol Š II 23/2021 prům. tl. 103 mm   190 m2=190,000 [F]<br>km 12,440 - 12,850 vlevo protokol D 8/2020 prům. tl. 186 mm     1654 m2=1 654,000 [G]<br>km 10,250 - 10,360 vpravo protokol D 6/2020 prům. tl. 140 mm     580,5 m2=580,500 [H]<br>km 12,440 - 12,720 vpravo protokol Š II 5/2022 prům. tl.140 mm   1302 m2=1 302,000 [I]<br>km 12,720 - 12,848 vpravo protokol Š II 5/2022 prům. tl.181 mm     459 m2=459,000 [J]<br>km 12,820 - 13,200 vlevo protokol Š II 23/2021 prům. tl. 207 mm   1411,0 m2=1 411,000 [K]<br><del>A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=13 220,600 [L]</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M2   | 13 516,000          | 26 736,600        | 13 220,600       | 109,73            | 1 483 110,68                | 0,00               | 1 450 696,43      | 2 933 807,11              | 1 450 696,43           | 97,81%               |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                     | 113155332   | Frézování betonového podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 40 mm<br><br>SoD<br>13995 odfrézování na požadovanou niveletu 13995 srovnání do příčného sklonu v místech jen frézování na tl. 60 mm=13 995,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M2   | 13 995,000          | 13 995,000        | 0,000            | 74,99             | 1 049 485,05                | 0,00               | 0,00              | 1 049 485,05              | 0,00                   | 0,00%                |

| Změnový soupis prací SO 102 po změně 12 pro ZBV 37                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II<br>Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice<br>Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                     |                   |                  |                   | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                     |                   |                  |                   | 102                         |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                     |                   |                  |                   | Celkem                      |                    |                   |                           |                        |                      |
| Poř. č. pol.                                                                                                                                                                                                                                       | Kód položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                 | 11                | 12                        | 13                     | 14                   |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                  | 113155333   | Frézování betonového krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M2   | 11 027,000          | 11 027,000        | 0,000            | 87,43             | 964 090,61                  | 0,00               | 0,00              | 964 090,61                | 0,00                   | 0,00%                |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |             | Frézování betonového podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |             | SoD<br>11027 bourání celkové konstrukce stáv. vozovky - CB konstrukce fréza v tl. 50 mm - odhad dle situace 11027 řezu=11 027,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                  | 113155334   | Frézování betonového krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M2   | 22 029,000          | 22 029,000        | 0,000            | 166,82            | 3 674 877,78                | 0,00               | 0,00              | 3 674 877,78              | 0,00                   | 0,00%                |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |             | Frézování betonového podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |             | SoD<br>5501*2 bourání voz. v místě změny příčného sklonu - tl. CB konstrukce tl.200 mm - odhad dle situace 11002 řezu=11 002,000 [A]<br>11027 bourání celkové konstrukce stáv. vozovky - tl. CB konstrukce 150 mm - fréza v tl. 100 mm - odhad dle situace 11002 řezu=11 027,000 [B]<br>Celkem: 11002+11027=22 029,000 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                 | 113202111   | Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M    | 88,000              | 88,000            | 0,000            | 91,95             | 8 091,60                    | 0,00               | 0,00              | 8 091,60                  | 0,00                   | 0,00%                |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |             | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |             | SoD<br>48+20+20=88,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                 | 122101103   | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 5000 m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M3   | 4 322,500           | 5 001,680         | 679,180          | 122,97            | 531 537,83                  | 0,00               | 83 518,76         | 615 056,59                | 83 518,76              | 15,71%               |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |             | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |             | SoD<br>910*4.75 odkop poslední vrstvy vozovky 4322.5 podloží pod vozovkou pro úpravu typu B2 - délka dle sit. x plocha ze vzor. řezu=4 322,500 [A]<br><br>ZBV č. 13<br>Odkop svahu se svahovými stupni<br>km 10,360 - 10,380 24 m3=24,000 [A]<br>km 10,380 - 10,420 190,7 m3 - úprava s geomříží =190,700 [B]<br>km 10,420 - 10,465 45 m3=45,000 [C]<br>km 10,465 - 10,475 11,9 m3=11,900 [D]<br>km 10,476 - 10,485 9,2 m3=9,200 [E]<br>km 10,485 - 10,575 126,3 m3=126,300 [F]<br>km 10,575 - 10,650 68,2 m3=68,200 [G]<br>km 10,706 - 10,840 161,7 m3=161,700 [H]<br>A+B+C+D+E+F+G+H=637,000 [I]<br><br>ZBV č. 20<br>odkop pro rozšíření vozovky km 13,150-13,210<br>1.050.37260.0=42.180 [A] |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                 | 122101403   | Výkopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 5000 m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M3   | 1 701,750           | 1 701,750         | 0,000            | 84,05             | 143 032,09                  | 0,00               | 0,00              | 143 032,09                | 0,00                   | 0,00%                |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |             | Výkopávky v zemních na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |             | SoD<br>11345*0.15 potřeba ornice na ohumusování dle pol. 182301132 x tl. 15 cm=1 701,750 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                 | 122201103   | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M3   | 4 077,490           | 4 077,490         | 0,000            | 122,97            | 501 408,95                  | 0,00               | 0,00              | 501 408,95                | 0,00                   | 0,00%                |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |             | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |             | 5501*0.2 Písek hlinitý v místě změny příčného sklonu - odtěžení na požadovanou niveletu, srovnání do příčného sklonu 1100.2 přehutnění=1 100,200 [A]<br>11027*0.27 Štěrka hlinitý tl. 270 mm - bourání vozovky komplet=2 977,290 [B]<br>Celkem: 1100.2+2977.29=4 077,490 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                 | 122201403   | Výkopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 5000 m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M3   | 3 694,800           | 3 694,800         | 0,000            | 84,05             | 310 547,94                  | 0,00               | 0,00              | 310 547,94                | 0,00                   | 0,00%                |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |             | Výkopávky v zemních na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |             | SoD<br>910*2.31 délka x plocha v řezu - dle pol. 564581111 - úprava typu B2=2 102,100 [A]<br>1410 dle pol. 182201101 x hloubka 60 cm - vhodná zemina pro svahové stupně=1 410,000 [B]<br>182.7 dle pol. 174101101 - obsyp propustku v km 12,925=182,700 [C]<br>Celkem: 2102.1+1410+182.7=3 694,800 [D]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                 | 131203101   | Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M3   | 0,315               | 2,865             | 2,550            | 4 417,49          | 1 391,51                    | 0,00               | 11 264,60         | 12 656,11                 | 11 264,60              | 809,52%              |

| Změnový soupis prací SO 102 po změně 12 pro ZBV 37                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II<br>Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice<br>Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                     |                   |                  |                   | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                     |                   |                  |                   | 102                         |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                     |                   |                  |                   | Celkem                      |                    |                   |                           |                        |                      |
| Poř. č. pol.                                                                                                                                                                                                                                       | Kód položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                 | 11                | 12                        | 13                     | 14                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |             | Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných<br>SoD<br>5*(0.3*0.3*0.7) počet sloupků pro svislé DZ x odhad rozměrů jámy =0,315 [A]<br><br>ZBV č. 37<br>zábradlí propustek<br>0,5*0,5*0,85*12=2,55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                 | 162701105   | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4<br>Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m<br>SoD<br>1701.75 dovoz ornice na ohumusování dle pol. 122101403=1 701,750 [A]<br>4322.5 odvoz odkopané zeminy dle pol. 122101103=4 322,500 [B]<br>2102.1 dovoz podsypu dle pol. 122201403 pro úpravu svahu typu B2=2 102,100 [C]<br>4077.490 odvoz odkopaného hlinitého písku dle pol. 122201103=4 077,490 [D]<br>2350*0.6*2 odvoz vykopané zeminy ze svahových stupňů dle pol. 182201101 x odhad hloubky 60cm - 1701.75 dovoz vhodné zeminy pro zpětný zásep stupňů=2 820,000 [E]<br>Celkem: 1701.75+4322.5+2102.1+4077.49+2820=15 023,840 [F]<br><br>ZBV č. 13<br>dle pol. 122101103 637=637,000 [A]<br><br>ZBV č. 20<br>odvoz odkopané zeminy dle pol. č. 122101103<br>42,18=42,18 [A]<br><br>ZBV č. 37<br>zábradlí propustek<br>0,5*0,5*0,85*12=2,55 | M3   | 15 023,840          | 15 705,570        | 681,730          | 504,88            | 7 585 236,34                | 0,00               | 344 191,84        | 7 929 428,18              | 344 191,84             | 4,54%                |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |             | Strmý svah vyztužením zeminy ocelovou sítí s kamenivem pohled svah přes 2 m do 4 m<br>Strmý svah ze zemín vyztužených geosyntetiky s pohledovou plochou upraveného svahu ocelovou sítí vyplněnou kamenivem [RockWall], výšky přes 2 m do 4 m<br>SoD<br>910*2.5 délka x odhadnutá výška svahu - úprava typ B2=2 275,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M2   | 2 275,000           | 2 275,000         | 0,000            | 1 323,12          | 3 010 098,00                | 0,00               | 0,00              | 3 010 098,00              | 0,00                   | 0,00%                |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                 | 171151222   | Uložení sypaniny na skládky<br>Uložení sypaniny na skládky<br>SoD<br>4322.500 dle pol. 122101103=4 322,500 [A]<br>4580*0.2 plocha krajnic x tl. - dle pol. 938909612=916,000 [B]<br>4077.490 hlinitý písek - dle pol. 122201103=4 077,490 [C]<br>2350*0.6 odvoz vykopané zeminy ze svahových stupňů dle pol. 182201101 x odhad hloubky 60cm=1 410,000 [D]<br>Celkem: 4322.5+916+4077.49+1410=10 725,990 [E]<br><br>ZBV č. 13<br>dle pol. 122101103 637=637,000 [A]<br><br>ZBV č. 20<br>vykopaná zemina 42,18=42,18 [A]<br><br>ZBV č. 37<br>zábradlí propustek<br>0,5*0,5*0,85*12=2,55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M3   | 10 725,990          | 11 407,720        | 681,730          | 16,70             | 179 124,03                  | 0,00               | 11 384,89         | 190 508,92                | 11 384,89              | 6,36%                |



| Změnový soupis prací SO 102 po změně 12 pro ZBV 37                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                        |                      |                  |                   | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)    |                       |                   |                              |                           |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|----------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II<br>Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice<br>Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                        |                      |                  |                   | 102                            |                       |                   |                              |                           |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                        |                      |                  |                   | Celkem                         |                       |                   |                              |                           |                         |
| Poř. č.<br>pol.                                                                                                                                                                                                                                    | Kód položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m.j. | Množství ve<br>Smlouvě | Množství ve<br>Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve<br>Smlouvě v Kč | Změny záporné v<br>Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve<br>Změně v Kč | Rozdíl cen<br>celkem v Kč | Podíl cen<br>celkem v % |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5                      | 6                    | 7                | 8                 | 9                              | 10                    | 11                | 12                           | 13                        | 14                      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                 | 171201211   | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)<br><br>Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)<br><br>SoD<br>4322.5*1.9 výkop dle pol. 171201201 x koef. přepočtu na tuny=8 212,750 [A]<br>2494.356 z čištění příkopů, vpustí 8212.75 propustků dle pol. 997221551a=2 494,356 [B]<br>1154.16 ze sejmutí nánosů na krajnicích dle pol. 938909612=1 154,160 [C]<br>4077.49*2.0 dle pol. 122201103 x koef. přepočtu na tuny=8 154,980 [D]<br>1410*1.9 odvoz vykopané zeminy ze svahových stupňů dle pol. 171201201 x koef. přepočtu na tuny=2 679,000 [E]<br>Celkem: 8212.75+2494.356+1154.16+8154.98+2679=22 695,246 [F]<br><br>ZBV č. 13<br>dle pol. 122101103 637*1,9=1 210,300 [A]<br><br>ZBV č. 20<br>odkopaná zemina 42,18*1,9=80,142 [A]<br><br>ZBV č. 37<br>zábradlí propustek<br>0,5*0,5*0,85*12*1,9=4,845 | T    | 22 695,246             | 23 990,533           | 1 295,287        | 138,17            | 3 135 802,14                   | 0,00                  | 178 969,80        | 3 314 771,94                 | 178 969,80                | 5,71%                   |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                 | 171201211a  | Poplatek za zemník<br><br>Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)<br><br>SoD<br>1701.75*1.9 dle pol. 122101402 x koef. 1,9 pro přepočet na tuny=3 233,325 [A]<br>2102.1*2.0 dle pol. 122201403 x koef.2,0 pro přepočet na tuny=4 204,200 [B]<br>1410*1.9 dle pol. 182201101 x hloubka 60 cm - vhodná zemina pro svahové stupně=2 679,000 [C]<br>182.7*2.0 dle pol. 174101101 - obsyp propustku v km 12,925=365,400 [D]<br>Celkem: 3233.325+4204.2+2679+365.4=10 481,925 [E]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | T    | 10 481,925             | 10 481,925           | 0,000            | 23,03             | 241 398,73                     | 0,00                  | 0,00              | 241 398,73                   | 0,00                      | 0,00%                   |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                 | 174101101   | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním<br><br>Zásyp sypaninou z jakékoli horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykoppávkách<br><br>SoD<br>14.5*(5.3*2+2.0) délka x plocha v řezu - obsyp propustku v km 12,925=182,700 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M3   | 182,700                | 182,700              | 0,000            | 254,57            | 46 509,94                      | 0,00                  | 0,00              | 46 509,94                    | 0,00                      | 0,00%                   |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                 | 181951102   | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním<br><br>Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním<br><br>ZBV č. 15<br>dle geodetického protokolu č. Š II 3/2022<br>km 13,2-13,7<br>žlaby 69,4=69,400 [A]<br>žulové kostky 100,9=100,900 [B]<br>A+B=170,300 [C]<br><br>ZBV č. 20<br>1,9*60=114,00 [A]<br><br>ZBV ZBV č. 27<br>geodetický protokol Š II 51/2022 92,2 m2=92,200 [A]<br>geodetický protokol Š II 58/2022 183,8 m2 =183,800 [B]<br>A+B=276,000 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M2   | 11 027,000             | 11 587,300           | 560,300          | 33,80             | 372 712,60                     | 0,00                  | 18 938,14         | 391 650,74                   | 18 938,14                 | 2,25%                   |

| Změnový soupis prací SO 102 po změně 12 pro ZBV 37                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                     |                   |                  |                   | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) |                    |                   |                           |                        |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II<br>Číslo a název SO/PS:    SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice<br>Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                     |                   |                  |                   | 102                         |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                     |                   |                  |                   | Celkem                      |                    |                   |                           |                        |                      |
| Poř. č. pol.                                                                                                                                                                                                                                          | Kód položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                     | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                 | 11                | 12                        | 13                     | 14                   |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                    | 182201101   | Svahování násypů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M2   | 2 350,000           | 3 201,200         | 851,200          | 43,01             | 101 073,50                  | 0,00               | 36 610,11         | 137 683,61                | 36 610,11              | 36,22%               |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |             | Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakémkoliv hornině                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |             | SoD<br>(420+50)*5    zřízení svahových stupňů v km 11,720 - 12,140 2350 v km 12,030 - 12,080 - délka x odhad prům.shírky ve svahu=2 350,000 [A]<br><br>ZBV č. 13<br>dle geodetického zaměření<br>km 10,360 - 10,422    111,9 m2=111,900 [A]<br>km 10,422 - 10,454    48,7 m2=48,700 [B]<br>km 10,455 - 10,476    44,9 m2 =44,900 [C]<br>km 10,480 - 10,654    369,6 m2=369,600 [D]<br>km 10,706 - 10,730    41,4 m2=41,400 [E]<br>km 10,730 - 10,840    234,7 m2=234,700 [F]<br>A+B+C+D+E+F=851,200 [G] |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                    | 182301132   | Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M2   | 11 345,000          | 11 345,000        | 0,000            | 36,89             | 418 517,05                  | 0,00               | 0,00              | 418 517,05                | 0,00                   | 0,00%                |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |             | Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |             | SoD<br>490*5,0    délka dle situace x odhad šířky - úprava svahu typu 2450=2 450,000 [A]<br>910*3,0*2    délka dle situace x odhad šířky x na obou stranách - úprava svahu typu B2=5 460,000 [B]<br>4580*1.5*0.5    délka trasy x odhadnutá šířka ohumusování x odhad 50 %=3 435,000 [C]<br>Celkem: 2450+5460+3435=11 345,000 [D]                                                                                                                                                                       |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                    | 183405211   | Výsev trávníku hydroosevem na ornici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M2   | 11 345,000          | 11 345,000        | 0,000            | 20,49             | 232 459,05                  | 0,00               | 0,00              | 232 459,05                | 0,00                   | 0,00%                |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                    | 005724740   | osivo směs travní krajinná - svahová                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | KG   | 283,625             | 283,625           | 0,000            | 155,44            | 44 086,67                   | 0,00               | 0,00              | 44 086,67                 | 0,00                   | 0,00%                |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                    | 184802631   | Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko ve svahu do 1:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M2   | 11 345,000          | 11 345,000        | 0,000            | 4,26              | 48 329,70                   | 0,00               | 0,00              | 48 329,70                 | 0,00                   | 0,00%                |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |             | Chemické odplevelení po založení kultury na svahu přes 1:2 do 1:1 postřikem na široko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                    | 185803113   | Ošetření trávníku shrabáním ve svahu do 1:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M2   | 11 345,000          | 11 345,000        | 0,000            | 4,61              | 52 300,45                   | 0,00               | 0,00              | 52 300,45                 | 0,00                   | 0,00%                |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |             | Ošetření trávníku jednorázové na svahu přes 1:2 do 1:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                    | 185804312   | Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M3   | 340,350             | 340,350           | 0,000            | 556,12            | 189 275,44                  | 0,00               | 0,00              | 189 275,44                | 0,00                   | 0,00%                |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |             | Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |             | SoD<br>11345.000*0.01*3=340,350 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |             | 2 Zakládání                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                    | 213221111   | Ochranná vrstva na základové spáře z bet. prost. se zvýš. nároky na prostředí C 25/30 tl do 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M3   | 16,530              | 16,530            | 0,000            | 3 321,98          | 54 912,33                   | 0,00               | 0,00              | 54 912,33                 | 0,00                   | 0,00%                |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |             | Ochranná vrstva na základové spáře z prostého betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 tl. do 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |             | SoD<br>1.7*3.0*0.30    Betonové lože C25/30-XF3 pod stupně z lomového kamene u propustku v km 12,925=1,530 [A]<br>2.5*20.0*0.3    betonové lože C25/30-XF3 pod propustkem=15,000 [B]<br>Celkem: 1.53+15=16,530 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |             | 4 Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                    | 451317777   | Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M2   | 5 223,400           | 6 074,600         | 851,200          | 581,54            | 3 037 616,04                | 0,00               | 495 006,85        | 3 532 622,89              | 495 006,85             | 16,30%               |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |             | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |             | ZBV č. 13<br>dle geodetického zaměření<br>km 10,360 - 10,422    111,9 m2=111,900 [A]<br>km 10,422 - 10,454    48,7 m2=48,700 [B]<br>km 10,455 - 10,476    44,9 m2 =44,900 [C]<br>km 10,480 - 10,654    369,6 m2=369,600 [D]<br>km 10,706 - 10,730    41,4 m2=41,400 [E]<br>km 10,730 - 10,840    234,7 m2=234,700 [F]<br>A+B+C+D+E+F=851,200 [G]                                                                                                                                                        |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |

| Změnový soupis prací SO 102 po změně 12 pro ZBV 37                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                                                                                                                                                |      |                     |                   |                  |                   | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) |                    |                   |                           |                        |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II<br>Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice<br>Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice |             |                                                                                                                                                                                                |      |                     |                   |                  |                   | 102                         |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                                                                                |      |                     |                   |                  |                   | Celkem                      |                    |                   |                           |                        |                      |
| Poř. č. pol.                                                                                                                                                                                                                                       | Kód položky | Název položky                                                                                                                                                                                  | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                  | 2           | 3                                                                                                                                                                                              | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                 | 11                | 12                        | 13                     | 14                   |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                 | 452318510   | Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí                                                                                                                            | M3   | 9,950               | 9,950             | 0,000            | 8 203,04          | 81 620,25                   | 0,00               | 0,00              | 81 620,25                 | 0,00                   | 0,00%                |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |             | Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí na dně a ve svahu melioračních kanálů s patkami nebo bez patek                                                             |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |             | SoD<br>$(0,5*0,8*2,5)*2+(0,3*0,8*2,5)*2+(0,5*1,8*2,5)*3 = 9,950 [A]$                                                                                                                           |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                 | 464511111   | Pohoz z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu                                                                                                                                        | M3   | 3,000               | 3,000             | 0,000            | 3 481,56          | 10 444,68                   | 0,00               | 0,00              | 10 444,68                 | 0,00                   | 0,00%                |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |             | Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu                                                                                                      |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |             | SoD<br>$5,0*3,0*0,2 \text{ Zpevnění dna toku pohozeným lomovým kamenem} = 3,000 [A]$                                                                                                           |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |             | <b>5 Komunikace pozemní</b>                                                                                                                                                                    |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                 | 564251111   | Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku ŠP tl 150 mm                                                                                                                                                | M2   | 63,750              | 63,750            | 0,000            | 152,90            | 9 747,38                    | 0,00               | 0,00              | 9 747,38                  | 0,00                   | 0,00%                |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |             | Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm                                                                                            |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |             | SoD<br>$(0,5*2,5)*5+(0,3*2,5)*2 \text{ podsyp pod betonové prahy}=7,750 [A]$<br>$20,0*2,8 \text{ ŠP podsyp od propustkem}=56,000 [B]$<br><b>Celkem: 7.75+56=63.750 [C]</b>                     |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                 | 564581111   | Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 300 mm                                                                                                                                            | M2   | 6 552,000           | 6 552,000         | 0,000            | 154,21            | 1 010 383,92                | 0,00               | 0,00              | 1 010 383,92              | 0,00                   | 0,00%                |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |             | Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vlhčením, a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm                                                                                       |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |             | SoD<br>$(910*3,6)*2 \text{ délka x šířka x dvakrát do tl. 600mm - úprava typu B2}=6 552,000 [A]$                                                                                               |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                 | 564861113   | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 220 mm                                                                                                                                                             | M2   | 17 520,100          | 17 910,100        | 390,000          | 215,26            | 3 771 376,73                | 0,00               | 83 951,40         | 3 855 328,13              | 83 951,40              | 2,23%                |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |             | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 220 mm                                                                                                                   |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |             | SoD<br>$11027*1,3 \text{ výměna celé konstrukce vozovky}=14 335,100 [A]$<br>$910*3,5 \text{ délka x šířka - úprava svahu typu B2}=3 185,000 [B]$<br><b>Celkem: 14335.1+3185=17 520,100 [C]</b> |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |             | ZBV č. 20<br>podklad ze ŠD v rozšíření<br>$1,9*60=114,00 [A]$                                                                                                                                  |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |             | ZBV ZBV č. 27<br>geodetický protokol Š II 51/2022 92,2 m2=92,200 [A]<br>geodetický protokol Š II 58/2022 183,8 m2 =183,800 [B]<br><b>A+B=276,000 [C]</b>                                       |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                 | 564871111   | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm                                                                                                                                                             | M2   | 3 731,000           | 3 731,000         | 0,000            | 298,95            | 1 115 382,45                | 0,00               | 0,00              | 1 115 382,45              | 0,00                   | 0,00%                |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |             | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm                                                                                                                   |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |             | SoD<br>$910*4,1 \text{ délka x šířka - polštář ze ŠD v min.tl.0,25m - úprava typu B2}=3 731,000 [A]$                                                                                           |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 38                                                                                                                                                                                                                                                 | 564951413R  | Recyklovaná směs (v misicím centru) RS 0/32 C3/4 CA (TP 208), tl. 150 mm                                                                                                                       | M2   | 19 007,200          | 0,000             | -19 007,200      | 174,41            | 3 315 045,75                | -3 315 045,74      | 0,00              | 0,01                      | -3 315 045,74          | -100,00%             |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |             | Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm                                                                                                |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |             | SoD<br>$11027*1,15 \text{ výměna celé konstrukce vozovky}=12 681,050 [A]$<br>$5501*1,15 \text{ změna příčného sklonu}=6 326,150 [B]$<br><b>Celkem: 12681.05+6326.15=19 007,200 [C]</b>         |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |             | ZBV č. 23<br>odpočet původního množství -19 007,20<br>nahrazeno novou položkou č. 151                                                                                                          |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |

| Změnový soupis prací SO 102 po změně 12 pro ZBV 37                                                                                                                                                                                                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                     |                   |                  |                   | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) |                    |                   |                           |                        |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II<br>Číslo a název SO/PS:   SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice<br>Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                     |                   |                  |                   | 102                         |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                     |                   |                  |                   | Celkem                      |                    |                   |                           |                        |                      |
| Poř. č. pol.                                                                                                                                                                                                                                         | Kód položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                    | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                 | 11                | 12                        | 13                     | 14                   |
| 39                                                                                                                                                                                                                                                   | 565125000R  | Asfaltová vrstva se zvýšenou odolností proti šíření trhlin SAL tl. 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M2   | 13 995,000          | 20 155,500        | 6 160,500        | 246,93            | 3 455 785,35                | 0,00               | 1 521 212,27      | 4 976 997,62              | 1 521 212,27           | 44,02%               |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |             | Asfaltová vrstva se zvýšenou odolností proti šíření trhlin SAL tl. 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |             | SoD<br>13995    frézování v tl. 60mm=13 995,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |             | ZBV č. 37<br>vrstva SAL<br>Geodetický protokol - doklad č.11<br>D 6/2020    km 10,250-10,360 vpravo    505,00=505,000 [A]<br>D 13/2020    km 12,440-12,850 vpravo    873,00=1 873,000 [B]<br>Š II 60/2021   km 10,680-10,760 úsek B   450,00=450,000 [C]<br>Š II 78/2021   km 12,846-13,201 vpravo   1562,30=1 562,300 [D]<br>Š II 100/2021 km 10,360-10,841        2203,30=2 203,300 [E]<br>Š II 15/2022   km 10,190-10,250 vlevo    251,90=251,900 [F]<br>Š II 49/2022 km 11,297-11,780 vlevo   2175,00=2 175,000 [G]<br>Š II 63/2022   km 14,424-14,580 vpravo    143,30=143,300 [H]<br>Š II 66/2022   km 11,298-11,780 vpravo   1957,40=1 957,400 [I]<br>Š II 10/2023   km 11,771-12,436 vlevo   2982,70=2 982,700 [J]<br>Š II 22/2023   km 10,881-10,060 a 11,182-11,299 vlevo   827,40+467,80=1 295,200 [K]<br>Š II 23/2023   km 13,694-14,114 vpravo   1859,90=1 859,900 [L]<br>Š II 25/2023   km 10,833-11,295 vpravo   1414,50=1 414,500 [M]<br>Š II 30/2023   km 14,112-14,430 vpravo   1482,00=1 482,000 [N]<br>odpočet původního množství -13995,00=-13 995,000 [O]<br>Celkem A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O=6 160,500 [P] |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 40                                                                                                                                                                                                                                                   | 565135111   | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M2   | 18 180,800          | 18 882,900        | 702,100          | 235,41            | 4 279 942,13                | 0,00               | 165 281,36        | 4 445 223,49              | 165 281,36             | 3,86%                |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |             | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |             | SoD<br>11027*1.1   výměna celé konstrukce vozovky=12 129,700 [A]<br>5501*1.1 frézování v tl. 150 mm - změna příčného sklonu=6 051,100 [B]<br>Celkem: 12129.7+6051.1=18 180,800 [C]<br>ZBV ZBV č. 12<br>náhrada odvodňovacího proužku v místě nové opěrné zdi1300*0,5=650,000 [A]<br><br>ZBV č. 21<br>protokol Š II 100/2021 km 10,360-10,841 vpravo<br>vrstva navíc 52,1=52,100 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 41                                                                                                                                                                                                                                                   | 569851111   | Zpevnění krajnic štěrkodrtí (recyklát) tl 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M2   | 3 435,000           | 3 435,000         | 0,000            | 402,88            | 1 383 892,80                | 0,00               | 0,00              | 1 383 892,80              | 0,00                   | 0,00%                |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |             | Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěši s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |             | SoD<br>4580*0.5*2*0.75   délka x šířka x obě strany - odhad 75%=3 435,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 130                                                                                                                                                                                                                                                  | 572241112   | Vyspravení výtluků asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 60 mm při vyspravované ploše do 10% na 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M2   | 2 034,900           | 2 034,900         | 0,000            | 362,06            | 736 755,89                  | 0,00               | 0,00              | 736 755,89                | 0,00                   | 0,00%                |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |             | Vyspravení výtluků materiálem na bázi asfaltu s řezáním, vysekáním, očištěním, zaplněním směsí a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) při vyspravované ploše na 1 km komunikace do 10 % tl. přes 40 do 60 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |             | SoD<br>(11027+13995+2160+5501+8015)*0.05    5% z plochy obrusné vrstvy=2 034,900 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 42                                                                                                                                                                                                                                                   | 572531131   | Oprava trhlin asfaltovou sanační hmotou š do 40 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M    | 6 674,400           | 6 674,400         | 0,000            | 128,96            | 860 730,62                  | 0,00               | 0,00              | 860 730,62                | 0,00                   | 0,00%                |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |             | Vyspravení trhlin dosavadního krytu asfaltovou sanační hmotou oprava trhlin šířky přes 30 do 40 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |             | SoD<br>21600*1.03*0.3=6 674,400 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 43                                                                                                                                                                                                                                                   | 573191111   | Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M2   | 38 153,750          | 38 803,750        | 650,000          | 28,06             | 1 070 594,23                | 0,00               | 18 239,00         | 1 088 833,23              | 18 239,00              | 1,70%                |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |             | Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |             | SoD<br>11027*1.25   výměna celé konstrukce vozovky=13 783,750 [A]<br>13995*1.25   frézování v tl. 60mm=17 493,750 [B]<br>5501*1.25   frézování v tl. 150 mm při změně příčného sklonu=6 876,250 [C]<br>Celkem: 13783.75+17493.75+6876.25=38 153,750 [D]<br><br>ZBV ZBV č. 12<br>náhrada odvodňovacího proužku v místě nové opěrné zdi1300*0,5=650,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |

[illegible]

[illegible]

[illegible]







| Změnový soupis prací SO 102 po změně 12 pro ZBV 37                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                     |                   |                  |                   | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) |                    |                   |                           |                        |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II<br>Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice<br>Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                     |                   |                  |                   | 102                         |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                     |                   |                  |                   | Celkem                      |                    |                   |                           |                        |                      |
| Poř. č. pol.                                                                                                                                                                                                                                       | Kód položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                 | 11                | 12                        | 13                     | 14                   |
| 95                                                                                                                                                                                                                                                 | 919131210R  | Kotvení na povrchu z betonářské výztuže dl. do 3m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | KUS  | 227,500             | 227,500           | 0,000            | 4 029,86          | 916 793,15                  | 0,00               | 0,00              | 916 793,15                | 0,00                   | 0,00%                |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |             | Vyztužení dilatačních spár v cementobetonovém krytu kotvami průměru 16 mm, délky 1 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |             | SoD<br>910/1.0/4 kotvy po jednom metru, potřebná délka cca 600mm, tzn. jedna výztuž dl.3,0m rozdělená na čtvrtiny=227,500 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 96                                                                                                                                                                                                                                                 | 919521140   | Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M    | 13,000              | 13,000            | 0,000            | 3 333,04          | 43 329,52                   | 0,00               | 0,00              | 43 329,52                 | 0,00                   | 0,00%                |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |             | Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |             | SoD<br>13 v km 13,89=13,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 98                                                                                                                                                                                                                                                 | 919521180   | Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M    | 20,000              | 20,000            | 0,000            | 5 724,70          | 114 494,00                  | 0,00               | 0,00              | 114 494,00                | 0,00                   | 0,00%                |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |             | Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 1000 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |             | SoD<br>20 v km 12,925=20,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 100                                                                                                                                                                                                                                                | 919535558   | Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 20/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M3   | 29,680              | 29,680            | 0,000            | 4 081,06          | 121 125,86                  | 0,00               | 0,00              | 121 125,86                | 0,00                   | 0,00%                |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |             | Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |             | SoD<br>(13*0.50)+(19*1.22) délka x plocha obetonování v řezu =29,680 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 101                                                                                                                                                                                                                                                | 919716111   | Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí KARI hmotnosti do 7,5 kg/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | T    | 0,077               | 0,077             | 0,000            | 32 954,10         | 2 537,47                    | 0,00               | 0,00              | 2 537,47                  | 0,00                   | 0,00%                |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |             | Ocelová výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí KARI hmotnosti do 7,5 kg/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |             | SoD<br>((1.7*3.0)*7.5*2)*0.001 vyztužení betonového lože dle v.č. 5=0,077 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 102                                                                                                                                                                                                                                                | 919721101   | Geomříž pro stabilizaci podkladu tkaná z PP podélná pevnost v tahu do 50 kN/m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M2   | 3 185,000           | 3 185,000         | 0,000            | 176,12            | 560 942,20                  | 0,00               | 0,00              | 560 942,20                | 0,00                   | 0,00%                |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |             | Geomříž pro stabilizaci podkladu tkaná z polyesteru, podélná pevnost v tahu do 50 kN/m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |             | SoD<br>910*3.5 délka x šířka - úprava svahu typu B2=3 185,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 103                                                                                                                                                                                                                                                | 919721202   | Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu z PP s geotextilií                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M2   | 40 698,000          | 40 698,000        | 0,000            | 102,22            | 4 160 149,56                | 0,00               | 0,00              | 4 160 149,56              | 0,00                   | 0,00%                |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |             | Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu z polypropylénu s geotextilií                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |             | SoD<br>11027 bouraná vozovka v celé tloušťce =11 027,000 [A]<br>13995+5501+8015+2160 frézování v různých tloušťkách=29 671,000 [B]<br>Celkem: 11027+29671=40 698,000 [C]                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 104                                                                                                                                                                                                                                                | 919732221   | Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M    | 4 826,200           | 4 860,200         | 34,000           | 116,82            | 563 796,68                  | 0,00               | 3 971,88          | 567 768,56                | 3 971,88               | 0,70%                |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |             | Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry                                                                                                                                                                                                                      |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |             | SoD<br>(55+8) řezání v napojeních na vedl.ulice + na ZÚ 63 na KÚ - při napojování vrstev=63,000 [A]<br>4580 podélná spára=4 580,000 [B]<br>(4580/200)*8.0 příčné spáry - předpoklad stavebních úseků po 200 m=183,200 [C]<br>Celkem: 63+4580+183.2=4 826,200 [D]<br><br>ZBV ZBV č. 10<br>33.0 + 2*0.5 dle zaměření km 10,250 - 10,283 =34,000 [A]                                                                                  |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 105                                                                                                                                                                                                                                                | 919735113   | Rezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M    | 5 585,200           | 4 935,200         | -650,000         | 130,38            | 728 198,38                  | -84 747,00         | 0,00              | 643 451,38                | -84 747,00             | -11,64%              |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |             | Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |             | SoD<br>(55+8)*2 řezání v napojeních na vedl.ulice + na ZÚ 126 na KÚ - při frézování 126 při napojování vrstev=126,000 [A]<br>46 podél obrubníku=46,000 [B]<br>4580 podélná spára=4 580,000 [C]<br>(4580/200)*8.0 příčné spáry - předpoklad stavebních úseků po 200 m=183,200 [D]<br>650 v odvodňovacím proužku v místě nové opěrné zdi=650,000 [E]<br>Celkem: 126+46+4580+183.2+650=5 585,200 [F]<br><br>ZBV č. 12<br>odpočet -650 |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 106                                                                                                                                                                                                                                                | 938902113   | Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,5 m3/m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M    | 2 290,000           | 2 290,000         | 0,000            | 95,49             | 218 672,10                  | 0,00               | 0,00              | 218 672,10                | 0,00                   | 0,00%                |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |             | Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,30 do 0,50 m3/m                                                                                                                  |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |             | SoD<br>4580/2 odhad půlka trasy=2 290,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |



[illegible]

[illegible]

[illegible]







[illegible]

| Změnový soupis prací SO 102 po změně 12 pro ZBV 37                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                     |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II<br>Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice<br>Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice |             |                                                                     |      |                     |                   |                  |                   | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                     |      |                     |                   |                  |                   | 102                         |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                     |      |                     |                   |                  |                   | Celkem                      |                    |                   |                           |                        |                      |
| Poř. č. pol.                                                                                                                                                                                                                                       | Kód položky | Název položky                                                       | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                  | 2           | 3                                                                   | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                 | 11                | 12                        | 13                     | 14                   |
| 156                                                                                                                                                                                                                                                | 919735123   | Rezání stávajícího betonového krytu hl přes 100 do 150 mm           | M    | 0,000               | 318,585           | 318,585          | 293,00            | 0,00                        | 0,00               | 93 345,40         | 93 345,40                 | 93 345,40              | 100,00%              |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |             | Cena položky dle URS 2022 02                                        |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |             | ZBV ZBV č. 27<br>318,585=318,585                                    |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 157                                                                                                                                                                                                                                                | 275313711   | Základové patky z betonu tř. C 20/25                                | M3   | 0,000               | 2,250             | 2,250            | 4 160,00          | 0,00                        | 0,00               | 9 360,00          | 9 360,00                  | 9 360,00               | 100,00%              |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |             | Cena položky dle URS 2023 02                                        |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |             | ZBV č. 37<br>zábradlí propustek<br>0,5*0,5*0,75*12                  |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 158                                                                                                                                                                                                                                                | 911111111   | Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného                            | M    | 0,000               | 20,000            | 20,000           | 192,00            | 0,00                        | 0,00               | 3 840,00          | 3 840,00                  | 3 840,00               | 100,00%              |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |             | Cena položky dle URS 2023 02                                        |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |             | ZBV č. 37<br>zábradlí propustek 6+4+6+4=20                          |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 225                                                                                                                                                                                                                                                | 74910606    | zábradlí městské obloukové bezpečnostní lakovaný povrch 2000x1000mm | KUS  | 0,000               | 10,000            | 10,000           | 6 110,00          | 0,00                        | 0,00               | 61 100,00         | 61 100,00                 | 61 100,00              |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |             | Cena položky dle URS 2023 02                                        |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |             | ZBV č. 37<br>zábradlí propustek 6+4+6+4=20                          |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |             | Celkem                                                              |      |                     |                   |                  |                   | 113 362 946,56              | - 6 715 953,90     | 18 330 101,17     | 124 977 093,83            | 11 614 147,27          | 10,25%               |

**STRABAG a.s.**  
Odštěpný závod Praha  
Kačírkova 982/4  
158 00 Praha5

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje  
Ing. Milan Peška  
Zborovská 11  
150 21 Praha 5

Vyřizuje:  
Ing. Karel Šimek

Naše značka:  
KSÚS\_/37

**Předmět: Oznámení o nové skutečnosti**

**Název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II.**

V souladu se smlouvou o dílo č. **S-468/00066001/2020** Vás informujeme o následujících nově zjištěných skutečnostech.

**1) Vrstva SAL množstevní změna**

Skutečně provedené množství asfaltové vrstvy proti šíření trhlin SAL, oproti předpokladu PDPS na stavebním objektu SO 102 se předpokládá větší. Vrstva bude položena v úsecích, kde po odfrézování stávajících AB vrstev bude zachována podkladní CB deska s příčnými a podélnými spárami, nebo bude změněna niveleta vozovky a konstrukce upravena po dohodě s projektantem RDS a TDI na skladbu 130 mm, kde podkladní vrstvu tvoří SAL.

**2) Zábradlí na vtoku propustku km 12,925**

Na stavbě bylo dohodnuto s projektantem a TDI zřídit kolem zpevněného vtoku z důvodu bezpečnosti chodců (v blízkosti jsou nemovitosti) ocelové zábradlí. Toto dodatečně naprojektoval projektant RDS.

Tato skutečnost má vliv na změnu soupisu prací. Žádáme tímto (zapsáno v příslušném stavebním deníku) o písemný pokyn k provedení prací nad rámec smlouvy.

S přátelským pozdravem

Ing. Karel Šimek

STRABAG a.s  
Kačírkova 982/4,  
158 00 Praha 5

**Věc: Souhlasné stanovisko k ZBV**

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace v návaznosti na projednání s TDS a zhotovitelem v rámci akce „II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II“ **souhlasí** s navrženou a projednanou změnou. Jmenovitě souhlasí s větším provedením množství asfaltové vrstvy proti šíření trhlin SAL oproti předpokladu PDPS na objektu SO 102 a se zřízením ocelového zábradlí kolem zpevněného vtoku z důvodu bezpečnosti na vtoku propustku v km 12,925.

Další práce požadujeme provést v koordinaci v souladu s pokyny AD a TDS a v souladu s uzavřenou SOD.

S pozdravem

  
Ing. ~~Milan~~ Peška  
technicko – provozní náměstek

Datum: 31.3.2023 Den týdne: PA

Středisko: P11/26A Název akce: 11/102 HR HL M PRAHY - STĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, ETAPA II.

Čas: 4<sup>00</sup> - 16<sup>00</sup>Pracovní přestávka: 11<sup>00</sup> - 12<sup>00</sup>

(jména a příjmení): JAROSLAV ŠTÍPEK, OLEH RUCHA, JIŘÍ LUDŮŠ, MYKHAILO CHODUR, VYTAHIL HRYŠEK, VÁCLAV ZEHEN, FRANTIŠEK JEDLIČKA, MICHAL DIVIS, JAN JUREK, KAREL FENCIL

Návrh: LIEBHERR 912, LIEBHERR 914, 3x NAKLADNÍ AUTO, MOTOROVÁ PILA, VIBRAČNÍ DESKA DPU

## Děné práce:

- ODSTRANĚNÍ NÁNOSŮ Z KRAJNIC + ODVOZ NA HEZIDEPONII
- PROVEDENÍ Kácení KŘOVIN V KM 11,820-12,100 (PRAVÁ STRANA VE SMĚRU STANIČENÍ) + ODVOZ KŘOVIN NA HEZIDEPONII
- PROVEDENÍ VÝKOPU PRO ROZŠÍŘENÍ CB DESKY V KM 11,820-12,440 (PRAVÁ STRANA VE SMĚRU STANIČENÍ) - DLE ZADÁNÍ Z POCHUZEK DNE 29.3.2023 + HUTNĚNÍ VIBRAČNÍ DESKY DPU

## ZÁPIS ZHOTOVITELÉ:

ZÁSTUPCE ZHOTOVITELÉ (A. STRABAG a.s.) MARTIN LIŠA UPOZORŇUJE TDI STAUBY P. MIROSLAVA VALENTA NA NÁSLEDUJÍCÍ STAV. PRŮV. PROVEDENÍ 2444 PRO ROZŠÍŘENÍ STAŤAVAJÍCÍ CB DESKY V KM 11,480-12,440 (PRAVÁ STRANA VE SMĚRU STANIČENÍ) BYLA ZJIŠTĚNA NEDOSTATEČNÁ TLOUŠŤKA STAŤAVAJÍCÍ CB DESKY V NĚKTERÝCH ÚSECÍCH REKONSTRUOVANÉ KOMUNIKACE SO 102 V KM 11,480-12,440 PRAVÁ STRANA VE SMĚRU STANIČENÍ. BYLA PROVEDENA FOTODOKUMENTACE STAŤAVAJÍCÍ CB DESKY V MÍSTECH NÍŽE TLOUŠŤKY.

ZÁPIS TDI: TLOUŠŤKA STAŤAV. CB DESKY V KM 11,480-12,440 P.J. DOŽADUJI ZDOKYMANOVAT PO PROFÍLECH TZN. V KAŽDEM PROFÍLU CÍLOM BUDE POŘÍZENO FOTO V MÍSTECH



P6 102

Datum: 29. 9. 2022 Den týdne: ČT

Nákladové středisko: P42620 Název akce: 11/102 HR. 12. 11. 2021, STROJNICE, DEKONTAMINACE II. ETAPA

Počasí: JAZERO, OBLOHA, ROZNO + Z, PR. + 12°C, VÍTR. 12°C

Pracovní doba: 9<sup>00</sup>-18<sup>00</sup>Pracovní přestávka: 11<sup>00</sup>-13<sup>00</sup>

Pracovníci (jména a příjmení): MICHAEL BARTON, FRANTIŠEK JEDLIČKA, MICHAEL DÍMČ, KAREL FENC, ALEX RUTKA, JOSEF JUREK, JATON LEMETKA, KAREL KAD, MICHAEL UHROVET

Mechanismy: LUBRIFIČNÍ ST. 12, STROJNICE (1200000), PR. 12/101, DEKONTAMINACE, STROJNICE, STROJNICE, STROJNICE, STROJNICE

Materiál: DEKONTAMINACE, BETON, STROJNICE, STROJNICE, STROJNICE

Zkoušky:

Provedené práce (včetně dodavatelů a jejich činnosti): PRONÁJEM STROJNICE (1200000) PRONÁJEM STROJNICE  
 2. PRONÁJEM STROJNICE (1200000) PRONÁJEM STROJNICE  
 - PRONÁJEM STROJNICE (1200000) PRONÁJEM STROJNICE  
 - PRONÁJEM STROJNICE (1200000) PRONÁJEM STROJNICE  
 - PRONÁJEM STROJNICE (1200000) PRONÁJEM STROJNICE  
 - PRONÁJEM STROJNICE (1200000) PRONÁJEM STROJNICE  
 - PRONÁJEM STROJNICE (1200000) PRONÁJEM STROJNICE  
 - PRONÁJEM STROJNICE (1200000) PRONÁJEM STROJNICE  
 - PRONÁJEM STROJNICE (1200000) PRONÁJEM STROJNICE

PRONÁJEM STROJNICE (1200000) PRONÁJEM STROJNICE  
 PRONÁJEM STROJNICE (1200000) PRONÁJEM STROJNICE  
 PRONÁJEM STROJNICE (1200000) PRONÁJEM STROJNICE  
 PRONÁJEM STROJNICE (1200000) PRONÁJEM STROJNICE  
 PRONÁJEM STROJNICE (1200000) PRONÁJEM STROJNICE  
 PRONÁJEM STROJNICE (1200000) PRONÁJEM STROJNICE  
 PRONÁJEM STROJNICE (1200000) PRONÁJEM STROJNICE  
 PRONÁJEM STROJNICE (1200000) PRONÁJEM STROJNICE  
 PRONÁJEM STROJNICE (1200000) PRONÁJEM STROJNICE  
 PRONÁJEM STROJNICE (1200000) PRONÁJEM STROJNICE

Podpis zástupce investora (TDI):



So 102 ✓

Datum: 3.10.2022 Den týdne: 10

disko: 841/E62C Název akce: 11/102 PR. MZ. 17. PRONÁJMA, PŘECHOVNICE, REKONSTRUKCE, P. 842  
1560 NO, 06 NO + 32, 802. + 122, 0002+162  
300 - 1/100 Pracovní přestávka: 11<sup>00</sup> - 12<sup>00</sup>

éna a příjmení): KORC Václav, DIKHAZ OTHENIDET

~~Arbeits (Arbeit) Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100~~

~~intentional~~ ~~unintentional~~ ~~serious~~ ~~very~~ ~~in~~?

à práce (včetně dodavatelů a jejich činnosti): - Podobnosti území Praha 15  
(okres Praha) v km 11,300 - 11,800 15100 okres Praha  
okres Praha  
- Podobnosti území Praha 15 okres Praha okres Praha

2025 JAGTSTÄLLE: SÖDERÅS LÄN (S. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841.

ЗАДАЧА 7Д1: 10 ВНЕШНЕГО КОНТРОЛЯ А НА ЗАДАЧЕ  
ВНЕШНЕГО КОНТРОЛЯ НА ПЕРВЫХ КОНТРОЛЯХ.  
ЗНАНИЕ ПОСЛЕДНИХ ПОСЛЕДСТВИЙ НА  
КАЖДОМ ПОСЛЕДСТВИИ (КОНТРОЛИ,  
ЗНАНИЕ = НАП. ПОЛИТИКА СЕТЬ (ПОЛИТИКА  
ПОСЛЕДСТВИИ).

o zástupce investora (TDI):



So 102

Datum: 5.10.2022 Den týdne: P.

středisko: PAKOV Název akce: 11/10J H2. R2. T. POHÝ PŘESKOUVÁNÍ, DEKONTAMINACE, I. STÁDO  
POKROK, DÁNO 30C, 20. + 10C, 20.12.1997

dob: 500 - 500

Pracovní přestávka: 30 - 20

ci (jména a příjmení): KOTOUŠ ZŠTEBA, KOPATISEK, JEDLIČKA, SPRÁVIL KUBO, OLŠA  
RUCKA, MICHAEL CHABADŠ, KOTLA KAD, JEDLIČKA JIPSEK, KOTIL  
LŠTEBA, KOTOUŠ PRACOBIL, KOTIL PRACOBIL, MICHAEL DINK,  
KOTIL JUDIK

ismy: ~~Lisbon~~ OR, LISBON PD, JALSC HATT, WBC. DEPTA OPL,  
FANES DO'SLE, DISTRIBUTOR, KONTAK WE

id: Re. S. 1001, Vol. 16 + 17B 2-153-60, 250020001 20000, 80000, 2000000000 000000 2000000000, 2000000000 2000000000

**Úřky:**

provedené práce (včetně dodavatelů a jejich činnosti): - provedení stavebního úprav na pozemku  
na zastavení komunikace pro výhled z ulice  
v km 1,300 - 1,300 stavební úpravy na pozemku  
provozování práce na pozemku

[illegible]

- PROHLÁŠENÍ MOUVNÍKŮ VOSTY & AKTIVNÍHO STAVU  
POD 16+PVB 25 155-60 V km 11,300-11,500. LEVO PŘEDNÍ  
VE STŘEDU STANČENÍ + MŮŽNĚ VĚCÍ MŮŽE

- podložni - právněho poslední části kg/m<sup>2</sup> v km  
1,300 - 1,800 2500 průměr 15 průměr průměr

- geografická poloha evropského dvoráka bohatství  
v místech dílčích pro střední ob ve v  
od 11 500 - 12 500 na 15 pro střední

[illegible]

- POUŽITÍ PRÁVNÍHO VYJÁDRĚNÍ PROU ŽELEZA KOMUNIKACE  
S OBSAHUJÍCÍM DO KATOVSKÉHO JAZY V Cm B, 480 -  
14,70 15,70 PRÁVNÍ JE POUŽITO PRÁVNÍM

- Deponierung Kosten Plastik v. km 2,440 - 2,900

- zakládání epitafního skupin hřbitovů bohumilské v km  
z 1800 - z 1830 neodotčen skupin hřbitovů bohumilské  
(okresy 250 č. 63) + hlavami po verších hřbitovů hlav

Podpis zástupce investora (TDI):

...stovhvedoucino:



80 102

Datum: 29. 11. 2011 Den týdne: ÚT

lisko: 8112001 Název akce: 11/101 HR. 12. 11. PDA17 - ŽESHOVSKÉ, DEKONSTRUKCE, II. STÁVA  
 11/101 HR. 12. 11. PDA17 - ŽESHOVSKÉ, DEKONSTRUKCE, II. STÁVA  
 300 - 11/101

Pracovní přestávka: 11:00 - 12:00

na a přijmení): JAROSLAV ŠPÍLEK, OLGA BUCHTA, BOJENKA KUTVENCUT, MICHAL  
 ŠENDEJ, VASIL VLAJ, FERNANDEZ VEDVICKA, MICHAL BERTEN, MICHAL DITZ,  
 MICHAL BERTEN, MICHAL DITZ,

11/101 HR. 12. 11. PDA17 - ŽESHOVSKÉ, DEKONSTRUKCE, II. STÁVA  
 11/101 HR. 12. 11. PDA17 - ŽESHOVSKÉ, DEKONSTRUKCE, II. STÁVA

11/101 HR. 12. 11. PDA17 - ŽESHOVSKÉ, DEKONSTRUKCE, II. STÁVA  
 11/101 HR. 12. 11. PDA17 - ŽESHOVSKÉ, DEKONSTRUKCE, II. STÁVA

- práce (včetně dodavatelů a jejich činnosti):
- PROVÁDĚNÍ PROPOJENÍ DEŠTOVÉ KANALIZACE (PRÁVĚ A LEVÉ PŘEDPOLÍ MASTI 30206) S VYTŘENÍM DO PŘÍSLUŠNÉHO POKLADU (POVLÁČKA PLASTOVÝCH ROVR) DO BETONOVÉHO LOKÁLU
  - PROVÁDĚNÍ OBSTUPU PŘI ROVRU (PRÁVĚ A LEVÉ PŘEDPOLÍ MASTI 30206) PŘÍKRYTÍ KČ. 01/1111
  - PROVÁDĚNÍ ZÁKLADNÍHO KROUŽKU ASFALTOBETONU + ODPOURÁNÍ V KM 11,580 - 11,450 PRÁVĚ STRANA KE STŘEDU STANOVISNÍ + ODPOURÁNÍ DEKONSTRUKCE PŘI NA MĚŘENÍ
  - PROVÁDĚNÍ ODPOURÁNÍ MASTI TĚŽKÉ KONTAMINACE A DEKONSTRUKCE DO BETONOVÉHO LOKÁLU V KM 11,300 - 11,400 LEVÁ STRANA KE STŘEDU STANOVISNÍ

OPIS ZÁKONNOSTI: OPIS ZÁKONNOSTI

(K PRÁVĚ A LEVÉ PŘEDPOLÍ MASTI 30206) S VYTŘENÍM DO PŘÍSLUŠNÉHO POKLADU (POVLÁČKA PLASTOVÝCH ROVR) DO BETONOVÉHO LOKÁLU  
 V KM 11,580 - 11,450 PRÁVĚ STRANA KE STŘEDU STANOVISNÍ  
 A O PROVÁDĚNÍ PROVÁDĚNÍ PROVÁDĚNÍ PROVÁDĚNÍ PROVÁDĚNÍ  
 30206 a PROVÁDĚNÍ ASFALTOBETONOVÉHO POKRYTÍ 16+2018,  
 16+2018, 16+2018, 16+2018, 16+2018

OPIS VDI: PO PŘÍKLADNÍ KONTROLE A ZA PODMÍNEK VYKONÁNÍ  
 KONTROL. ZKONTROL. POKRYTÍ POKRYTÍ POKRYTÍ  
 V GYMNÁZIUMU



So 1021

Datum: 7. 12. 2022 Den týdne: St.

středisko: 84126001 Název akce: 11/1021 H2, H2.11, POUH1 - STĚNOVÝK, PŘEČNOSTAVKA, I. ETAPA  
PŘEČNOSTAVKA, POUH1 + 70%, POUH2 + 50%, POUH3 + 40%  
oba: 30% - 16% Pracovní přestávka: 11<sup>30</sup> - 12<sup>00</sup>

oba: 500-16

Pracovní přestávka: 11<sup>30</sup> - 12<sup>00</sup>

(jména a příjmení): MILAN ŠTĚPÁN, DOMINIK JARUŠKA, MILOŠ PŘEVRŮZ, KRYŠTOF  
MILOŠ DÍK, LUDMIL FANAL, JAN VŘEŠ, JIŘÍ LUKŠ, ZDENEK  
LOUISKOPF

ny: 3x KÄSE MATIN, FINNISK KÜBBLE, KOSTICIN, LINC ROBERT,  
DASTON, LIEBHERR 912, LIEBHERR 913, 9x KÄSE MATIN AUTO

ACI 16+50/90, PAVIMENTAÇÃO PORTÁTELA 0,3 kg/m<sup>2</sup>, ACI 16+P713 25/55-60,  
PAVIMENTAÇÃO PORTÁTELA 1,2 kg/m<sup>2</sup>, ACI 11+P713 4/10-60, DISCULÇÃO  
LATERAL, 8570N, 892 P 17501F

- [illegible]



So 102

Datum: 3.5.2023

Den týdne: 81

Název akce: M/MU H2. H2. D. PRAHA, ŠKOLNICE, PRÁVNICKÉ J. KLOP

Maximo:  $P_{\text{azo}} + 6^\circ\text{C}$ ,  $P_{\text{O}_2} + 1^\circ\text{C}$ ,  $P_{\text{O}_2} + 1/2^\circ\text{C}$

Pracovní přestávka: 11<sup>00</sup> - 12<sup>00</sup>

členovia (jména a prijímení): JOSEF KOUTERAT, ALF. PANKRAT, JOSEF V. ŽUPK, ALF. BUCHA, MATOUŠ PUSKOSIL, MICHAL ABENDAT, JOSEF V. KAD, PÍTALIT HARTIK, JOSEF V. ŽUPK, FRANTIŠEK VEDLIČKA, MICHAL DITK, LAUREN PANKR, ANTONÍN TENCAL

mechanismy: ~~LIEBHERR~~ 914, ~~LIEBHERR~~ 912, ~~DAWIDEC~~ CERNÍ NAKLADNĚ, ~~BRIDE~~,  
31 NAKLADNÍ AUTO, MOTOROLA ŘEZAČKA, BOVERCI KLADOVO WACKER,  
21 FORD TREASURY, VOZEC HANIT, HŘEŠTINŮ DĚLA DPU.

Material: REGULACIÓN BÓRRA, 8502, SC 5/6, ADELANTADO 11. 10cm, 20 de 0.02mm.

roušky: *stříbrná' šatkovací' bavlna (24 š. se. 0/32 m m a)*

vedené práce: - porádění občů k práci těleso rotundní práce po 102  
8 občů k práci do 102 v km 11, 130-  
1330 práci stana 15 práci stana 15

2020 EMMONTELS: EMMONTELS EMMONTELS (F. 17896 a.s.)

Martin Lita Lada's ~~Business~~ ~~Entrepreneurship~~ Project on 08/06/21

INVESTICE p. MIKROPLASMA VALENTNÍ O POVOLENÍ PROVOZOVÁNÍ

konstruktiv vrtiti & 80 5/16 ~~in~~ in 1/2. 100mm V

Em 10,870 - 10,880 a 11,060 - 11,180 L516' PRANA 15 PÁREO  
POTENCIAR

- průměrná kapacita v km<sup>2</sup> na PC 5% v z. 10 mm 68500  
v km 10,940 - 10,940 p v km 11,060 - 11,720 15% průměrná  
ve střední průměrné + kapalně PC 5% 11,060 - 11,720 15%

PROJEKTI 'POSLEDNOSTI' BELEŽNIKU DO RASTAVLJENJA KOSKE  
1 km N. 20. - 11. 19. 1970. STONA 15. STONENI STONENI

(DATE AND ADDRESS) - PUBLISHED BY DATE  
P D-PC)

POWIERZENIE WARTOŚCI NIEWYŻEJ 8 ED. KŁ. 0/34mm 9 PRO

Zároveň dážďu v km 11,25-11,285 L510 PRANA 15 APRIL  
1968

80% 8 MONTHS!

PE ~~ANALYZOVANÍ~~ PRÁVNÍČÍ, OB 288107 V KM 11,060-11,180 LSKA \*

podpis zástupce investora (TDI):



SO 102

Datum: 3.5.2003 Den týdne: ST.

ové středisko: Smlouva Název akce: 11/102/AR. HL. 17. PRAT, BRANOVICKÉ, PRONKTEURCE, II. BRAPA

ni doba: Pracovní přestávka:  
nici (jména a příjmení):

ismy:

ené práce: \* PRANA VE PRÁVNÍ STANOVENÍ 87% ZUKTÉN NÁKLADNÍ  
PRV. V ORS KONUMIRACE VE TLOVĚKA STAVNÍ  
CS DES/OT 00A 180-190 mm. PO OTEŘOVÁNÍ STAVNÍHO  
ARALTOVÉHO SOUTEVNÍ A STAVNÍ CS DES/OT NA PRANÉ  
PRANÉ VE PRÁVNÍ STANOVENÍ NA POSUDOVANÝ ÚROVEN  
DLE DRS V km 11,060 - 11,180 BUDÉ BRANOVICKÉ STAVNÍ  
CS DES/OT V TLOVĚKA 80-90 mm A TÍT NEVHODNÍ.  
BRANOVICKÉ DRS PROJEKTANT A AD PRAT O NÁVRH  
BRANOVICKÉ TLOVĚKA. BILA PROJEKTANTA PROJEKTANT  
V PROJEKTANT 80 km.  
DLE V km 11,180 - 11,060 A 11,180 - 11,300 LENO PRANA VE  
PRÁVNÍ STANOVENÍ SE NÁKLADNÍ PRANOVICKÉ CS DES/OT  
87% ORS NÁKLADNÍ KONUMIRACE KONUMIRACE KONUMIRACE, NEJLÉ  
PROJEKTANT BRANOVICKÉ KONUMIRACE KONUMIRACE TO KONUMIRACE S DRS  
KONUMIRACE KONUMIRACE A AD PRAT BILA PROJEKTANT BRANOVICKÉ  
STAVNÍ CS DES/OT V km 11,180 - 11,060 A 11,180 - 11,300  
A NÁKLADNÍ KONUMIRACE A OTEŘOVÁNÍ BRANOVICKÉ STAVNÍ  
CS DES/OT

ZAPIS TDI: BEPL AT VEDOMI

PO 1024

Datum: 15.12.2022 Den t ydne: JT.

ve středisku: *PHILIPAC* Název akce: *M/101/10. 12. 11. PRAT, PRATOVACE, PRATOVACE, PRATOVACE*  
*PRATOVACE, PRATOVACE, PRATOVACE, PRATOVACE*

ni doba: 50 - 17 30

Pracovní přestávka: 71<sup>00</sup> - 24<sup>00</sup>

nici (jměna a příjmení): KOBANEK KOUTENSKÝ, JAROSLAV ŠILPSE, VASIL KLAD, MICHAL  
CHENDEB, OLGA DUCHKA, EDENÁKE KOTÁ, MARIE PASOUKIL,  
KOŽLAV ZEMEN

insmy: *PINKED, VIGOR, 31 VIGOR HATT, 31 VIGOR HATT, KATPESOE,*  
*31 VIGOR HATT, CISTENA (PINKED)*

ál: 2016. é. 202. § 2001F, MFLTERÁNI, PAVRÁCI, PASTÁRI

šky:

vedené práce (včetně dodavatelů a jejich činnosti): - poskytnutí účelové správy v km

49,500 - 11,200 PENNY PRANA NE VIDEA/ PAMČEN!

- PRÁVA ČENÍ POKROČILÉ: APOZITURNOSTNÉ PRÁVNÍKY

ACL 10+ 1 km 11,300-11,400 peabó plants vs other species

- poznámka: společné ho integrované ho partei u km 11.300 - 11.400

PARISH STREET 15 FIRST FLOOR

- Решение полагая  $\alpha = 1$  и  $\beta = 1$  получим  $\frac{1}{2} \ln 2$

PRATI E' O'ENI TEMPA SA P 70215 V km 11,300-11,800 PERVA

Priglasenie na koncert

- PROVODNOST PODROBNÉHO INFILTRAČNÍHO PŘETOKU:  $0,3 \text{ kg/m}^2$

ZÁPIŠ TD1: POHLÁDKA AIT- VYHOVNÁVALI PRISTV MCL6T  
I MODIRIKOVANÝM POSIVEM A POHLÁDKA  
PRISTV JAL BTLV PROVEDENT BEE  
POLITIKY TD1 2 DEKODU KESTADNASTY  
KUKATICKYH ZODNATREZ DE JTY 756101

Podpis zástupce investora (T



So 102 ✓

Datum: 9.5.2023

Den týdne: 07

Středisko: *PHILADEL* Název akce: *11/102 HE. HL. D. PRAMT, ŠTĚCHOVICE, PRACOVNICE, 2. STUP*  
*ESNO, DŽÁN O 8°C, PAR. +16°C, ADPAZ. +20°C*

oba: 300-19 50

Pracovní přestávka: 11<sup>00</sup> - 12<sup>00</sup>

(jména a příjmení): VÁCLAV ŽITEN, FERNÁNDEZ JEDLIČKA, JAROSLAV ŠÍPŠEK,  
JOSÉ LÓPEZ, MATEJ PASCOSIL, EUGENE KATRANES, VITALIY PRITIK,  
MICHAEL CHENDET, ROSE WARD, MICHAEL DIVER, CAROL FRANK, ANTONÍN  
FRANČEK

my: LIESNEC 914 + MIDL. KLADIVO, LIESNEC 9R, KOSTEC ČERNÍ NARJANE,  
S4 FOR JAGUIT, 3 + MIDL. AUTO, MOTOCYKLOVÝ PRŮVAZ,  
KOMPAKTOVÉ + HODINKY PŘÍKAL

INFLUENZA POSTICHE STRALI: 1,0 kg/m<sup>2</sup>, 1,2 kg/m<sup>2</sup>

dené práce:

- PROVÍDĚNÍ ODPOVĚDNÉHO VÝKONNÉHO PRACOVNÍKA Z. NEJEDNÁKOVIC NA PRÁZDNÉHO HODIN V 10h
- PROVÍDĚNÍ ZÁKAZNÍKA POKRYTÍ, ES DESKAT V km 11,345 - 11,300
- 15h PRÁHA KE PRÁZDNÉHO PROVÍDĚNÍ PRO PRÁZDNÉHO PRACOVNÍKA (VÝKONNÉHO PRACOVNÍKA V km 11,225 - 11,285
- 10h PRÁHA + ODPOVĚDNÍ
- PROVÍDĚNÍ ÚKOLU PRACOVNÍKA PO 10h V km 10,840 - 11,300
- 15h PRÁHA KE PRÁZDNÉHO PROVÍDĚNÍ
- PROVÍDĚNÍ ZÁKAZNÍKA PRÁZDNÉHO (PROVÍDĚNÍ PRACOVNÍKA PRO PROVÍDĚNÍ PRACOVNÍKA PRACOVNÍKA)
- PROVÍDĚNÍ ZÁKAZNÍKA PRACOVNÍKA PRACOVNÍKA PRO PRACOVNÍKA PRACOVNÍKA V km 11,880
- PRÁHA PRÁHA KE PRÁZDNÉHO PROVÍDĚNÍ

2015 SNOWBIRDS: 2015 SNOWBIRDS (K. STEBBINS a.s.)

11.005/19 L.16A 8303 ~~STANOV~~ POKRYTÍ DOBROU INKUSTORA  
P. MIROSLAVA VALENTI O POKRYTÍ POKRYTÍ INFILTRACNÍHO  
POSTŮKOU 51431 1,2 kg/m<sup>2</sup> a 10 kg/m<sup>2</sup> v km 10,870 - 11,300  
1510 PRANA 15 (PTEU) STANOVENÍ A O POKRYTÍ POKRYTÍ  
ACQUADASTANOVU KORTER 90P 16+, PAL 210015, AGL 16+ PIRB O  
ACQUADASTANOVU KORTER 90P 16+, PAL 210015, AGL 16+ PIRB O  
ACQUADASTANOVU KORTER 90P 16+, PAL 210015, AGL 16+ PIRB O

ЗАДАЧА: ПО ВИЗУАЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ И НА ЗАДАЧАХ ВЫЯВЛЕНИЯ  
ВИЗУАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ИЛИ ПРОЦЕССА ПОДЪЕМА ПОДЪЕМА,  
КАК ВЕРНО ПОСТРОИТЬ В СЛУЖБЕ ИЛИ В СЛУЖБЕ, ИЛИ

- PROVEDENÍ INFILTRAČNÍHO POKUSU: V km 10,80 - 10,80 a 11,060 - 11,180 - 1,0 kg/m<sup>2</sup> a v km 11,880 - 11,060 a 11,180 - 11,300 - 1,2 kg/m<sup>2</sup> (LEVIS STAGN - KE PRŮBĚHU STAGNŮ)

Podpis zástupce investora (TDI):

Podpis stavbyvedoucího:



80 102 ✓

Datum: 10. 5. 2023 Den týdne: 8.

středisko: *Bilba* Název akce: *11/10 AD. PL. D. POAM, STROMICE, REKONSTRUKCE, T. ETOPA*  
*POLOVANO, BANO +6°C, POL. + 11°C, ADPOL. + 19°C*

dob: 200 - 1980

Pracovní přestávka: 11<sup>00</sup> - 12<sup>00</sup>

řici (jména a příjmení): KACZOV BERTEN, KRANTIRSEK UBDLICKA, JAROSLAV MIFER,  
OLEH DUCHRA, HATOLIS FORCOIL, SEDENISE KULTENRIST, MICHAL  
CHRADEK, KACEL KLOD VITALITY HOTTSEK

nismy:

LIBRERIA 9K, LIBRERIA # + HEDERLICHE KLADIVO, BOARBE  
CELAN' ANGLADAN, 91 MALLADN'ATO, PAPER 10452E, 34 KALE  
HATID, EL 05MEOLA, RALOVE 0500ADLO, DISTIBUTOR

right:

AQL 16+, AQL 8.700117, INFILTRACIÓ PASTORIL, PRODUCCIÓ 0,3 kg/m<sup>2</sup>,  
 AQL 16+ PNB, MONOLITICUS MOEREN HUST, (2) FC. 0/30 mm Ø,  
 INFILTRACIÓ PASTORIL, 1,2 kg/m<sup>2</sup>, OSELRACIÓ KATHEL, BATO 2

**uškv:**

provedené práce:

- PROHÁDĚNÍ POZDĚNÝM APOKALYPTICKÝM KARTUŽ ACP 16+  
K. Pr. 10. Pr. 10 - 11. Pr. 10 A 11. Pr. 10 - 11. Pr. 10 15. Pr. 10

KE PRÁČÍ PIANISTY + HUBNĚNÍ AKORDISTY KALE, HART

- degradarea populației afectându totuși pe un număr mic de persoane

POOT, PĚSŇÍ TANZIN 192 F 1701 F V Km 7,000 - 7,060 m

17. 80 - 11,300 LBS - STAINA VS. PRAVEJ PLOVNIČENÍ + HUBNĚNÍ

998 P. MUIF. VALER HADIT

- POVÝŠENÍ SPLOVNOSTI PARTEI 0,3 kg/m<sup>2</sup> v km 2 840 - 7,300  
1510' PREVA VS PRÁVE KLADENÍ

- POOMÄÄR! POUMÄÄR OSASTAJASTUNOKSE MAKSY AKL 16+100VF.

Y km 19,840 - 17,300 L500' STRANA VE PŘÍKRUŽNÍM PŘEMĚNĚ + HUTNĚNÍ  
23.12.2017

- TAVARSKI, SAKRSNI, SPALNIHO MESTNA V LEM B. 890 PRILUŠTAK  
NA STARI PRAMENI + OČISTI + OČISTO, AVARSKIHO SPALNIHO  
MESTNA NA MEDOBROJE (VILIP PED PRIFABRICIRANO) HODILO  
VILIP

- Оспрашанъ мѣстоуеѣхъ 1007 8ѣ скланиѣно маѣту (ѣ. оспрашѣла + маѣтѣ  
оспрашѣно 104)

- POUKROVENÍ: POUKROVENÍ POŠTA HODRÁŽE VYSTI DO BEDNOVSKÉHO LOKA  
V km 13, 940 PRAHA STŘANA 145 VÝŠK + OBST. F. HODRÁŽE  
1. HODRÁŽE 800 POUKROVENÍ 1. HODRÁŽE 800 POUKROVENÍ 1. HODRÁŽE 800 POUKROVENÍ  
PRAHA

- POKROVNÍ ÚKLIDU ODSTRANOVÁNÍ PLOCH KUTURNICE  
PO 100 V KM 13,900 - 14,100 PRAHA (BARA K5 PŘED STANOVÍ)

- PROKÁZÁNÍ ODLEŽENÍ SVAZU TĚLESA KOMUNIKACE PO 10J Z REKONSTRUOVANÉHO KONTAKTU DO BEZPEČNÉHO MÍSTA V km 11,930 - 11,930 PRÁV. STRAN 15 PRŮP. ST.

Podpis zástupce investora (TDI):

Podpis stavbyvedoucího:

102

Datum: 10.5.2023 Den týdne: P

středisko: Mladá Název akce: 11/102/ H2. H2. 17. PRAN, STUHOVCE, REKONSTRUKCE, II. ŠTAPA

oba:

Pracovní přestávka:

(jména a příjmení):

my:

dené práce:

ŠTAPA STUHOVCE:

ZÁSTUPCE STUHOVCE (F. POKORAL A.Š.) MARTIN LIŠA ŠTAPA STUHOVCE,  
POSOL INVESTORA P. MUDROSLAVA KOLENČU O POUŽITÍ PRACOVNÍ  
INFILTRACNÍHO POSTELU EPULE, 1,2 kg/m<sup>2</sup> V KM 13,900 - 14,100  
PRÁK POKORAL VE STUHOVCE A POUŽITÍ VYROVNÁVAČI VERTU AČL 16+  
DLE RDS, REKONSTRUKCE VERTU SE VYŠŠÍ ODOVNOSTI PROTI PŘÍČNÍ  
TOKU POKORAL AČL 16+ PITS A AČL 11+PITS V KM 13,900 - 14,100  
PRÁK POKORAL VE STUHOVCE STUHOVCE,

ZADÍ TDI: PO VIZUÁLNÍ KONTROLE A NA ZÁKLADĚ  
TO STAVEČNĚ TL. ČEK (MIN. 120MM) POKORAL  
POKLÁDKU HAV V UVEDENÉ MÍSTĚ  
VŠETKÉ PODTRIKU

- POUŽITÍ INFILTRACNÍHO POSTELU EPULE, 1,2 kg/m<sup>2</sup>  
V KM 13,900 - 14,100 PRÁK POKORAL VE STUHOVCE  
(DISTRIBUTOŘI)



So 102 ✓

Datum: 11.5.2023

Den týdne: 07

Název akce: 11/1021 H2, H2, 17, P2AN7, J. ŠCHONICE, Bělohradský, II. etapa

POZNASNO, LÍZTO +16°C, POL. +16°C, ROPAL. +17°C

Pracovní přestávka: 11<sup>00</sup> - 12<sup>00</sup>

osobníci (jména a příjmení): FRANTIŠEK JEDLIČKA, VÁCLAV ŠTEJN, JACOBSON ŠTÍP, PATRIK  
LEHOKA, OLEK KUDRKA, MATOUŠ POKROČIL, ZDENĚK KOUTENSKÝ,  
VOSTA HAD, VÍTALÍK HODRÍK, MICHAL CHENDEŠ, MICHAL DÍVĚ,  
KARL FENC, ANTONÍN MENČI.

mechanismy: LIEBHARD 914, LIEBHARD 912, 3x MÄLARDEN AUTO, 2x FORD TRANSIT,  
FIMMER LÖGGE; 3x MÄLSC HATT, MOTOROLA BILSKA

Material: REGULOVANÍ KLÁTES, SĚTA, ŽELEZOVÁ OVLÁDA, LEONITE, AČL 16+,  
PPL 2 MODIF, AČL 16+ PITS, PRONOVACI, PASTIK 0,3 kg/m<sup>2</sup> A 12 kg/m<sup>2</sup>

**koušky:**

- PROVÁDĚNÍ ODVODU NEVYHODNĚHO VÝPOVĚDNÍHO MATERIÁLU  
S PŘÍDEPKEM NA POKRYTÍ KONTAKTU
- PROVÁDĚNÍ, OVLÁDĚNÍ, PŘÍMÁ TĚLESA KOMUNIKACE PO 102  
S REGULÁČNÍM PATEK DO BETONOVÉHO LOŽE V km 11,830-11,830  
PŘÍMÁ PŘÍMÁ KE PŘÍMÉ STANOVENÍ
- PROVÁDĚNÍ, OVLÁDĚNÍ + OVLÁDÁNÍ SÁTKOVÉ VLASTI  
V km 11,830-11,830 PŘÍMÁ PŘÍMÁ KE PŘÍMÉ STANOVENÍ  
(ODVODNÍ POKRYTÍ)
- PROVÁDĚNÍ POKRYTÍ VÝPOVĚDNÍ, POKRYTÍ VÝPOVĚDNÍ  
AČL 16+ DLE DLE V km 13,700-14,100 PŘÍMÁ PŘÍMÁ  
KE PŘÍMÉ STANOVENÍ
- PROVÁDĚNÍ, POKRYTÍ, POKRYTÍ NA VÝPOVĚDNÍ, POKRYTÍ 1,2 kg/m<sup>2</sup>
- PROVÁDĚNÍ, POKRYTÍ, POKRYTÍ KE SÁTKOVÉ OVLÁDÁNÍ, POKRYTÍ  
PŘÍMÁ PŘÍMÁ PŘÍMÁ S POKRYTÍ + POKRYTÍ POKRYTÍ POKRYTÍ  
V km 13,700-14,100 PŘÍMÁ PŘÍMÁ KE PŘÍMÉ STANOVENÍ
- PROVÁDĚNÍ, POKRYTÍ, POKRYTÍ 0,3 kg/m<sup>2</sup> V km 13,700-14,100  
PŘÍMÁ PŘÍMÁ KE PŘÍMÉ STANOVENÍ
- PROVÁDĚNÍ, POKRYTÍ, POKRYTÍ POKRYTÍ AČL 16+ PŘÍMÁ  
V km 13,700-14,100 PŘÍMÁ PŘÍMÁ KE PŘÍMÉ STANOVENÍ +  
POKRYTÍ POKRYTÍ POKRYTÍ POKRYTÍ
- PROVÁDĚNÍ, POKRYTÍ, POKRYTÍ POKRYTÍ 0,3 kg/m<sup>2</sup> V km 13,700-14,100  
PŘÍMÁ PŘÍMÁ KE PŘÍMÉ STANOVENÍ + POKRYTÍ POKRYTÍ (POKRYTÍ  
POKRYTÍ POKRYTÍ, 1,2 kg/m<sup>2</sup>)
- PROVÁDĚNÍ, POKRYTÍ, POKRYTÍ POKRYTÍ 0,3 kg/m<sup>2</sup> V km 14,850-14,850  
PŘÍMÁ PŘÍMÁ KE PŘÍMÉ STANOVENÍ + POKRYTÍ POKRYTÍ (POKRYTÍ  
POKRYTÍ POKRYTÍ, 1,2 kg/m<sup>2</sup>)

Podpis zástupce investora (TDI):

Podľa stavbyvedného:



Den týdne:  $P_C$ Pracovní přestávka: 11<sup>00</sup> - 12<sup>00</sup>

LIEBARDI 914, LIEBARDI 914, LIEBARDI 052N: NAPOLANO; 9 MILLARDI  
AUTO, MINERI MOBILE, 3x TALEO MOTT, 2x FORD JESUIT,  
LIEBARDI 102.

C 30/34 154, 20P 164, 20L 8 MODIF, 20L 164 MODIF, 20S/10 234/10  
(20V/10, 20L/10). 20S/10, 20L/10 234/10

- ПОДЪОБНИ ПОДЪОБНАТ НАСТАТОК НАСТУП НА СУПЕРНОУ АУДИОСТА,  
ПОТ, ПИБЕНИ ТАСИ.В ПАД П МОДИ. Y KM 19,800 - 11,060 A  
Y KM 11,80 - 11,300 PANA PIBANA NA PAKEN PAMIOENI

PROJEKCIJA PLOŠTE PROJEKCIJE: 0,3 kg/m<sup>2</sup> v km 10,840 - 11,300  
POSLOJ PLOŠTE VE PLOŠTE PLOŠTE

- POOLIDENÍ / ZOBRAZIT AKTIVITOSTI AČK B + PR Y EM N. 840 - 11,300  
POKE POSKY K5 PŘEDU STANOVENÍ + MÍNĚNÍ. AKTIVITOSTI  
KALC. HADN

- PROVEDENÍ SETONÁŽE SETONOVSKHO PRÁHU V km 13,9963-13,9903  
PRÁHU STOMA NA PÍSEK STANOVENÍ V SETONU C30132 X44

- POUKŮDĚNÍ, PŘEDVÁNÍ, REGULÁČNÍHO RYTMUSU DO BEDNOUTVÝHO  
LOŽE POKYSLENOJ PŘEDVACI, MÍTOSTI PŘED V LHM 11,830 - 11,830  
POKRYŠ STOMA VE JINÉHU PŘEDVÁNÍ

- OADR, NEMANOVANJE I NEPOVJERANJE IZABRAZU I NEODOSTUPNOST  
NA PRAZNIKU IZABRAZU

- PROVĚŘENÍ ÚJEDNÍ PRÁVNOSTI V LM 11,260 - 11,380 28'40  
(PROVĚŘENÍ ÚJEDNÍ PRÁVNOSTI (POZITIVNÍ ROZSAH KONTROL))

s zástupce investora (TDI):



So far

Datum: 1.6.2023

Den týdne: 07

8/1/88 Název akce: 11/101 HB. H. II. PLAN, FISCHOVIC, REKONSTRUKCE, 1. ETAP  
Rozsah prac. poz. + 1900, odprac. + 2500

Pracovní přestávka: 7<sup>00</sup> - 12<sup>00</sup>

příjmení): KARLAV JAROSLAV, FRANTIŠEK JEDLIČKA, JAROSLAV ŠTÍPÁK,  
OTOMAR DVOŘÁK, KAREL PRŮCHA, ANTONÍN PRŮCHA, PAVEL LEHOCKA,  
LEH RUDOLPH, JAROSLAV POKROK, VITALÍK KRTOČEK, KARL HAD, OTOMAR  
HENDRYCH

KERHAI' 9R, LIRAHSEI' 9M, PRATEC' JIJAN' NALLADU, B' NALLADU' ATO,  
VASE' NOBLE, 3+ VASE' MINT, KOPIC' URS, 3+ FUD TENDT,  
KOPIC' CHAIO.

5, AGL 764, PROJEKCI: POSTERIOR 9,8 kg/m<sup>2</sup>, ~~SAZ~~ SAZ P. MODIF, AGL 764778,  
VIBRAC, CL 20/21, PROJEKCI: POSTERIOR 9,2 kg/m<sup>2</sup>

- poradieni' poradieni' obuklojenih' bariev do stonovho  
1055 poradieni' hitotaj pila v km 11,830-11,830 pravé  
poradieni' 15 pila pila.

POKOŠENÍ VÍCEJŠ STANICÍ V KM 19,060 - 19,380 ~~POKOŠENÍ~~  
5 STANIC STANICÍ (POŠTÍKOVÉ POUKAZ KARTY)

பொருளின் அடர்த்தி (டென்சி - DENSITY)  $1.2 \text{ kg/m}^3$

[illegible]

Thị trấn Phố Mới tỉnh Quảng Bình, cách QL 16 + km 14,100 - 14,425

[illegible]

наименование организации, предприятия

PROBEN: PAKISTAN, ARABISCHE REP. DES SAUDISCHEN ARABISCHEN PEN.

5. TEMI' BAZILIN SEK 8 MODIF. 1 km 14,100 - 14,425 BEAR'S PEARLS

ARSEN PRONČENI' + KATANI / VOŠT KOLEI KATIT

коэф. пропорционального распредел.  $\approx 93 \text{ кг/м}^2$  в том же, то-же, 25

15. PŘEDNÍ 15. PRŮBĚH PRŮBĚH

DEVI 9013250K7 18FA21088TONN 92K 16+PDR V km 13,100-13,425

15. PICAHO 18. PRAČU STANOVNI + HUMANI AČL 16 + PIRB VALČU HETIT

Богданов, мо. частици 93 kg/m<sup>2</sup>

[illegible]

Ustanov: V km. 4,95 pravoúhelník přesu stanicí.

STRABAG a.s.  
Dopravní stavitelství  
direkce TC  
Kačírkova 982/4  
CZ – 158 00 Praha 5 / Česká republika

**STRABAG**

**Stavba: II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE**  
**Dodavatel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Praha 5**

**Číslo předávacího protokolu: D 6a/2020**

**Předmět měření: SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE**  
**Plocha vrstvy SAL – km 10,250 – 10,360 - vpravo**

**SAL**

Plocha: 505.0 m<sup>2</sup>

Měření bylo provedeno GPS TOPCON HR.  
Dopustné odchylky měření a výpočtu nebyly překročeny,

**Souřadnicový systém:** S-JTSK  
**Výškový systém:** Bpv  
**Přílohy:**

|                   |           |              |
|-------------------|-----------|--------------|
| <b>Zaměřil:</b>   | 22.6.2020 | Josef Tůma   |
| <b>Zpracoval:</b> | 22.6.2020 | Josef Tůma   |
| <b>Ověřil:</b>    | 29.6.2020 | Ing. S.Bílek |

Ověření výsledků zeměměřických činností ve výstavbě  
podle §13 odst.1 písm. c) zák. č. 200/1994 Sb




DAVLE PLOCHY FREZOVANÍ K 22.6.2020

PLOCHA FREZOVANÍ 4 cm 580,5 m<sup>2</sup>

PLOCHA FREZOVANÍ 10 cm 505,0 m<sup>2</sup>

PLOCHA SANACE 38,2 m<sup>2</sup>

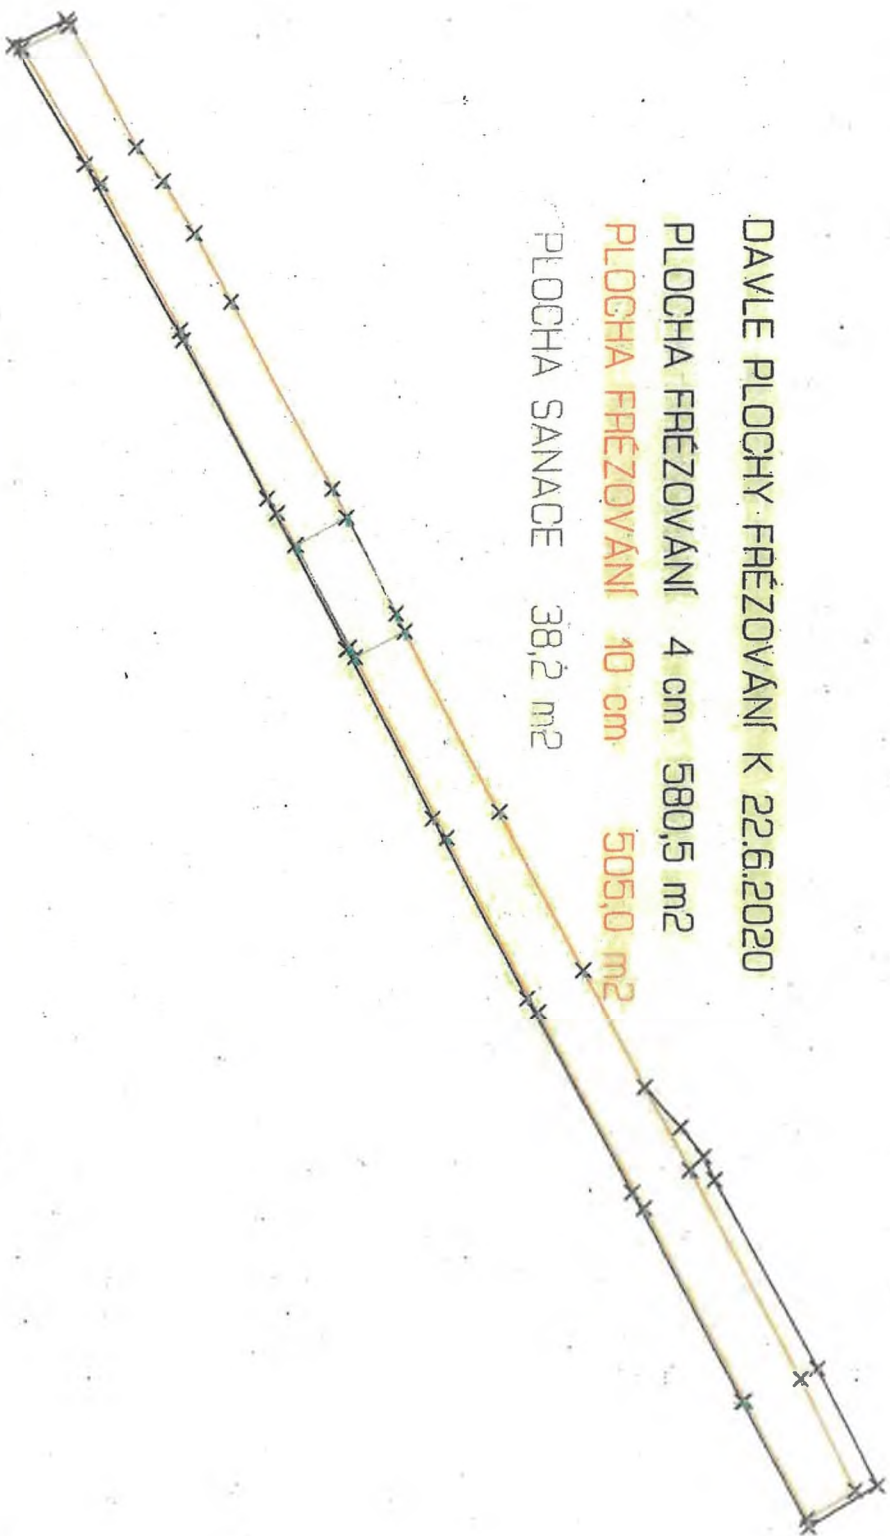



STRABAG a.s.  
Dopravní stavitelství  
direkce TC  
Kačírkova 982/4  
CZ – 158 00 Praha 5 / Česká republika

**STRABAG**

**Stavba:** II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE  
**Dodavatel:** STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Praha 5

**Číslo předávacího protokolu:** D 13/2020

**Předmět měření:** SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE  
**Plocha nové živičné vozovky – km 12,440 – 12,850**

**Vlevo:**

|     |                     |
|-----|---------------------|
| ACO | 1936 m <sup>2</sup> |
| ACL | 1931 m <sup>2</sup> |
| ACP | 1927 m <sup>2</sup> |

**Vpravo:**

|              |                     |                   |
|--------------|---------------------|-------------------|
| ACO          | 1761 m <sup>2</sup> | prům. tl. 42,4 mm |
| ACL          | 1818 m <sup>2</sup> | prům. tl. 60,2 mm |
| SAL          | 1873 m <sup>2</sup> | prům. tl. 31,0 mm |
| ACL - spodní | 1342 m <sup>2</sup> | prům. tl. 30,7 mm |

**Plocha geomříží:** 315 m<sup>2</sup>

Měření bylo provedeno GPS TOPCON HR.  
Dopustné odchylky měření a výpočtu nebyly překročeny,

**Souřadnicový systém:** S-JTSK

**Výškový systém:** Bpv

**Přílohy:**

**Zaměřil:** 10.-11.2020

Ing. S.Bílek

**Zpracoval:** 24.11.2020

Ing. S.Bílek

**Ověřil:** 24.11.2020

Ing. S.Bílek

Ověření výsledků zeměměřických činností ve výstavbě  
podle §13 odst.1 písm. c) zák. č. 200/1994 Sb



STRABAG a.s.  
Dopravní stavitelství  
direkce TC  
Kačírkova 982/4  
CZ – 158 00 Praha 5 / Česká republika



PŘEDÁVACÍ PROTOKOL č. ŠII 60/21

STAVBA: II/102 HR. HL. MĚSTA PRAHY - ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, ETAPA II  
OBJEKT: SO 102 - Rekonstrukce vozovky, Davle - Stěchovice  
úsek B

Kontrolní měření SAL

| km     | vlevo 0,5 m od okraje |         |        | sklon    |       |        | osa     |         |        | vpravo 0,5 m od okraje |       |        | sklon  |          |       |
|--------|-----------------------|---------|--------|----------|-------|--------|---------|---------|--------|------------------------|-------|--------|--------|----------|-------|
|        | proj.                 | měření  | rozdíl | tloušťka | proj. | měření | proj.   | měření  | rozdíl | tloušťka               | proj. | měření | rozdíl | tloušťka | proj. |
| 10,520 |                       |         |        |          |       |        |         |         |        |                        |       |        |        |          |       |
| 10,540 |                       |         |        |          |       |        |         |         |        |                        |       |        |        |          |       |
| 10,560 |                       |         |        |          |       |        |         |         |        |                        |       |        |        |          |       |
| 10,580 |                       |         |        |          |       |        |         |         |        |                        |       |        |        |          |       |
| 10,600 |                       |         |        |          |       |        |         |         |        |                        |       |        |        |          |       |
| 10,620 |                       |         |        |          |       |        |         |         |        |                        |       |        |        |          |       |
| 10,640 |                       |         |        |          |       |        |         |         |        |                        |       |        |        |          |       |
| 10,660 |                       |         |        |          |       |        |         |         |        |                        |       |        |        |          |       |
| 10,680 | 202,965               | 202,954 | -11    |          | -2,5  | -2,53  | 203,059 | 203,049 | -10    |                        |       |        |        |          |       |
| 10,700 | 203,026               | 203,015 | -11    |          | -2,5  | -2,56  | 203,120 | 203,111 | -9     |                        |       |        |        |          |       |
| 10,720 | 203,007               | 203,009 | 2      |          | -2,5  | -2,51  | 203,101 | 203,103 | 2      |                        |       |        |        |          |       |
| 10,740 | 202,949               | 202,950 | 1      |          | -2,5  | -2,40  | 203,043 | 203,040 | -3     |                        |       |        |        |          |       |
| 10,760 | 202,892               | 202,891 | -1     |          | -2,5  | -2,40  | 202,986 | 202,981 | -3     |                        |       |        |        |          |       |
| 10,780 |                       |         |        |          |       |        |         |         |        |                        |       |        |        |          |       |
| 10,800 |                       |         |        |          |       |        |         |         |        |                        |       |        |        |          |       |
| 10,820 |                       |         |        |          |       |        |         |         |        |                        |       |        |        |          |       |
| 10,840 |                       |         |        |          |       |        |         |         |        |                        |       |        |        |          |       |

Výška: max.odchylka +20, -20 mm  
max.rozdíl +2; -11 mm

prům.rozdíl: -4,5 mm

Celková plocha : 450 m<sup>2</sup>

Ověření výsledk  
podle § 13 odst.  
24.8.2021

**Stavba:** II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE  
**Dodavatel:** STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Praha 5

**Číslo předávacího protokolu:** Š II 78/2021

**Předmět měření:** SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE  
.Úsek B – km 12,822 – 13,202 - vpravo

**Plocha asfaltových vrstev**

|       |                    |                       |
|-------|--------------------|-----------------------|
| ACO - | km 12,822 – 13,202 | 1551,4 m <sup>2</sup> |
| ACL - | km 12,846 – 13,202 | 1530,7 m <sup>2</sup> |
| SAL - | km 12,846 – 13,201 | 1562,3 m <sup>2</sup> |

|         |         |                      |
|---------|---------|----------------------|
| Geomříž | podélně | 759,7 m <sup>2</sup> |
|         | příčně  | 100,1 m <sup>2</sup> |

Měření bylo provedeno GPS TOPCON HR.  
Dopustné odchylky měření a výpočtu nebyly překročeny,

**Souřadnicový systém:** S-JTSK

**Výškový systém:** Bpv

**Přílohy:**

|                   |           |               |
|-------------------|-----------|---------------|
| <b>Zaměřil:</b>   | 29.9.2021 | Ing. S. Bílek |
| <b>Zpracoval:</b> | 30.9.2021 | Ing. S. Bílek |
| <b>Ověřil:</b>    | 30.9.2021 | Ing. S. Bílek |

Ověření výsledků zeměměřických činností ve výstavbě  
podle §13 odst.1 písm. c) zák. č. 200/1994 Sb



STRABAG a.s.  
Dopravní stavitelství  
direkce TC  
Kačírkova 982/4  
CZ – 158 00 Praha 5 / Česká republika

**STRABAG**

**Stavba: II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE**  
**Dodavatel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Praha 5**

**Číslo předávacího protokolu: Š II 100/2021**

**Předmět měření: SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE**  
**Úsek A,B – plocha konstrukčních vrstev v km 10,360 – 10,841**

|              |                                                         |
|--------------|---------------------------------------------------------|
| KSC - vpravo | 1490,5 m <sup>2</sup>                                   |
| SAL - vpravo | 2203,3 m <sup>2</sup>                                   |
| ACP - vpravo | 52,1 m <sup>2</sup>                                     |
| ACL - vpravo | 2198,2 m <sup>2</sup> + vyrovnávky 164,3 m <sup>2</sup> |
| ACO          | 4065,6 m <sup>2</sup> (-+P)                             |


|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| geomříže           |                           |
| km 10,525 – 10,580 | š. 2 m 101 m <sup>2</sup> |
| km 10,680 – 10,840 | š. 2 m 320 m <sup>2</sup> |

Měření bylo provedeno GPS TOPCON HR.  
Dopustné odchylky měření a výpočtu nebyly překročeny,

**Souřadnicový systém:** S-JTSK  
**Výškový systém:** Bpv  
**Přílohy:**

|                   |            |               |
|-------------------|------------|---------------|
| <b>Zaměřil:</b>   | 11.2021    | Ing. S. Bílek |
| <b>Zpracoval:</b> | 10.11.2021 | Ing. S. Bílek |
| <b>Ověřil:</b>    | 10.11.2021 | Ing. S. Bílek |

Ověření výsledků zeměměřických činností ve výstavbě  
podle §13 odst.1 písm. c) zák. č. 200/1994 Sb





**Stavba:** II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE  
**Dodavatel:** STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Praha 5

Číslo předávacího protokolu: Š II 15/2022

**Předmět měření:** SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE

Úsek A – km 10,000 – 10,250 - vlevo

Plocha konstrukčních vrstev

**SO 102**

|       |                    |                      |
|-------|--------------------|----------------------|
| ACL - | km 10,000 – 10,117 | 685,0 m <sup>2</sup> |
|       | km 10,130 – 10,250 | 512,1 m <sup>2</sup> |

|       |                    |                      |
|-------|--------------------|----------------------|
| ACP - | km 10,000 – 10,117 | 700,1 m <sup>2</sup> |
|       | km 10,130 – 10,190 | 274,6 m <sup>2</sup> |

|       |                    |                      |
|-------|--------------------|----------------------|
| SAL - | km 10,190 – 10,250 | 251,9 m <sup>2</sup> |
|-------|--------------------|----------------------|

|      |                    |                      |
|------|--------------------|----------------------|
| SC - | km 10,000 – 10,117 | 713,1 m <sup>2</sup> |
|      | km 10,130 – 10,250 | 362,8 m <sup>2</sup> |

|      |                    |                      |
|------|--------------------|----------------------|
| ŠD - | km 10,000 – 10,117 | 733,6 m <sup>2</sup> |
|      | km 10,130 – 10,250 | 376,3 m <sup>2</sup> |

**SO 204**

|       |                    |                     |
|-------|--------------------|---------------------|
| ACL - | km 10,117 – 10,130 | 80,9 m <sup>2</sup> |
|-------|--------------------|---------------------|

|       |                    |                     |
|-------|--------------------|---------------------|
| ACP - | km 10,117 – 10,130 | 81,4 m <sup>2</sup> |
|-------|--------------------|---------------------|

|      |                    |                     |
|------|--------------------|---------------------|
| SC - | km 10,117 – 10,130 | 82,8 m <sup>2</sup> |
|------|--------------------|---------------------|

Měření bylo provedeno GPS TOPCON HR.  
Dopustné odchylky měření a výpočtu nebyly překročeny,

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Souřadnicový systém: | S-JTSK                    |
| Výškový systém:      | Bpv                       |
| Přílohy:             | Seznam souřadnic<br>náčrt |

**Zaměřil:** 3.-4.2022

**Zpracoval:** 14.4.2022

**Ověřil:** 14.4.2022

Ověření výsledků zeměměřických činností ve výstavbě  
podle §13 odst. 1 písm. c) zák. č. 200/1994 Sb

Ing. S. Bílek

Ing. S. Bílek

Ing. S. Bílek



## II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE

Úsek A


Plocha konstrukčních vrstev - km 10,000 – 10,250 – vlevo

### Seznam souřadnic

| Bod | Y         | X          | Výška  |
|-----|-----------|------------|--------|
| 1   | 747773.92 | 1064711.60 | 202.68 |
| 2   | 747772.71 | 1064711.18 | 202.68 |
| 3   | 747752.40 | 1064707.89 | 202.57 |
| 4   | 747742.69 | 1064706.46 | 202.55 |
| 5   | 747723.69 | 1064703.75 | 202.55 |
| 6   | 747703.73 | 1064700.96 | 202.54 |
| 7   | 747683.95 | 1064698.16 | 202.57 |
| 8   | 747662.95 | 1064695.50 | 202.71 |
| 9   | 747663.94 | 1064689.35 | 202.79 |
| 10  | 747684.71 | 1064692.36 | 202.71 |
| 11  | 747704.59 | 1064695.12 | 202.70 |
| 12  | 747722.18 | 1064697.60 | 202.69 |
| 13  | 747744.15 | 1064700.76 | 202.70 |
| 14  | 747753.69 | 1064702.32 | 202.71 |
| 15  | 747773.41 | 1064705.89 | 202.81 |
| 16  | 747775.46 | 1064706.19 | 202.80 |
| 17  | 747778.10 | 1064706.34 | 202.81 |
| 18  | 747780.46 | 1064706.62 | 202.81 |
| 19  | 747782.16 | 1064707.17 | 202.79 |
| 20  | 747784.25 | 1064707.84 | 202.79 |
| 21  | 747789.52 | 1064709.15 | 202.78 |
| 22  | 747789.67 | 1064708.85 | 202.79 |
| 23  | 747792.44 | 1064709.58 | 202.77 |
| 24  | 747793.59 | 1064709.97 | 202.77 |
| 25  | 747794.89 | 1064710.52 | 202.75 |
| 26  | 747797.42 | 1064711.69 | 202.74 |
| 27  | 747798.90 | 1064712.34 | 202.74 |
| 28  | 747801.27 | 1064713.09 | 202.74 |
| 29  | 747812.34 | 1064716.49 | 202.71 |
| 30  | 747821.71 | 1064719.98 | 202.73 |
| 31  | 747828.84 | 1064722.85 | 202.76 |
| 32  | 747828.85 | 1064727.56 | 202.66 |
| 33  | 747819.90 | 1064723.95 | 202.61 |
| 34  | 747810.93 | 1064720.72 | 202.61 |
| 35  | 747802.23 | 1064717.91 | 202.62 |
| 36  | 747797.35 | 1064716.99 | 202.61 |
| 37  | 747831.03 | 1064723.74 | 202.75 |
| 38  | 747786.60 | 1064714.29 | 202.64 |
| 39  | 747778.89 | 1064712.64 | 202.66 |
| 41  | 747840.12 | 1064727.72 | 202.78 |
| 42  | 747849.15 | 1064732.12 | 202.82 |
| 43  | 747858.01 | 1064736.59 | 202.85 |
| 44  | 747866.95 | 1064741.23 | 202.87 |
| 45  | 747875.77 | 1064745.78 | 202.88 |
| 46  | 747884.69 | 1064750.42 | 202.88 |
| 47  | 747893.60 | 1064755.06 | 202.88 |
| 48  | 747898.78 | 1064757.81 | 202.92 |
| 49  | 747896.60 | 1064762.19 | 202.80 |
| 50  | 747892.12 | 1064759.27 | 202.75 |
| 51  | 747882.52 | 1064754.26 | 202.77 |
| 52  | 747873.67 | 1064749.64 | 202.76 |
| 53  | 747856.15 | 1064740.54 | 202.74 |
| 54  | 747847.28 | 1064736.10 | 202.72 |
| 55  | 747837.79 | 1064731.52 | 202.68 |
| 122 | 747847.78 | 1064734.81 | 202.68 |
| 127 | 747861.64 | 1064741.93 | 202.72 |
| 132 | 747878.22 | 1064750.55 | 202.72 |
| 137 | 747894.48 | 1064758.97 | 202.71 |

MOST  
MOST

Davle 10,000

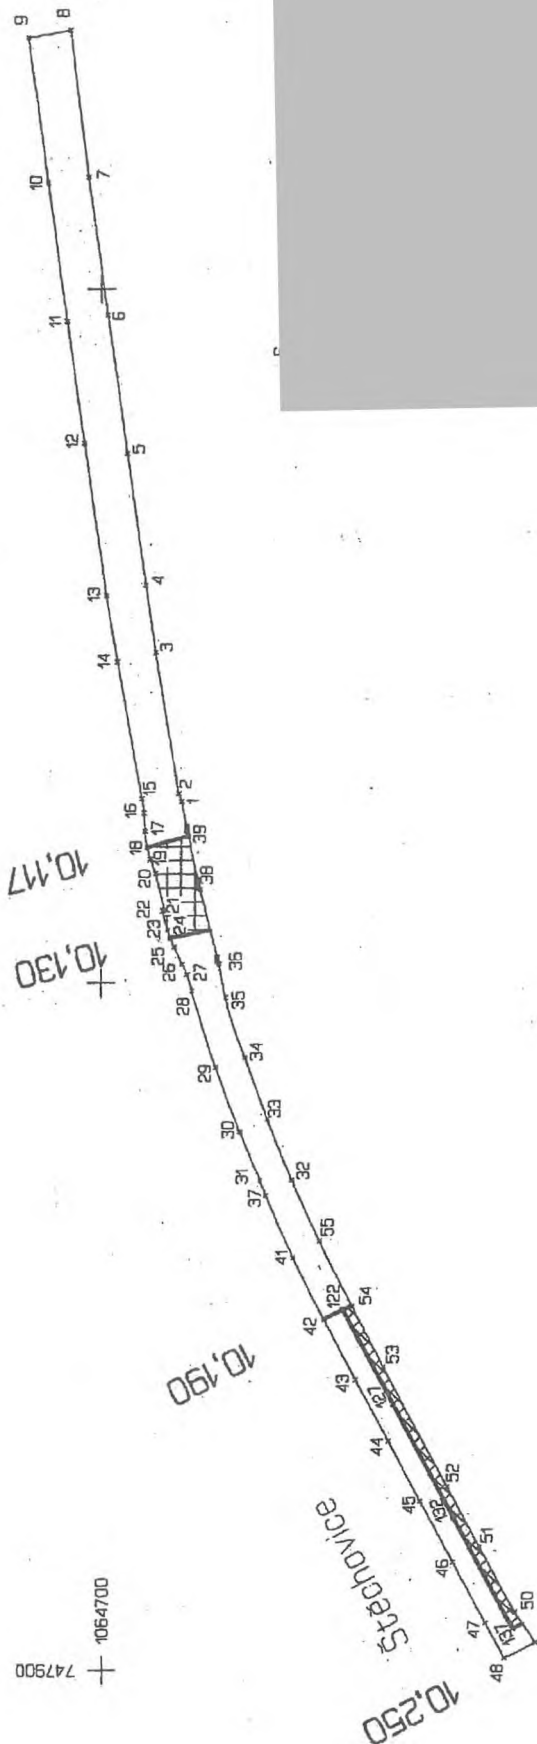

|                                                  |                                                                                                                                                                                                 |       |              |              |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|
| <b>STRABAG a.s.</b><br>Kačírkova 982/41, Praha 5 | číslo zakázky                                                                                                                                                                                   |       | Ing. S. Břek |              |
|                                                  | ověřil                                                                                                                                                                                          |       | 14.4. 2022   |              |
|                                                  | datum                                                                                                                                                                                           |       |              |              |
|                                                  | číslo ověřen                                                                                                                                                                                    |       |              |              |
| akce                                             | <b>1/102 Hr. H. Města Prahy - Střechovice, rekonstrukce, etapa I</b><br><b>SO 102 - Rekonstrukce vozovky,- Davle - Střechovice</b><br>Úsek A - km 10,000 - 10,250 - plocha konstrukčních vrstev |       |              | výkres číslo |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                 |       |              | 1:1000       |
| záměr                                            | Ing. Stanislav Břek                                                                                                                                                                             | datum | 3.-4. 2022   | souř. systém |
| kresl                                            | Ing. Stanislav Břek                                                                                                                                                                             | datum | 14.4.2022    | výsk. systém |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                 |       |              | čpv          |

STRABAG a.s.  
Dopravní stavitelství  
direkce TC  
Kačírkova 982/4  
CZ – 158 00 Praha 5 / Česká republika

**STRABAG**

**Stavba: II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE**  
**Dodavatel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Praha 5**

**Číslo předávacího protokolu: Š II 49/2022**

**Předmět měření: SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE**  
**Úsek B – km 11,297 – 11,780 – vlevo – plocha živice**

**ACL:**

|                             |                     |           |
|-----------------------------|---------------------|-----------|
| SO 102 - km 11,297 – 11,780 | 2130 m <sup>2</sup> | tl. 60 mm |
| SO 206 - km 11,363 – 11,377 | 63 m <sup>2</sup>   | tl. 60 mm |

**ACL – vyrovnávka:**

|                    |                     |                |
|--------------------|---------------------|----------------|
| km 11,534 – 11,780 | 1125 m <sup>2</sup> | prům tl. 44 mm |
|--------------------|---------------------|----------------|

**SAL:**

|                            |                     |           |
|----------------------------|---------------------|-----------|
| SO 102 – km 11297 – 11,780 | 2175 m <sup>2</sup> | tl. 30 mm |
|----------------------------|---------------------|-----------|

**geomříže:**

328 1 m<sup>2</sup>

Měření bylo provedeno totální stanicí TOPCON IS 305.  
Dopustné odchylky měření a výpočtu nebyly překročeny,

**Souřadnicový systém:**

S-JTSK

**Výškový systém:**

Bpv

**Přílohy:**

Seznam souřadnic  
Náčrt

**Zaměřil:** 10.2022

Ing. S. Bílek

**Zpracoval:** 21.10.2022

Ing. S. Bílek

**Ověřil:** 21.10.2022

Ing. S. Bílek

Ověření výsledků zeměměřických činností ve výstavbě  
podle §13 odst.1 písm. c) zák. č. 200/1994 Sb





**II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, etapa II**  
**SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE**

**Úsek B**

**Km 11,297 – 11,780 – vlevo – plocha živice**

**Seznam souřadnic**


| <b>Bod</b> | <b>Y</b>  | <b>X</b>   | <b>Výška</b> |
|------------|-----------|------------|--------------|
| 101        | 748226.68 | 1065685.48 | 204.30       |
| 102        | 748227.11 | 1065685.31 | 204.30       |
| 103        | 748229.09 | 1065674.99 | 204.27       |
| 104        | 748230.15 | 1065668.74 | 204.25       |
| 105        | 748225.79 | 1065667.98 | 204.13       |
| 106        | 748229.14 | 1065648.00 | 204.08       |
| 107        | 748233.61 | 1065649.05 | 204.21       |
| 108        | 748237.03 | 1065629.27 | 204.16       |
| 109        | 748232.64 | 1065628.32 | 204.05       |
| 110        | 748234.69 | 1065616.02 | 204.09       |
| 111        | 748239.41 | 1065617.10 | 204.17       |
| 118        | 748224.00 | 1065677.78 | 204.16       |
| 119        | 748223.19 | 1065682.14 | 204.19       |
| 120        | 748221.41 | 1065693.55 | 204.25       |
| 121        | 748225.69 | 1065691.67 | 204.35       |
| 122        | 748226.20 | 1065691.79 | 204.32       |
| 123        | 748224.69 | 1065703.27 | 204.37       |
| 124        | 748220.26 | 1065702.51 | 204.29       |
| 127        | 748216.43 | 1065727.22 | 204.24       |
| 128        | 748220.91 | 1065728.01 | 204.32       |
| 131        | 748213.31 | 1065747.40 | 204.25       |
| 132        | 748217.87 | 1065747.76 | 204.35       |
| 135        | 748210.33 | 1065766.91 | 204.28       |
| 136        | 748214.81 | 1065767.53 | 204.37       |
| 139        | 748207.09 | 1065787.08 | 204.30       |
| 140        | 748211.69 | 1065787.32 | 204.40       |
| 143        | 748204.15 | 1065806.19 | 204.33       |
| 144        | 748208.53 | 1065807.02 | 204.43       |
| 147        | 748201.10 | 1065826.04 | 204.34       |
| 148        | 748205.47 | 1065826.84 | 204.44       |
| 151        | 748198.00 | 1065845.88 | 204.34       |
| 152        | 748202.46 | 1065846.63 | 204.44       |
| 155        | 748194.93 | 1065865.64 | 204.34       |
| 156        | 748199.42 | 1065866.34 | 204.44       |
| 160        | 748191.85 | 1065885.30 | 204.35       |
| 161        | 748196.67 | 1065886.04 | 204.46       |
| 164        | 748188.80 | 1065905.08 | 204.34       |
| 165        | 748193.90 | 1065906.03 | 204.45       |
| 168        | 748185.71 | 1065925.09 | 204.28       |
| 169        | 748190.22 | 1065925.65 | 204.38       |
| 172        | 748182.71 | 1065944.72 | 204.26       |
| 173        | 748187.12 | 1065945.44 | 204.36       |
| 176        | 748179.78 | 1065964.49 | 204.20       |
| 177        | 748184.19 | 1065965.21 | 204.30       |
| 180        | 748176.96 | 1065984.24 | 204.14       |
| 181        | 748181.34 | 1065985.01 | 204.24       |
| 184        | 748178.36 | 1066005.94 | 204.19       |
| 185        | 748174.11 | 1066004.67 | 204.10       |
| 188        | 748175.92 | 1066024.61 | 204.13       |
| 189        | 748171.40 | 1066024.16 | 204.04       |
| 192        | 748173.17 | 1066044.43 | 204.12       |
| 193        | 748168.79 | 1066043.93 | 204.01       |
| 196        | 748170.57 | 1066064.08 | 204.09       |
| 197        | 748166.14 | 1066063.40 | 203.98       |
| 200        | 748168.05 | 1066084.12 | 204.07       |
| 201        | 748163.56 | 1066083.66 | 203.96       |
| 202        | 748166.83 | 1066094.27 | 204.07       |
| 203        | 748162.30 | 1066093.50 | 204.01       |

**Geomříže**

|     |           |            |        |
|-----|-----------|------------|--------|
| 502 | 748238.75 | 1065619.88 | 206.17 |
| 503 | 748237.42 | 1065626.89 | 206.16 |
| 504 | 748235.71 | 1065636.67 | 206.17 |
| 505 | 748233.99 | 1065646.67 | 206.20 |

|     |           |            |        |
|-----|-----------|------------|--------|
| 506 | 748232.23 | 1065656.47 | 206.22 |
| 507 | 748230.57 | 1065666.39 | 206.24 |
| 508 | 748229.60 | 1065671.65 | 206.26 |
| 509 | 748221.85 | 1065721.65 | 206.33 |
| 510 | 748220.95 | 1065727.44 | 206.33 |
| 511 | 748219.50 | 1065737.37 | 206.34 |
| 512 | 748218.07 | 1065747.05 | 206.35 |
| 513 | 748216.37 | 1065757.17 | 206.23 |
| 514 | 748214.83 | 1065767.04 | 206.20 |
| 515 | 748213.33 | 1065777.04 | 204.39 |
| 516 | 748211.74 | 1065786.79 | 204.40 |
| 517 | 748210.26 | 1065796.80 | 204.42 |
| 518 | 748208.63 | 1065806.71 | 204.44 |
| 519 | 748207.52 | 1065815.09 | 204.46 |
| 520 | 748205.60 | 1065826.48 | 204.44 |
| 521 | 748204.14 | 1065835.65 | 204.45 |
| 522 | 748202.52 | 1065846.19 | 204.44 |
| 523 | 748201.01 | 1065856.11 | 204.45 |
| 524 | 748199.44 | 1065865.98 | 204.44 |
| 525 | 748185.94 | 1065952.78 | 204.34 |
| 526 | 748196.45 | 1065885.73 | 204.46 |
| 527 | 748193.42 | 1065905.40 | 204.45 |
| 528 | 748191.87 | 1065915.30 | 204.42 |
| 529 | 748184.71 | 1065961.72 | 204.31 |
| 530 | 748183.44 | 1065970.62 | 204.29 |
| 531 | 748182.06 | 1065979.59 | 204.26 |
| 532 | 748180.70 | 1065989.54 | 204.23 |
| 533 | 748179.31 | 1065999.55 | 204.21 |
| 534 | 748177.86 | 1066009.57 | 204.18 |
| 535 | 748172.19 | 1066051.96 | 204.10 |
| 536 | 748167.44 | 1066088.40 | 204.07 |

50 206



11,780

Stachovice

11,534

11,373

11,363

Davle

11,297

|                                                                                                                                                                               |                       |                         |            |                |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------|----------------|--|
| STRABAG a.s.<br>Kadrňkova 982/41, Praha 5                                                                                                                                     |                       | oslo zakázky            |            | Ing. S. Blásek |  |
|                                                                                                                                                                               |                       | měřítko                 |            | 21.10.2022     |  |
|                                                                                                                                                                               |                       | datum                   |            |                |  |
|                                                                                                                                                                               |                       | oslo měření             |            |                |  |
| účel: 1/102 Hr. Hl. Města Prahy - Stachovice, rekonstrukce, etapa I<br>SO 102 Rekonstrukce vozovky, Davle - Stachovice<br>Úsek B, km 11,297 - 11,780 - vlevo - plochy žlivoce |                       | výkres číslo<br>1: 2000 |            | měřítko        |  |
|                                                                                                                                                                               |                       |                         |            | 10.2022        |  |
|                                                                                                                                                                               |                       |                         |            | datum          |  |
|                                                                                                                                                                               |                       |                         |            | datum          |  |
| záměr                                                                                                                                                                         | Ing. Stanislav Blásek | datum                   | 10.2022    | souř. systém   |  |
| kreslil                                                                                                                                                                       | Ing. Stanislav Blásek | datum                   | 21.10.2022 | výřk. systém   |  |
|                                                                                                                                                                               |                       |                         |            | S-JTSK         |  |
|                                                                                                                                                                               |                       |                         |            | BpV            |  |

STRABAG a.s.  
Dopravní stavitelství  
direkce TC  
Kačírkova 982/4  
CZ – 158 00 Praha 5 / Česká republika

**STRABAG**

**Stavba: II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE**  
**Dodavatel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Praha 5**

**Číslo předávacího protokolu: Š II 63/2022**

**Předmět měření: SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE**  
**Úsek C – km 14,424 – 14,580 – vpravo – plochy konstrukčních vrstev**

|     |   |                      |            |                                    |
|-----|---|----------------------|------------|------------------------------------|
| ŠD  | - | 602,3 m <sup>2</sup> | tl. 220 mm |                                    |
| SC  | - | 580,8 m <sup>2</sup> | tl. 150 mm |                                    |
| ACP | - | 569,3 m <sup>2</sup> | tl. 50 mm  | SAL 143,3 m <sup>2</sup> tl. 30 mm |
| ACL | - | 701,8 m <sup>2</sup> | tl. 60 mm  |                                    |
| ACO | - | 684,1 m <sup>2</sup> | tl. 40 mm  |                                    |

**SO 103 - REKONSTRUKCE VOZOVKY, Průtah Štěchovicemi**  
**Úsek A – km 14,580 – 14,609 – vpravo – plochy konstrukčních vrstev**

|     |   |                      |            |
|-----|---|----------------------|------------|
| ŠD  | - | 153,6 m <sup>2</sup> | tl. 150 mm |
| ŠD  | - | 153,6 m <sup>2</sup> | tl. 200 mm |
| ACP | - | 153,6 m <sup>2</sup> | tl. 90 mm  |
| ACL | - | 153,6 m <sup>2</sup> | tl. 60 mm  |
| ACO | - | 158,3 m <sup>2</sup> | tl. 40 mm  |

Měření bylo provedeno totální stanicí TOPCON IS 305.  
Dopustné odchylky měření a výpočtu nebyly překročeny,

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Souřadnicový systém: | S-JTSK           |
| Výškový systém:      | Bpv              |
| Přílohy:             | Seznam souřadnic |
|                      | Náčrt            |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| Zaměřil:   | 11.-12.2022 | Ing. S. Bílek |
| Zpracoval: | 8.12.2022   | Ing. S. Bílek |
| Ověřil:    | 8.12.2022   | Ing. S. Bílek |

Ověření výsledků zeměměřických činností ve výstavbě  
podle §13 odst. 1 písm. c) zák. č. 200/1994 Sb



**II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, etapa II**  
**SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE**

Úsek C km - 14,424 – 14,580 – vpravo – plocha konstrukčních vrstev


**SO 103 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - PRŮTAH ŠTĚCHOVICEMI**

Úsek A km - 14,580 – 14,609 – vlevo – plocha konstrukčních vrstev

**Seznam souřadnic**

| Bod | Y         | X          | Výška  |
|-----|-----------|------------|--------|
| 1   | 747721.73 | 1068670.44 | 206.06 |
| 2   | 747729.58 | 1068663.89 | 206.07 |
| 3   | 747737.14 | 1068657.34 | 206.07 |
| 4   | 747739.58 | 1068655.14 | 206.08 |
| 5   | 747745.10 | 1068649.94 | 206.05 |
| 6   | 747748.18 | 1068653.35 | 206.06 |
| 7   | 747742.53 | 1068658.43 | 206.17 |
| 8   | 747735.51 | 1068664.51 | 206.16 |
| 9   | 747726.46 | 1068672.26 | 206.15 |
| 10  | 747719.69 | 1068677.75 | 206.12 |
| 11  | 747716.45 | 1068674.69 | 206.03 |
| 12  | 747707.86 | 1068681.34 | 205.96 |
| 13  | 747710.56 | 1068684.99 | 206.06 |
| 14  | 747702.41 | 1068690.97 | 206.00 |
| 15  | 747699.76 | 1068687.31 | 205.91 |
| 16  | 747691.36 | 1068693.32 | 205.89 |
| 17  | 747692.67 | 1068697.82 | 205.97 |
| 18  | 747683.02 | 1068704.53 | 205.95 |
| 19  | 747680.46 | 1068700.86 | 205.87 |
| 20  | 747670.27 | 1068707.82 | 205.89 |
| 21  | 747672.66 | 1068711.60 | 205.95 |
| 22  | 747661.38 | 1068719.24 | 205.97 |
| 23  | 747658.97 | 1068715.58 | 205.91 |
| 24  | 747651.12 | 1068720.91 | 205.91 |
| 26  | 747644.53 | 1068730.54 | 205.97 |
| 27  | 747642.12 | 1068727.02 | 205.89 |
| 29  | 747638.13 | 1068734.66 | 205.96 |
| 30  | 747629.15 | 1068740.37 | 205.92 |
| 31  | 747622.93 | 1068744.30 | 205.91 |
| 32  | 747621.86 | 1068745.00 | 205.91 |
| 33  | 747616.79 | 1068748.23 | 205.88 |
| 34  | 747615.99 | 1068748.74 | 205.89 |
| 35  | 747613.46 | 1068750.39 | 205.87 |
| 36  | 747612.69 | 1068751.02 | 205.86 |
| 37  | 747612.00 | 1068751.70 | 205.81 |
| 38  | 747609.22 | 1068754.90 | 205.69 |
| 39  | 747608.71 | 1068755.47 | 205.68 |
| 40  | 747608.19 | 1068754.99 | 205.71 |
| 41  | 747595.93 | 1068761.11 | 205.81 |
| 42  | 747594.85 | 1068758.76 | 205.80 |
| 43  | 747594.67 | 1068758.40 | 205.80 |
| 44  | 747603.11 | 1068754.90 | 205.88 |
| 45  | 747602.95 | 1068754.57 | 205.88 |
| 47  | 747593.38 | 1068755.56 | 205.90 |
| 48  | 747600.80 | 1068751.90 | 205.92 |
| 49  | 747608.70 | 1068747.65 | 205.88 |
| 50  | 747617.19 | 1068742.95 | 205.84 |
| 51  | 747623.85 | 1068739.04 | 205.88 |
| 52  | 747631.77 | 1068733.87 | 205.87 |
| 53  | 747636.16 | 1068730.97 | 205.88 |



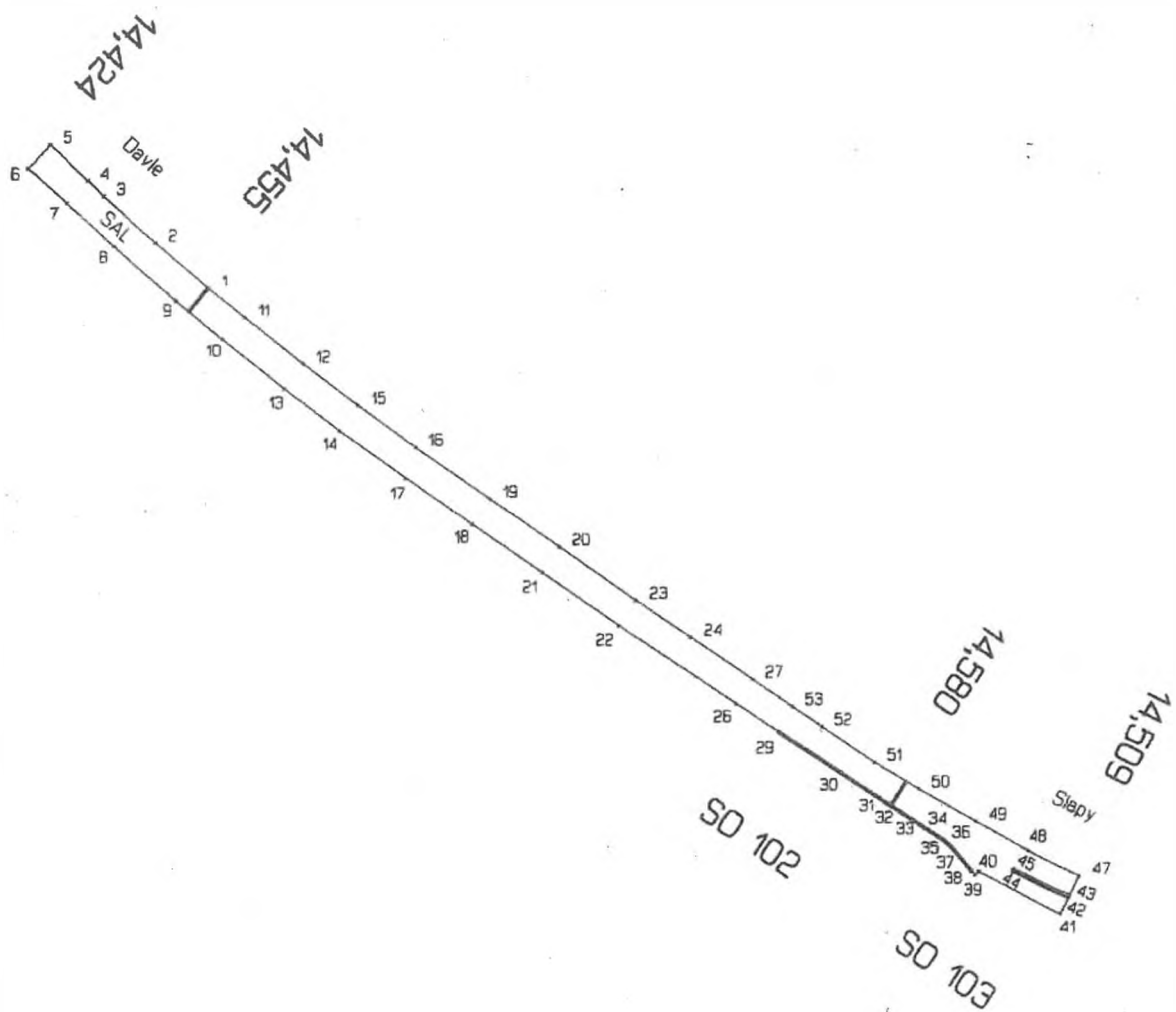

|                                                                     |                      |       |                                  |               |               |              |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|----------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| STRABAG a.s.<br><br>Kačírkova 982/41, Praha 5                       |                      |       |                                  | číslo zakázky |               |              |
|                                                                     |                      |       |                                  | ověřil        | Ing. S. Bílek |              |
|                                                                     |                      |       |                                  | datum         | 8.12.2022     |              |
|                                                                     |                      |       |                                  | číslo ověření |               |              |
| akce II/102 Hr. Hl. Města Prahy - Stechovice, rekonstrukce, etapa I |                      |       |                                  |               |               | vykres číslo |
| SO 102,<br>Úsek C km 14,424 - 14,580                                |                      |       | SO 103<br>Úsek A 14,580 - 14,609 |               |               |              |
|                                                                     |                      |       |                                  |               |               |              |
|                                                                     |                      |       |                                  |               | měřítko       | 1 : 1000     |
| zameril                                                             | Ing. Stanislav Bílek | datum | 11.-12.2022                      | souř. systém  | S-JTSK        |              |
| kreslil                                                             | Ing. Stanislav Bílek | datum | 8.12.2022                        | výšk. systém  | Bpv           |              |

STRABAG a.s.  
Dopravní stavitelství  
direkce TC  
Kačírkova 982/4  
CZ – 158 00 Praha 5 / Česká republika

**STRABAG**

**Stavba: II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE**  
**Dodavatel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Praha 5**

**Číslo předávacího protokolu: Š II 66/2022**

**Předmět měření: SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE**  
**Úsek B – km 11,298 – 11,780 – vpravo – plocha živice**

|                   |                             |                       |                |
|-------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------|
| ACL:              | SO 102 - km 11,298 – 11,780 | 1916,4 m <sup>2</sup> | tl. 60 mm      |
|                   | SO 206 - km 11,363 – 11,377 | 63,0 m <sup>2</sup>   | tl. 60 mm ✓    |
| SAL:              | SO 102 – km 11,298 – 11,780 | 1957,4 m <sup>2</sup> | tl. 30 mm      |
| ACL - vyrovnávka: | km 11,298 – 11,780          | 2000,1 m <sup>2</sup> | prům tl. 29 mm |
| ACP:              | SO 206 – km 11,363 – 11,377 | 63,0 m <sup>2</sup>   | tl. 50 mm ✓    |

Měření bylo provedeno totální stanicí TOPCON IS 305.  
Dopustné odchylky měření a výpočtu nebyly překročeny,

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Souřadnicový systém: | S-JTSK                    |
| Výškový systém:      | Bpv                       |
| Přílohy:             | Seznam souřadnic<br>Náčrt |

|            |            |               |
|------------|------------|---------------|
| Zaměřil:   | 12.2022    | Ing. S. Bílek |
| Zpracoval: | 20.12.2022 | Ing. S. Bílek |
| Ověřil:    | 20.12.2022 | Ing. S. Bílek |

Ověření výsledků zeměměřických činností ve výstavbě  
podle §13 odst. 1 písm. c) zák. č. 200/1994 Sb



# **II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, etapa II** **SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE**


**Úsek B**

**Km 11,298 – 11,780 – vpravo – plocha AB vrstev vozovky**

**Seznam souřadnic**

| Bod | Y         | X          | Výška  |          |
|-----|-----------|------------|--------|----------|
| 1   | 748223.88 | 1065737.60 | 204.20 |          |
| 2   | 748221.56 | 1065751.75 | 204.21 |          |
| 3   | 748217.17 | 1065751.02 | 204.30 |          |
| 4   | 748222.38 | 1065718.73 | 204.29 |          |
| 5   | 748226.60 | 1065719.29 | 204.21 |          |
| 6   | 748229.37 | 1065700.59 | 204.27 |          |
| 7   | 748225.13 | 1065699.97 | 204.36 |          |
| 8   | 748226.22 | 1065691.81 | 204.30 |          |
| 9   | 748225.79 | 1065691.57 | 204.28 |          |
| 10  | 748226.84 | 1065685.46 | 204.26 |          |
| 11  | 748227.19 | 1065685.31 | 204.25 |          |
| 12  | 748233.31 | 1065675.95 | 204.14 |          |
| 13  | 748229.06 | 1065675.13 | 204.21 |          |
| 14  | 748232.31 | 1065656.56 | 204.17 |          |
| 15  | 748236.38 | 1065657.13 | 204.09 |          |
| 16  | 748239.95 | 1065637.80 | 204.03 |          |
| 17  | 748235.72 | 1065636.98 | 204.11 |          |
| 18  | 748239.18 | 1065618.00 | 204.14 |          |
| 19  | 748239.36 | 1065617.07 | 204.18 |          |
| 20  | 748243.55 | 1065618.78 | 204.05 |          |
| 21  | 748243.72 | 1065617.89 | 204.08 |          |
| 22  | 748231.91 | 1065684.10 | 204.13 |          |
| 24  | 748231.59 | 1065686.55 | 204.40 |          |
| 25  | 748230.66 | 1065692.49 | 204.43 |          |
| 26  | 748230.29 | 1065694.92 | 204.32 |          |
| 55  | 748219.71 | 1065736.75 | 204.28 |          |
| 56  | 748214.58 | 1065769.25 | 204.31 |          |
| 57  | 748218.70 | 1065770.12 | 204.26 |          |
| 58  | 748215.72 | 1065789.51 | 204.29 |          |
| 59  | 748211.55 | 1065789.01 | 204.37 |          |
| 60  | 748208.47 | 1065808.26 | 204.40 |          |
| 61  | 748212.62 | 1065809.09 | 204.30 |          |
| 62  | 748209.72 | 1065827.94 | 204.29 |          |
| 63  | 748205.55 | 1065827.22 | 204.40 |          |
| 64  | 748207.92 | 1065839.52 | 204.28 |          |
| 65  | 748203.72 | 1065839.25 | 204.41 |          |
| 66  | 748200.74 | 1065857.98 | 204.41 |          |
| 67  | 748205.00 | 1065858.67 | 204.31 |          |
| 68  | 748201.91 | 1065878.04 | 204.31 |          |
| 69  | 748197.76 | 1065877.43 | 204.39 |          |
| 70  | 748183.22 | 1066002.52 | 204.14 | STERBINA |
| 71  | 748182.86 | 1066002.47 | 204.15 | STERBINA |
| 73  | 748178.97 | 1066002.48 | 204.15 |          |
| 74  | 748177.23 | 1066014.60 | 204.10 |          |
| 75  | 748181.13 | 1066015.16 | 204.12 | STERBINA |
| 76  | 748181.50 | 1066015.20 | 204.12 | STERBINA |
| 77  | 748178.76 | 1066035.19 | 204.07 | STERBINA |
| 78  | 748178.40 | 1066035.15 | 204.07 | STERBINA |
| 80  | 748174.64 | 1066033.98 | 204.06 |          |
| 81  | 748172.23 | 1066051.94 | 204.03 |          |
| 82  | 748176.05 | 1066052.57 | 203.96 |          |
| 83  | 748173.70 | 1066071.14 | 203.91 |          |
| 84  | 748169.77 | 1066070.71 | 204.01 |          |
| 85  | 748167.59 | 1066087.63 | 204.00 |          |
| 86  | 748166.79 | 1066093.50 | 204.04 |          |
| 87  | 748166.69 | 1066094.28 | 204.09 |          |
| 88  | 748170.61 | 1066093.98 | 203.96 |          |
| 89  | 748170.41 | 1066094.79 | 203.99 |          |
| 90  | 748178.21 | 1066037.01 | 203.94 | BUS      |
| 91  | 748178.94 | 1066035.97 | 204.00 | BUS      |
| 92  | 748179.73 | 1066033.41 | 204.04 | BUS      |
| 93  | 748181.92 | 1066028.91 | 204.15 | BUS      |
| 94  | 748183.70 | 1066016.14 | 204.15 | BUS      |
| 95  | 748183.74 | 1066013.16 | 204.12 | BUS      |
| 96  | 748183.99 | 1066009.14 | 204.12 | BUS      |

|     |           |            |        |     |
|-----|-----------|------------|--------|-----|
| 97  | 748184.54 | 1066004.37 | 204.13 | BUS |
| 98  | 748184.37 | 1066001.91 | 204.09 | BUS |
| 99  | 748183.80 | 1066001.76 | 204.10 | BUS |
| 101 | 748187.08 | 1065975.63 | 204.12 |     |
| 102 | 748182.83 | 1065975.19 | 204.22 |     |
| 103 | 748185.66 | 1065955.32 | 204.30 |     |
| 104 | 748190.09 | 1065955.96 | 204.19 |     |
| 105 | 748192.31 | 1065940.65 | 204.21 |     |
| 106 | 748187.99 | 1065940.19 | 204.32 |     |
| 107 | 748190.83 | 1065922.06 | 204.33 |     |
| 108 | 748194.97 | 1065922.45 | 204.25 |     |
| 109 | 748198.42 | 1065900.96 | 204.29 |     |
| 110 | 748194.18 | 1065900.54 | 204.38 |     |
| 111 | 748196.96 | 1065882.39 | 204.37 |     |
| 112 | 748201.26 | 1065882.98 | 204.31 |     |



11,780

11,723

11,686

Stachovice

902 05

Davle

11,298



|                                                                                                                                                                         |                      |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| STRABAG a.s.<br>Kacrkova 982/41, Praha 5                                                                                                                                |                      | číslo zakázky | Ing. S. Blisk |
|                                                                                                                                                                         |                      | ověřil        | datum         |
|                                                                                                                                                                         |                      | číslo ověření | 20.12.2022    |
| úsek I/102 Hr. Hl. Města Prahy - Stachovice, rekonstrukce, etapa I<br>SO 102 Rekonstrukce vozovky, Davle - Stachovice<br>Úsek B, km 11,298 - 11,780 - AB vrstvy vozovky |                      | výhled stávo  |               |
| záměr                                                                                                                                                                   | Ing. Stanislav Blisk | datum         | 12.12.22      |
| realiz                                                                                                                                                                  | Ing. Stanislav Blisk | datum         | 20.12.2022    |
|                                                                                                                                                                         |                      | měřítka       | bez           |
|                                                                                                                                                                         |                      | soft. systém  | S-JTSK        |
|                                                                                                                                                                         |                      | výpl. systém  | Boh           |



STRABAG a.s.  
Dopravní stavitelství  
direkce TC  
Kačírkova 982/4  
CZ – 158 00 Praha 5 / Česká republika

**STRABAG**

**Stavba: II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE**  
**Dodavatel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Praha 5**

**Číslo předávacího protokolu: Š II 10/2023**

**Předmět měření: SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE**  
**Úsek C – km 11,771 – 12,436 – vlevo**

|            |   |                       |            |
|------------|---|-----------------------|------------|
| <b>ŠD</b>  | - | 1527,0 m <sup>2</sup> | tl. 250 mm |
| <b>SC</b>  | - | 1463,1 m <sup>2</sup> | tl. 150 mm |
| <b>SAL</b> | - | 2982,7 m <sup>2</sup> | tl. 30 mm  |
| <b>ACL</b> | - | 2964,4 m <sup>2</sup> | tl. 60 mm  |
| <b>ACO</b> | - | 2922,9 m <sup>2</sup> | tl. 40 mm  |

**Plocha geomříží - 390,8 m<sup>2</sup>**

Měření bylo provedeno totální stanicí TOPCON IS 305.  
Dopustné odchylky měření a výpočtu nebyly překročeny,

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| <b>Souřadnicový systém:</b> | S-JTSK                    |
| <b>Výškový systém:</b>      | Bpv                       |
| <b>Přílohy:</b>             | Seznam souřadnic<br>Náčrt |

|                   |           |               |
|-------------------|-----------|---------------|
| <b>Zaměřil:</b>   | 3.2023    | Ing. S. Bílek |
| <b>Zpracoval:</b> | 21.3.2023 | Ing. S. Bílek |
| <b>Ověřil:</b>    | 21.3.2023 | Ing. S. Bílek |

Ověření výsledků zeměměřických činností ve výstavbě  
podle §13 odst.1 písm. c) zák. č. 200/1994 Sb



# II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, etapa II SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE


Úsek B

Plochy konstrukčních vrstev vozovky v km 11,771 – 12,436 - vlevo



Seznam souřadnic

| Bod | Y         | X          | Výška  |
|-----|-----------|------------|--------|
| 1   | 748154.95 | 1066152.42 | 204.03 |
| 2   | 748157.43 | 1066132.73 | 204.01 |
| 3   | 748159.92 | 1066113.42 | 204.00 |
| 4   | 748162.38 | 1066093.44 | 204.01 |
| 5   | 748163.53 | 1066084.11 | 203.99 |
| 6   | 748167.91 | 1066084.66 | 204.09 |
| 7   | 748166.85 | 1066094.05 | 204.11 |
| 8   | 748164.26 | 1066113.77 | 204.11 |
| 9   | 748161.72 | 1066133.64 | 204.12 |
| 10  | 748135.05 | 1066311.60 | 203.76 |
| 11  | 748156.70 | 1066173.25 | 204.16 |
| 12  | 748152.41 | 1066172.86 | 204.06 |
| 13  | 748149.87 | 1066192.85 | 204.10 |
| 14  | 748154.20 | 1066193.19 | 204.20 |
| 15  | 748151.71 | 1066213.07 | 204.24 |
| 16  | 748147.94 | 1066212.52 | 204.12 |
| 17  | 748146.63 | 1066217.35 | 204.13 |
| 18  | 748145.65 | 1066222.48 | 204.13 |
| 19  | 748143.96 | 1066236.23 | 204.14 |
| 20  | 748143.98 | 1066238.39 | 204.15 |
| 21  | 748143.59 | 1066242.46 | 204.15 |
| 23  | 748137.61 | 1066291.47 | 204.13 |
| 24  | 748140.07 | 1066271.36 | 204.13 |
| 25  | 748142.47 | 1066252.00 | 204.15 |
| 26  | 748149.23 | 1066232.86 | 204.23 |
| 27  | 748146.79 | 1066252.73 | 204.24 |
| 28  | 748144.34 | 1066272.58 | 204.24 |
| 29  | 748141.86 | 1066292.36 | 204.24 |
| 30  | 748139.39 | 1066312.22 | 204.27 |
| 31  | 748136.95 | 1066332.12 | 204.32 |
| 32  | 748132.65 | 1066331.78 | 204.22 |
| 33  | 748130.14 | 1066351.85 | 204.24 |
| 34  | 748134.44 | 1066352.15 | 204.35 |
| 35  | 748132.07 | 1066371.81 | 204.36 |
| 36  | 748127.75 | 1066371.27 | 204.25 |
| 37  | 748125.26 | 1066391.34 | 204.26 |
| 38  | 748129.57 | 1066391.70 | 204.37 |
| 40  | 748127.10 | 1066411.66 | 204.38 |
| 41  | 748122.75 | 1066411.11 | 204.28 |
| 42  | 748120.30 | 1066431.01 | 204.31 |
| 43  | 748124.65 | 1066431.40 | 204.41 |
| 44  | 748122.15 | 1066451.34 | 204.44 |
| 45  | 748117.86 | 1066450.80 | 204.34 |
| 46  | 748115.38 | 1066470.74 | 204.37 |
| 47  | 748119.74 | 1066471.27 | 204.48 |
| 48  | 748114.85 | 1066510.71 | 204.47 |
| 49  | 748117.30 | 1066490.86 | 204.47 |
| 52  | 748112.87 | 1066490.67 | 204.36 |
| 53  | 748110.46 | 1066510.46 | 204.37 |
| 54  | 748107.98 | 1066530.42 | 204.38 |
| 56  | 748112.41 | 1066530.60 | 204.47 |
| 57  | 748109.93 | 1066550.46 | 204.49 |
| 58  | 748105.60 | 1066550.03 | 204.38 |
| 59  | 748103.15 | 1066569.84 | 204.39 |
| 60  | 748107.47 | 1066570.32 | 204.49 |
| 61  | 748104.98 | 1066590.18 | 204.49 |
| 62  | 748100.63 | 1066589.65 | 204.38 |
| 63  | 748098.14 | 1066609.72 | 204.38 |
| 64  | 748102.50 | 1066609.98 | 204.48 |
| 65  | 748100.09 | 1066629.76 | 204.49 |
| 66  | 748095.76 | 1066629.20 | 204.39 |
| 67  | 748093.27 | 1066649.31 | 204.39 |

|     |           |            |        |         |
|-----|-----------|------------|--------|---------|
| 68  | 748097.66 | 1066649.66 | 204.49 |         |
| 69  | 748090.74 | 1066669.26 | 204.38 |         |
| 70  | 748095.20 | 1066669.55 | 204.49 |         |
| 71  | 748092.74 | 1066689.47 | 204.49 |         |
| 72  | 748088.37 | 1066688.76 | 204.39 |         |
| 73  | 748090.24 | 1066709.16 | 204.50 |         |
| 75  | 748085.71 | 1066708.56 | 204.27 |         |
| 76  | 748083.23 | 1066729.92 | 204.41 |         |
| 77  | 748081.40 | 1066744.65 | 204.42 |         |
| 78  | 748082.42 | 1066744.81 | 204.45 |         |
|     |           |            |        |         |
| 101 | 748101.38 | 1066616.91 | 204.31 | GEOMRIZ |
| 102 | 748101.28 | 1066620.62 | 204.35 | GEOMRIZ |
| 103 | 748098.28 | 1066644.97 | 204.35 | GEOMRIZ |
| 104 | 748098.13 | 1066645.86 | 204.35 | GEOMRIZ |
| 105 | 748095.96 | 1066663.42 | 204.36 | GEOMRIZ |
| 106 | 748091.52 | 1066678.34 | 204.29 | GEOMRIZ |
| 107 | 748090.08 | 1066706.47 | 204.36 | GEOMRIZ |
| 108 | 748087.94 | 1066724.23 | 204.37 | GEOMRIZ |
| 109 | 748103.50 | 1066602.72 | 204.35 | GEOMRIZ |
| 110 | 748103.86 | 1066599.57 | 204.35 | GEOMRIZ |
| 111 | 748105.06 | 1066589.62 | 204.34 | GEOMRIZ |
| 112 | 748106.19 | 1066580.51 | 204.34 | GEOMRIZ |
| 113 | 748107.20 | 1066572.42 | 204.35 | GEOMRIZ |
| 114 | 748110.10 | 1066549.60 | 204.34 | GEOMRIZ |
| 115 | 748111.88 | 1066535.41 | 204.35 | GEOMRIZ |
| 116 | 748113.37 | 1066522.51 | 204.34 | GEOMRIZ |
| 117 | 748116.43 | 1066497.89 | 204.35 | GEOMRIZ |
| 118 | 748119.31 | 1066474.47 | 204.33 | GEOMRIZ |
| 120 | 748132.18 | 1066370.79 | 204.22 | GEOMRIZ |
| 121 | 748129.75 | 1066390.24 | 204.24 | GEOMRIZ |
| 122 | 748126.73 | 1066413.95 | 204.25 | GEOMRIZ |
| 123 | 748125.38 | 1066425.24 | 204.28 | GEOMRIZ |
| 124 | 748123.48 | 1066439.86 | 204.29 | GEOMRIZ |
| 125 | 748123.20 | 1066442.47 | 204.30 | GEOMRIZ |
| 126 | 748122.73 | 1066446.40 | 204.30 | GEOMRIZ |
| 127 | 748121.66 | 1066455.55 | 204.32 | GEOMRIZ |
| 128 | 748134.44 | 1066350.52 | 204.36 | GEOMRIZ |
| 129 | 748136.09 | 1066338.51 | 204.19 | GEOMRIZ |
| 130 | 748137.97 | 1066322.49 | 204.14 | GEOMRIZ |
| 131 | 748140.15 | 1066304.82 | 204.12 | GEOMRIZ |
| 132 | 748140.93 | 1066299.20 | 204.10 | GEOMRIZ |
| 133 | 748144.09 | 1066273.87 | 204.11 | GEOMRIZ |
| 134 | 748145.57 | 1066261.77 | 204.12 | GEOMRIZ |
| 135 | 748147.29 | 1066248.35 | 204.10 | GEOMRIZ |
| 136 | 748148.06 | 1066241.65 | 204.10 | GEOMRIZ |
| 137 | 748149.18 | 1066232.94 | 204.10 | GEOMRIZ |
| 138 | 748149.48 | 1066230.45 | 204.09 | GEOMRIZ |
| 139 | 748156.86 | 1066171.75 | 204.02 | GEOMRIZ |
| 140 | 748159.05 | 1066153.05 | 203.99 | GEOMRIZ |
| 141 | 748159.97 | 1066147.56 | 203.99 | GEOMRIZ |
| 142 | 748160.75 | 1066141.47 | 203.99 | GEOMRIZ |
| 143 | 748163.54 | 1066120.03 | 203.98 | GEOMRIZ |
| 144 | 748164.96 | 1066108.71 | 203.98 | GEOMRIZ |
| 145 | 748165.39 | 1066105.45 | 203.98 | GEOMRIZ |
| 146 | 748166.87 | 1066094.29 | 203.94 | GEOMRIZ |

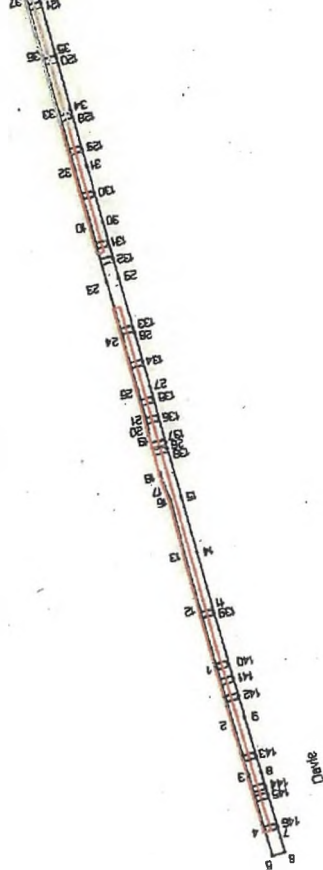

11,771

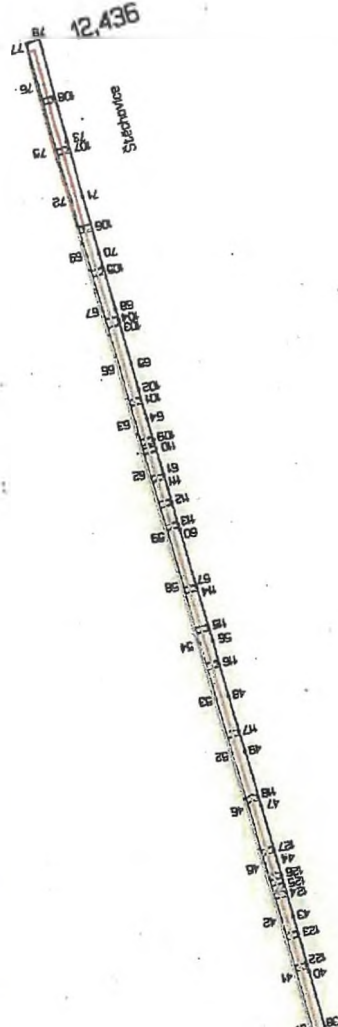

|                                                                                                                                                                                       |                      |                |              |               |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|--------------|---------------|-----|
| STRABAG a.s.<br>Kadrkova 982/41, Praha 5                                                                                                                                              |                      | časlo zastavky |              | Ing. S. Blisk |     |
|                                                                                                                                                                                       |                      | osveta         |              | 21.3.2023     |     |
|                                                                                                                                                                                       |                      | datum          |              |               |     |
|                                                                                                                                                                                       |                      | časlo tvoreni  |              |               |     |
| etapa I<br>UVD2 H. H. Masara Praha - Stachovice, rekonstrukce, etapa I<br>SO 402 Rekonstrukce vozovky, Devle - Stachovice<br>Usek B, km 11,771 - 12,436 - plochy konstrukcnych vrstev |                      |                |              | vykres číslo  |     |
| transp                                                                                                                                                                                | Ing. Stanislav Blisk | datum          | 3.2.2023     | baz           |     |
| traz                                                                                                                                                                                  | Ing. Stanislav Blisk | datum          | 21.3.2023    | 5-VSK         | Byv |
|                                                                                                                                                                                       |                      |                | vypis system |               |     |



STRABAG a.s.  
Dopravní stavitelství  
direkce TC  
Kačírkova 982/4  
CZ – 158 00 Praha 5 / Česká republika

**STRABAG**

**Stavba: II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE**  
**Dodavatel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Praha 5**

**Číslo předávacího protokolu: Š II 22/2023**

**Předmět měření: SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE**  
**Úsek C – km 10,833 – 11,299 – vlevo – konstrukční vrstvy**

|            |                           |   |                             |                    |
|------------|---------------------------|---|-----------------------------|--------------------|
| <b>ŠD</b>  | <i>km 10,833 – 10,881</i> | - | <i>231,5 m<sup>2</sup></i>  | <i>tl. 220 mm</i>  |
|            | <i>km 11,060 – 11,182</i> | - | <i>590,3 m<sup>2</sup></i>  | <i>tl. 220 mm</i>  |
| <b>SC</b>  | <i>km 10,833 – 10,881</i> | - | <i>229,6 m<sup>2</sup></i>  | <i>tl. 150 mm</i>  |
|            | <i>km 11,060 – 11,182</i> | - | <i>577,5 m<sup>2</sup></i>  | <i>tl. 150 mm</i>  |
| <b>SAL</b> | <i>km 10,881 – 11,060</i> | - | <i>827,4 m<sup>2</sup></i>  | <i>tl. 30 mm</i>   |
|            | <i>km 11,182 – 11,299</i> | - | <i>467,8 m<sup>2</sup></i>  | <i>tl. 30 mm</i>   |
| <b>ACP</b> | <i>km 10,833 – 10,881</i> | - | <i>225,5 m<sup>2</sup></i>  | <i>tl. 50 mm</i>   |
|            | <i>km 11,060 – 11,182</i> | - | <i>561,1 m<sup>2</sup></i>  | <i>tl. 50 mm</i>   |
|            | <i>km 11,190 – 11,299</i> | - | <i>410,8 m<sup>2</sup></i>  | <i>tl. 51,2 mm</i> |
| <b>ACL</b> | <i>km 10,833 – 11,299</i> | - | <i>2064,0 m<sup>2</sup></i> | <i>tl. 60 mm</i>   |
| <b>ACO</b> | <i>km 10,833 – 11,299</i> | - | <i>2016,3 m<sup>2</sup></i> | <i>tl. 40 mm</i>   |


**Geomřlže** 388,8 m<sup>2</sup>  
**Zámková dlažba** 32,2 m<sup>2</sup>  
**Štěrbinový žlab** 30 m  
**Osazení svodidel:**  
**km – 10,840 – 11,300** - 436 m

Měření bylo provedeno totální stanicí TOPCON IS 305.  
Dopustné odchylky měření a výpočtu nebyly překročeny,

**Souřadnicový systém:** S-JTSK  
**Výškový systém:** Bpv  
**Přiložky:** Seznam souřadnic  
Náčrt

**Zaměřil:** 5.2023 Ing. S. Bílek  
**Zpracoval:** 18.5.2023 Ing. S. Bílek  
**Ověřil:** 18.5.2023 Ing. S. Bílek

Ověření výsledků zeměměřických činností ve výstavbě  
podle §13 odst. 1 písm. c) zák. č. 200/1994 Sb



# **II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, etapa II** **SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE**

## **Úsek B**

**Nová vozovka v km 10,833 – 11,299 - vlevo**

### **Seznam souřadnic**

| <b>Bod</b> | <b>X</b>  | <b>Y</b>   | <b>Výška</b> |          |
|------------|-----------|------------|--------------|----------|
| 1          | 748309.02 | 1065241.83 | 203.35       | GEOMŘÍŽ  |
| 2          | 748308.56 | 1065237.28 | 203.33       | GEOMŘÍŽ  |
| 3          | 748307.91 | 1065232.05 | 203.30       | GEOMŘÍŽ  |
| 4          | 748306.55 | 1065222.21 | 203.28       | GEOMŘÍŽ  |
| 5          | 748305.01 | 1065212.24 | 203.25       | GEOMŘÍŽ  |
| 6          | 748302.81 | 1065200.46 | 203.20       | ŽIVICE   |
| 7          | 748299.68 | 1065187.13 | 203.15       | ŽIVICE   |
| 8          | 748296.83 | 1065175.67 | 203.11       | ŽIVICE   |
| 9          | 748293.16 | 1065162.16 | 203.06       | ŽIVICE   |
| 10         | 748288.86 | 1065163.32 | 202.93       | ŽIVICE   |
| 11         | 748289.44 | 1065167.80 | 202.90       | SVODIDLO |
| 12         | 748292.30 | 1065178.77 | 202.93       | SVODIDLO |
| 13         | 748292.80 | 1065178.72 | 202.99       | ŽIVICE   |
| 14         | 748295.95 | 1065191.50 | 203.01       | ŽIVICE   |
| 15         | 748295.43 | 1065191.60 | 202.97       | SVODIDLO |
| 16         | 748297.93 | 1065202.30 | 203.00       | SVODIDLO |
| 17         | 748298.41 | 1065202.27 | 203.05       | ŽIVICE   |
| 18         | 748299.47 | 1065209.71 | 203.01       | SVODIDLO |
| 19         | 748299.93 | 1065209.71 | 203.08       | GEOMŘÍŽ  |
| 20         | 748302.23 | 1065209.10 | 203.16       | GEOMŘÍŽ  |
| 21         | 748300.54 | 1065212.98 | 203.10       | GEOMŘÍŽ  |
| 22         | 748300.92 | 1065214.85 | 203.10       | GEOMŘÍŽ  |
| 23         | 748302.88 | 1065213.70 | 203.17       | GEOMŘÍŽ  |
| 24         | 748302.26 | 1065222.76 | 203.13       | GEOMŘÍŽ  |
| 25         | 748302.54 | 1065224.65 | 203.13       | GEOMŘÍŽ  |
| 26         | 748304.65 | 1065224.00 | 203.20       | GEOMŘÍŽ  |
| 27         | 748302.46 | 1065227.20 | 203.06       | SVODIDLO |
| 28         | 748303.89 | 1065240.29 | 203.13       | SVODIDLO |
| 29         | 748303.53 | 1065232.25 | 203.16       | GEOMŘÍŽ  |
| 30         | 748303.76 | 1065234.34 | 203.17       | GEOMŘÍŽ  |
| 31         | 748305.89 | 1065233.72 | 203.23       | GEOMŘÍŽ  |
| 32         | 748304.10 | 1065237.44 | 203.19       | GEOMŘÍŽ  |
| 33         | 748304.35 | 1065239.48 | 203.19       | GEOMŘÍŽ  |
| 34         | 748306.46 | 1065238.88 | 203.26       | GEOMŘÍŽ  |
| 35         | 748304.59 | 1065242.21 | 203.21       | GEOMŘÍŽ  |
| 36         | 748304.74 | 1065244.16 | 203.22       | GEOMŘÍŽ  |
| 37         | 748306.83 | 1065243.52 | 203.28       | GEOMŘÍŽ  |
| 38         | 748305.29 | 1065252.23 | 203.24       | GEOMŘÍŽ  |
| 39         | 748305.37 | 1065253.71 | 203.24       | GEOMŘÍŽ  |
| 40         | 748305.53 | 1065256.97 | 203.25       | GEOMŘÍŽ  |
| 41         | 748307.76 | 1065256.79 | 203.32       | GEOMŘÍŽ  |
| 42         | 748305.01 | 1065256.12 | 203.19       | SVODIDLO |
| 43         | 748305.31 | 1065266.68 | 203.26       | SVODIDLO |
| 44         | 748305.71 | 1065262.07 | 203.27       | GEOMŘÍŽ  |
| 45         | 748305.85 | 1065271.82 | 203.31       | GEOMŘÍŽ  |
| 46         | 748305.63 | 1065281.78 | 203.33       | GEOMŘÍŽ  |
| 47         | 748305.05 | 1065284.21 | 203.28       | SVODIDLO |
| 48         | 748304.29 | 1065296.37 | 203.30       | SVODIDLO |
| 49         | 748305.09 | 1065291.74 | 203.36       | GEOMŘÍŽ  |
| 50         | 748304.28 | 1065301.65 | 203.40       | GEOMŘÍŽ  |
| 51         | 748304.10 | 1065303.58 | 203.40       | GEOMŘÍŽ  |
| 52         | 748303.18 | 1065311.24 | 203.42       | GEOMŘÍŽ  |
| 53         | 748301.79 | 1065320.96 | 203.46       | GEOMŘÍŽ  |
| 54         | 748301.48 | 1065322.94 | 203.47       | GEOMŘÍŽ  |
| 55         | 748300.97 | 1065322.89 | 203.42       | SVODIDLO |
| 56         | 748300.09 | 1065330.68 | 203.50       | GEOMŘÍŽ  |
| 57         | 748298.07 | 1065340.42 | 203.52       | GEOMŘÍŽ  |
| 58         | 748297.30 | 1065341.72 | 203.51       | SVODIDLO |
| 59         | 748295.63 | 1065348.55 | 203.51       | SVODIDLO |
| 60         | 748293.68 | 1065355.32 | 203.51       | SVODIDLO |
| 61         | 748297.07 | 1065344.98 | 203.53       | GEOMŘÍŽ  |

|     |           |            |        |             |
|-----|-----------|------------|--------|-------------|
| 62  | 748293.63 | 1065359.85 | 203.59 | GEOMŘÍŽ     |
| 63  | 748293.20 | 1065361.71 | 203.60 | GEOMŘÍŽ     |
| 64  | 748295.89 | 1065370.21 | 203.75 | GEOMŘÍŽ     |
| 65  | 748298.07 | 1065360.88 | 203.72 | GEOMŘÍŽ     |
| 66  | 748300.37 | 1065350.85 | 203.69 | GEOMŘÍŽ     |
| 67  | 748301.47 | 1065345.86 | 203.67 | GEOMŘÍŽ     |
| 68  | 748302.45 | 1065341.42 | 203.66 | GEOMŘÍŽ     |
| 69  | 748304.45 | 1065331.68 | 203.64 | GEOMŘÍŽ     |
| 70  | 748306.24 | 1065321.66 | 203.61 | GEOMŘÍŽ     |
| 71  | 748307.65 | 1065311.84 | 203.57 | GEOMŘÍŽ     |
| 72  | 748308.80 | 1065302.00 | 203.55 | GEOMŘÍŽ     |
| 73  | 748309.63 | 1065291.94 | 203.51 | GEOMŘÍŽ     |
| 74  | 748310.16 | 1065281.93 | 203.48 | GEOMŘÍŽ     |
| 75  | 748310.33 | 1065272.02 | 203.45 | GEOMŘÍŽ     |
| 76  | 748310.12 | 1065261.98 | 203.42 | GEOMŘÍŽ     |
| 77  | 748309.78 | 1065253.45 | 203.39 | GEOMŘÍŽ     |
| 78  | 748309.70 | 1065251.94 | 203.39 | GEOMŘÍŽ     |
| 79  | 748274.19 | 1065463.34 | 203.89 | ŽIVICE      |
| 80  | 748278.73 | 1065443.98 | 203.87 | ŽIVICE      |
| 81  | 748283.28 | 1065424.41 | 203.85 | ŽIVICE11100 |
| 82  | 748287.77 | 1065404.96 | 203.80 | ŽIVICE      |
| 83  | 748292.24 | 1065385.64 | 203.77 | ŽIVICE      |
| 84  | 748290.99 | 1065371.15 | 203.63 | GEOMŘÍŽ     |
| 85  | 748289.18 | 1065378.99 | 203.65 | GEOMŘÍŽ     |
| 86  | 748288.77 | 1065380.99 | 203.65 | GEOMŘÍŽ     |
| 87  | 748292.10 | 1065359.67 | 203.53 | SVODIDLO    |
| 88  | 748289.51 | 1065366.71 | 203.52 | SVODIDLO    |
| 89  | 748287.24 | 1065372.54 | 203.49 | SVODIDLO    |
| 90  | 748285.62 | 1065376.26 | 203.29 | SVODIDLO    |
| 91  | 748284.01 | 1065380.11 | 202.87 | SVODIDLOK   |
| 92  | 748288.35 | 1065380.37 | 203.56 | SVODIDLOK   |
| 93  | 748287.34 | 1065384.47 | 203.55 | SVODIDLOK   |
| 94  | 748288.02 | 1065384.06 | 203.66 | ŽIVICE      |
| 95  | 748283.35 | 1065403.82 | 203.68 | ŽIVICE      |
| 96  | 748282.76 | 1065403.78 | 203.63 | SVODIDLO    |
| 97  | 748278.29 | 1065423.31 | 203.66 | SVODIDLO    |
| 98  | 748278.82 | 1065423.55 | 203.72 | ŽIVICE      |
| 99  | 748274.22 | 1065443.09 | 203.75 | ŽIVICE      |
| 100 | 748273.63 | 1065443.25 | 203.69 | SVODIDLO    |
| 101 | 748269.17 | 1065462.22 | 203.69 | SVODIDLO    |
| 102 | 748269.74 | 1065462.26 | 203.76 | ŽIVICE      |
| 103 | 748265.21 | 1065481.91 | 203.81 | ŽIVICE      |
| 104 | 748264.67 | 1065481.84 | 203.75 | SVODIDLO    |
| 105 | 748260.27 | 1065501.25 | 203.86 | SVODIDLO    |
| 107 | 748259.74 | 1065505.86 | 203.92 | GEOMŘÍŽ     |
| 108 | 748257.23 | 1065517.62 | 203.96 | GEOMŘÍŽ     |
| 109 | 748256.57 | 1065517.90 | 203.90 | SVODIDLO    |
| 110 | 748255.48 | 1065525.47 | 203.98 | GEOMŘÍŽ     |
| 111 | 748253.28 | 1065535.11 | 203.99 | GEOMŘÍŽ     |
| 112 | 748252.26 | 1065537.24 | 203.97 | SVODIDLO    |
| 113 | 748248.92 | 1065554.85 | 204.04 | GEOMŘÍŽ     |
| 114 | 748247.54 | 1065558.40 | 204.03 | SVODIDLO    |
| 115 | 748246.77 | 1065564.68 | 204.05 | GEOMŘÍŽ     |
| 116 | 748246.35 | 1065566.63 | 204.05 | GEOMŘÍŽ     |
| 117 | 748244.71 | 1065576.66 | 204.06 | GEOMŘÍŽ     |
| 118 | 748244.20 | 1065573.62 | 204.01 | SVODIDLO    |
| 119 | 748243.47 | 1065576.77 | 204.14 | SVODIDLOK   |
| 120 | 748243.26 | 1065573.85 | 204.23 | OBRUBNIK    |
| 121 | 748244.29 | 1065574.03 | 204.21 | OBRUBNIK    |
| 122 | 748244.55 | 1065574.20 | 204.21 | OBRUBNIK    |
| 123 | 748244.61 | 1065574.57 | 204.20 | OBRUBNIK    |
| 124 | 748244.62 | 1065574.57 | 204.06 | ŠTERB. ŽLAB |
| 125 | 748245.04 | 1065574.67 | 204.05 | ŠTERB. ŽLAB |
| 126 | 748243.80 | 1065578.45 | 204.23 | OBRUBNIK    |
| 127 | 748243.70 | 1065578.40 | 204.23 | OBRUBNIK    |
| 128 | 748242.32 | 1065578.12 | 204.27 | OBRUBNIK    |
| 129 | 748242.21 | 1065588.08 | 204.10 | GEOMŘÍŽ     |
| 130 | 748240.15 | 1065597.72 | 204.10 | GEOMŘÍŽ     |
| 131 | 748239.18 | 1065600.21 | 204.26 | OBRUBNIK    |
| 132 | 748239.07 | 1065600.20 | 204.26 | OBRUBNIK    |
| 133 | 748237.61 | 1065599.92 | 204.29 | OBRUBNIK    |
| 134 | 748236.70 | 1065604.26 | 204.29 | OBRUBNIK    |

|     |           |            |        |             |
|-----|-----------|------------|--------|-------------|
| 135 | 748237.74 | 1065604.49 | 204.27 | OBRUBNIK    |
| 136 | 748238.09 | 1065604.43 | 204.28 | OBRUBNIK    |
| 137 | 748238.30 | 1065604.17 | 204.27 | OBRUBNIK    |
| 138 | 748238.33 | 1065604.16 | 204.12 | ŠTERB. ŽLAB |
| 139 | 748238.72 | 1065604.22 | 204.12 | ŠTERB. ŽLAB |
| 140 | 748238.34 | 1065601.35 | 204.21 | SVODIDLOK   |
| 141 | 748237.42 | 1065605.11 | 204.10 | SVODIDLO    |
| 142 | 748238.02 | 1065605.73 | 204.12 | GEOMŘÍŽ     |
| 143 | 748235.75 | 1065615.62 | 204.12 | GEOMŘÍŽ     |
| 144 | 748235.29 | 1065617.59 | 204.12 | GEOMŘÍŽ     |
| 145 | 748239.22 | 1065618.26 | 204.18 | GEOMŘÍŽ     |
| 146 | 748239.55 | 1065616.46 | 204.19 | GEOMŘÍŽ     |
| 147 | 748234.79 | 1065617.46 | 204.08 | SVODIDLO    |
| 148 | 748236.20 | 1065613.58 | 204.11 | ŽIVICE      |
| 149 | 748240.02 | 1065614.22 | 204.19 | ŽIVICE      |
| 150 | 748241.60 | 1065606.42 | 204.20 | GEOMŘÍŽ     |
| 151 | 748243.65 | 1065596.50 | 204.17 | GEOMŘÍŽ     |
| 152 | 748245.74 | 1065586.77 | 204.17 | GEOMŘÍŽ     |
| 153 | 748247.87 | 1065577.16 | 204.15 | GEOMŘÍŽ     |
| 154 | 748250.55 | 1065565.31 | 204.15 | GEOMŘÍŽ     |
| 155 | 748252.76 | 1065555.63 | 204.14 | GEOMŘÍŽ     |
| 156 | 748255.03 | 1065545.69 | 204.11 | GEOMŘÍŽ     |
| 157 | 748257.25 | 1065536.00 | 204.10 | GEOMŘÍŽ     |
| 158 | 748259.57 | 1065526.26 | 204.08 | GEOMŘÍŽ     |
| 159 | 748261.83 | 1065516.59 | 204.06 | GEOMŘÍŽ     |
| 160 | 748264.03 | 1065506.90 | 204.03 | GEOMŘÍŽ     |
| 161 | 748265.34 | 1065501.57 | 204.02 | GEOMŘÍŽ     |
| 162 | 748260.93 | 1065500.59 | 203.90 | GEOMŘÍŽ     |
| 164 | 748269.65 | 1065482.90 | 203.94 | ŽIVICE      |
| 165 | 748305.34 | 1065214.21 | 0.00   | GEOMŘÍŽ     |
| 166 | 748306.89 | 1065224.18 | 0.00   | GEOMŘÍŽ     |
| 167 | 748308.15 | 1065234.04 | 0.00   | GEOMŘÍŽ     |
| 168 | 748308.75 | 1065239.25 | 0.00   | GEOMŘÍŽ     |
| 169 | 748309.15 | 1065243.84 | 0.00   | GEOMŘÍŽ     |
| 170 | 748310.13 | 1065263.99 | 0.00   | GEOMŘÍŽ     |
| 171 | 748305.78 | 1065264.07 | 0.00   | GEOMŘÍŽ     |
| 172 | 748305.83 | 1065273.83 | 0.00   | GEOMŘÍŽ     |
| 173 | 748310.29 | 1065274.01 | 0.00   | GEOMŘÍŽ     |
| 174 | 748310.06 | 1065283.92 | 0.00   | GEOMŘÍŽ     |
| 175 | 748305.55 | 1065283.78 | 0.00   | GEOMŘÍŽ     |
| 176 | 748304.95 | 1065293.73 | 0.00   | GEOMŘÍŽ     |
| 177 | 748309.48 | 1065293.95 | 0.00   | GEOMŘÍŽ     |
| 178 | 748308.58 | 1065303.97 | 0.00   | GEOMŘÍŽ     |
| 179 | 748307.32 | 1065313.84 | 0.00   | GEOMŘÍŽ     |
| 180 | 748302.92 | 1065313.22 | 0.00   | GEOMŘÍŽ     |
| 181 | 748305.88 | 1065323.64 | 0.00   | GEOMŘÍŽ     |
| 182 | 748304.02 | 1065333.65 | 0.00   | GEOMŘÍŽ     |
| 183 | 748299.71 | 1065332.64 | 0.00   | GEOMŘÍŽ     |
| 184 | 748301.98 | 1065343.36 | 0.00   | GEOMŘÍŽ     |
| 185 | 748297.62 | 1065342.39 | 0.00   | GEOMŘÍŽ     |
| 186 | 748296.62 | 1065346.93 | 0.00   | GEOMŘÍŽ     |
| 187 | 748301.00 | 1065347.81 | 0.00   | GEOMŘÍŽ     |
| 188 | 748295.98 | 1065349.86 | 0.00   | GEOMŘÍŽ     |
| 189 | 748295.52 | 1065351.80 | 0.00   | GEOMŘÍŽ     |
| 190 | 748299.89 | 1065352.81 | 0.00   | GEOMŘÍŽ     |
| 191 | 748297.59 | 1065362.76 | 0.00   | GEOMŘÍŽ     |
| 192 | 748291.43 | 1065369.18 | 0.00   | GEOMŘÍŽ     |
| 193 | 748295.42 | 1065372.16 | 0.00   | GEOMŘÍŽ     |
| 194 | 748293.55 | 1065380.02 | 0.00   | GEOMŘÍŽ     |
| 195 | 748293.07 | 1065382.02 | 0.00   | GEOMŘÍŽ     |
| 196 | 748260.48 | 1065502.54 | 0.00   | GEOMŘÍŽ     |
| 197 | 748264.85 | 1065503.52 | 0.00   | GEOMŘÍŽ     |
| 198 | 748259.34 | 1065507.83 | 0.00   | GEOMŘÍŽ     |
| 199 | 748263.58 | 1065508.85 | 0.00   | GEOMŘÍŽ     |
| 200 | 748261.37 | 1065518.54 | 0.00   | GEOMŘÍŽ     |
| 201 | 748255.09 | 1065527.36 | 0.00   | GEOMŘÍŽ     |
| 202 | 748259.09 | 1065528.21 | 0.00   | GEOMŘÍŽ     |
| 203 | 748252.87 | 1065537.08 | 0.00   | GEOMŘÍŽ     |
| 204 | 748256.78 | 1065537.95 | 0.00   | GEOMŘÍŽ     |
| 205 | 748251.12 | 1065544.83 | 0.00   | GEOMŘÍŽ     |
| 206 | 748250.68 | 1065546.71 | 0.00   | GEOMŘÍŽ     |
| 207 | 748254.56 | 1065547.59 | 0.00   | GEOMŘÍŽ     |

|     |           |            |      |         |
|-----|-----------|------------|------|---------|
| 208 | 748248.45 | 1065556.79 | 0.00 | GEOMŘÍŽ |
| 209 | 748252.28 | 1065557.59 | 0.00 | GEOMŘÍŽ |
| 210 | 748250.10 | 1065567.27 | 0.00 |         |
| 211 | 748244.28 | 1065578.61 | 0.00 |         |
| 212 | 748247.43 | 1065579.12 | 0.00 |         |
| 213 | 748242.64 | 1065586.08 | 0.00 |         |
| 214 | 748245.31 | 1065588.72 | 0.00 |         |
| 215 | 748240.50 | 1065595.84 | 0.00 |         |
| 216 | 748243.22 | 1065598.46 | 0.00 |         |
| 217 | 748237.53 | 1065607.65 | 0.00 |         |
| 218 | 748241.18 | 1065608.40 | 0.00 |         |
| 219 | 748257.66 | 1065515.69 | 0.00 |         |





STRABAG a.s.  
Dopravní stavitelství  
direkce TC  
Kačírkova 982/4  
CZ – 158 00 Praha 5 / Česká republika

**STRABAG**

**Stavba: II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE**  
**Dodavatel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Praha 5**

**Číslo předávacího protokolu: Š II 23/2023**

**Předmět měření: SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE**  
**Úsek C – km 13,694 – 14,114 – vpravo – konstrukční vrstvy**

|            |   |                       |     |       |
|------------|---|-----------------------|-----|-------|
| <b>SAL</b> | - | 1859,9 m <sup>2</sup> | tl. | 30 mm |
| <b>ACL</b> | - | 1837,3 m <sup>2</sup> | tl. | 60 mm |
| <b>ACO</b> | - | 1799,8 m <sup>2</sup> | tl. | 40 mm |

**Vyrovnávka:**  
km – 13,788 – 13,934 - ( 299,4 m<sup>2</sup> tl) 40,7 mm

**Geomříže:** 124,3 m<sup>2</sup>

Měření bylo provedeno totální stanicí TOPCON IS 305.  
Dopustné odchylky měření a výpočtu nebyly překročeny,

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| <b>Souřadnicový systém:</b> | S-JTSK                    |
| <b>Výškový systém:</b>      | Bpv                       |
| <b>Přílohy:</b>             | Seznam souřadnic<br>Náčrt |

|                   |           |               |
|-------------------|-----------|---------------|
| <b>Zaměřil:</b>   | 5.2023    | Ing. S. Bílek |
| <b>Zpracoval:</b> | 24.5.2023 | Ing. S. Bílek |
| <b>Ověřil:</b>    | 24.5.2023 | Ing. S. Bílek |

Ověření výsledků zeměměřických č.  
podle §13 odst.1 písm. c) zák. č. 20



**II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, etapa II**  
**SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE**



Úsek C, km 13,694 – 14,114 – vpravo - konstrukční vrstvy

**Seznam souřadnic**

| Bod | Y         | X          | Výška  |         |
|-----|-----------|------------|--------|---------|
| 1   | 748007.07 | 1068106.58 | 205.82 |         |
| 2   | 748008.21 | 1068100.47 | 205.81 | GEOMŘÍŽ |
| 3   | 748008.61 | 1068098.36 | 205.81 | GEOMŘÍŽ |
| 4   | 748010.49 | 1068088.05 | 205.82 |         |
| 6   | 748016.84 | 1068049.66 | 205.78 | GEOMŘÍŽ |
| 7   | 748017.09 | 1068047.75 | 205.77 | GEOMŘÍŽ |
| 8   | 748019.04 | 1068033.09 | 205.77 |         |
| 9   | 748019.18 | 1068031.91 | 205.76 | GEOMŘÍŽ |
| 10  | 748019.49 | 1068029.93 | 205.77 | GEOMŘÍŽ |
| 11  | 748020.75 | 1068019.13 | 205.75 |         |
| 12  | 748022.27 | 1068005.43 | 205.71 |         |
| 13  | 748023.17 | 1067997.32 | 205.69 |         |
| 14  | 748023.49 | 1067995.91 | 205.69 |         |
| 15  | 748027.60 | 1067996.19 | 205.80 |         |
| 16  | 748027.03 | 1068002.50 | 205.85 |         |
| 17  | 748026.54 | 1068008.10 | 205.83 |         |
| 18  | 748025.26 | 1068021.32 | 205.88 |         |
| 19  | 748024.15 | 1068030.37 | 205.89 | GEOMŘÍŽ |
| 20  | 748023.88 | 1068032.31 | 205.89 | GEOMŘÍŽ |
| 22  | 748021.54 | 1068048.34 | 205.87 | GEOMŘÍŽ |
| 23  | 748021.27 | 1068050.21 | 205.88 | GEOMŘÍŽ |
| 24  | 748019.31 | 1068062.41 | 205.90 |         |
| 25  | 748018.33 | 1068068.42 | 205.90 | GEOMŘÍŽ |
| 26  | 748017.97 | 1068070.34 | 205.90 | GEOMŘÍŽ |
| 27  | 748013.71 | 1068069.65 | 205.79 | GEOMŘÍŽ |
| 28  | 748014.01 | 1068067.74 | 205.79 | GEOMŘÍŽ |
| 29  | 748015.19 | 1068085.88 | 205.91 |         |
| 30  | 748012.73 | 1068099.14 | 205.91 | GEOMŘÍŽ |
| 31  | 748012.29 | 1068101.01 | 205.91 | GEOMŘÍŽ |
| 32  | 748007.53 | 1068125.14 | 205.91 | GEOMŘÍŽ |
| 33  | 748007.16 | 1068127.06 | 205.91 | GEOMŘÍŽ |
| 34  | 748004.12 | 1068142.48 | 205.92 |         |
| 35  | 748002.21 | 1068152.60 | 205.92 | GEOMŘÍŽ |
| 36  | 748001.85 | 1068154.51 | 205.93 | GEOMŘÍŽ |
| 37  | 747999.03 | 1068169.35 | 205.94 | GEOMŘÍŽ |
| 38  | 747998.61 | 1068171.27 | 205.95 | GEOMŘÍŽ |
| 39  | 747995.52 | 1068186.85 | 205.96 |         |
| 44  | 747992.50 | 1068201.95 | 205.95 | GEOMŘÍŽ |
| 46  | 747992.18 | 1068203.88 | 205.95 | GEOMŘÍŽ |
| 47  | 747990.46 | 1068212.65 | 205.97 | GEOMŘÍŽ |
| 48  | 747990.11 | 1068214.55 | 205.97 | GEOMŘÍŽ |
| 49  | 747987.11 | 1068229.89 | 205.98 | GEOMŘÍŽ |
| 50  | 747986.65 | 1068232.04 | 205.98 | GEOMŘÍŽ |
| 51  | 747983.95 | 1068245.75 | 205.98 | GEOMŘÍŽ |
| 53  | 747983.59 | 1068247.67 | 205.98 | GEOMŘÍŽ |
| 54  | 747980.39 | 1068264.61 | 205.99 |         |
| 55  | 747978.53 | 1068274.39 | 205.99 |         |
| 56  | 747974.29 | 1068273.52 | 205.89 |         |
| 57  | 747977.62 | 1068256.98 | 205.90 |         |
| 58  | 747979.57 | 1068246.90 | 205.90 | GEOMŘÍŽ |
| 59  | 747979.92 | 1068245.16 | 205.90 | GEOMŘÍŽ |
| 60  | 747982.66 | 1068231.09 | 205.88 | GEOMŘÍŽ |
| 61  | 747983.08 | 1068229.11 | 205.89 | GEOMŘÍŽ |
| 62  | 747986.02 | 1068213.75 | 205.88 | GEOMŘÍŽ |
| 63  | 747986.41 | 1068211.84 | 205.87 | GEOMŘÍŽ |
| 64  | 747988.15 | 1068203.19 | 205.86 | GEOMŘÍŽ |
| 65  | 747988.54 | 1068201.18 | 205.85 | GEOMŘÍŽ |
| 66  | 747991.83 | 1068184.23 | 205.87 |         |
| 67  | 747994.52 | 1068170.47 | 205.85 | GEOMŘÍŽ |
| 68  | 747994.94 | 1068168.56 | 205.85 | GEOMŘÍŽ |
| 69  | 747997.85 | 1068153.71 | 205.83 | GEOMŘÍŽ |
| 70  | 747998.22 | 1068151.71 | 205.84 | GEOMŘÍŽ |

|     |           |            |        |         |
|-----|-----------|------------|--------|---------|
| 71  | 748001.27 | 1068135.97 | 205.83 |         |
| 72  | 748003.22 | 1068126.27 | 205.83 | GEOMRIŽ |
| 73  | 748003.59 | 1068124.38 | 205.83 | GEOMRIŽ |
| 74  | 747960.54 | 1068349.98 | 206.19 | GEOMRIŽ |
| 75  | 747961.14 | 1068348.26 | 206.06 | GEOMRIŽ |
| 76  | 747965.92 | 1068332.23 | 206.06 |         |
| 77  | 747969.73 | 1068317.35 | 206.04 | GEOMRIŽ |
| 78  | 747970.16 | 1068315.48 | 206.04 | GEOMRIŽ |
| 79  | 747971.41 | 1068310.08 | 206.03 | GEOMRIŽ |
| 80  | 747971.87 | 1068308.14 | 206.04 | GEOMRIŽ |
| 81  | 747974.97 | 1068293.01 | 206.03 |         |
| 82  | 747976.88 | 1068283.02 | 206.03 | GEOMRIŽ |
| 83  | 747977.25 | 1068281.11 | 206.02 | GEOMRIŽ |
| 84  | 747973.04 | 1068280.29 | 205.92 | GEOMRIŽ |
| 85  | 747972.73 | 1068282.21 | 205.93 | GEOMRIŽ |
| 86  | 747970.48 | 1068293.72 | 205.94 |         |
| 87  | 747967.57 | 1068307.11 | 205.93 | GEOMRIŽ |
| 88  | 747967.20 | 1068308.97 | 205.93 | GEOMRIŽ |
| 89  | 747965.92 | 1068314.50 | 205.94 | GEOMRIŽ |
| 90  | 747965.51 | 1068316.25 | 205.94 | GEOMRIŽ |
| 91  | 747961.69 | 1068331.18 | 205.95 |         |
| 92  | 747956.93 | 1068346.92 | 205.96 | GEOMRIŽ |
| 93  | 747956.38 | 1068348.76 | 205.96 | GEOMRIŽ |
| 94  | 747949.84 | 1068367.58 | 205.96 |         |
| 95  | 747943.31 | 1068383.41 | 205.98 |         |
| 96  | 747937.59 | 1068396.26 | 205.98 |         |
| 97  | 747934.31 | 1068403.32 | 205.98 |         |
| 98  | 747938.29 | 1068405.10 | 206.08 |         |
| 99  | 747937.56 | 1068406.68 | 206.03 |         |
| 100 | 747933.81 | 1068404.81 | 205.95 |         |
| 101 | 747942.93 | 1068395.33 | 206.08 |         |
| 102 | 747947.82 | 1068384.26 | 206.08 |         |
| 103 | 747952.30 | 1068373.22 | 206.07 |         |
| 104 | 747956.70 | 1068361.25 | 206.07 |         |

14,114

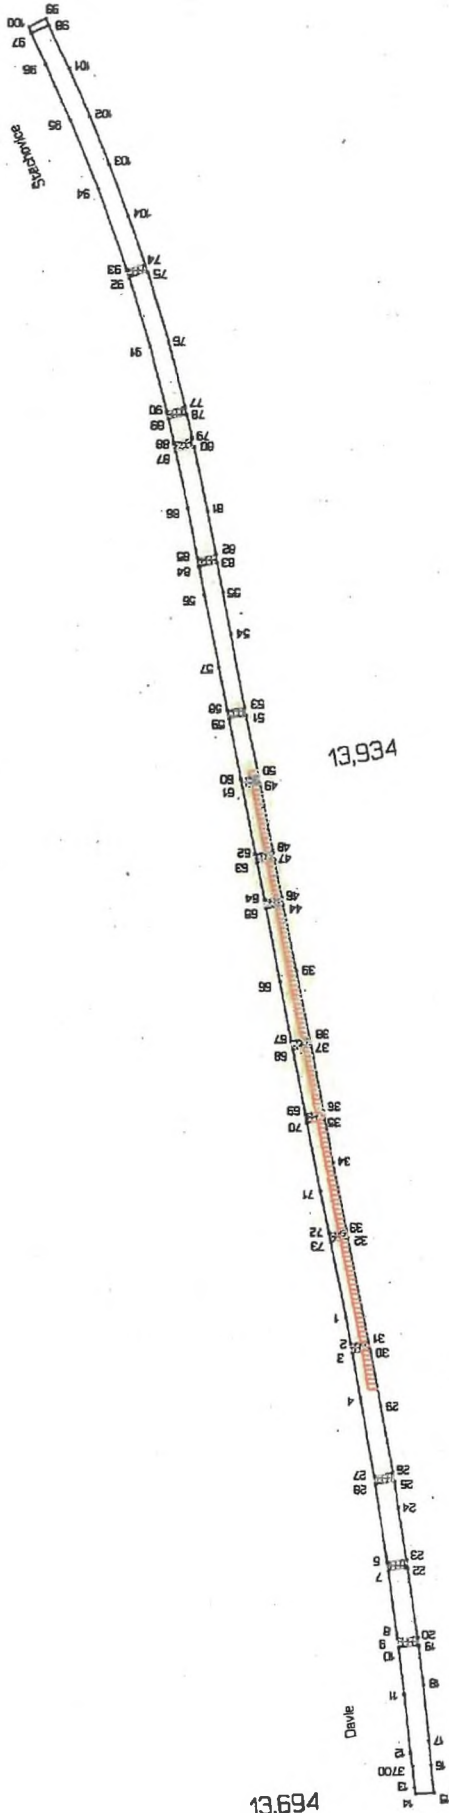

|                                                              |  |                      |  |               |  |
|--------------------------------------------------------------|--|----------------------|--|---------------|--|
| STRABAG a.s.<br>Kadřkova 982/41, Praha 5                     |  | - číslo zářadí       |  | Ing. S. Brlek |  |
|                                                              |  | ověř                 |  | datum         |  |
|                                                              |  | datum                |  | 24.5.2023     |  |
|                                                              |  | opráv                |  | datum         |  |
|                                                              |  |                      |  | 24.5.2023     |  |
| akce                                                         |  | výkres číslo         |  |               |  |
| I/402 Hr. H. Města Prahy - Sedčovice, rekonstrukce, etapa II |  |                      |  |               |  |
| SO 102 Rekonstrukce vozovky, Davle - Sedčovice               |  |                      |  |               |  |
| Úsek C, km 13,694 - 14,114 - vpravo - konstrukční vrstvy     |  |                      |  |               |  |
|                                                              |  | metodo               |  | bez           |  |
|                                                              |  | 5.2023               |  | S-JTSK        |  |
| záměr                                                        |  | Ing. Stanislav Brlek |  | ověř. systém  |  |
| kresla                                                       |  | Ing. Stanislav Brlek |  | výřk. systém  |  |
|                                                              |  | datum                |  | 24.5.2023     |  |
|                                                              |  |                      |  | Boj           |  |

**Stavba: II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE**  
**Dodavatel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Praha 5**

**Číslo předávacího protokolu: Š II 25/2023**

**Předmět měření: SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE**  
**Úsek C – km 10,833 – 11,295 – vpravo – konstrukční vrstvy**

|       |                       |            |
|-------|-----------------------|------------|
| ŠD ✓  | 781,4 m <sup>2</sup>  | tl. 220 mm |
| SC ✓  | 764,2 m <sup>2</sup>  | tl. 150 mm |
| ACP ✓ | 746,5 m <sup>2</sup>  | tl. 50 mm  |
| SAL ✓ | 1414,5 m <sup>2</sup> | tl. 30 mm  |
| ACL ✓ | 2155,0 m <sup>2</sup> | tl. 60 mm  |
| ACO ✓ | 2106,2 m <sup>2</sup> | tl. 40 mm  |


Geomříže: 457,5 m<sup>2</sup> ✓

Měření bylo provedeno totální stanicí TOPCON IS 305.  
Dopustné odchylky měření a výpočtu nebyly překročeny,

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Souřadnicový systém: | S-JTSK                    |
| Výškový systém:      | Bpv                       |
| Přílohy:             | Seznam souřadnic<br>Náčrt |

|            |           |               |
|------------|-----------|---------------|
| Zaměřil:   | 5.2023    | Ing. S. Bílek |
| Zpracoval: | 30.5.2023 | Ing. S. Bílek |
| Ověřil:    | 30.5.2023 | Ing. S. Bílek |

Ověření výsledků zeměměřických činností ve výstavbě  
podle §13 odst. 1 písm. c) zák. č. 200/1994 Sb





# II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, etapa II SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE

Úsek B


10,833 – 11,295 – vpravo – plocha konstrukčních vrstev

Seznam souřadnic

| Bod | Y         | X          | Výška  |     |
|-----|-----------|------------|--------|-----|
| 1   | 748273.75 | 1065483.75 | 203.92 |     |
| 2   | 748269.10 | 1065503.65 | 203.90 |     |
| 3   | 748265.06 | 1065502.39 | 204.01 |     |
| 4   | 748260.77 | 1065520.98 | 204.06 |     |
| 5   | 748264.87 | 1065522.58 | 203.95 |     |
| 6   | 748260.40 | 1065541.78 | 203.97 |     |
| 7   | 748260.36 | 1065543.39 | 203.96 |     |
| 8   | 748260.53 | 1065550.49 | 203.97 |     |
| 9   | 748260.03 | 1065556.52 | 203.99 |     |
| 10  | 748259.69 | 1065558.08 | 204.02 | OBR |
| 11  | 748256.89 | 1065571.35 | 204.13 | OBR |
| 12  | 748251.17 | 1065579.95 | 204.03 | ST  |
| 13  | 748251.54 | 1065580.05 | 204.03 | ST  |
| 15  | 748247.51 | 1065578.72 | 204.15 |     |
| 16  | 748250.93 | 1065563.61 | 204.14 |     |
| 17  | 748254.96 | 1065563.29 | 204.02 | ST  |
| 18  | 748255.32 | 1065563.36 | 204.01 | ST  |
| 19  | 748259.59 | 1065544.95 | 203.99 | ST  |
| 20  | 748259.23 | 1065544.87 | 203.99 | ST  |
| 22  | 748255.14 | 1065544.90 | 204.10 |     |
| 23  | 748260.40 | 1065543.50 | 203.97 | GEO |
| 24  | 748260.74 | 1065540.50 | 203.97 | GEO |
| 25  | 748261.33 | 1065538.13 | 203.96 | GEO |
| 26  | 748254.70 | 1065546.73 | 204.11 | GEO |
| 27  | 748253.40 | 1065552.51 | 204.12 | GEO |
| 28  | 748252.48 | 1065556.56 | 204.13 | GEO |
| 29  | 748250.26 | 1065566.33 | 204.14 | GEO |
| 30  | 748245.41 | 1065587.87 | 204.16 | GEO |
| 31  | 748244.51 | 1065592.03 | 204.16 | GEO |
| 32  | 748243.34 | 1065597.64 | 204.17 | GEO |
| 33  | 748239.91 | 1065614.27 | 204.19 |     |
| 34  | 748263.49 | 1065528.56 | 203.96 | GEO |
| 35  | 748265.05 | 1065521.99 | 203.94 | GEO |
| 36  | 748265.80 | 1065518.45 | 203.94 | GEO |
| 37  | 748266.82 | 1065513.90 | 203.93 | GEO |
| 38  | 748267.94 | 1065508.92 | 203.91 | GEO |
| 39  | 748274.06 | 1065463.71 | 203.88 |     |
| 40  | 748278.18 | 1065464.44 | 203.95 |     |
| 41  | 748282.92 | 1065444.19 | 203.97 |     |
| 42  | 748278.80 | 1065443.28 | 203.86 |     |
| 43  | 748283.22 | 1065424.21 | 203.84 |     |
| 44  | 748287.44 | 1065424.92 | 203.94 |     |
| 45  | 748291.72 | 1065406.52 | 203.90 |     |
| 46  | 748287.47 | 1065405.93 | 203.81 |     |
| 47  | 748291.74 | 1065387.64 | 203.77 |     |
| 48  | 748295.89 | 1065388.42 | 203.88 |     |
| 49  | 748299.92 | 1065370.74 | 203.83 |     |
| 50  | 748295.93 | 1065369.76 | 203.74 |     |
| 51  | 748299.74 | 1065353.49 | 203.69 |     |
| 52  | 748303.75 | 1065354.58 | 203.78 |     |
| 53  | 748307.53 | 1065337.67 | 203.72 |     |
| 54  | 748308.19 | 1065337.19 | 203.67 |     |
| 55  | 748311.02 | 1065322.76 | 203.62 |     |
| 56  | 748310.71 | 1065322.57 | 203.66 |     |
| 57  | 748310.51 | 1065322.30 | 203.67 |     |
| 58  | 748310.49 | 1065321.91 | 203.67 |     |
| 59  | 748306.16 | 1065321.78 | 203.59 |     |
| 60  | 748306.37 | 1065342.94 | 203.74 | GEO |
| 61  | 748305.41 | 1065347.32 | 203.76 | GEO |

|     |           |            |        |     |
|-----|-----------|------------|--------|-----|
| 62  | 748304.18 | 1065352.78 | 203.78 | GEO |
| 63  | 748310.82 | 1065319.27 | 203.66 | GEO |
| 64  | 748311.68 | 1065314.08 | 203.57 | GEO |
| 65  | 748309.61 | 1065313.80 | 203.60 | GEO |
| 66  | 748312.25 | 1065308.31 | 203.64 |     |
| 67  | 748308.08 | 1065307.82 | 203.54 |     |
| 68  | 748313.23 | 1065298.95 | 203.62 |     |
| 70  | 748257.66 | 1065571.49 | 204.20 |     |
| 71  | 748257.00 | 1065574.33 | 204.15 |     |
| 72  | 748256.03 | 1065575.54 | 204.11 |     |
| 74  | 748254.86 | 1065579.03 | 204.11 |     |
| 75  | 748254.09 | 1065580.01 | 204.10 |     |
| 76  | 748253.05 | 1065581.07 | 204.09 |     |
| 77  | 748252.30 | 1065581.69 | 204.07 |     |
| 78  | 748251.33 | 1065582.02 | 204.04 |     |
| 79  | 748248.76 | 1065593.65 | 204.04 |     |
| 82  | 748246.73 | 1065603.96 | 204.06 |     |
| 84  | 748246.83 | 1065605.31 | 204.07 |     |
| 85  | 748246.32 | 1065605.89 | 204.07 |     |
| 86  | 748244.93 | 1065612.84 | 204.08 |     |
| 87  | 748244.92 | 1065613.52 | 204.06 |     |
| 88  | 748244.61 | 1065614.28 | 204.09 |     |
| 89  | 748244.42 | 1065615.04 | 204.08 |     |
| 91  | 748247.81 | 1065598.77 | 204.04 | GEO |
| 92  | 748249.79 | 1065588.84 | 204.04 | GEO |
| 98  | 748304.98 | 1065212.97 | 203.26 | GEO |
| 99  | 748309.26 | 1065212.35 | 203.39 | GEO |
| 100 | 748308.16 | 1065206.81 | 203.35 | GEO |
| 101 | 748306.19 | 1065207.20 | 203.30 | GEO |
| 102 | 748306.22 | 1065197.41 | 203.31 |     |
| 103 | 748306.30 | 1065196.72 | 203.32 |     |
| 104 | 748306.88 | 1065196.15 | 203.31 |     |
| 105 | 748304.12 | 1065184.96 | 203.23 |     |
| 106 | 748303.28 | 1065184.62 | 203.28 |     |
| 107 | 748300.82 | 1065174.71 | 203.23 |     |
| 108 | 748297.08 | 1065160.87 | 203.16 |     |
| 109 | 748292.99 | 1065162.06 | 203.07 |     |
| 110 | 748296.59 | 1065175.36 | 203.12 |     |
| 111 | 748300.99 | 1065193.17 | 203.18 |     |
| 112 | 748304.07 | 1065207.72 | 203.24 |     |
| 113 | 748306.55 | 1065223.08 | 203.29 | GEO |
| 114 | 748310.85 | 1065222.42 | 203.41 | GEO |
| 115 | 748307.87 | 1065232.99 | 203.31 | GEO |
| 116 | 748312.29 | 1065232.59 | 203.44 | GEO |
| 117 | 748313.34 | 1065242.60 | 203.49 | GEO |
| 118 | 748308.93 | 1065242.87 | 203.36 | GEO |
| 119 | 748309.67 | 1065252.95 | 203.38 | GEO |
| 120 | 748314.03 | 1065252.92 | 203.52 | GEO |
| 121 | 748314.32 | 1065262.97 | 203.54 | GEO |
| 122 | 748310.19 | 1065262.99 | 203.41 | GEO |
| 125 | 748310.19 | 1065273.01 | 203.44 | GEO |
| 126 | 748314.42 | 1065273.11 | 203.56 | GEO |
| 127 | 748314.23 | 1065283.55 | 203.59 | GEO |
| 128 | 748310.01 | 1065282.94 | 203.48 | GEO |
| 129 | 748309.42 | 1065293.03 | 203.51 | GEO |
| 130 | 748313.60 | 1065293.08 | 203.62 | GEO |
| 131 | 748308.40 | 1065304.93 | 203.55 |     |
| 132 | 748269.57 | 1065483.00 | 203.94 |     |
| 151 | 748251.12 | 1065582.36 | 204.04 |     |
| 152 | 748254.57 | 1065583.49 | 204.19 |     |
| 153 | 748259.01 | 1065579.49 | 204.31 |     |
| 154 | 748255.43 | 1065577.03 | 204.10 |     |

11,295

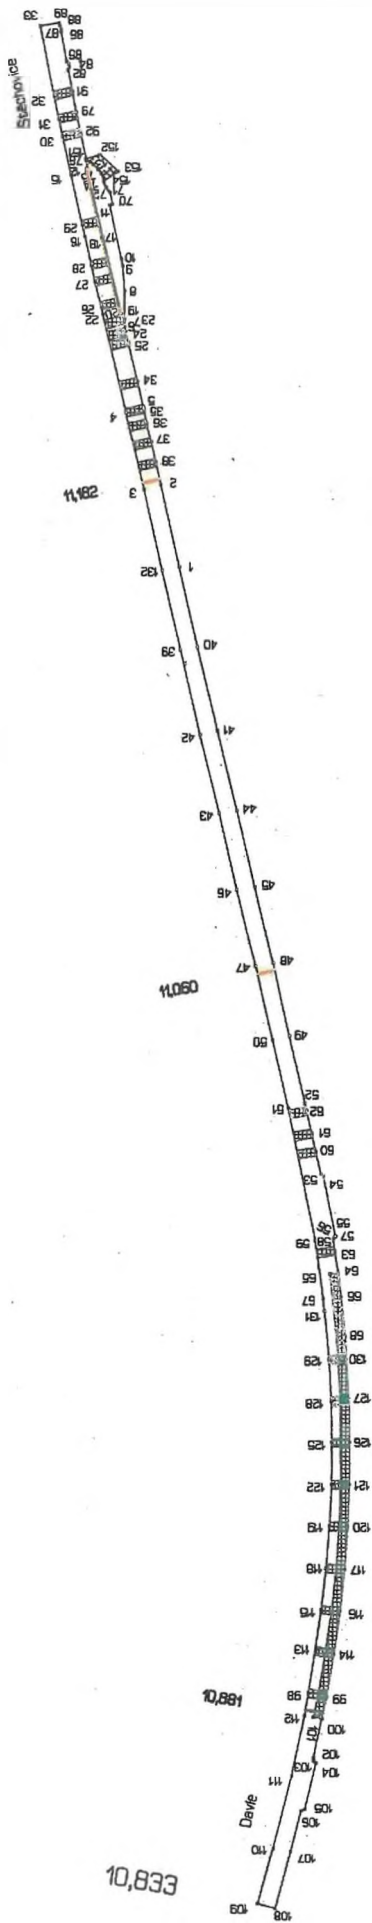

|                                                                                                                                                          |           |  |              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--------------|--|
| STRABAG a.s.<br>Kadřická 982/41, Praha 5                                                                                                                 | obrázky   |  | Ing. S. Blék |  |
|                                                                                                                                                          | overl     |  | 30.5.2023    |  |
|                                                                                                                                                          | datum     |  |              |  |
|                                                                                                                                                          | obrázky   |  |              |  |
| úsek<br>1/102 Hr. HL Města Přehy - Štěchovice, rekonstrukce, etapa II<br>SO 102 Rekonstrukce vozovky, Davle - Štěchovice<br>Úsek B, km 10,840 - 10,245 - | výřez dle |  |              |  |
|                                                                                                                                                          | bez       |  | S-JSK        |  |
|                                                                                                                                                          | datum     |  | výřez systém |  |
|                                                                                                                                                          | datum     |  | výřez systém |  |
| záměr<br>Ing. Stanislav Blék                                                                                                                             | datum     |  | bez          |  |
|                                                                                                                                                          | datum     |  | S-JSK        |  |
|                                                                                                                                                          | datum     |  | výřez systém |  |
|                                                                                                                                                          | datum     |  | výřez systém |  |

STRABAG a.s.  
Dopravní stavitelství  
direkce TC  
Kačírkova 982/4  
CZ – 158 00 Praha 5 / Česká republika

**STRABAG**

**Stavba: II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE**  
**Dodavatel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Praha 5**

**Číslo předávacího protokolu: Š II 30/2023**

**Předmět měření: SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE**  
**Úsek C – km 13,693 – 14,430 – konstrukční vrstvy**

**km 14,112 – 14,430 – pravá strana**

|                   |   |                             |                  |
|-------------------|---|-----------------------------|------------------|
| <b>SAL</b> ✓      | - | <b>1482,0 m<sup>2</sup></b> | <b>tl. 30 mm</b> |
| <b>ACL</b> ✓      | - | <b>1639,0 m<sup>2</sup></b> | <b>tl. 60 mm</b> |
| <b>Vyrovnávka</b> |   | <b>257,0 m<sup>2</sup></b>  | <b>tl. 52 mm</b> |
| <b>ACO</b> ✓      | - | <b>1622,0 m<sup>2</sup></b> | <b>tl. 40 mm</b> |

**Geomříše: 146,3 m<sup>2</sup>**

**km 13,693 – 14,430 – levá strana**

|              |   |                             |                  |
|--------------|---|-----------------------------|------------------|
| <b>ACO</b> ✓ | - | <b>3178,1 m<sup>2</sup></b> | <b>tl. 40 mm</b> |
|--------------|---|-----------------------------|------------------|

Měření bylo provedeno totální stanicí TOPCON IS 305.  
Dopustné odchylky měření a výpočtu nebyly překročeny,

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| <b>Souřadnicový systém:</b> | <b>S-JTSK</b>           |
| <b>Výškový systém:</b>      | <b>Bpv</b>              |
| <b>Přilohy:</b>             | <b>Seznam souřadnic</b> |
|                             | <b>Náčrt</b>            |

|                   |                  |                      |
|-------------------|------------------|----------------------|
| <b>Zaměřil:</b>   | <b>6.2023</b>    | <b>Ing. S. Bílek</b> |
| <b>Zpracoval:</b> | <b>23.6.2023</b> | <b>Ing. S. Bílek</b> |
| <b>Ověřil:</b>    | <b>23.6.2023</b> | <b>Ing. S. Bílek</b> |

Ověření výsledků zeměměřických činností ve výstavbě  
podle §13 odst.1 písm. c) zák. č. 200/1994 Sb



# **II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, etapa II** **SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE**

Úsek C, km 13,693 – 14,430 - konstrukční vrstvy

## **Seznam souřadnic**

| Bod | Y         | X          | Výška  |      |
|-----|-----------|------------|--------|------|
| 1   | 747883.51 | 1068483.01 | 205.99 | GEO  |
| 2   | 747892.20 | 1068471.48 | 205.97 |      |
| 3   | 747900.44 | 1068460.23 | 205.96 |      |
| 4   | 747906.10 | 1068451.90 | 205.97 | GEO  |
| 5   | 747912.18 | 1068442.68 | 205.97 |      |
| 6   | 747915.77 | 1068436.90 | 205.97 | GEO  |
| 7   | 747921.06 | 1068428.11 | 205.96 |      |
| 8   | 747927.53 | 1068416.69 | 205.97 |      |
| 9   | 747934.51 | 1068403.08 | 205.96 |      |
| 10  | 747938.58 | 1068404.83 | 206.07 |      |
| 11  | 747932.32 | 1068417.25 | 206.06 |      |
| 12  | 747924.87 | 1068430.65 | 206.06 |      |
| 13  | 747919.62 | 1068439.39 | 206.06 |      |
| 14  | 747915.73 | 1068445.92 | 206.06 |      |
| 15  | 747909.73 | 1068455.09 | 206.06 |      |
| 16  | 747904.54 | 1068462.52 | 206.08 | OBR  |
| 17  | 747903.70 | 1068464.37 | 206.10 | OBR  |
| 18  | 747901.53 | 1068470.50 | 206.15 | OBR  |
| 19  | 747901.22 | 1068470.41 | 206.14 | OBR  |
| 20  | 747894.80 | 1068479.46 | 206.16 | OBR  |
| 21  | 747891.52 | 1068483.54 | 206.14 | OBR  |
| 22  | 747887.27 | 1068486.26 | 206.09 | OBR  |
| 23  | 747886.71 | 1068486.53 | 206.09 | OBR  |
| 24  | 747876.47 | 1068499.45 | 206.09 | OBR  |
| 26  | 747860.94 | 1068511.60 | 206.00 |      |
| 27  | 747864.53 | 1068514.41 | 206.07 | OBR  |
| 28  | 747853.50 | 1068520.90 | 206.00 |      |
| 29  | 747842.29 | 1068534.85 | 206.01 |      |
| 30  | 747844.34 | 1068541.43 | 206.00 | DREN |
| 31  | 747844.56 | 1068548.61 | 206.17 | DREN |
| 32  | 747834.77 | 1068556.38 | 206.13 | OBR  |
| 33  | 747825.72 | 1068563.52 | 206.13 | OBR  |
| 34  | 747825.13 | 1068564.29 | 206.11 | OBR  |
| 35  | 747825.00 | 1068564.31 | 206.12 |      |
| 37  | 747813.87 | 1068570.08 | 206.06 |      |
| 38  | 747823.75 | 1068557.71 | 206.03 |      |
| 39  | 747833.09 | 1068546.28 | 206.02 | GEO  |
| 41  | 747855.42 | 1068518.49 | 206.01 | GEO  |
| 42  | 747857.65 | 1068515.71 | 206.01 | GEO  |
| 43  | 747872.39 | 1068497.16 | 205.99 | GEO  |
| 45  | 747857.79 | 1068522.79 | 206.09 | OBR  |
| 46  | 747856.52 | 1068524.31 | 206.09 | OBR  |
| 47  | 747850.14 | 1068532.36 | 206.09 | GEO  |
| 48  | 747844.73 | 1068539.09 | 206.09 | OBR  |
| 49  | 747843.94 | 1068540.09 | 206.09 | OBR  |
| 50  | 747843.77 | 1068540.96 | 206.08 | OBR  |
| 51  | 747831.42 | 1068557.70 | 206.12 | GEO  |
| 52  | 747828.77 | 1068561.10 | 206.13 | GEO  |
| 53  | 747819.98 | 1068569.93 | 206.13 |      |
| 54  | 747817.26 | 1068573.18 | 206.14 |      |
| 55  | 747808.70 | 1068583.85 | 206.14 |      |
| 56  | 747805.08 | 1068581.03 | 206.07 |      |
| 57  | 747812.74 | 1068571.51 | 206.06 | GEO  |
| 59  | 747799.55 | 1068595.21 | 206.16 | GEO  |
| 60  | 747795.95 | 1068592.51 | 206.07 | GEO  |
| 61  | 747784.09 | 1068606.77 | 206.08 |      |
| 62  | 747787.59 | 1068609.96 | 206.17 |      |
| 63  | 747776.82 | 1068615.36 | 206.09 | GEO  |
| 64  | 747780.45 | 1068618.50 | 206.18 | GEO  |
| 65  | 747765.70 | 1068628.03 | 206.09 | GEO  |
| 66  | 747769.19 | 1068631.34 | 206.18 | GEO  |
| 67  | 747760.04 | 1068634.25 | 206.09 | GEO  |
| 68  | 747764.01 | 1068637.11 | 206.19 | GEO  |
| 69  | 747750.49 | 1068644.27 | 206.11 |      |
| 70  | 747744.22 | 1068650.70 | 206.09 | GEO  |




|     |           |            |        |     |
|-----|-----------|------------|--------|-----|
| 71  | 747742.47 | 1068652.28 | 206.09 | GEO |
| 73  | 747744.05 | 1068657.00 | 206.19 |     |
| 74  | 747755.60 | 1068645.94 | 206.20 |     |
| 75  | 747762.44 | 1068638.79 | 206.19 |     |
| 101 | 748010.37 | 1068089.08 | 205.80 |     |
| 102 | 748006.21 | 1068088.25 | 205.70 |     |
| 103 | 748009.32 | 1068070.06 | 205.69 |     |
| 104 | 748013.61 | 1068070.48 | 205.78 |     |
| 105 | 748016.56 | 1068051.85 | 205.77 |     |
| 106 | 748012.36 | 1068050.97 | 205.68 |     |
| 107 | 748014.91 | 1068032.11 | 205.68 |     |
| 108 | 748019.16 | 1068032.34 | 205.76 |     |
| 109 | 748021.44 | 1068013.48 | 205.73 |     |
| 110 | 748023.55 | 1067995.80 | 205.69 |     |
| 111 | 748019.11 | 1067995.46 | 205.58 |     |
| 112 | 748018.69 | 1068000.22 | 205.60 |     |
| 113 | 748018.44 | 1068002.57 | 205.63 |     |
| 114 | 748018.11 | 1068005.09 | 205.63 |     |
| 115 | 748017.71 | 1068007.57 | 205.65 |     |
| 116 | 748017.17 | 1068011.83 | 205.66 |     |
| 125 | 748006.81 | 1068108.17 | 205.81 | ZED |
| 126 | 748002.63 | 1068107.32 | 205.70 |     |
| 127 | 747998.99 | 1068125.89 | 205.72 |     |
| 128 | 748003.18 | 1068126.79 | 205.82 |     |
| 129 | 747999.42 | 1068145.81 | 205.83 |     |
| 130 | 747995.26 | 1068144.88 | 205.73 |     |
| 131 | 747991.61 | 1068163.68 | 205.73 |     |
| 132 | 747995.76 | 1068164.76 | 205.83 |     |
| 133 | 747991.86 | 1068184.53 | 205.86 |     |
| 134 | 747987.61 | 1068183.82 | 205.75 |     |
| 135 | 747983.82 | 1068203.07 | 205.74 |     |
| 136 | 747988.04 | 1068203.82 | 205.85 |     |
| 137 | 747984.48 | 1068222.43 | 205.87 |     |
| 138 | 747980.17 | 1068221.57 | 205.76 |     |
| 139 | 747976.57 | 1068239.70 | 205.77 |     |
| 140 | 747980.89 | 1068240.52 | 205.88 |     |
| 141 | 747952.61 | 1068360.07 | 205.96 |     |
| 142 | 747948.43 | 1068358.46 | 205.85 |     |
| 143 | 747952.33 | 1068346.97 | 205.84 |     |
| 144 | 747956.66 | 1068348.00 | 205.95 |     |
| 145 | 747954.79 | 1068339.24 | 205.85 |     |
| 146 | 747959.00 | 1068340.25 | 205.95 |     |
| 147 | 747962.48 | 1068328.41 | 205.94 |     |
| 148 | 747958.18 | 1068327.33 | 205.84 |     |
| 149 | 747961.20 | 1068315.38 | 205.83 |     |
| 150 | 747965.54 | 1068316.14 | 205.93 |     |
| 151 | 747968.20 | 1068304.25 | 205.93 |     |
| 152 | 747963.92 | 1068303.29 | 205.82 |     |
| 154 | 747966.46 | 1068291.25 | 205.82 |     |
| 155 | 747970.78 | 1068291.86 | 205.93 |     |
| 156 | 747973.19 | 1068279.68 | 205.91 |     |
| 157 | 747968.84 | 1068279.12 | 205.81 |     |
| 158 | 747971.29 | 1068267.02 | 205.80 |     |
| 159 | 747975.57 | 1068267.60 | 205.91 |     |
| 160 | 747977.97 | 1068255.61 | 205.90 |     |
| 161 | 747973.64 | 1068254.91 | 205.80 |     |
| 163 | 747946.93 | 1068362.66 | 205.85 |     |
| 164 | 747951.13 | 1068364.17 | 205.96 |     |
| 165 | 747946.58 | 1068375.86 | 205.95 |     |
| 166 | 747942.47 | 1068374.18 | 205.85 |     |
| 167 | 747937.69 | 1068385.51 | 205.87 |     |
| 168 | 747941.74 | 1068387.16 | 205.97 |     |
| 169 | 747936.43 | 1068398.85 | 205.98 |     |
| 170 | 747932.54 | 1068396.76 | 205.87 |     |
| 171 | 747927.06 | 1068407.81 | 205.88 |     |
| 174 | 747921.24 | 1068418.74 | 205.88 |     |
| 175 | 747915.11 | 1068429.47 | 205.88 |     |
| 178 | 747908.67 | 1068440.01 | 205.88 |     |
| 179 | 747901.92 | 1068450.36 | 205.87 |     |
| 182 | 747894.86 | 1068460.50 | 205.87 |     |
| 183 | 747887.63 | 1068470.42 | 205.87 |     |
| 210 | 747737.84 | 1068650.55 | 205.97 |     |
| 211 | 747740.92 | 1068653.78 | 206.09 |     |
| 213 | 747747.31 | 1068641.41 | 206.00 |     |

|     |           |            |        |     |
|-----|-----------|------------|--------|-----|
| 214 | 747751.53 | 1068637.06 | 206.00 | OBR |
| 215 | 747755.09 | 1068633.30 | 205.94 | OBR |
| 216 | 747762.12 | 1068625.77 | 205.97 | OBR |
| 217 | 747762.06 | 1068625.72 | 205.97 | OBR |
| 218 | 747763.51 | 1068624.27 | 206.00 |     |
| 219 | 747771.73 | 1068614.96 | 205.99 |     |
| 220 | 747779.73 | 1068605.53 | 205.98 |     |
| 221 | 747787.62 | 1068596.01 | 205.97 |     |
| 222 | 747795.37 | 1068586.45 | 205.97 |     |
| 223 | 747803.13 | 1068576.78 | 205.96 |     |
| 224 | 747810.85 | 1068567.16 | 205.95 |     |
| 225 | 747818.56 | 1068557.50 | 205.94 |     |
| 226 | 747826.29 | 1068547.84 | 205.92 |     |
| 227 | 747833.99 | 1068538.21 | 205.92 |     |
| 228 | 747841.71 | 1068528.55 | 205.90 |     |
| 229 | 747849.45 | 1068518.93 | 205.90 |     |
| 230 | 747857.17 | 1068509.29 | 205.89 |     |
| 231 | 747864.87 | 1068499.64 | 205.89 |     |
| 232 | 747872.55 | 1068489.96 | 205.88 |     |
| 233 | 747880.18 | 1068480.28 | 205.89 |     |





103 101 102 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166

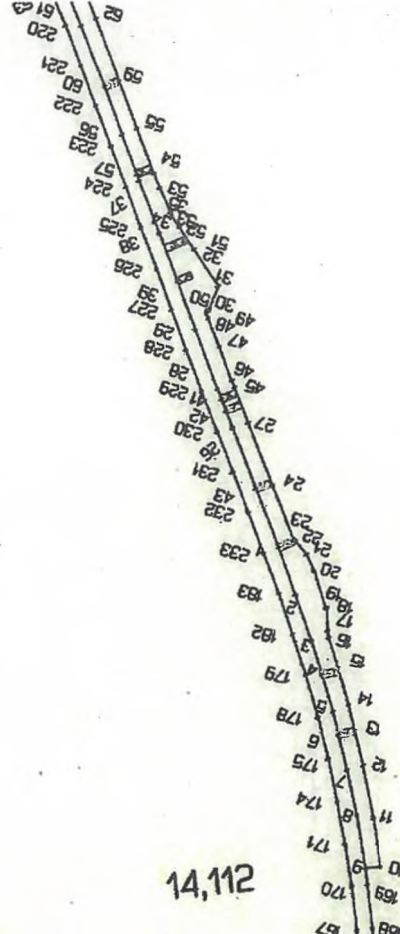

**STRABAG a.s.**

Kacínkova 982/41, Praha 5

číslo zakázky

ověř

datum

číslo ověření

ekce

**I/102 H. H. Města Prahy - Střechovice, rekonstrukce, etapa I**

[illegible]

Technical drawing of a roof structure showing a cross-section with various layers, slopes, and dimensions. The drawing includes labels for materials like concrete, insulation, and waterproofing, as well as specific dimensions for slopes and heights. Key features include a main roof slope of 1:1.75, a lower slope of 1:3.00, and a vertical drop of 197.00. The drawing is divided into sections with different materials and construction details.

[illegible][illegible]

② návrh řešení obsahuje ve výkresové a textové části je plněním ochrany dle autorského zákona



KSÚS Středočeského kraje  
Ing. Milan Peška  
Zborovská 81/11  
150 00 Praha 5

Č. j.: Px 4372/2023/DDv  
Datum: 21. 6. 2023  
Vyřizuje: Ing. David Dvořáček,

tel.: [redacted]

**II/102 hr. hl. m. Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, II. etapa**  
**Vyjádření autorského dozoru č. 69 - SO 102, frézování, SAL**

Byli jsme požádáni o vyjádření k výměrám položek řešících frézování stávající vozovky a pokládku vrstvy SAL při realizaci vozovky nové.

Frézování je v přípravné dokumnetaci řešeno pomocí následujících položek:

- frézování živičného krytu tl. 100 mm,
- frézování živičného krytu tl. 200 mm,
- frézování betonového krytu tl. 40 mm,
- frézování betonového krytu tl. 50 mm,
- frézování betonového krytu tl. 100 mm.

Typ a výměra položek vychází v návrhu rekonstrukce zpracovaného na základě diagnostického průzkumu vozovky. Diagnostický průzkum vozovky byl proveden v obvyklém rozsahu. Skládal se z vizuální prohlídky, bodových destruktivních sond, bodového měření únosnosti a georadarového měření. Dokumentace skutečného provedení konstrukcí vozovky se nedomáhala. Jelikož podklady k zakrytým konstrukcím byly obecně pouze bodové, jsou výměry uvedené v přípravné dokumnetaci pouze odborným odhadem.

Během realizace stavby došlo ke zpřesnění technického řešení i rozsahu jednotlivých prací. Důvody byly především následující:

- potřeba úpravy výškového řešení komunikace na základě zpřesnění podkladů (zaměření) nebo změny stavu (změna navazujících ploch),
- zastižení jiné tloušťky vrstvy než bylo předpokládáno (jednak u asfaltobetonových vrstev, jednak u cementobetonových vrstev, jejichž ponechání předpokládalo min. zbytkovou tl. po úpravě sklonu),
- zastižení lokálních asfaltobetonových nálitků na cementobetonové vrstvě,
- zastižení výrazného poškození zakrytých vrstev (nevhodně sanované rýhy u inž. sítí, výrazná degradační poškození),
- zastižení jiné šířky zakrytých vrstev (jedná se především o cementobetonové vrstvy nedosahující k okraji vozovky).

Výše uvedné důvody vyvolaly potřebu nárůstu výměry příslušných položek.

S výše uvedenou problematikou úzce souvisí zpřesnění rozsahu použití vrstvy proti šíření trhlin SAL. Její rozsah byl upřesněn na základě skutečně zastižených poměrů.

**Provedli jsme kontrolu rozsahu skutečně výměr a za AD nemáme připomínky.**


S pozdravem

Ing. David Dvořáček,  
hlavní inženýr projektu



**Na vědomí (zasláno pouze elektronicky):**

1. Objednatel, KSÚS, Ing. M.
2. Objednatel, KSÚS, Ing. A
3. TDI, Pragoprojekt, a. s., I
4. Strabag, a. s., Karel Šimek
5. Strabag, a. s., Martin Lísá
6. Atelier PROMIKA, s. r. o.



KSÚS Středočeského kraje  
Ing. Milan Peška  
Zborovská 81/11  
150 00 Praha 5

Č. j.: Px 4366/2023/DDv  
Datum: 18. 6. 2023  
Vyřizuje: Ing. David Dvořáček,

tel.: 

**II/102 hr. hl. m. Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, II. etapa**  
**Vyjádření autorského dozoru č. 67 - SO 102, zábradlí u propustku v km 12.925**


Ve vyjádření č. 44 ze dne 22. 5. 2022 jsme sdělili stanovisko AD k zajištění okrajů vodoteče. Obecně nejsou okraje vodoteče předmětem řešené stavby a problematika jejich zajištění je věcí správce vodoteče.

Při realizaci propustku v km 12.925 bylo po odstranění náletové vegetace a nánosů a usazení nové konstrukce zjištěno, že tvar terénu v těsné blízkosti propustku vykazuje lokálně sklon strmější než 1:1 při hloubce přesahující 2 m.

**S ohledem na blízkost nemovitostí požaduje AD v tomto případě doplnit k propustku silniční bezpečnostní zábradlí.**

S pozdravem

Ing. David Dvořáček,  
hlavní inženýr projektu



**Na vědomí (zasláno pouze elektronicky):**

1. Objednatel, KSÚS, Ing. M
2. Objednatel, KSÚS, Ing. A
3. TDI, Pragoprojekt, a. s.,
4. Strabag, a. s., Karel Šime
5. Strabag, a. s., Martin Lís
6. Atelier PROMIKA, s. r. o

So 102

Datum: 2.6.2023

Den týdne: *Pu*

Jísno: Bříkhol Název akce: 11/10/19. HL. II. PRÁVÍ, PRACOVNÍ, DISCONTINUOUS, I. STADI  
NOL, DOLNO + 8°C, POZ. + 12°C, ABPOZ. + 12°C  
700 - 7830

Pracovní přestávka 17<sup>00</sup> - 18<sup>00</sup>

na a příjmení): FRANČEK, JUDITA, MIKAL DIT, PATEK, LEHÁČEK, HOSMAN  
ŠT. POK, KREŠ FRANK

2188 HRC 914, 1 MILLION' AUTO, 120000' CASH, 10000' WOODS,  
34 HRC 1000, 10000' WOODS, 34 HRC 1000

ACO 11 + PDS, OBELOV'S GARDEN.

áce: - PROVÁZENÍ PULSOMETR APOKRYTOU ACO M + PMS V km 11,100 - 11,120  
 POKYŠOVÁNÍ K VÝŠEŘÍ STAMBOČENÍ + MÍNĚNÍ KESTY ACO M + PMS  
 VÝŠEŘÍ MĚŘENÍ  
 - PROVÁZENÍ POKYŠOVÁNÍ ROZŠÍŘENÉHO OCELOVÉHO LÁZOVNÍHO  
 POKYŠOVÁNÍ V km 11,120 POKYŠOVÁNÍ K VÝŠEŘÍ STAMBOČENÍ  
 - PROVÁZENÍ ÚKLADU STAMBOČENÍ V km 11,160 - 11,180 POKYŠOVÁNÍ  
 K VÝŠEŘÍ STAMBOČENÍ (POKYŠOVÁNÍ POKYŠOVÁNÍ KESTY)

tupce investora (TDI):







## USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl vyšší soudní úřednicí Marií Šiškovou v právní věci

navrhovatele: **STRABAG a.s.**, IČO 608 38 744  
sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

**o návrhu na zápis změny do obchodního rejstříku**

**takto:**

V obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce číslo 7634

**se vymazává**

Statutární orgán

člen představenstva

Ing. JARMILA POVAŽANOVÁ, dat. nar. 19. října 1962, r.č. 626019/6514

82101 Bratislava, Drieňova 16175/1B, Slovenská republika

Den vzniku členství: 3. června 2019

Prokura

Ing. RENATA HAMRSKÁ, dat. nar. 19. března 1961, r.č. 615319/0153

Hvozdková 837, Liberec XXV-Vesec, 463 12 Liberec

Ing. TOMÁŠ HOZA, dat. nar. 8. května 1969, r.č. 690508/4406

Purkyňova 749/10, 767 01 Kroměříž

Ing. JIŘÍ JAROŠ, dat. nar. 31. ledna 1962, r.č. 620131/0643

Plachého 272/25, České Budějovice 1, 370 01 České Budějovice

**se zapisuje**

Statutární orgán

U vymazávané osoby: Ing. JARMILA POVAŽANOVÁ, dat. nar. 19. října 1962, r.č. 626019/6514

Den zániku členství: 7. prosince 2022

člen představenstva

Ing. TOMÁŠ HOZA, dat. nar. 8. května 1969, r.č. 690508/4406

Purkyňova 749/10, 767 01 Kroměříž

Den vzniku členství: 8. prosince 2022

Prokura

Ing. KAREL KLOFÁČ, dat. nar. 18. června 1973, r.č. 730618/2972

U Rybníčku 4041, 580 01 Havlíčkův Brod

Den zápisu změny: Dnem nabytí právní moci

**Poučení:**

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím nadepsaného soudu.

Praha 19. prosince 2022

Marie Šišková v. r.  
vyšší soudní úřednice



**Výpis**

z obchodního rejstříku, vedeného  
Městským soudem v Praze  
oddíl B, vložka 7634

**Datum vzniku a zápisu:**

1. března 1994

**Spisová značka:**

B 7634 vedená u Městského soudu v Praze

**Obchodní firma:**

STRABAG a.s.

**Sídlo:**

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

**Identifikační číslo:**

608 38 744

**Právní forma:**

Akciová společnost

**Předmět podnikání:**

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

projektová činnost ve výstavbě

výroba betonu a obalovaných živičných směsí

opravy silničních vozidel

hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem v rozsahu: ( otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek s omezením pro povrchové dobývání; zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl; úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním; zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť; dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů; podzemní sanační práce; zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin; podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol a tunelů)

silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní

výkon zeměměřických činností

provádění trhačích a ohňostrojných prací

výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin

zámečnictví, nástrojářství

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

distribuce pohonných hmot

**Statutární orgán:****předseda představenstva:**

Dipl. Ing. MORITZ FREYBORN, dat. nar. 1. září 1975

1180 Vídeň, Haizingergasse 1-3/32, Rakouská republika

Den vzniku funkce: 1. listopadu 2022

Den vzniku členství: 1. listopadu 2022

**člen představenstva:**

Ing. PAVEL BRYCHCÍN, dat. nar. 25. května 1972

Zakšínská 607/11, Střížkov, 190 00 Praha 9

Den vzniku členství: 1. července 2020

---

**člen představenstva:**

Ing. TOMÁŠ HOZA, dat. nar. 8. května 1969  
Purkyňova 749/10, 767 01 Kroměříž  
Den vzniku členství: 8. prosince 2022

---

**Počet členů:**

3

---

**Způsob jednání:**

Statutárním orgánem je představenstvo. Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám, před soudy, správními a samosprávnými orgány ve všech záležitostech představenstvo a to vždy předseda představenstva s dalším členem představenstva nebo dva členové představenstva. Podepisování se děje tím způsobem, že k napsané firmě společnosti nebo otisku razítka připojí svůj podpis předseda představenstva s dalším členem představenstva nebo dva členové představenstva s označením své funkce.

---

**Prokura:**

Ing. RADEK HRADIL, dat. nar. 2. února 1964  
Okružní 660, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště

Ing. ROSTISLAV KRONES, dat. nar. 8. května 1968  
č.p. 46, 592 03 Kadov

Ing. JIŘÍ HORÁLEK, dat. nar. 16. listopadu 1964  
Ludvíka Podéště 777/16, Stránice, 602 00 Brno

Ing. JAN HÝZL, dat. nar. 6. ledna 1976  
Profesora Fuky 1276/4, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

Ing. JAN CHROMÝ, dat. nar. 30. června 1974  
Litvínovice - Mokré 119, PSČ 37001

Ing. PAVEL KLAS, dat. nar. 22. listopadu 1964  
č.p. 5, 386 01 Radošovice

Ing. RADIM AULICKÝ, dat. nar. 22. června 1974  
Oldřicha Nového 833, 252 64 Velké Přílepy

Ing. ALEXEJ KOROTKOV, dat. nar. 1. dubna 1978  
Lechowiczova 2827/11, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Ing. LUKÁŠ PŘIBYL, dat. nar. 21. prosince 1982  
Slunečná 333, 373 71 Adamov

Ing. RICHARD FISCHER, dat. nar. 7. října 1975  
V Podhradí 33, 250 73 Jenštejn

Ing. Mag. MICHAL PRISTAŠ, dat. nar. 14. dubna 1981  
2460 Bruckneudorf, Marc Aurel Strasse 2f, Rakouská republika

Ing. Mag. Michal Pristaš je oprávněn zastupovat Společnost spolu s dalším prokuristou. Toto zmocnění zahrnuje i oprávnění nabýt, zcizit nebo zatížit nemovitou věc.

MICHAL VANĚČEK, dat. nar. 27. března 1978  
Pod Nouzovem 1007/25, Kbely, 197 00 Praha 9

Ing. MICHAL KOPPER, dat. nar. 15. května 1979  
82104 Bratislava - Ružinov, Doležalova 3424/15F, Slovenská republika

Ing. Michal Kopper je oprávněn zastupovat Společnost spolu s dalším prokuristou. Toto zmocnění zahrnuje i oprávnění nabýt, zcizit nebo zatížit nemovitou věc.

Ing. TOMÁŠ RYS, dat. nar. 17. listopadu 1981  
U sanatoria 737/20, Radotín, 153 00 Praha 5

PETR KAFKA, dat. nar. 21. února 1962  
Sadová 246, Nemošice, 530 03 Pardubice

Ing. arch. JAN HAVELKA, dat. nar. 9. srpna 1988  
č.p. 228, 373 32 Jílovce

Ing. JIŘÍ SVOBODA, Ph.D., dat. nar. 27. září 1984



U Hřiště 456, Mladcová, 760 01 Zlín

Ing. KAREL KLOFÁČ, dat. nar. 18. června 1973

U Rybníčku 4041, 580 01 Havlíčkův Brod

Ing. MARTIN BAŠÁR, dat. nar. 3. září 1979

Dělnická 443, 252 41 Dolní Břežany

K zastupování a podepisování za společnost jsou oprávněni vždy dva prokuristé. Prokuristé podepisují tím způsobem, že k firmě společnosti připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru.

#### **Dozorčí rada:**

##### **předseda dozorčí rady:**

Dipl. Ing. (FH) ALFRED WATZL, dat. nar. 13. září 1970

05-080 Izabelin C, Krasinského 37, Polská republika

Den vzniku funkce: 13. června 2022

Den vzniku členství: 13. června 2022

##### **člen dozorčí rady:**

Mgr. KARIN BÍLKOVÁ, dat. nar. 18. dubna 1975

Bezručova 603, 250 91 Zeleneč

Den vzniku členství: 4. prosince 2018

##### **člen dozorčí rady:**

Mag. HERIBERT HERZOG, dat. nar. 15. září 1964

7423 Grafenschachen, Grafenschachen 22, Rakouská republika

Den vzniku členství: 12. ledna 2023

#### **Počet členů:**

3

#### **Jediný akcionář:**

Bau Holding Beteiligungs GmbH

9800 Spittal an der Drau, Ortenburgerstraße 27, Rakouská republika

Registrační číslo: FN 117476 i

Právní forma: společnost s ručeným omezeným

#### **Akcie:**

1 000 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč

11 096 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč

#### **Základní kapitál:**

1 119 600 000,- Kč

Splaceno: 1 119 600 000,- Kč

#### **Ostatní skutečnosti:**

Akciová společnost byla založena notářským zápisem osvědčenou zakladatelskou listinou tří zakladatelů, fyzických osob, ze dne 23.2.1994, rozdělením současně zrušené společnosti s ručením omezeným SAREMO, se sídlem České Budějovice, ul.Plachého 27, na dvě nově vzniklé společnosti SAREMO a.s. a HYDROLINE s.r.o., se sídlem České Budějovice, Lidická 1131.

Zakladatelé současně schválili stanovy a.s. a zvolili členy orgánů společnosti.

Notářský zápis, zakladatelská smlouva a stanovy a.s. byly přiloženy.

Základní jmění je splaceno v plném rozsahu.

Valná hromada společnosti rozhodla dne 30.6.1999 o sloučení se společností STRABAG ČR a.s.

Na společnost STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ 608 38 744, jako nástupnickou společnost, přešlo na základě smlouvy o fúzi sloučením ze dne 20. 11. 2006 s rozhodným dnem sloučení 1. 10. 2006 jmění společnosti ILBAU Plzeň a.s. se sídlem České Budějovice, Vrbenská 31,

IČ 648 34 352, jako zanikající společnosti.

Společnost STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ 608 38 744 je právním nástupcem bez likvidace zrušené a zaniklé společnosti ILBAU Plzeň a.s. se sídlem České Budějovice, Vrbenská 31, IČ 648 34 352, dosud zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddílu B vložce 1148.

Na společnost STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ 608 38 744, jako nástupnickou společnost, přešlo na základě smlouvy o fúzi sloučením ze dne 20.11.2006 s rozhodným dnem sloučení 1.10.2006 jmění společnosti Stavební technologie, spol. s r.o. se sídlem Humpolec, Nádražní 729, okres Pelhřimov, PSČ 396 01, IČ 251 83 133, jako zanikající společnosti.

Společnost STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ 608 38 744 je právním nástupcem bez likvidace zrušené a zaniklé společnosti Stavební technologie, spol. s r.o. se sídlem Humpolec, Nádražní 729, okres Pelhřimov, PSČ 396 01, IČ 251 83 133, dosud zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích C 8266.

Obchodní společnost STRABAG a.s. jako společnost nástupnická převzala v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění zanikající společnosti STRABAG konstrukce s.r.o., IČ 252 63 579, se sídlem Chrudim, Tovární 209.

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Na společnost STRABAG a.s., jako na společnost nástupnickou, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikajících společností JHP spol. s r.o., se sídlem Ústřední 423/62, Štěrboholy, 102 00 Praha 10, identifikační číslo 45798290 a MiTTaG spol. s r.o. pozemní a průmyslové stavitelství, se sídlem Na Bělidle 198/21, Smíchov, 150 00 Praha 5, identifikační číslo 00547514. Rozhodným dnem fúze byl 1. leden 2016.

Na základě projektu vnitrostátní fúze sloučením ze dne 11.8.2017 došlo ke sloučení společnosti Dálniční stavby Praha, a.s., se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 15000, identifikační číslo 40614948, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 744, jako zanikající společnosti, do společnosti STRABAG a.s., jako nástupnické společnosti, přičemž na nástupnickou společnost STRABAG a.s. přešlo jmění zanikající společnosti Dálniční stavby Praha, a.s.

## **Odštěpné závody:**

### **Odštěpný závod:**

#### **Označení odštěpného závodu:**

STRABAG a.s. odštěpný závod Praha

#### **Sídlo nebo umístění:**

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

#### **Předmět podnikání:**

montáž, opravy údržba revize vyhrazených el. zařízení

výroba betonu a obalovaných živičných směsí

výkon zeměměřických činností

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

zámečnictví, nástrojářství

opravy silničních vozidel

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

#### **Vedoucí odštěpného závodu:**

Ing. MARTIN BAŠÁR, dat. nar. 3. září 1979

Dělnická 443, 252 41 Dolní Břežany

### **Odštěpný závod:**

#### **Označení odštěpného závodu:**

STRABAG a.s. odštěpný závod České Budějovice

#### **Sídlo nebo umístění:**

České Budějovice, Vrbenská 31, PSČ 37006

#### **Předmět podnikání:**

výkon zeměměřických činností

projektová činnost ve výstavbě

výroba betonu a obalovaných živičných směsí

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

zámečnictví, nástrojářství

opravy silničních vozidel

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

**Vedoucí odštěpného závodu:**

Ing. PAVEL KLAS, dat. nar. 22. listopadu 1964

č.p. 5, 386 01 Radošovice

**Odštěpný závod:**

**Označení odštěpného závodu:**

STRABAG a.s. odštěpný závod Morava

**Sídlo nebo umístění:**

Holická 1004/29, Hodolany, 779 00 Olomouc

**Předmět podnikání:**

výroba betonu a obalovaných živičných směsí

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

opravy silničních vozidel

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

**Vedoucí odštěpného závodu:**

Ing. JAN HÝZL, dat. nar. 6. ledna 1976

Profesora Fuky 1276/4, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

**Odštěpný závod:**

**Označení odštěpného závodu:**

STRABAG a.s. odštěpný závod pozemní a inženýrské stavitelství Praha

**Sídlo nebo umístění:**

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

**Předmět podnikání:**

výroba betonu a obalovaných živičných směsí

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

**Vedoucí odštěpného závodu:**

PETR KAFKA, dat. nar. 21. února 1962

Sadová 246, Nemošice, 530 03 Pardubice

**Odštěpný závod:**

**Označení odštěpného závodu:**

STRABAG a.s. odštěpný závod pozemní a inženýrské stavitelství České Budějovice

**Sídlo nebo umístění:**

České Budějovice, Vrbenská /31, PSČ 37006

**Předmět podnikání:**

- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

- projektová činnost ve výstavbě

- výkon zeměměřických činností

- zámečnictví, nástrojářství

- silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, -

nákladní mezinárodní provozovaná vozidla o největší povolené  
hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, -  
mezinárodní příležitostná osobní  
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3  
živnostenského zákona  
- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

---

**Vedoucí odštěpného závodu:**

Ing. JAN CHROMÝ, dat. nar. 30. června 1974  
Mokré 119, 370 01 Litvínovice

---

**Odštěpný závod:**

---

**Označení odštěpného závodu:**

STRABAG a.s. odštěpný závod STRABAG Real Estate

---

**Sídlo nebo umístění:**

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

---

**Předmět podnikání:**

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona  
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

---

**Vedoucí odštěpného závodu:**

Dipl. Ing. SONJA WERTITSCH, dat. nar. 29. září 1976  
1210 Vídeň, Kugelfanggasse 79a, Rakouská republika

**Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu** (<http://www.justice.cz>).

Dne: 7.9.2023 10:56

Údaje platné ke dni 7.9.2023 03:54

Naše značka: TD/259/19-120/VM/23

Vaše značka:

Vyřizuje: M. Valenta

Tel. +420 724 370 591

e-mail

Datum: 2. 11. 2023

**KSÚS Středočeského kraje**

**Ing. Milan PEŠKA**

**Technicko-provozní náměstek**

**Zborovská 11**

**150 21 Praha 5**

**Stavba: II/102 hr. hl. m Prahy – Štěchovice, rekonstrukce, etapa II.**

**Věc: Stanovisko TDS k návrhu ZBV č. 37 SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice.**

Zhotovitel stavby dne 11. 8. 2023 předložil a 22. 8. 2023 doplnil návrh ZBV č. 37 SO 102 (102/12) Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice (Asfaltová vrstva SAL, zábradlí propustku km 12,925).

Návrh změny řeší skutečně provedenou plochu asfaltové vrstvy proti šíření trhlin SAL. Rozsah změny byl určen na základě stavu podkladní CB desky (min. zbytková tloušťka 120 mm po odfrézování stávajících asf. vrstev) viz stanovisko AD č. 69 z 21. 6. 2023.

Konstrukce vozovky s asf. vrstvou SAL byla provedena v úsecích:

Km 10,190 – 10,250 vlevo (251,9 m<sup>2</sup>)

Km 10,680 – 10,760 vlevo (450 m<sup>2</sup>)

Km 10,881 – 11,060 vlevo (827,4 m<sup>2</sup>)

Km 11,182 – 11,299 vlevo (467,8 m<sup>2</sup>)

Km 11,297 – 11,780 vlevo (2175 m<sup>2</sup>)

Km 11,771 – 12,436 vlevo (2982,7 m<sup>2</sup>)

Km 10,250 – 10,360 vpravo (505 m<sup>2</sup>)

Km 10,360 – 10,841 vpravo (2203,3 m<sup>2</sup>)

Km 10,833 – 11,295 vpravo (1414,5 m<sup>2</sup>)

Km 11,298 – 11,780 vpravo (1957,4 m<sup>2</sup>)

Km 12,440 – 12,850 vpravo (1873 m<sup>2</sup>)

Km 12,846 – 13,201 vpravo (1562,3 m<sup>2</sup>)

Km 13,694 – 14,114 vpravo (1859,9 m<sup>2</sup>)

Km 14,112 – 14,430 vpravo (1482,0 m<sup>2</sup>)

Km 14,424 – 14,580 vpravo (143,3 m<sup>2</sup>)

Změna ovlivnila výměry položek č. 39, 44.

Dále bylo z důvodu bezpečnosti osazeno ocelové trubkové zábradlí kolem nátoky propustku v km 12,925 viz stanovisko AD č. 67 z 18. 6. 2023.

Změna ovlivnila výměry položek č. 15, 16, 18, 19, 61, 62 a nové položky č. 157, 158, 225.

TDS potvrzuje skutečnosti uvedené v návrhu ZBV č. 37 (102/12) Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice (Asfaltová vrstva SAL, zábradlí propustku km 12,925).

Položky oceněného soupisu prací SO 102 (102/12) budou fakturovány na základě skutečně provedených prací doložených geodetickým zaměřením ÚOZI-Z a záznamy ve stavebním deníku.

M. Valenta

Technický dozor investora

Na vědomí: Ing. Karel Šimek



## Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

**II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

**Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice**

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

**102/13**

Číslo ZBV:

**38**

Objednatel:

**Krajská správa a údržba Středočeského kraje, příspěvková organizace**

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

IČ: 00066001 DIČ: CZ00066001

Zhotovitel:

**STRABAG a. s.**

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

IČ: 60838744 DIČ: CZ60838744

## Rekapitulace ZBV č. 38 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 38.1        | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                                       |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 38.2        | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                                       |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 38.3        | 0,00                                | 1 530 172,61                       | 1 530 172,61                                               |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 38.4        | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                                       |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 38.5        | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                                       |

| Suma ZBV<br>č. | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
|----------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>38</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>1 530 172,61</b>                | <b>1 530 172,61</b>                                        |

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.  
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy  
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

1

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

**II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

**Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice**

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

**102/13**

Číslo ZBV:

**38**

Strany smlouvy o dílo č. S-468/00066001/2020 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 3.3.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: STRABAG a. s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Přílohy Změnového listu:

|                                             |    |             |
|---------------------------------------------|----|-------------|
| 1. Krycí list                               | 1  | počet listů |
| 2. Změnový list                             | 1  | počet listů |
| 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací | 1  | počet listů |
| 4. Rozpis ocenění Změn položek              | 1  | počet listů |
| 5. Přehled zařazení změn do skupin          | 2  | počet listů |
| 6. Přehled dalších dokladů                  | 1  | počet listů |
| Další doklady dle přehledu dokladů          | 59 | počet listů |

Paré č.

Příjemce

|   |                                         |
|---|-----------------------------------------|
| 1 | Objednatel                              |
| 2 | Zhotovitel                              |
| 3 | Projektant (AD)                         |
| 4 | Stavební dozor                          |
| 5 | Supervize (Regionální dotační kancelář) |

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

**Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / betonová svodidla**

V PDPS v úseku km 13,720-14,140 SO 102 se uvažovalo pouze s demontáží stávajících betonových svodidel a jejich zpětnou montáží po zřízení nových konstrukčních vrstev vozovky. Při demontáži stávajících betonových svodidel se ukázalo značné opotřebení hlavně ve spojích a po odstranění nánosů ze stávající pravé krajnice i nedostatečná šíře pravé poloviny vozovky (PDPS uvažovalo 4,25 m od osy, skutečnost 3,75 m a lokálně i 3,60 m). Zároveň bylo zjištěno, že přilehlý skalní masiv za pravou krajnicí není "dostatečně hladký a proto po dohodě s projektantem RDS (příl. č. 8), AD (příl. č. 11) a objednatelem (příl. č. 16) bylo dohodnuto následující. Stávající betonová svodidla nahradit novými betonovými jednostrannými výšky 1,2 m podél celého přilehlého masivu a tím eliminovat nebezpečí boční překážky. Tento úsek je rozdělen na dva úseky, délky 124 m a 84 m (propojen v prostoru nové HV ocelovým svodidlem délky 9 m s přesahy). Pod novým betonovým svodidlem je navrženo provést novou betonovou desku šíře 1,5 m tl. 0,20 m, která spočívá na ŠD podsypu. U HV v km 13,892 bylo provedeno zpevnění odlážděním ze žulových kostek do betonového lože a zakončeno podél hrany vozovky betonovou palisádou. Změna se týká pol. č. 63, 64, 93, 104, 119, 121-123, 126-129, a nových pol. č. 130, 140 141, 159-172.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle § 5, odst.1 písm. c), resp. podle § 10 Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazena do **skupiny 3** jako změna z nepředvídaných důvodů. Zároveň se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a to z důvodu nepředvídaných fyzických podmínek vzniklých na stavbě v průběhu realizace a hodnota těchto dodatečných stavebních prací nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku.

|                                  |                                 |                                                         |                                                          |
|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Údaje v Kč bez DPH:              |                                 |                                                         |                                                          |
| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem | Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných |
| 0,00                             | 1 530 172,61                    | 1 530 172,61                                            | 1 530 172,61                                             |

|                             |       |                      |       |        |
|-----------------------------|-------|----------------------|-------|--------|
| Technická pomoc Objednatele | jméno | Ing. Lubomír Smetana | datum | podpis |
|-----------------------------|-------|----------------------|-------|--------|

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

|                                          |       |                  |       |        |
|------------------------------------------|-------|------------------|-------|--------|
| Zhotovitel (stavbyvedoucí): STRABAG a.s. | jméno | Ing. Karel Šimek | datum | podpis |
|------------------------------------------|-------|------------------|-------|--------|

|                                                   |       |                     |       |        |
|---------------------------------------------------|-------|---------------------|-------|--------|
| Projektant (autorský dozor): Pontex, spol. s.r.o. | jméno | Ing. David Dvořáček | datum | podpis |
|---------------------------------------------------|-------|---------------------|-------|--------|

|                                     |       |                  |       |        |
|-------------------------------------|-------|------------------|-------|--------|
| Stavební dozor: Pragoprojekt, a. s. | jméno | Miroslav Valenta | datum | podpis |
|-------------------------------------|-------|------------------|-------|--------|

|                                         |       |  |       |        |
|-----------------------------------------|-------|--|-------|--------|
| Supervize (Regionální dotační kancelář) | jméno |  | datum | podpis |
|-----------------------------------------|-------|--|-------|--------|

|                               |       |                  |       |        |
|-------------------------------|-------|------------------|-------|--------|
| Zástupce Objednatele: KSÚS SK | jméno | Ing. Milan Peška | datum | podpis |
|-------------------------------|-------|------------------|-------|--------|

|                                                           |       |                        |       |        |
|-----------------------------------------------------------|-------|------------------------|-------|--------|
| Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny | jméno | Ing. Jaroslava Jurková | datum | podpis |
|-----------------------------------------------------------|-------|------------------------|-------|--------|

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

|                                          |       |                       |       |        |
|------------------------------------------|-------|-----------------------|-------|--------|
| Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) | jméno | Ing. Jan Fidler, DiS. | datum | podpis |
|------------------------------------------|-------|-----------------------|-------|--------|

|            |       |                                        |       |        |
|------------|-------|----------------------------------------|-------|--------|
| Zhotovitel | jméno | Ing. Martin Bašár<br>Ing. Karel Klofáč | datum | podpis |
|------------|-------|----------------------------------------|-------|--------|

|  |             |
|--|-------------|
|  | Číslo paré: |
|--|-------------|

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 38

|                                                      |                                                               |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Název Stavby:                                        | II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II |
| Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:                     | 102/13                                                        |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): | Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice                       |

Údaje v Kč bez DPH

|                        |
|------------------------|
| Cena SO/PS dle Smlouvy |
| 1 - zadat              |
| 113 362 946,56         |

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

|                         | Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena SO/PS po všech předchozích Změnách | Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 2                       | 3 - zadat                                                | 4 - zadat                                               | 5=1+3+4                                 | 6=5-1                                                       |
| stavební/montážní práce | -6 715 953,90                                            | 18 330 101,17                                           | 124 977 093,83                          | 11 614 147,27                                               |

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

|                         | Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS | Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS | Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 7                       | 8 - zadat                                 | 9 - zadat                                | 10=4+9                                                         | 11=10/1                                                        |
| stavební/montážní práce | 0,00                                      | 1 530 172,61                             | 19 860 273,78                                                  | 17,52%                                                         |

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

|                         | Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena SO/PS po této Změně | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 12                      | 13=3+8                                                          | 14=1+13+10               | 15=14-1                                                       | 16=15/1                                                           |
| stavební/montážní práce | -6 715 953,90                                                   | 126 507 266,44           | 13 144 319,88                                                 | 11,59%                                                            |

| Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo 38                                                                                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                                                                 |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II<br>Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice<br>Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice |             |                                                                                                                                                                                                 |      |                     |                   |                  |                   | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                                                                                 |      |                     |                   |                  |                   | 102                         |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                                                                                 |      |                     |                   |                  |                   | Skupina změn 3              |                    |                   |                           |                        |                      |
| Poř. č. pol.                                                                                                                                                                                                                                       | Kód položky | Název položky                                                                                                                                                                                   | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                  | 2           | 3                                                                                                                                                                                               | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                 | 11                | 12                        | 13                     | 14                   |
| 63                                                                                                                                                                                                                                                 | 911331135   | Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti H1 typ KB1 RH1 V se zabíraním sloupků v rozmezí do 4 m                                                                                                 | M    | 2 740,000           | 2 749,000         | 9,000            | 1 093,82          | 2 997 066,80                | 0,00               | 9 844,38          | 3 006 911,18              | 9 844,38               | 0,33%                |
| 64                                                                                                                                                                                                                                                 | 911381124   | Silniční svodidlo betonové jednostranné průběžné délky 4 m výšky 1,2 m                                                                                                                          | M    | 48,000              | 208,000           | 160,000          | 5 181,24          | 248 699,52                  | 0,00               | 828 998,40        | 1 077 697,92              | 828 998,40             | 333,33%              |
| 93                                                                                                                                                                                                                                                 | 59217031    | obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm                                                                                                                                                     | M    | 46,000              | 70,000            | 24,000           | 135,29            | 6 223,34                    | 0,00               | 3 246,96          | 9 470,30                  | 3 246,96               | 0,00%                |
| 104                                                                                                                                                                                                                                                | 919732221   | Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání                                                                                             | M    | 4 826,200           | 5 034,200         | 208,000          | 116,82            | 563 796,68                  | 0,00               | 24 298,56         | 588 095,24                | 24 298,56              | 4,31%                |
| 119                                                                                                                                                                                                                                                | 997221551   | Vodorovná doprava sutí ze sybkých materiálů do 1 km                                                                                                                                             | T    | 3 197,830           | 3 369,614         | 171,784          | 13,82             | 44 194,01                   | 0,00               | 2 374,05          | 46 568,06                 | 2 374,05               | 5,37%                |
| 121                                                                                                                                                                                                                                                | 997221559   | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sybkých materiálů                                                                                                                                | T    | 79 690,604          | 82 095,580        | 2 404,976        | 7,03              | 560 224,95                  | 0,00               | 16 906,98         | 577 131,93                | 16 906,98              | 3,02%                |
| 122                                                                                                                                                                                                                                                | 997221561   | Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km                                                                                                                                             | T    | 11 138,845          | 11 239,165        | 100,320          | 27,06             | 301 417,15                  | 0,00               | 2 714,66          | 304 131,81                | 2 714,66               | 0,90%                |
| 123                                                                                                                                                                                                                                                | 997221569   | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů                                                                                                                                | T    | 155 943,830         | 156 837,590       | 893,760          | 0,58              | 90 447,42                   | 0,00               | 518,38            | 90 965,80                 | 518,38                 | 0,57%                |
| 126                                                                                                                                                                                                                                                | 997221815   | Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)                                                                                                                                   | T    | 10 352,419          | 10 416,259        | 63,840           | 34,54             | 357 572,55                  | 0,00               | 2 205,03          | 359 777,58                | 2 205,03               | 0,62%                |
| 127                                                                                                                                                                                                                                                | 997221855   | Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)                                                                                                                                   | T    | 3 197,830           | 3 369,614         | 171,784          | 34,54             | 110 453,05                  | 0,00               | 5 933,41          | 116 386,46                | 5 933,41               | 5,37%                |
| 128                                                                                                                                                                                                                                                | 998225111   | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným                                                                                                      | T    | 5 047,476           | 5 220,856         | 173,380          | 147,76            | 745 815,05                  | 0,00               | 25 618,63         | 771 433,68                | 25 618,63              | 3,43%                |
| 129                                                                                                                                                                                                                                                | 998225194   | Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m                                                                                                | T    | 5 047,476           | 5 220,856         | 173,380          | 29,55             | 149 152,92                  | 0,00               | 5 123,38          | 154 276,30                | 5 123,38               | 3,43%                |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |             | NOVÉ POLOŽKY                                                                                                                                                                                    |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 130                                                                                                                                                                                                                                                | 12002000    | Geodetické práce - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ                                                                                                                                                          | Kč   | 0,000               | 7 717,175         | 7 717,175        | 1,00              | 0,00                        | 0,00               | 7 717,17          | 7 717,17                  | 7 717,17               | 100,00%              |
| 140                                                                                                                                                                                                                                                | 451319777   | Podklad nebo lože pod dlažbu příplatek k cenám za každých dalších i započatých 100 mm podkladu nebo lože z betonu prostého                                                                      | M2   | 0,000               | 15,000            | 15,000           | 30,40             | 0,00                        | 0,00               | 456,00            | 456,00                    | 456,00                 | 100,00%              |
| 141                                                                                                                                                                                                                                                | 591141111   | Kladení dlažby z kostek velkých z kamene, do lože z cementové malty s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici | M2   | 0,000               | 15,000            | 15,000           | 608,00            | 0,00                        | 0,00               | 9 120,00          | 9 120,00                  | 9 120,00               | 100,00%              |
| 159                                                                                                                                                                                                                                                | 113107223   | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm                                                                                                                                   | M2   | 0,000               | 315,000           | 315,000          | 64,80             | 0,00                        | 0,00               | 20 412,00         | 20 412,00                 | 20 412,00              | 100,00%              |
| 160                                                                                                                                                                                                                                                | 132151101   | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně                                                                                       | M3   | 0,000               | 0,900             | 0,900            | 585,00            | 0,00                        | 0,00               | 526,50            | 526,50                    | 526,50                 | 100,00%              |
| 161                                                                                                                                                                                                                                                | 339921112   | Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivě výšky prvku přes 0,5 do 1m                                                                                                        | kus  | 0,000               | 75,000            | 75,000           | 216,00            | 0,00                        | 0,00               | 16 200,00         | 16 200,00                 | 16 200,00              | 100,00%              |
| 162                                                                                                                                                                                                                                                | 273313911   | Základové desky z betonu tř. C 30/37                                                                                                                                                            | M3   | 0,000               | 47,250            | 47,250           | 4 180,00          | 0,00                        | 0,00               | 197 505,00        | 197 505,00                | 197 505,00             | 100,00%              |
| 163                                                                                                                                                                                                                                                | 273351121   | Zřízení bednění základových desek                                                                                                                                                               | M2   | 0,000               | 63,900            | 63,900           | 560,00            | 0,00                        | 0,00               | 35 784,00         | 35 784,00                 | 35 784,00              | 100,00%              |
| 164                                                                                                                                                                                                                                                | 273351122   | Odstranění bednění základových desek                                                                                                                                                            | M2   | 0,000               | 63,900            | 63,900           | 138,00            | 0,00                        | 0,00               | 8 818,20          | 8 818,20                  | 8 818,20               | 100,00%              |
| 165                                                                                                                                                                                                                                                | 564841112   | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 130 mm                                                                                                                                           | M2   | 0,000               | 315,000           | 315,000          | 167,00            | 0,00                        | 0,00               | 52 605,00         | 52 605,00                 | 52 605,00              | 100,00%              |
| 170                                                                                                                                                                                                                                                | 564851111   | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm                                                                                                                                             | M2   | 0,000               | 48,000            | 48,000           | 139,52            | 0,00                        | 0,00               | 6 696,96          | 6 696,96                  | 6 696,96               | 100,00%              |
| 166                                                                                                                                                                                                                                                | 59228408    | palisáda betonová tyčová hranatá přírodní 110x110x600mm                                                                                                                                         | KUS  | 0,000               | 75,000            | 75,000           | 181,00            | 0,00                        | 0,00               | 13 575,00         | 13 575,00                 | 13 575,00              | 100,00%              |
| 167                                                                                                                                                                                                                                                | 911381124a  | Silniční svodidlo betonové jednostranné průběžné délky 4 m výšky 1,2 m montáž s přesunem (bez dodávky)                                                                                          | M    | 0,000               | 48,000            | 48,000           | 1 381,67          | 0,00                        | 0,00               | 66 320,16         | 66 320,16                 | 66 320,16              | 100,00%              |
| 168                                                                                                                                                                                                                                                | 911381824   | Odstranění silničního betonového svodidla délky 4 m výšky 1,2 m                                                                                                                                 | M    | 0,000               | 132,000           | 132,000          | 939,00            | 0,00                        | 0,00               | 123 948,00        | 123 948,00                | 123 948,00             | 100,00%              |
| 171                                                                                                                                                                                                                                                | 58381008    | kostka štípaná dlažební žula velká 15/17                                                                                                                                                        | M2   | 0,000               | 16,500            | 16,500           | 1 610,00          | 0,00                        | 0,00               | 26 565,00         | 26 565,00                 | 26 565,00              | 100,00%              |
| 172                                                                                                                                                                                                                                                | 919735111   | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm                                                                                                                                                  | M    | 0,000               | 208,000           | 208,00           | 77,60             | 0,00                        | 0,00               | 16 140,80         | 16 140,80                 | 16 140,80              | 100,00%              |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |             | Celkem                                                                                                                                                                                          |      |                     |                   |                  |                   | 6 175 063,44                | 0,00               | 1 530 172,61      | 7 705 236,05              | 1 530 172,61           | 24,78%               |

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.  
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Karel Šimek, (vedoucí projektu)

Za Objednatele: Miroslav Valenta, (TDI)

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:



PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

|                                                                                               |                                                                                            |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Název a evidenční číslo Stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II |                                                                                            |                |
| 1                                                                                             | Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH                                                   | 377 812 002,59 |
| 2=1+19+20                                                                                     | Aktuální smluvní částka (cena stavby)                                                      | 394 620 137,74 |
|                                                                                               | Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH                                           | 477 490 366,67 |
| 3=(2/1)*100                                                                                   | Procento změny Přijaté smluvní částky                                                      | 104,45%        |
| 4=(25/1)*100                                                                                  | Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)                                                     | 0,00%          |
| 5=(28/1)*100                                                                                  | Sledování změny položek (Skupina 2)                                                        | 0,00%          |
| 40=(19/1)*100                                                                                 | Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b) | -5,25%         |

|             |                                                           |                |
|-------------|-----------------------------------------------------------|----------------|
| 6=32+36     | Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4 | 17 570 402,50  |
| 7=(6/1)*100 | Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4      | 4,65%          |
| 8=1*0,3     | Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4              | 113 343 600,78 |

|                |                                                                                  |                |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 9=(32A/1)*100  | Sledování limitu 50 % Skupina 3                                                  | 12,66%         |
| 10=(36A/1)*100 | Sledování limitu 50 % Skupina 4                                                  | 1,24%          |
| 10A=32A+36A    | Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4 | 52 504 331,66  |
| 11=1*0,5       | Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4                                     | 188 906 001,30 |

|                 |                                 |                |
|-----------------|---------------------------------|----------------|
| 12=(37/1)*100   | Sledování limitu (15%)          | 1,05%          |
| 13=37           | Sledování limitu 137 366 000 Kč | 3 998 392,61   |
| 14=137366000-37 |                                 | 133 367 607,39 |

| 40=(19/1)*100 |        |                                                                                                                              |                                            |                      |                | Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b) |              |                                     | -5,25%                                                     |              |                                     |                                                                |               |                                     |                                                        |                                                            |              |                                     |                                                        |                                                   |               |
|---------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|
|               |        |                                                                                                                              |                                            |                      |                | - 1 -                                                                                      |              |                                     | - 2 -                                                      |              |                                     | - 3 -                                                          |               |                                     |                                                        | - 4 -                                                      |              |                                     |                                                        | - 5 -                                             |               |
|               |        |                                                                                                                              |                                            |                      |                | Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)                                |              |                                     | Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.) |              |                                     | Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.) |               |                                     |                                                        | Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.) |              |                                     |                                                        | Změny de minimis                                  |               |
| SO            | ZBV č. | Název SO/PS / předmět Změny                                                                                                  | Změny záporné (žadávat se znaménkem minus) | Změny kladné         | Hodnota ZBV    | Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)                                                 | Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)                 | Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)                     | Změny kladné  | Suma Změn záporných a Změn kladných | Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných | Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)                 | Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných | Změny de minimus (15% nebo limit 137 366 000,- Kč | limit 15 %    |
| 16            | 17     | 18                                                                                                                           | 19=23+26+29+33                             | 20=24+27+30+34+37+39 | 21=19+20       | 23                                                                                         | 24           | 25=23+24                            | 26                                                         | 27           | 28=26+27                            | 29                                                             | 30            | 32=29+30                            | 32A=ABS(29)+30                                         | 33                                                         | 34           | 36=33+34                            | 36A=ABS(33)+34                                         | 37                                                | 38=(37/1)*100 |
|               |        | II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II                                                                | - 19 847 294,56                            | 36 655 429,71        | 16 808 135,15  | 0,00                                                                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00                                | - 17 404 410,90                                                | 30 423 289,40 | 13 018 878,50                       | 47 827 700,30                                          | - 62 553,68                                                | 4 614 077,68 | 4 551 524,00                        | 4 676 631,36                                           | 3 998 392,61                                      | 1,05%         |
| 103           | 1      | Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / úprava poklopů a vodoznaků                                                      | 0,00                                       | 124 942,66           | 124 942,66     | 0,00                                                                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                           | 0,00          | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                                       | 124 942,66   | 124 942,66                          | 124 942,66                                             | 0,00                                              | 0,00%         |
| 103/2         | 2      | Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / přeložka vodovodní přípojky km 14,815-14,895, kolize s kabelem CETIN            | 0,00                                       | 158 202,22           | 158 202,22     | 0,00                                                                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                           | 158 202,22    | 158 202,22                          | 158 202,22                                             | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                              | 0,00%         |
| 103/3         | 3      | Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / odstranění žulových kostek                                                      | - 147 928,60                               | 470 739,23           | 322 810,63     | 0,00                                                                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00                                | - 147 928,60                                                   | 470 739,23    | 322 810,63                          | 618 667,83                                             | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                              | 0,00%         |
| 103/4         | 4      | Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / oprava objízdné trasy Masečín                                                   | 0,00                                       | 514 671,37           | 514 671,37     | 0,00                                                                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                           | 0,00          | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                                       | 514 671,37   | 514 671,37                          | 514 671,37                                             | 0,00                                              | 0,00%         |
| 103/5         | 5      | Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / kolize kabelů s kanalizací a novým profilem vozovky                             | 0,00                                       | 1 072 447,19         | 1 072 447,19   | 0,00                                                                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                           | 1 072 447,19  | 1 072 447,19                        | 1 072 447,19                                           | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                              | 0,00%         |
| 102           | 6      | Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / zvýšené množství odstraňování křovin                                               | - 62 553,68                                | 2 301 662,61         | 2 239 108,93   | 0,00                                                                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                           | 0,00          | 0,00                                | 0,00                                                   | - 62 553,68                                                | 2 301 662,61 | 2 239 108,93                        | 2 364 216,29                                           | 0,00                                              | 0,00%         |
| 901           | 7      | Provizorní most přes Kočábu / změna založení mostního provizoria                                                             | - 535 759,98                               | 1 068 988,13         | 533 228,15     | 0,00                                                                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                           | 0,00          | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                   | 1 604 748,11                                      | 0,42%         |
| 207           | 8      | Most ev.č.102-017 / Zajištění skálního svahu                                                                                 | 0,00                                       | 728 985,00           | 728 985,00     | 0,00                                                                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                           | 728 985,00    | 728 985,00                          | 728 985,00                                             | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                              | 0,00%         |
| 207/2         | 9      | Most ev.č.102-017 / odstranění vrstvy žulových kostek + podkladní vrstva pod OP1                                             | 0,00                                       | 75 186,27            | 75 186,27      | 0,00                                                                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                           | 75 186,27     | 75 186,27                           | 75 186,27                                              | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                              | 0,00%         |
| 102/2         | 10     | Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice/ frézování a doplnění konstrukčních vrstev vozovky                                   | 0,00                                       | 43 669,94            | 43 669,94      | 0,00                                                                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                           | 0,00          | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                                       | 43 669,94    | 43 669,94                           | 43 669,94                                              | 0,00                                              | 0,00%         |
| 103/6         | 11     | Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi / předláždění chodníků, obruby, úprava plotové zídky u křižovatky Hlavní a Školní | 0,00                                       | 671 285,54           | 671 285,54     | 0,00                                                                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                           | 0,00          | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                                       | 671 285,54   | 671 285,54                          | 671 285,54                                             | 0,00                                              | 0,00%         |
| 102/3         | 12     | Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / odvodňovací proužek                                                                | - 1 844 570,00                             | 549 074,50           | - 1 295 495,50 | 0,00                                                                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00                                |                                                                |               | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                   | 2 393 644,50                                      | 0,63%         |
| 102/4         | 13     | Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / Úprava svahu dlažbou z lomového kamene km 10,360-10,840 L.S.                       | 0,00                                       | 5 693 724,53         | 5 693 724,53   | 0,00                                                                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                           | 5 693 724,53  | 5 693 724,53                        | 5 693 724,53                                           | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                              | 0,00%         |
| 253           | 14     | Opěrné zdi - Davle - Štěchovice - vlevo / sanace základové spáry v založení SO 253, zeď č. 61 vlevo                          | 0,00                                       | 277 190,48           | 277 190,48     | 0,00                                                                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                           | 277 190,48    | 277 190,48                          | 277 190,48                                             | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                              | 0,00%         |
| 102/5         | 15     | Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / Km 13,200-13,700 svodidlo, krajnice, žulové kostky                                 | 0,00                                       | 881 187,01           | 881 187,01     | 0,00                                                                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                           | 881 187,01    | 881 187,01                          | 881 187,01                                             | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                              | 0,00%         |
| 334           | 16     | Kanalizace ve Štěchovicích / zaslepení nefunkční dešťové kanalizace                                                          | 0,00                                       | 587 837,86           | 587 837,86     | 0,00                                                                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                           | 587 837,86    | 587 837,86                          | 587 837,86                                             | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                              | 0,00%         |
| 102/6         | 17     | Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice /Změna množství odřezovaných vrstev AB                                               | - 784 390,50                               | 1 450 696,44         | 666 305,94     | 0,00                                                                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00                                | - 784 390,50                                                   | 1 450 696,44  | 666 305,94                          | 2 235 086,94                                           | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                              | 0,00%         |
| 334/2         | 18     | Kanalizace ve Štěchovicích / Kolize s kabelem ČEZ                                                                            | 0,00                                       | 39 769,75            | 39 769,75      | 0,00                                                                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                           | 39 769,75     | 39 769,75                           | 39 769,75                                              | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                              | 0,00%         |
| 204           | 19     | Most ev.č. 102-012 / Změna spodní stavby, dobetonávky k původním opěrám                                                      | - 13 158,52                                | 158 423,56           | 145 265,04     | 0,00                                                                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00                                | - 13 158,52                                                    | 158 423,56    | 145 265,04                          | 171 582,08                                             | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                              | 0,00%         |
| 102/7         | 20     | Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / Úprava v kraji vozovky km 13,15-13,202 vlevo                                       | 0,00                                       | 210 681,35           | 210 681,35     | 0,00                                                                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                           | 210 681,35    | 210 681,35                          | 210 681,35                                             | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                              | 0,00%         |
| 102/8         | 21     | Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / Změna tloušťek AB vrstev                                                           | - 685 017,85                               | 2 326 749,68         | 1 641 731,83   | 0,00                                                                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00                                | - 685 017,85                                                   | 2 326 749,68  | 1 641 731,83                        | 3 011 767,53                                           | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                              | 0,00          |
| 334/3         | 22     | Kanalizace ve Štěchovicích / Štěrbínové žlaby, vpusti, žlaby                                                                 | - 848 332,68                               | 893 335,27           | 45 002,59      | 0,00                                                                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00                                | - 848 332,68                                                   | 893 335,27    | 45 002,59                           | 1 741 667,95                                           | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                              | 0,00          |
| 102/9         | 23     | Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / Změna podkladní vrstvy                                                             | - 3 315 045,75                             | 4 872 115,58         | 1 557 069,83   | 0,00                                                                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00                                | - 3 315 045,75                                                 | 4 872 115,58  | 1 557 069,83                        | 8 187 161,33                                           | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                              | 0,00          |
| 103/7         | 24     | Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / Ochrana proti ostřiků                                                           | 0,00                                       | 386 957,63           | 386 957,63     | 0,00                                                                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                           | 386 957,63    | 386 957,63                          | 386 957,63                                             | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                              | 0,00          |
| 253/2         | 25     | Opěrné zdi - Davle - Štěchovice - vlevo / změna zatížení hornin                                                              | - 11 482 675,35                            | 4 065 440,24         | - 7 417 235,11 | 0,00                                                                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00                                | - 11 482 675,35                                                | 4 065 440,24  | - 7 417 235,11                      | 15 548 115,59                                          | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                              | 0,00          |
| 102/10        | 26     | Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / zvýšené množství odstraňování křovin                                               | 0,00                                       | 893 825,06           | 893 825,06     | 0,00                                                                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                           | 0,00          | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                                       | 893 825,06   | 893 825,06                          | 893 825,06                                             | 0,00                                              | 0,00          |
| 102/11        | 27     | Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / lokální opravy CB desek                                                            | 0,00                                       | 439 876,30           | 439 876,30     | 0,00                                                                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                           | 439 876,30    | 439 876,30                          | 439 876,30                                             | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                              | 0,00          |
| 103/8         | 28     | Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / úpravy v km 14,915, 14,950 a 15,070                                             | 0,00                                       | 337 421,30           | 337 421,30     | 0,00                                                                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                           | 337 421,30    | 337 421,30                          | 337 421,30                                             | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                              | 0,00          |
| 000/1         | 29     | Vedlejší a ostatní náklady/ RDS vypracování změn                                                                             | 0,00                                       | 1 879 064,84         | 1 879 064,84   | 0,00                                                                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                           | 1 879 064,84  | 1 879 064,84                        | 1 879 064,84                                           | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                              | 0,00          |
| 331/1         | 30     | Přeložka kanalizace u mostu 102-012/ doplnění šoupátek                                                                       | 0,00                                       | 41 604,72            | 41 604,72      | 0,00                                                                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                           | 41 604,72     | 41 604,72                           | 41 604,72                                              | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                              | 0,00          |
| 332/1         | 31     | Přeložka kanalizace u mostu 102-013 / doplnění šoupátek                                                                      | 0,00                                       | 41 604,72            | 41 604,72      | 0,00                                                                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                           | 41 604,72     | 41 604,72                           | 41 604,72                                              | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                              | 0,00          |
| 333/1         | 32     | Přeložka kanalizace u mostu 102-014 / doplnění šoupátek                                                                      | 0,00                                       | 41 604,72            | 41 604,72      | 0,00                                                                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                           | 41 604,72     | 41 604,72                           | 41 604,72                                              | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                              | 0,00          |
| 341/1         | 33     | Přeložka vodovodu u mostu 102-012 / doplnění šoupátek                                                                        | - 13 643,95                                | 26 030,02            | 12 386,07      | 0,00                                                                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00                                | - 13 643,95                                                    | 26 030,02     | 12 386,07                           | 39 673,97                                              | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                              | 0,00          |
| 342/1         | 34     | Přeložka vodovodu u mostu 102-013 / doplnění šoupátek                                                                        | - 13 643,95                                | 26 030,02            | 12 386,07      | 0,00                                                                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00                                | - 13 643,95                                                    | 26 030,02     | 12 386,07                           | 39 673,97                                              | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                              | 0,00          |



|         |    |                                                                                           |             |              |              |      |      |      |      |      |      |             |              |              |              |      |           |           |           |      |      |
|---------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|-------------|--------------|--------------|--------------|------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| 343/1   | 35 | Přeložka vodovodu u mostu 102-014 / doplnění šoupátek                                     | - 13 643,95 | 26 030,02    | 12 386,07    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 13 643,95 | 26 030,02    | 12 386,07    | 39 673,97    | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 181.2/1 | 36 | Přechodné dopravní značení / posunutí semaforu                                            | 0,00        | 64 020,50    | 64 020,50    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 64 020,50 | 64 020,50 | 64 020,50 | 0,00 | 0,00 |
| 102/12  | 37 | Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / lokální opravy CB desek SAL, zábradlí propustek | - 86 929,80 | 1 684 180,84 | 1 597 251,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 86 929,80 | 1 684 180,84 | 1 597 251,04 | 1 771 110,64 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 102/13  | 38 | Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / betonová svodidla                               | 0,00        | 1 530 172,61 | 1 530 172,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 1 530 172,61 | 1 530 172,61 | 1 530 172,61 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|         | 39 |                                                                                           | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|         | 40 |                                                                                           | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |

Přehled dalších dokladů

|                                                        |                                                               |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Číslo ZBV:                                             | 38                                                            |
| Název a evidenční číslo stavby:                        | II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II |
| Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS): | Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice                       |
| Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:                       | 102/13                                                        |

| Doklad                                                | Součást dokumentace ZBV |              |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|
|                                                       | ANO<br>(počet listů)    | NE - Uloženo |
| 07 Změnový soupis prací SO 102 po změně 13 pro ZBV 38 | 25                      |              |
| 08 Oznámení zhotovitele o nové skutečnosti            | 1                       |              |
| 09 Stanovisko KSÚSSK a pokyn ke zpracování ZBV        | 1                       |              |
| 10 Stanovisko projektanta RDS                         | 4                       |              |
| 11 Vyjádření AD č. 61                                 | 1                       |              |
| 12 Geodetické protokoly                               | 2                       |              |
| 13 Fotodokumentace                                    | 2                       |              |
| 14 Listy SD                                           | 11                      |              |
| 15 Faktura - pamětní deska                            | 2                       |              |
| 16 Vyjádření objednatele k likvidaci svodidel         | 1                       |              |
| 17 Zápis Ing. Klofáče do obch. Rejstříku              | 2                       |              |
| 18 Zápis Ing. Bašára do obch. rejstříku               | 6                       |              |
| 19 Stanovisko TDS                                     | 1                       |              |
|                                                       |                         |              |
|                                                       |                         |              |
|                                                       |                         |              |
|                                                       |                         |              |
| Počet listů celkem                                    | 59                      |              |













[illegible]



| Změnový soupis prací SO 102 po změně 13 pro ZBV 38                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                     |                   |                  |                   | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) |                    |                   |                           |                        |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II<br>Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice<br>Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                     |                   |                  |                   | 102                         |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                     |                   |                  |                   | Celkem                      |                    |                   |                           |                        |                      |
| Poř. č. pol.                                                                                                                                                                                                                                       | Kód položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                 | 11                | 12                        | 13                     | 14                   |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                 | 182201101   | Svahování násypů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M2   | 2 350,000           | 3 201,200         | 851,200          | 43,01             | 101 073,50                  | 0,00               | 36 610,11         | 137 683,61                | 36 610,11              | 36,22%               |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |             | Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |             | SoD<br>(420+50)*5 zřízení svahových stupňů v km 11,720 - 12,140 2350 v km 12,030 - 12,080 - délka x odhad prům. šířky ve svahu=2 350,000 [A]<br><br>ZBV č. 13<br>dle geodetického zaměření<br>km 10,360 - 10,422 111,9 m2=111,900 [A]<br>km 10,422 - 10,454 48,7 m2=48,700 [B]<br>km 10,455 - 10,476 44,9 m2 =44,900 [C]<br>km 10,480 - 10,654 369,6 m2=369,600 [D]<br>km 10,706 - 10,730 41,4 m2=41,400 [E]<br>km 10,730 - 10,840 234,7 m2=234,700 [F]<br>A+B+C+D+F=851 200 [G] |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                 | 182301132   | Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M2   | 11 345,000          | 11 345,000        | 0,000            | 36,89             | 418 517,05                  | 0,00               | 0,00              | 418 517,05                | 0,00                   | 0,00%                |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |             | Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |             | SoD<br>490*5.0 délka dle situace x odhad šířky - úprava svahu typu 2450=2 450,000 [A]<br>910*3.0*2 délka dle situace x odhad šířky x na obou stranách - úprava svahu typu B2=5 460,000 [B]<br>4580*1.5*0.5 délka trasy x odhadnutá šířka ohumusování x odhad 50 %=3 435,000 [C]<br>Celkem: 2450+5460+3435=11 345,000 [D]                                                                                                                                                         |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                 | 183405211   | Výsev travníku hydroosevem na ornici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M2   | 11 345,000          | 11 345,000        | 0,000            | 20,49             | 232 459,05                  | 0,00               | 0,00              | 232 459,05                | 0,00                   | 0,00%                |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                 | 005724740   | osivo směs travní krajinná - svahová                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | KG   | 283,625             | 283,625           | 0,000            | 155,44            | 44 086,67                   | 0,00               | 0,00              | 44 086,67                 | 0,00                   | 0,00%                |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                 | 184802631   | Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko ve svahu do 1:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M2   | 11 345,000          | 11 345,000        | 0,000            | 4,26              | 48 329,70                   | 0,00               | 0,00              | 48 329,70                 | 0,00                   | 0,00%                |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |             | Chemické odplevelení po založení kultury na svahu přes 1:2 do 1:1 postřikem na široko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                 | 185803113   | Ošetření travníku shrabáním ve svahu do 1:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M2   | 11 345,000          | 11 345,000        | 0,000            | 4,61              | 52 300,45                   | 0,00               | 0,00              | 52 300,45                 | 0,00                   | 0,00%                |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |             | Ošetření travníku jednorázové na svahu přes 1:2 do 1:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                 | 185804312   | Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M3   | 340,350             | 340,350           | 0,000            | 556,12            | 189 275,44                  | 0,00               | 0,00              | 189 275,44                | 0,00                   | 0,00%                |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |             | Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |             | SoD<br>11345.000*0.01*3=340,350 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |             | 2 Zakládání                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                 | 213221111   | Ochranná vrstva na základové spáře z bet. prost. se zvýš. nároky na prostředí C 25/30 tl do 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M3   | 16,530              | 16,530            | 0,000            | 3 321,98          | 54 912,33                   | 0,00               | 0,00              | 54 912,33                 | 0,00                   | 0,00%                |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |             | Ochranná vrstva na základové spáře z prostého betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 tl. do 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |             | SoD<br>1.7*3.0*0.30 Betonové lože C25/30-XF3 pod stupně z lomového kamene u propustku v km 12,925=1,530 [A]<br>2.5*20.0*0.3 betonové lože C25/30-XF3 pod propustkem=15,000 [B]<br>Celkem: 1.53+15=16,530 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |             | 4 Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                 | 451317777   | Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M2   | 5 223,400           | 6 074,600         | 851,200          | 581,54            | 3 037 616,04                | 0,00               | 495 006,85        | 3 532 622,89              | 495 006,85             | 16,30%               |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |             | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |             | ZBV č. 13<br>dle geodetického zaměření<br>km 10,360 - 10,422 111,9 m2=111,900 [A]<br>km 10,422 - 10,454 48,7 m2=48,700 [B]<br>km 10,455 - 10,476 44,9 m2 =44,900 [C]<br>km 10,480 - 10,654 369,6 m2=369,600 [D]<br>km 10,706 - 10,730 41,4 m2=41,400 [E]<br>km 10,730 - 10,840 234,7 m2=234,700 [F]<br>A+B+C+D+E+F=851,200 [G]                                                                                                                                                   |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |















| Změnový soupis prací SO 102 po změně 13 pro ZBV 38                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                     |                   |                  |                   | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) |                    |                   |                           |                        |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II<br>Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice<br>Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice |             |                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                     |                   |                  |                   | 102                         |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                     |                   |                  |                   | Celkem                      |                    |                   |                           |                        |                      |
| Poř. č. pol.                                                                                                                                                                                                                                       | Kód položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                         | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                 | 11                | 12                        | 13                     | 14                   |
| 61                                                                                                                                                                                                                                                 | 911121111   | Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu                                                                                                                                                                                                   | M    | 10,000              | 0,000             | -10,000          | 863,54            | 8 635,40                    | -8 635,40          | 0,00              | 0,00                      | -8 635,40              | -100,00%             |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |             | ZBV č. 37<br>neprovádělo se                                                                                                                                                                                                                                           |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 63                                                                                                                                                                                                                                                 | 911331135   | Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti H1 typ KB1 RH1 V se zabíraním sloupků v rozmezí do 4 m                                                                                                                                                                       | M    | 2 740,000           | 2 749,000         | 9,000            | 1 093,82          | 2 997 066,80                | 0,00               | 9 844,38          | 3 006 911,18              | 9 844,38               | 0,33%                |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |             | Silniční svodidlo s osazením sloupků zabíraním ocelové úroveň zádržnosti H1 vzdálenosti sloupků přes 2 do 4 m jednostranné [KB1 RH1 V]                                                                                                                                |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |             | SoD<br>150+120+26+70 vpravo - dle situace + u benzinky=366,000 [A]<br>2374 vlevo - výměna stávajícího svodidla=2 374,000 [B]<br>Celkem: 366+2374=2 740,000 [C]<br><br>ZBV č. 38<br>geodetický protokol Š II 39/2023<br>km 13,887-13,896 v pravo včetně přesahů<br>9=9 |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 64                                                                                                                                                                                                                                                 | 911381124   | Silniční svodidlo betonové jednostranné průběžné délky 4 m výšky 1,2 m                                                                                                                                                                                                | M    | 48,000              | 208,000           | 160,000          | 5 181,24          | 248 699,52                  | 0,00               | 828 998,40        | 1 077 697,92              | 828 998,40             | 333,33%              |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |             | SoD<br>24+24=48,000 [A]<br><br>ZBV č. 38<br>geodetický protokol Š II 39/2023<br>km 13,764-13,888 vpravo 124 m<br>km 13,895-13,979 vpravo 84 m<br>124+84=208<br>odpočet původního množství -48<br>208-48=160,00                                                        |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 65                                                                                                                                                                                                                                                 | 911381813   | Odstranění silničního betonového svodidla délky 2 m výšky 1,0 m                                                                                                                                                                                                       | M    | 24,000              | 24,000            | 0,000            | 2 302,78          | 55 266,72                   | 0,00               | 0,00              | 55 266,72                 | 0,00                   | 0,00%                |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |             | Odstranění silničního betonového svodidla s naložením na dopravní prostředek délky 2 m, výšky 1,0 m                                                                                                                                                                   |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |             | SoD<br>24 dle situace - bude nahrazeno novým beton. svodidlem=24,000 [A]                                                                                                                                                                                              |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 66                                                                                                                                                                                                                                                 | 912211111   | Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu                                                                                                                                                                                  | KUS  | 66,240              | 66,240            | 0,000            | 276,33            | 18 304,10                   | 0,00               | 0,00              | 18 304,10                 | 0,00                   | 0,00%                |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |             | Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložení bez betonového základu silničního                                                                                                                                                                      |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |             | SoD<br>(2880/50)*1.15 km 11,700 - 14,580=66,240 [A]                                                                                                                                                                                                                   |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 68                                                                                                                                                                                                                                                 | 912311111   | Montáž odrazky na ocelové svodidlo                                                                                                                                                                                                                                    | KUS  | 54,800              | 54,800            | 0,000            | 217,61            | 11 925,03                   | 0,00               | 0,00              | 11 925,03                 | 0,00                   | 0,00%                |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |             | SoD<br>2740/50 délka svodidla dle pol. 911331135/odrazky po 50-ti metrech - jen na jedné straně silnice, na druhé straně budou směrové sloupky=54,800 [A]                                                                                                             |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 70                                                                                                                                                                                                                                                 | 912321111   | Montáž odrazky na betonové svodidlo                                                                                                                                                                                                                                   | KUS  | 4,000               | 4,000             | 0,000            | 316,63            | 1 266,52                    | 0,00               | 0,00              | 1 266,52                  | 0,00                   | 0,00%                |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 72                                                                                                                                                                                                                                                 | 914111111   | Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu                                                                                                                                                                                     | KUS  | 5,000               | 5,000             | 0,000            | 609,08            | 3 045,40                    | 0,00               | 0,00              | 3 045,40                  | 0,00                   | 0,00%                |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |             | Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly                                                                                                                                                                            |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |             | SoD<br>2+1+2 2 x Z4a 5 1 x IJ4c + B21a 5 B21b=5,000 [A]                                                                                                                                                                                                               |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 76                                                                                                                                                                                                                                                 | 914511111   | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem                                                                                                                                                                                                  | KUS  | 5,000               | 5,000             | 0,000            | 995,95            | 4 979,75                    | 0,00               | 0,00              | 4 979,75                  | 0,00                   | 0,00%                |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |             | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu                                                                                                                                                                                                 |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 77                                                                                                                                                                                                                                                 | 914511112   | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou                                                                                                                                                                                         | KUS  | 7,000               | 7,000             | 0,000            | 995,95            | 6 971,65                    | 0,00               | 0,00              | 6 971,65                  | 0,00                   | 0,00%                |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |             | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky                                                                                                                                                                                                    |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 78                                                                                                                                                                                                                                                 | 915111111   | Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva                                                                                                                                                                                          | M    | 2 450,000           | 2 450,000         | 0,000            | 13,24             | 32 438,00                   | 0,00               | 0,00              | 32 438,00                 | 0,00                   | 0,00%                |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |             | Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní                                                                                                                                                                            |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |             | SoD<br>2450 V1a - dle situace=2 450,000 [A]                                                                                                                                                                                                                           |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 79                                                                                                                                                                                                                                                 | 915111115   | Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní žlutá barva                                                                                                                                                                                         | M    | 137,000             | 137,000           | 0,000            | 19,57             | 2 681,09                    | 0,00               | 0,00              | 2 681,09                  | 0,00                   | 0,00%                |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |             | Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá žlutá základní                                                                                                                                                                           |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |             | SoD<br>35+38+64 V11a (0,125) - dle situace=137,000 [A]                                                                                                                                                                                                                |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |













[illegible]

[illegible]



[illegible]



[illegible]



[illegible]







| Změnový soupis prací SO 102 po změně 13 pro ZBV 38                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                                                                                                            |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II<br>Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice<br>Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice |             |                                                                                                                                                            |      |                     |                   |                  |                   | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                                            |      |                     |                   |                  |                   | 102                         |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                                            |      |                     |                   |                  |                   | Celkem                      |                    |                   |                           |                        |                      |
| Poř. č. pol.                                                                                                                                                                                                                                       | Kód položky | Název položky                                                                                                                                              | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                  | 2           | 3                                                                                                                                                          | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                 | 11                | 12                        | 13                     | 14                   |
| 168                                                                                                                                                                                                                                                | 911381824   | Odstranění silničního betonového svodidla délky 4 m výšky 1,2 m                                                                                            | M    | 0,000               | 132,000           | 132,000          | 939,00            | 0,00                        | 0,00               | 123 948,00        | 123 948,00                | 123 948,00             | 100,00%              |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |             | URS 2023/1                                                                                                                                                 |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |             | ZBV č. 38<br>geodetický protokol Š II 36/2023<br>km 13,763-13,799 vpravo 36m<br>km 13,843-13,891 vpravo 48m<br>km 14,351-14,399 vpravo 48m<br>36+48+48=132 |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 171                                                                                                                                                                                                                                                | 58381008    | Kostka štípaná dlažební žula velká 15/17                                                                                                                   | M2   | 0,000               | 16,500            | 16,500           | 1 610,00          | 0,00                        | 0,00               | 26 565,00         | 26 565,00                 | 26 565,00              | 100,00%              |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |             | Cena dle URS 2023/1                                                                                                                                        |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |             | ZBV č. 38<br>okolo HV<br>7,5*2*1,1=16,5                                                                                                                    |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 172                                                                                                                                                                                                                                                | 919735111   | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm                                                                                                             | M    | 0,000               | 208,000           | 208,00           | 77,60             | 0,00                        | 0,00               | 16 140,80         | 16 140,80                 | 16 140,80              | 100,00%              |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |             | Cena dle URS 2023/1                                                                                                                                        |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |             | ZBV č. 38<br>nové betonové svodidlo<br>208=208                                                                                                             |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |             | Celkem                                                                                                                                                     |      |                     |                   |                  |                   | 113 362 946,56              | - 6 715 953,91     | 19 860 273,78     | 126 507 266,44            | 13 144 319,88          | 11,59%               |

Položka

Název a evidenční číslo Stavby:

Název stavebního objektu/provozního  
souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

Objednatel:

Zhotovitel:

Skupina změn

Data

II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II

Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

102/13

38

Krajská správa a údržba Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

IČ: 00066001

DIČ: CZ00066001

STRABAG a. s.

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

3

II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II

II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II  
SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice



**PRAGOPROJEKT a.s.**  
**Miroslav Valenta, TDI**  
**K Ryšánce 1668/16**  
**Praha 4**  
**147 54**

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje

Místo a datum odeslání

STECHOVRDS\_010/23

Ing. Ctibor  
mobil:

Praha,  
18.5.2023

**Akce: II/102 hr. hl. m. Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, II. Etapa**

**Věc: Doporučení projektanta RDS č. 21 – nedostatečná šířka pravé poloviny vozovky v km 13,720 -14,140, výměna a doplnění bet. svodidel**

Po odstranění betonových svodidel vpravo v km 13,764 – 13,800, dl. 36 m a km 13,843 – 13,892, dl. 49 m, (celkem 85 m), a násosů z pravé krajnice v km cca km 13,720 – 14,140 bylo zjištěno, že **pravá polovina vozovky nemá oproti očekávání PDPS v tomto úseku šíři 4,25 m**, tak jako v ostatních částech trasy, ale pouze cca 3,75 m, lokálně min. 3,60 m. Dle PDPS měla být v tomto úseku provedena výměna asfaltových vrstev vozovky. Zároveň bylo po odstranění napadané suti ze skály zjištěno, že přilehlý skalní masiv není „dostatečně hladký“. U stávajícího bet. svodidla bylo zjištěno, že není vzájemně spojeno kotvicími prvky a některé díly vykazují různý stupeň poškození. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem navrhuji následující:

1. Stávající bet. svodidlo nahradit **novým betonovým jednostranným výšky 1,2 m v rozsahu podél celého přilehlého skalního masivu**, tj.
  - km 13,7647 – 13,8887, dl. 124 m,
  - km 13,8963 – 13,9803, dl. 84 m, (celkem 208 m)

Oba úseky budou vzájemně propojeny ocelovým svodidlem H1 dl. 7,6 m. (z důvodu umístění horské vpusti). Pod bet. svodidlem bude provedena podkladní bet. deska tl. 0,2 m a šířky 1,5 m viz příloha vzorový příčný řez.

2. Vzhledem k nutnému doplnění bet. svodidla v celém úseku s přilehlým skalním masivem viz bod 1) bude zachována stávající šířka zpevnění a bude provedena konstrukce vozovky v souladu s PDPS. Šířka jízdního pruhu bude 3,5 m rovněž v souladu s PDPS. V kombinaci s doplněnými bet. svodidly není podél skalního masivu dostatečný prostor na rozšíření pravé poloviny vozovky na š. 4,25 m. Při pokládce asf. hutněných směsí bude minimalizován příčný přesah jednotlivých vrstev, tak, aby šířka vozovky v obrusné vrstvě byla maximální (optimálně alespoň 3,75 m). Za hranou zpevnění bude těsně přiléhat podkladní beton pod bet. svodidlo. Vodící čára š. 0,25 m bude umístěna u hrany zpevnění. Viz příloha vzorový příčný řez.



**atelierpromika**  
projektová činnost a řízení

**Atelier PROMIKA s.r.o.**  
Na Pankráci 1062/58, 140 00 Praha 4  
IČ: 26080273, DIČ: CZ26080273

**Na vědomí:**


**zhotovitel: Strabag, Ing. Karel Šimek**

**za Atelier PROMIKA s.r.o.**

**Příloha: vzorový příčný řez, situace bet. svodidla**



SIL. II/102  
NOVÉ BETONOVÉ SVODIDLO TYPU  
NEW JERSEY V KRAJNICI

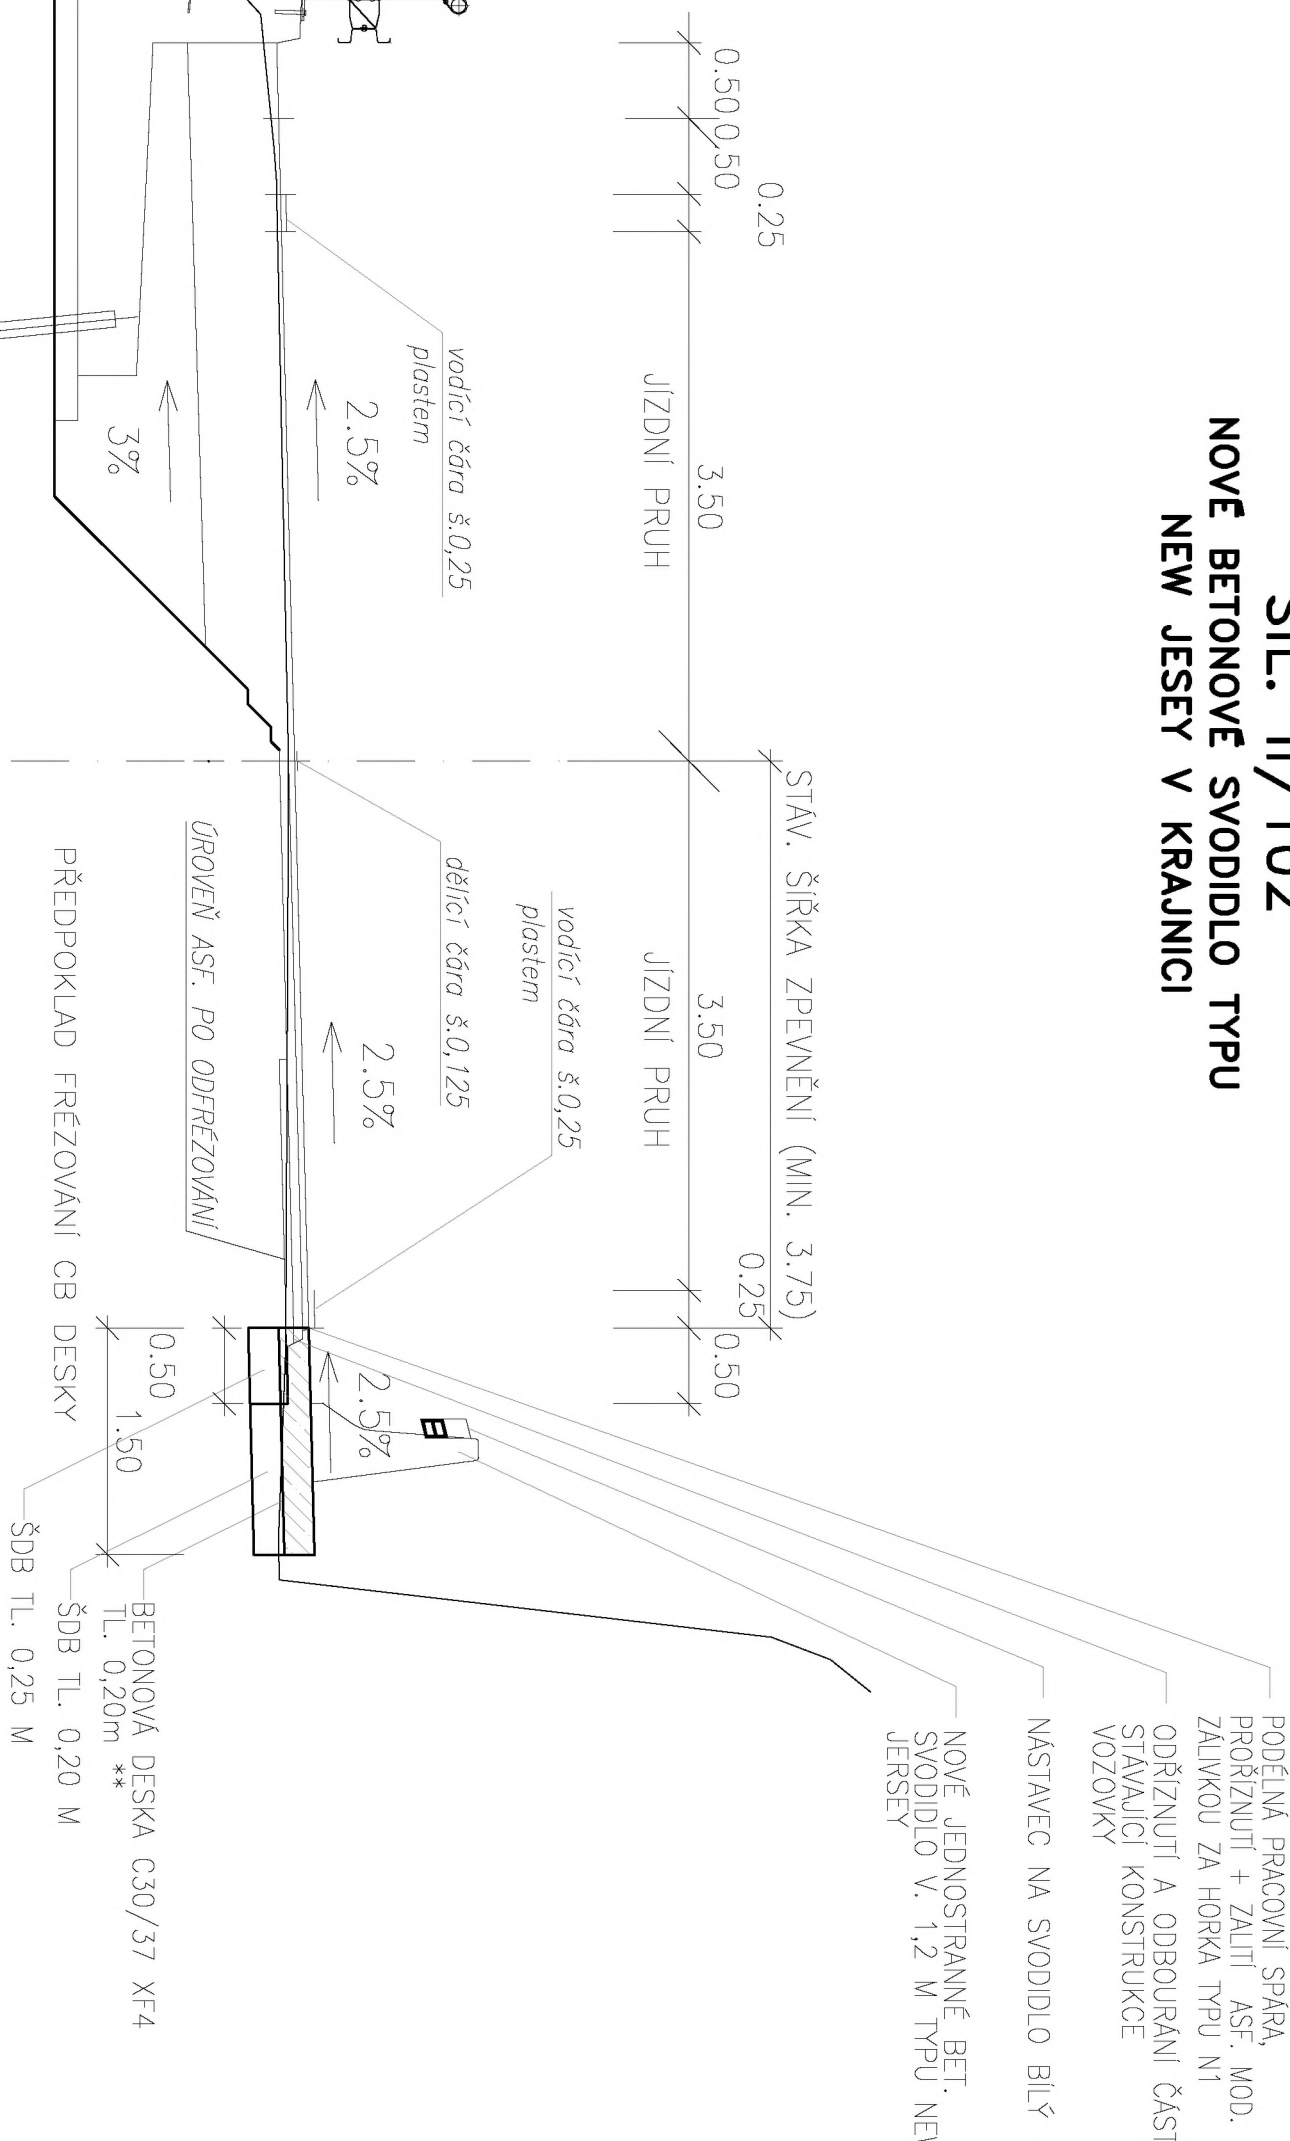

POZN:

\*\* PO 2,5M BUDOU PROŘÍZNUTY PŘÍČNÉ SPÁRY, KTERÉ BUDOU UTĚSNĚNY TRVALE PRUŽNÝM TMELEM

|            |          |                                                                 |       |
|------------|----------|-----------------------------------------------------------------|-------|
| Č. přílohy | Akce:    | II/102 HR. HL. MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, ETAPA II |       |
|            | Objekt:  | SO 102-C REKONSTRUKCE VOZOVKY, DAVLE – ŠTĚCHOVICE – ÚSEK C      |       |
|            | Příloha: | VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY – DETAIL – KRAJNICE S BET. SVODIDLEM        | 1:100 |




II/102 - SMĚR ŠTĚCHOVICE

13,89 výměna stávajícího propustku za n  
výměna stávajícího svodidla v. 1,2 m úrovně zadržení H2, dl. 84 m (vč. náběhového a přechodového dílu)  
pod výlekem je pozhoz lomovým ka  
km 13.8963 – 13.9803 betonové jednostranné svodidlo v. 1,2 m úrovně zadržení H2, dl. 84 m (vč. náběhového a přechodového dílu)  
podkladní beton km 13.896 – 13.981

13.887 – 13.8963 ocelové svodidlo úrovně zadržení H1, dl. 7,6 m

km 13.7647 – 13.8887 betonové jednostranné svodidlo v. 1,2 m úrovně zadržení H2, dl. 124 m (vč. náběhového a přechodového dílu)  
podkladní beton km 13.764 – 13.889

II/102 - SMĚR DAVLE

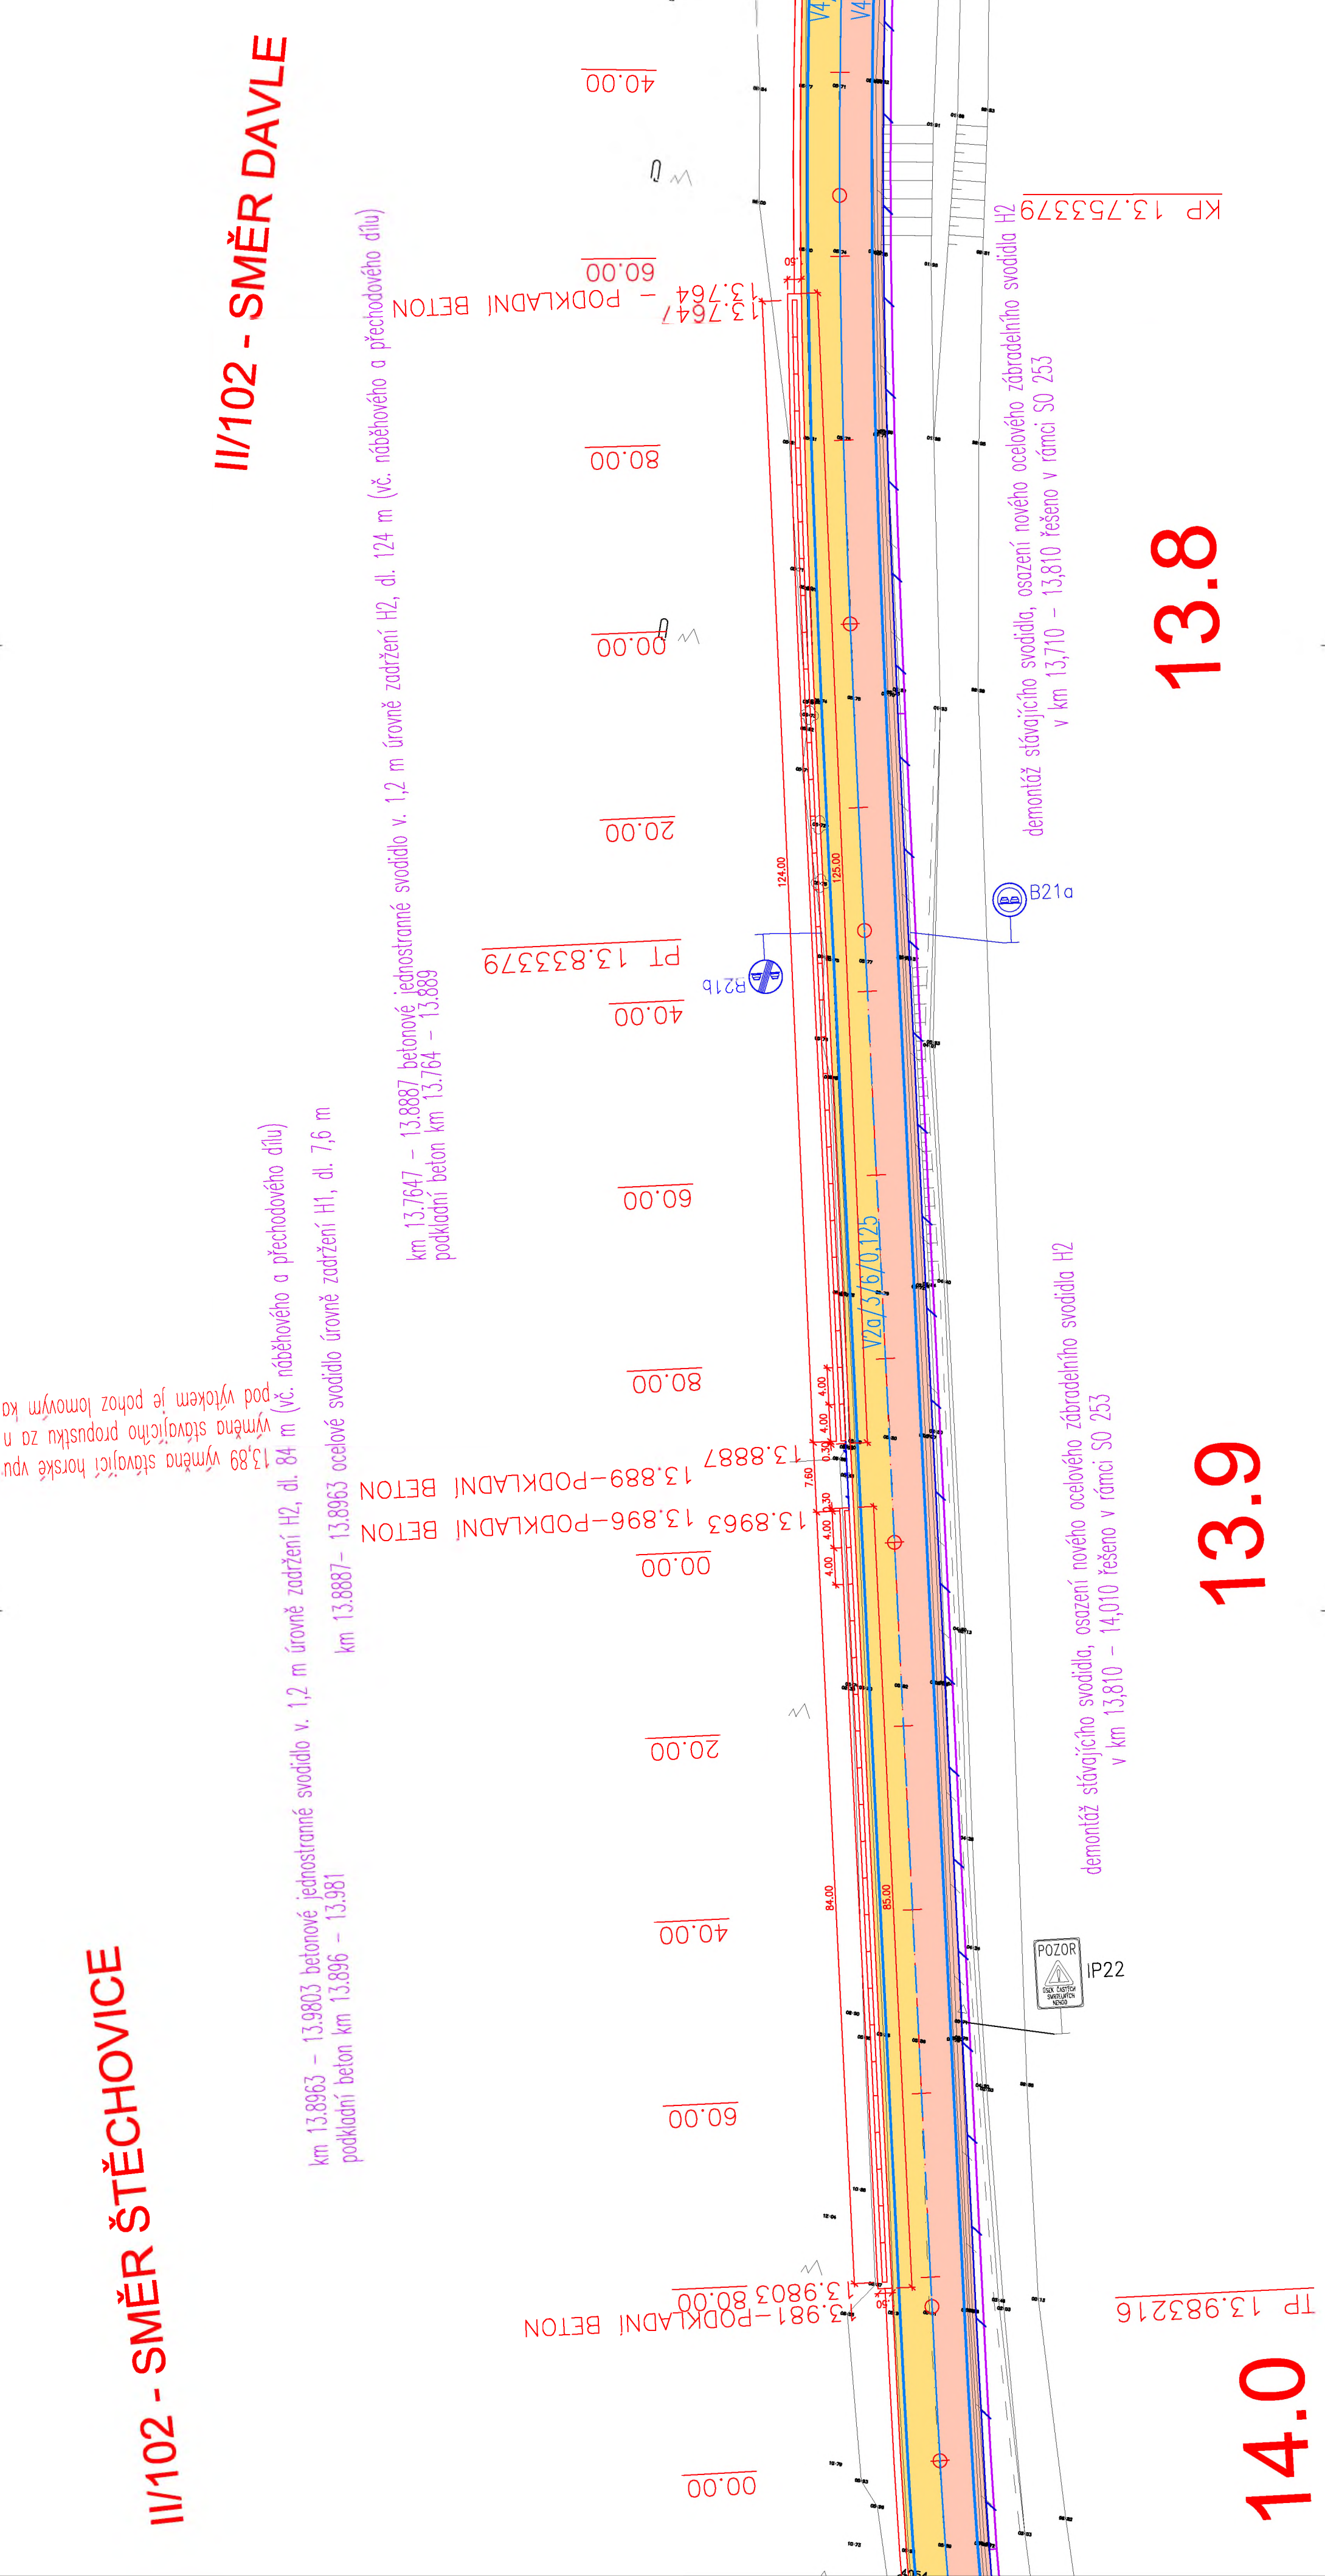

TP 13.983216

14.0

13.9

13.8

KP 13.753379



**STRABAG a.s.**  
Odštěpný závod Praha  
Kačírkova 982/4  
158 00 Praha 5

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje  
Ing. Milan Peška  
Zborovská 11  
150 21 Praha 5

Vyřizuje:  
Ing. Karel Šimek  
Mobil +420 602 224 685  
karel.simek@strabag.com

Naše značka:  
KSÚS\_/38

**Předmět: Oznámení o nové skutečnosti**

**Název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II.**

V souladu se smlouvou o dílo č. **S-468/00066001/2020** Vás informujeme o následujících nově zjištěných skutečnostech.

Při demontáži stávajících betonových svodidel v km 13,720-14,140 SO 102 se ukázalo značné opotřebení hlavně ve spojích a po odstranění nánosu ze stávající pravé krajnice i nedostatečná šíře pravé poloviny vozovky (PDPS uvažovalo 4,25 m od osy, skutečnost 3,75 m a lokálně i 3,60 m). Zároveň bylo zjištěno, že přilehlý skalní masiv za pravou krajnicí není "dostatečně hladký" a proto po dohodě s projektantem RDS a objednatelem bylo dohodnuto následující. Stávající betonová svodidla nahradit novými betonovými jednostrannými výšky 1,2 m podél celého přilehlého masivu a tím eliminovat nebezpečí boční překážky. Tento úsek je rozdělen na dva úseky, délky 124 m a 84 m (propojen v prostoru nové HV ocelovým svodidlem délky 7,6 m). Pod novým betonovým svodidlem je navrženo provést novou betonovou desku šíře 1,5 m tl. 0,20 m, která spočívá na ŠD podsypu. Tato skutečnost má vliv na změnu soupisu prací. U HV bude provedeno zpevnění odlážděním ze žulových kostek do betonového lože.

Žádáme tímto (zapsáno v příslušném stavebním deníku) o písemný pokyn k provedení prací nad rámec smlouvy.

S přátelským pozdravem

Ing. Karel Šimek

**STRABAG a.s.**  
Ustřední 423/82  
102 00 Praha 10 Česká republika

Tel. +420 272 701-667  
Fax +420 272 701-701

Sídlo společnosti: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jirčovice. Zápis v obchodním rejstříku. Městský soud v Praze  
IČO 60838744, DIČ CZ60838744

strana 1 z 1

STRABAG a.s  
Kačírkova 982/4,  
158 00 Praha 5

**Věc: Souhlasné stanovisko k ZBV**

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace v návaznosti na projednání s TDS a zhotovitelem v rámci akce „II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II“ souhlasí s navrženou a projednanou změnou. Jmenovitě souhlasí s výměnou opotřeбенých svodidel a novou betonovou deskou pod těmito svydidly v km 13,270 – 14,140 SO102.

Další práce požadujeme provést v koordinaci v souladu s pokyny AD a TDS a v souladu s uzavřenou SOD.

S pozdravem

  
Ing. ~~Milan~~ Peška  
technicko – provozní náměstek



KSÚS Středočeského kraje  
Ing. Milan Peška  
Zborovská 81/11  
150 00 Praha 5

Č. j.: Px4314/2023/DDv

Datum: 24. 5. 2023

Vyřizuje: Ing. David Dvořáček,

tel.: [redacted]

**II/102 hr. hl. m. Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, II. etapa**

**Vyjádření autorského dozoru č. 61 - SO 102, km 13.720-14.140 vpravo, šířka vozovky, betonová svodidla**

Zástupcem zhotovitele jsme byli informováni, že po zahájení prací spočívající v odstranění nánosů a demontáži stávajících betonových svodidel na pravé polovině vozovky v úseku v km 13.720 až 14.140 byly zjištěny následující skutečnosti:

- celková šířka pravé poloviny vozovky je menší než očekávaných 4.25 m,
- povrch přilehlého sklaného masivu je nerovný a lokálně se ve spodní části přibližuje k vozovce,
- některá betonová svodidla jsou poškozená, navíc došlo ke krádeži spojek segmentů betonových svodidel.

Zjištěné skutečnosti jsme ověřili místním šetřením.

Zhotovitel předložil řešení navržené projektantem RDS. Řešení jsme za AD posoudili a považujeme ho za vhodné. **Požadujeme postupovat dle návrhu projektanta RDS definovaném ve vyjádření č. 21 ze dne 18. 5. 2023.**

Požadované řešení rekapitulujeme takto:

- stávající betonové svodidlo bude nahrazeno novým betonovým svodidlem výšky 1.2 m podél celého sklaného masivu v km 13.765-13.889 a km 13.896-13.980 s přerušením v místě horské vpusti,
- oba úseky betonového svodidla budou v oblasti horské vpusti propojeny ocelovým svodidlem, úrovně zadržení H1,
- bude zachována stávající šířka zpevnění vozovky, optimálně alespoň 3.75 m,
- konstrukce vozovky bude provedena dle přípravné dokumentace,
- beton pod betonové svodidlo bude přilchat těsně za hranu zpevnění,
- jízdní pruh bude vyznačen v šířce 3.5 m dle přípravné dokumentace.

S pozdravem

Ing. David Dvořáček,  
hlavní inženýr projektu



STRABAG a.s.  
Dopravní stavitelství  
direkce TC  
Kačírkova 982/4  
CZ – 158 00 Praha 5 / Česká republika

210 c. (4p)

**STRABAG**

**Stavba: II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE**  
**Dodavatel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Praha 5**

**Číslo předávacího protokolu: Š II 36/2023**

**Předmět měření: SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE**  
**Demontáž starých betonových svodidel**

km 13,763 – 13,799 – vpravo 36 m  
km 13,843 – 13,891 – vpravo 48 m  
km 14,351 – 14,399 – vpravo 48 m

Měření bylo provedeno totální stanicí TOPCON IS 305.  
Dopustné odchylky měření a výpočtu nebyly překročeny,

**Souřadnicový systém:** S-JTSK  
**Výškový systém:**  
**Přilohy:**

**Zaměřil:** 2023  
**Zpracoval:** 17.7.2023  
**Ověřil:** 17.7.2023

Ing. S. Bílek  
Ing. S. Bílek  
Ing. S. Bílek

Ověření výsledků zeměměřických činností ve výstavbě  
podle §13 odst.1 písm. c) zák. č. 200/1994 Sb





**STRABAG a.s.**  
Dopravní stavitelství  
direkce TC  
Kačírkova 982/4  
CZ – 158 00 Praha 5 / Česká republika

**STRABAG**

**Stavba: II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE**  
**Dodavatel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Praha 5**

**Číslo předávacího protokolu: Š II 39/2023**

**Předmět měření: SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE**  
**Osazení nových betonových svodidel**

km 13,764 – 13,888 – vpravo 124 m  
km 13,895 – 13,979 – vpravo 84 m

**propojení ocelovým svodidlem**  
km 13,887 – 13,896 – vpravo 9 m

Měření bylo provedeno totální stanicí TOPCON IS 305.  
Dopustné odchylky měření a výpočtu nebyly překročeny.

**Souřadnicový systém:** S-JTSK  
**Výškový systém:**  
**Přiložky:**


|                   |          |               |
|-------------------|----------|---------------|
| <b>Zaměřil:</b>   | 2023     | Ing. S. Bílek |
| <b>Zpracoval:</b> | 4.8.2023 | Ing. S. Bílek |
| <b>Ověřil:</b>    | 4.8.2023 | Ing. S. Bílek |

Ověření výsledků zeměměřických činností ve výstavbě  
podle §13 odst. 1 písm. c) zák. č. 200/1994 Sb.







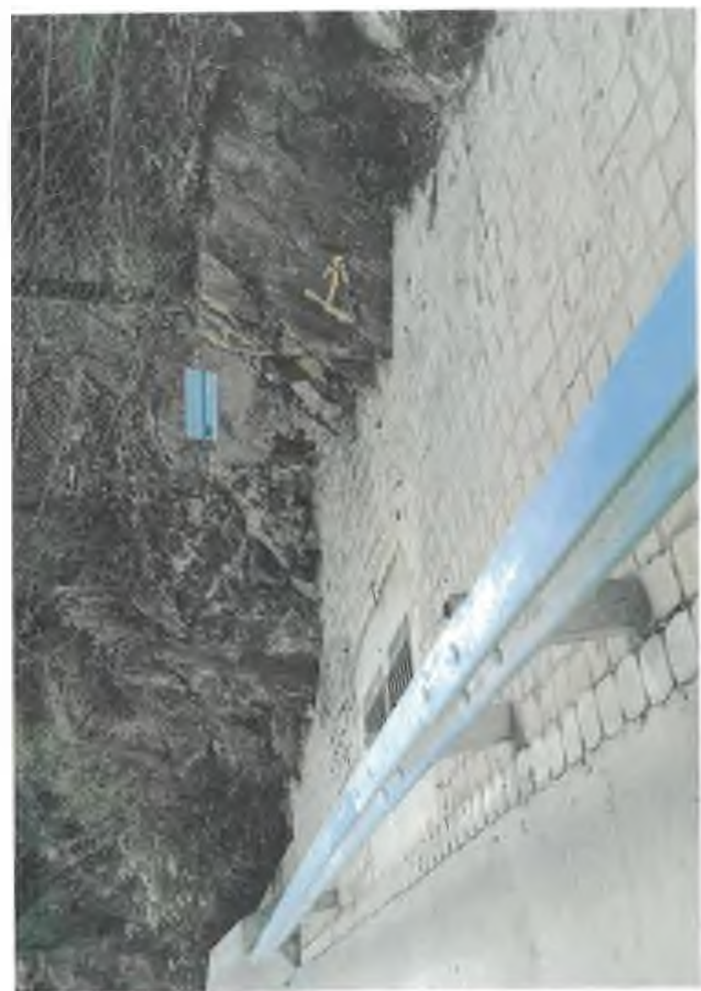







**STRABAG**

50 102

Datum: 22. 6. 2023 Den tydnr: 00

Název akce: 11/1021 HR. 112. 7. 80011, (SILVANOVA, DISKONKURZUJE, I. Etapa)  
Název akce: 11/1021 HR. 112. 7. 80011, (SILVANOVA, DISKONKURZUJE, I. Etapa)

29% adipon + 35%

Pracovní přestávka: 11<sup>00</sup> - 12<sup>00</sup>

*První doba 3-4-79*

*činnosti (měřena a přijímání) BURELLE ROUTEARET, KOSTA KLAD, MICHAL OMENDEK, MATOUŠ HASELOUN,*  
*OLGA PAVLA, KRISTOF ŠUPPE, JUDITA LEHÉČKA*

*(Handwritten notes at bottom of page)*

1. LUGAR 9R, LUGAR 9R, A NOME, VARIAS OUTRAS PARTES,  
SUAZLANDIA, AUTO E DUBAI E BORDO, FREIA (PROTEÇÃO AUTOMÁTICA  
E PROTEÇÃO PDS), DOTA E MODIFICAR O LUGAR

Saliva, ocular fluids + tears, semen, prostatic, vaginal fluids

- POHODLÍ, MONITOR 010 V km 11,300 - 11,800 PRÁVA
- BOJNA KE PRÁVA PRAMĚNÍ
- POHODLÍ, PRACOVNÍ A BOJNA PRACOVNÍ A PRACOVNÍ
- PRÁVA BOJNA PRÁVA V km 11,300 - 11,400
- POHODLÍ, PRACOVNÍ + MONITOR PRACOVNÍ PRÁVA V km 11,300 - 11,400 PRÁVA PRÁVA KE PRÁVA PRAMĚNÍ
- POHODLÍ, PRACOVNÍ PRACOVNÍ PRACOVNÍ PRÁVA (AUTOMATICKY)
- V km 11,300 - 11,400 PRÁVA PRÁVA KE PRÁVA PRAMĚNÍ
- POHODLÍ, PRACOVNÍ PRACOVNÍ PRÁVA V km 11,300 - 11,400
- (PRACOVNÍ PRACOVNÍ PRACOVNÍ - PRACOVNÍ PRÁVA)
- POHODLÍ, PRACOVNÍ PRACOVNÍ PRÁVA V km 11,300 - 11,400
- POHODLÍ, PRACOVNÍ PRACOVNÍ PRÁVA PRÁVA PRÁVA V km 11,300 - 11,400 PRÁVA PRÁVA KE PRÁVA PRAMĚNÍ

odpis zástupce investora (TDI)











80 102

Datum: 26.5.2023

Den tydne. / 6

Název akce 4/10/19. 12. 11. PRÁNY, JIŘIHOVICKÉ, BRONŠTEJNŮV I. STOR

500 + 50°C, 1000 + 100°C, 2000 + 200°C

1380

Pracovní přestávka: 8<sup>00</sup> - 12<sup>00</sup>

(meni): James Alexander Ross 12012, Michael Andrew Pflitz

HOUSLEY, ROBERT OWENSON, ALEA RUSSELL, JARRELL LEAFORD

STICKS, DIPS, M-CR6, FENCE, GARDEN, MEXCL, FORTNITE

NOV 10 1951

SAGE, 914, 183000, 914, 200000, 65N, NADIR, 914, 183000

7. ~~1945~~ 1945. 3x 102. 10/17. 24/10/17. 50/10/17

Level 482.

30/32 154. 20P 16+. 936 8 10015. 936 16+ 10015. 936 16+ 10015. 936 16+ 10015.

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, ਮੁਕਤਸਰ, ਮੁਕਤਸਰ, ਮੁਕਤਸਰ, ਮੁਕਤਸਰ

[illegible][illegible]

0750450857041/ 10201 10017

Pracovníkovi zaslán 27. listopadu 1957 ps. zvláštní, přílohou.

1957-1958 - 1959 - 1960 - 1961 - 1962 - 1963 - 1964 - 1965 - 1966 - 1967 - 1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977 - 1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986 - 1987 - 1988 - 1989 - 1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026 - 2027 - 2028 - 2029 - 2030 - 2031 - 2032 - 2033 - 2034 - 2035 - 2036 - 2037 - 2038 - 2039 - 2040 - 2041 - 2042 - 2043 - 2044 - 2045 - 2046 - 2047 - 2048 - 2049 - 2050 - 2051 - 2052 - 2053 - 2054 - 2055 - 2056 - 2057 - 2058 - 2059 - 2060 - 2061 - 2062 - 2063 - 2064 - 2065 - 2066 - 2067 - 2068 - 2069 - 2070 - 2071 - 2072 - 2073 - 2074 - 2075 - 2076 - 2077 - 2078 - 2079 - 2080 - 2081 - 2082 - 2083 - 2084 - 2085 - 2086 - 2087 - 2088 - 2089 - 2090 - 2091 - 2092 - 2093 - 2094 - 2095 - 2096 - 2097 - 2098 - 2099 - 2100 - 2101 - 2102 - 2103 - 2104 - 2105 - 2106 - 2107 - 2108 - 2109 - 2110 - 2111 - 2112 - 2113 - 2114 - 2115 - 2116 - 2117 - 2118 - 2119 - 2120 - 2121 - 2122 - 2123 - 2124 - 2125 - 2126 - 2127 - 2128 - 2129 - 2130 - 2131 - 2132 - 2133 - 2134 - 2135 - 2136 - 2137 - 2138 - 2139 - 2140 - 2141 - 2142 - 2143 - 2144 - 2145 - 2146 - 2147 - 2148 - 2149 - 2150 - 2151 - 2152 - 2153 - 2154 - 2155 - 2156 - 2157 - 2158 - 2159 - 2160 - 2161 - 2162 - 2163 - 2164 - 2165 - 2166 - 2167 - 2168 - 2169 - 2170 - 2171 - 2172 - 2173 - 2174 - 2175 - 2176 - 2177 - 2178 - 2179 - 2180 - 2181 - 2182 - 2183 - 2184 - 2185 - 2186 - 2187 - 2188 - 2189 - 2190 - 2191 - 2192 - 2193 - 2194 - 2195 - 2196 - 2197 - 2198 - 2199 - 2200 - 2201 - 2202 - 2203 - 2204 - 2205 - 2206 - 2207 - 2208 - 2209 - 2210 - 2211 - 2212 - 2213 - 2214 - 2215 - 2216 - 2217 - 2218 - 2219 - 2220 - 2221 - 2222 - 2223 - 2224 - 2225 - 2226 - 2227 - 2228 - 2229 - 2230 - 2231 - 2232 - 2233 - 2234 - 2235 - 2236 - 2237 - 2238 - 2239 - 2240 - 2241 - 2242 - 2243 - 2244 - 2245 - 2246 - 2247 - 2248 - 2249 - 2250 - 2251 - 2252 - 2253 - 2254 - 2255 - 2256 - 2257 - 2258 - 2259 - 2260 - 2261 - 2262 - 2263 - 2264 - 2265 - 2266 - 2267 - 2268 - 2269 - 2270 - 2271 - 2272 - 2273 - 2274 - 2275 - 2276 - 2277 - 2278 - 2279 - 2280 - 2281 - 2282 - 2283 - 2284 - 2285 - 2286 - 2287 - 2288 - 2289 - 2290 - 2291 - 2292 - 2293 - 2294 - 2295 - 2296 - 2297 - 2298 - 2299 - 2300 - 2301 - 2302 - 2303 - 2304 - 2305 - 2306 - 2307 - 2308 - 2309 - 2310 - 2311 - 2312 - 2313 - 2314 - 2315 - 2316 - 2317 - 2318 - 2319 - 2320 - 2321 - 2322 - 2323 - 2324 - 2325 - 2326 - 2327 - 2328 - 2329 - 2330 - 2331 - 2332 - 2333 - 2334 - 2335 - 2336 - 2337 - 2338 - 2339 - 2340 - 2341 - 2342 - 2343 - 2344 - 2345 - 2346 - 2347 - 2348 - 2349 - 2350 - 2351 - 2352 - 2353 - 2354 - 2355 - 2356 - 2357 - 2358 - 2359 - 2360 - 2361 - 2362 - 2363 - 2364 - 2365 - 2366 - 2367 - 2368 - 2369 - 2370 - 2371 - 2372 - 2373 - 2374 - 2375 - 2376 - 2377 - 2378 - 2379 - 2380 - 2381 - 2382 - 2383 - 2384 - 2385 - 2386 - 2387 - 2388 - 2389 - 2390 - 2391 - 2392 - 2393 - 2394 - 2395 - 2396 - 2397 - 2398 - 2399 - 2400 - 2401 - 2402 - 2403 - 2404 - 2405 - 2406 - 2407 - 2408 - 2409 - 2410 - 2411 - 2412 - 2413 - 2414 - 2415 - 2416 - 2417 - 2418 - 2419 - 2420 - 2421 - 2422 - 2423 - 2424 - 2425 - 2426 - 2427 - 2428 - 2429 - 2430 - 2431 - 2432 - 2433 - 2434 - 2435 - 2436 - 2437 - 2438 - 2439 - 2440 - 2441 - 2442 - 2443 - 2444 - 2445 - 2446 - 2447 - 2448 - 2449 - 2450 - 2451 - 2452 - 2453 - 2454 - 2455 - 2456 - 2457 - 2458 - 2459 - 2460 - 2461 - 2462 - 2463 - 2464 - 2465 - 2466 - 2467 - 2468 - 2469 - 2470 - 2471 - 2472 - 2473 - 2474 - 2475 - 2476 - 2477 - 2478 - 2479 - 2480 - 2481 - 2482 - 2483 - 2484 - 2485 - 2486 - 2487 - 2488 - 2489 - 2490 - 2491 - 2492 - 2493 - 2494 - 2495 - 2496 - 2497 - 2498 - 2499 - 2500 - 2501 - 2502 - 2503 - 2504 - 2505 - 2506 - 2507 - 2508 - 2509 - 2510 - 2511 - 2512 - 2513 - 2514 - 2515 - 2516 - 2517 - 2518 - 2519 - 2520 - 2521 - 2522 - 2523 - 2524 - 2525 - 2526 - 2527 - 2528 - 2529 - 2530 - 2531 - 2532 - 2533 - 2534 - 2535 - 2536 - 2537 - 2538 - 2539 - 2540 - 2541 - 2542 - 2543 - 2544 - 2545 - 2546 - 2547 - 2548 - 2549 - 2550 - 2551 - 2552 - 2553 - 2554 - 2555 - 2556 - 2557 - 2558 - 2559 - 2560 - 2561 - 2562 - 2563 - 2564 - 2565 - 2566 - 2567 - 2568 - 2569 - 2570 - 2571 - 2572 - 2573 - 2574 - 2575 - 2576 - 2577 - 2578 - 2579 - 2580 - 2581 - 2582 - 2583 - 2584 - 2585 - 2586 - 2587 - 2588 - 2589 - 2590 - 2591 - 2592 - 2593 - 2594 - 2595 - 2596 - 2597 - 2598 - 2599 - 2600 - 2601 - 2602 - 2603 - 2604 - 2605 - 2606 - 2607 - 2608 - 2609 - 2610 - 2611 - 2612 - 2613 - 2614 - 2615 - 2616 - 2617 - 2618 - 2619 - 2620 - 2621 - 2622 - 2623 - 2624 - 2625 - 2626 - 2627 - 2628 - 2629 - 2630 - 2631 - 2632 - 2633 - 2634 - 2635 - 2636 - 2637 - 2638 - 263

11:00 - 11:30 PM "HYPNOSIS AND MENTAL PAIN"

Pressure: 500 psi 0.3 kg/cm<sup>2</sup> V. low in P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> - 12.00

... 31. 12. 1971 ...

$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

2.  $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$  (The probability of getting a head and a tail is  $\frac{1}{4}$ .)

\_\_\_\_\_

08-12-13 90

1941-1942 1943-1944 1945-1946 1947-1948 1949-1950 1951-1952 1953-1954 1955-1956 1957-1958 1959-1960 1961-1962 1963-1964 1965-1966 1967-1968 1969-1970 1971-1972 1973-1974 1975-1976 1977-1978 1979-1980 1981-1982 1983-1984 1985-1986 1987-1988 1989-1990 1991-1992 1993-1994 1995-1996 1997-1998 1999-2000 2001-2002 2003-2004 2005-2006 2007-2008 2009-2010 2011-2012 2013-2014 2015-2016 2017-2018 2019-2020 2021-2022 2023-2024 2025-2026 2027-2028 2029-2030 2031-2032 2033-2034 2035-2036 2037-2038 2039-2040 2041-2042 2043-2044 2045-2046 2047-2048 2049-2050 2051-2052 2053-2054 2055-2056 2057-2058 2059-2060 2061-2062 2063-2064 2065-2066 2067-2068 2069-2070 2071-2072 2073-2074 2075-2076 2077-2078 2079-2080 2081-2082 2083-2084 2085-2086 2087-2088 2089-2090 2091-2092 2093-2094 2095-2096 2097-2098 2099-2100 2101-2102 2103-2104 2105-2106 2107-2108 2109-2110 2111-2112 2113-2114 2115-2116 2117-2118 2119-2120 2121-2122 2123-2124 2125-2126 2127-2128 2129-2130 2131-2132 2133-2134 2135-2136 2137-2138 2139-2140 2141-2142 2143-2144 2145-2146 2147-2148 2149-2150 2151-2152 2153-2154 2155-2156 2157-2158 2159-2160 2161-2162 2163-2164 2165-2166 2167-2168 2169-2170 2171-2172 2173-2174 2175-2176 2177-2178 2179-2180 2181-2182 2183-2184 2185-2186 2187-2188 2189-2190 2191-2192 2193-2194 2195-2196 2197-2198 2199-2200 2201-2202 2203-2204 2205-2206 2207-2208 2209-2210 2211-2212 2213-2214 2215-2216 2217-2218 2219-2220 2221-2222 2223-2224 2225-2226 2227-2228 2229-2230 2231-2232 2233-2234 2235-2236 2237-2238 2239-2240 2241-2242 2243-2244 2245-2246 2247-2248 2249-2250 2251-2252 2253-2254 2255-2256 2257-2258 2259-2260 2261-2262 2263-2264 2265-2266 2267-2268 2269-2270 2271-2272 2273-2274 2275-2276 2277-2278 2279-2280 2281-2282 2283-2284 2285-2286 2287-2288 2289-2290 2291-2292 2293-2294 2295-2296 2297-2298 2299-2300 2301-2302 2303-2304 2305-2306 2307-2308 2309-2310 2311-2312 2313-2314 2315-2316 2317-2318 2319-2320 2321-2322 2323-2324 2325-2326 2327-2328 2329-2330 2331-2332 2333-2334 2335-2336 2337-2338 2339-2340 2341-2342 2343-2344 2345-2346 2347-2348 2349-2350 2351-2352 2353-2354 2355-2356 2357-2358 2359-2360 2361-2362 2363-2364 2365-2366 2367-2368 2369-2370 2371-2372 2373-2374 2375-2376 2377-2378 2379-2380 2381-2382 2383-2384 2385-2386 2387-2388 2389-2390 2391-2392 2393-2394 2395-2396 2397-2398 2399-2400 2401-2402 2403-2404 2405-2406 2407-2408 2409-2410 2411-2412 2413-2414 2415-2416 2417-2418 2419-2420 2421-2422 2423-2424 2425-2426 2427-2428 2429-2430 2431-2432 2433-2434 2435-2436 2437-2438 2439-2440 2441-2442 2443-2444 2445-2446 2447-2448 2449-2450 2451-2452 2453-2454 2455-2456 2457-2458 2459-2460 2461-2462 2463-2464 2465-2466 2467-2468 2469-2470 2471-2472 2473-2474 2475-2476 2477-2478 2479-2480 2481-2482 2483-2484 2485-2486 2487-2488 2489-2490 2491-2492 2493-2494 2495-2496 2497-2498 2499-2500 2501-2502 2503-2504 2505-2506 2507-2508 2509-2510 2511-2512 2513-2514 2515-2516 2517-2518 2519-2520 2521-2522 2523-2524 2525-2526 2527-2528 2529-2530 2531-2532 2533-2534 2535-2536 2537-2538 2539-2540 2541-2542 2543-2544 2545-2546 2547-2548 2549-2550 2551-2552 2553-2554 2555-2556 2557-2558 2559-2560 2561-2562 2563-2564 2565-2566 2567-2568 2569-2570 2571-2572 2573-2574 2575-2576 2577-2578 2579-2580 2581-2582 2583-2584 2585-2586 2587-2588 2589-2590 2591-2592 2593-2594 2595-2596 2597-2598 2599-2600 2601-2602 2603-2604 2605-2606 2607-2608 2609-2610 2611-2612 2613-2614 2615-2616 2617-2618 2619-2620 2621-2622 2623-2624 2625-2626 2627-2628 2629-2630 2631-2632 2633-2634 2635-2636 2637-2638 2639-2640 2641-2642 2643-2644 2645-2646 2647-2648 2649-2650 2651-2652 2653-2654 2655-2656 2657-2658 2659-2660 2661-2662 2663-2664 2665-2666 2667-2668 2669-2670 2671-2672 2673-2674 2675-2676 2677-2678 2679-2680 2681-2682 2683-2684 2685-2686 2687-2688 2689-2690 2691-2692 2693-2694 2695-2696 2697-2698 2699-2700 2701-2702 2703-2704 2705-2706 2707-2708 2709-2710 2711-2712 2713-2714 2715-2716 2717-2718 2719-2720 2721-2722 2723-2724 2725-2726 2727-2728 2729-2730 2731-2732 2733-2734 2735-2736 2737-2738 2739-2740 2741-2742 2743-2744 2745-2746 2747-2748 2749-2750 2751-2752 2753-2754 2755-2756 2757-2758 2759

1. The first part of the text discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions, including sales, purchases, and expenses. It emphasizes that proper record-keeping is essential for determining the correct amount of tax liability and for providing evidence in the event of an audit.

[illegible]

10-10-1978

1980 V. C. 1980 NB V. 1980 V. 1980

12/15/2013 12:00 PM

2020/10/27

[illegible]

2019 1st Quarter: 1/1/2019 - 3/31/2019

---

| Circumstance                  | Justified (%) | Not justified (%) |
|-------------------------------|---------------|-------------------|
| If someone is attacking you   | 85            | 15                |
| If someone is threatening you | 75            | 25                |
| If someone is harassing you   | 65            | 35                |
| If someone is insulting you   | 55            | 45                |
| If someone is annoying you    | 15            | 85                |

\_\_\_\_\_

Alora (TDI): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



Po 122

Datum: 15.5.2003

Den tydne: 81.

Název akce: M/MOZJ AB. W. 17. PRANIZ, ŠTROMOVCE, DEČANSKÉ VCE, II. STUP

1.  $\text{NaNO}_3$ ,  $\text{BaSO}_4 + 10^\circ\text{C}$ ,  $\text{FeCl}_3 + 15^\circ\text{C}$ ,  $\text{AgNO}_3 + 20^\circ\text{C}$

dobro: 30-1300

Pracovní plastovka: 17<sup>02</sup> - 12<sup>02</sup>

miči (mėna a pīl'men): FORTISKO JEDLIČKA, KRAJČI ŽETKA, GATVĖN MENC, KOSKZ FENC,  
MILKE DILAS, ~~BOB~~ KOSKZV ŽIPKE, PATIRK. LEHČKA, DUTKIS POKOČI,  
BOBTH RICHKO, KOSKZ KROD, DUTKIS CHAMKOT KOSKZIT MOKSIC

[illegible]

Ad: Průběhová křivka v. roton. dobytek fašný

Зapis YDN: Po digitalnem kontrole u BY podniku  
Vetrovnickych letistech kontrol. Zpracov.  
pokloni poklonem, HAV VETNE POKLON  
U LITELN KOI 840 - M. 1800 P.S.

Dear,

vedení práce:

- [illegible]

[illegible]

Průměrná hustota: 12 kg / 10 kg m<sup>3</sup>

Podpis zástupce investora (TDI):

Podpis stavbyvedoucího:















PO 102

Datum: 25.4.2023

Den týdne: ÚT

Místové stavenisko: Mlýnský Název akce: III/102 RE-14.17.12.17, TECHNICKÉ, ROZVOJNÉ, II. ETAPA

Podoba: OBLOŽENÝ, KAMN + 9%, POU + 11%, ODPAZ. +

Pracovní doba: 8<sup>00</sup> - 17<sup>00</sup>

Pracovní přestávka: 11<sup>00</sup> - 12<sup>00</sup>

Pracovníci (jména a příjmení): ŠTĚPÁN KUDRKA, MICHAEL ANGLER, PAVEL KAD, PAVEL  
BOLEK, JAROSLAV ŠPIL, OLGA KUČERA, MATEJ PŘEDK,   
JANUŠ BŘED, ROZVÍKEL, JAROSLAV, MICHAEL DITĚ, PAVEL KENCI

Pracovní místa: LIDSKÉ 914, LIDSKÉ 914, EX. NÁKLADNÍ, 200, 200 EX. POUZ. 20000,

Pracovní materiál: ROZVOJNÉ, KAMN, BETON, LIDSKÉ 800000, 20000

Pracovní

- Pracovní práce:
- ROZVOJNÉ ROZVOJNÉ LIDSKÉ 800000 (20000) NA  
LIDSKÉ 200000 V LIDSKÉ 17,914 LIDSKÉ + POUZ. 20000  
LIDSKÉ 200000
  - ROZVOJNÉ ROZVOJNÉ LIDSKÉ 800000 (20000) NA  
LIDSKÉ 200000 LIDSKÉ DO ROZVOJNÉ 20000 V LIDSKÉ 17,930 - 17,930  
LIDSKÉ 20000 NA LIDSKÉ 200000
  - ROZVOJNÉ ROZVOJNÉ LIDSKÉ 800000 (20000) NA  
LIDSKÉ 20000 - 17,930 LIDSKÉ 20000 NA LIDSKÉ 200000 + 20000,  
LIDSKÉ 800000 NA LIDSKÉ 200000
  - ROZVOJNÉ ROZVOJNÉ LIDSKÉ 800000 (20000) NA  
LIDSKÉ 800000 LIDSKÉ 20000 NA LIDSKÉ 200000  
V LIDSKÉ 13,964 - 13,964 V LIDSKÉ 13,943 - 13,943 LIDSKÉ 20000  
NA LIDSKÉ 200000

80 1021

Datum: 11. 12. 2022

Den týdne: ÚT

iko: 11/12/2022 Název akce: 11/12/2022 BE. 02. 17. PRAM, STŘEDOVCE, BRODARSKÝ, I. KAP

Pracovní přestávka


a a přijetí)

ce: 8012 BRODARSKÝ

ANALÝZA DLE PRŮBĚHU JAKOSTI (F. PRŮBĚH 4. 2.)  
MĚŘENÍ DLE PRŮBĚHU K MĚŘENÍ DLE PRŮBĚHU  
DLE PRŮBĚHU DLE PRŮBĚHU DLE PRŮBĚHU  
A DLE PRŮBĚHU DLE PRŮBĚHU

8012 BRODARSKÝ: 8012 BRODARSKÝ F. PRŮBĚH 4. 2.  
MĚŘENÍ DLE PRŮBĚHU DLE PRŮBĚHU DLE PRŮBĚHU  
DLE PRŮBĚHU DLE PRŮBĚHU DLE PRŮBĚHU  
A DLE PRŮBĚHU DLE PRŮBĚHU

ZADIV TDI: NA ZÁKLADĚ VÝSLEDKŮ  
KONTROL. ZKOUŠEK NA ZEMNÍ PLÁN  
POVOLUJÍ TOKY DLE DLE VÝSLEDKŮ  
VÝSLEDKŮ.



**Dodavatel:** INTERSIGN, s.r.o.

Libušská 109/258

142 00 Praha 4 - Libuš

Česká republika

IČ: 28912748

DIČ: CZ28912748

www.intersign.cz

Spis.značka: C 152740 Městský soud v Praze

Registrační č.: 14124 Puncovní úřad v Praze

**Peněžní ústav:** Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 4291419001/5500

SWIFT kód: RZBC CZ PP

IBAN kód: CZ285500000004291419001

**Příjemce:**

Strabag a.s., Kačírkova 982/4, 158 00

Praha 5, ČR

**Způsob dopravy:** Vlastní**FAKTURA - daňový doklad****72300167**

Objednávka: 2022/ZGAC/0050

Zakázka: 20223875

Ref. kód: RC-KST-CZ-841-ZGAC Konst. symbol: 0308

Variabilní symbol: 72300167

**Odběratel:**

Strabag a.s.

Kačírkova 982/4

158 00 Praha 5

ČR

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

**Dodací a platební podmínky:** Datum splatnosti: 23.02.2023

Forma úhrady: Převodním příkazem

Datum uskutečnění plnění: 24.01.2023

Datum vystavení: 24.01.2023

Označení dodávky

Množství

MJ

Cena za MJ  
[CZK]Sleva  
%Sazba Celkem bez DPH  
DPH v % [CZK]

Fakturuje Vám

cedule EU / Štěchovice II.

|   |                                                                                 |   |          |    |          |
|---|---------------------------------------------------------------------------------|---|----------|----|----------|
| • | Cedule hliníková, GX620(AF8) -<br>Gravoxal matný stříbrný - 2 mm,<br>400x300 mm | 1 | 8 690,00 | 21 | 8 690,00 |
| • | Krytka ozdobná duralová - stříbrná<br>GX620, v ceně                             | 4 | 0,00     | 21 | 0,00     |

8 690,00

Rekapitulace DPH v CZK

| Sazba | Celkem základ | Celkem DPH | Předplatba s DPH | Základ DPH | DPH      |
|-------|---------------|------------|------------------|------------|----------|
| 0 %   | 0,00          | -          | 0,00             | 0,00       | -        |
| 15 %  | 0,00          | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00     |
| 21 %  | 8 690,00      | 1 824,90   | 0,00             | 8 690,00   | 1 824,90 |

Zaokrouhlení: 0,10 Kč

K úhradě: 10 515,00 Kč

Přílohy:

Strana: 1 / 1

Fakturu vystavil: \*Markéta Sýkorová

Tel.: 241 727 075

Fax:

Úrok z prodlení činí 0,050 % za každý den prodlení platby.

PREMIER  
SYSTEM

QR platba telefonem

STRABAG A.S.

KAČÍRKOVA 982/4  
CZ-158 00 PRAHA 5 - JINONICE

---

Č. dodavatele: 2235546  
Číslo dokladu: 72300167  
Referenční kód: RC-KST-CZ-841-ZGAC  
Barcode: CZP07483

INTERSIGN, S.R.O.

LIBUŠSKÁ 109/258  
CZ-142 00 PRAHA 4-LIBUŠ

1.2.2023

### Schvalovací list INVOICE4U

| Datum           | Uživatel        | Druh                    |
|-----------------|-----------------|-------------------------|
| 26.1.2023 13:05 | Trejbalová Hana | ekonomický schvalovatel |
| 27.1.2023 8:43  | Lísa Martin     | ekonomický schvalovatel |
| 30.1.2023 13:38 | Šimek Karel     | ekonomický schvalovatel |
| 1.2.2023 7:52   | Hauser Vladimír | ekonomický schvalovatel |
| 1.2.2023 16:52  | Novák Tomáš     | věcný schvalovatel      |





## USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl vyšší soudní úřednicí Marií Šiškovou v právní věci

navrhovatele: **STRABAG a.s.**, IČO 608 38 744  
sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

**o návrhu na zápis změny do obchodního rejstříku**

**takto:**

V obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce číslo 7634

**se vymazává**

Statutární orgán

člen představenstva

Ing. JARMILA POVAŽANOVÁ, dat. nar. 19. října 1962, r.č. 626019/6514

82101 Bratislava, Drieňova 16175/1B, Slovenská republika

Den vzniku členství: 3. června 2019

Prokura

Ing. RENATA HAMRSKÁ, dat. nar. 19. března 1961, r.č. 615319/0153

Hvozdková 837, Liberec XXV-Vesec, 463 12 Liberec

Ing. TOMÁŠ HOZA, dat. nar. 8. května 1969, r.č. 690508/4406

Purkyňova 749/10, 767 01 Kroměříž

Ing. JIŘÍ JAROŠ, dat. nar. 31. ledna 1962, r.č. 620131/0643

Plachého 272/25, České Budějovice 1, 370 01 České Budějovice

**se zapisuje**

Statutární orgán

U vymazávané osoby: Ing. JARMILA POVAŽANOVÁ, dat. nar. 19. října 1962, r.č. 626019/6514

Den zániku členství: 7. prosince 2022

člen představenstva

Ing. TOMÁŠ HOZA, dat. nar. 8. května 1969, r.č. 690508/4406

Purkyňova 749/10, 767 01 Kroměříž

Den vzniku členství: 8. prosince 2022

Prokura

Ing. KAREL KLOFÁČ, dat. nar. 18. června 1973, r.č. 730618/2972

U Rybníčku 4041, 580 01 Havlíčkův Brod

Den zápisu změny: Dnem nabytí právní moci

**Poučení:**

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím nadepsaného soudu.

Praha 19. prosince 2022

Marie Šišková v. r.  
vyšší soudní úřednice



**Výpis**

z obchodního rejstříku, vedeného  
Městským soudem v Praze  
oddíl B, vložka 7634

**Datum vzniku a zápisu:**

1. března 1994

**Spisová značka:**

B 7634 vedená u Městského soudu v Praze

**Obchodní firma:**

STRABAG a.s.

**Sídlo:**

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

**Identifikační číslo:**

608 38 744

**Právní forma:**

Akciová společnost

**Předmět podnikání:**

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

projektová činnost ve výstavbě

výroba betonu a obalovaných živičných směsí

opravy silničních vozidel

hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem v rozsahu: ( otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek s omezením pro povrchové dobývání; zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl; úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním; zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť; dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů; podzemní sanační práce; zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin; podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol a tunelů)

silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní

výkon zeměměřických činností

provádění trhačích a ohňostrojných prací

výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin

zámečnictví, nástrojářství

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

distribuce pohonných hmot

**Statutární orgán:****předseda představenstva:**

Dipl. Ing. MORITZ FREYBORN, dat. nar. 1. září 1975

1180 Vídeň, Haizingergasse 1-3/32, Rakouská republika

Den vzniku funkce: 1. listopadu 2022

Den vzniku členství: 1. listopadu 2022

**člen představenstva:**

Ing. PAVEL BRYCHCÍN, dat. nar. 25. května 1972

Zakšínská 607/11, Střížkov, 190 00 Praha 9

Den vzniku členství: 1. července 2020

---

**člen představenstva:**

Ing. TOMÁŠ HOZA, dat. nar. 8. května 1969  
Purkyňova 749/10, 767 01 Kroměříž  
Den vzniku členství: 8. prosince 2022

---

**Počet členů:**

3

---

**Způsob jednání:**

Statutárním orgánem je představenstvo. Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám, před soudy, správními a samosprávnými orgány ve všech záležitostech představenstvo a to vždy předseda představenstva s dalším členem představenstva nebo dva členové představenstva. Podepisování se děje tím způsobem, že k napsané firmě společnosti nebo otisku razítka připojí svůj podpis předseda představenstva s dalším členem představenstva nebo dva členové představenstva s označením své funkce.

---

**Prokura:**

Ing. RADEK HRADIL, dat. nar. 2. února 1964  
Okružní 660, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště

Ing. ROSTISLAV KRONES, dat. nar. 8. května 1968  
č.p. 46, 592 03 Kadov

Ing. JIŘÍ HORÁLEK, dat. nar. 16. listopadu 1964  
Ludvíka Poděště 777/16, Stránice, 602 00 Brno

Ing. JAN HÝZL, dat. nar. 6. ledna 1976  
Profesora Fuky 1276/4, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

Ing. JAN CHROMÝ, dat. nar. 30. června 1974  
Litvínovice - Mokré 119, PSČ 37001

Ing. PAVEL KLAS, dat. nar. 22. listopadu 1964  
č.p. 5, 386 01 Radošovice

Ing. RADIM AULICKÝ, dat. nar. 22. června 1974  
Oldřicha Nového 833, 252 64 Velké Přílepy

Ing. ALEXEJ KOROTKOV, dat. nar. 1. dubna 1978  
Lechowiczova 2827/11, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Ing. LUKÁŠ PŘIBYL, dat. nar. 21. prosince 1982  
Slunečná 333, 373 71 Adamov

Ing. RICHARD FISCHER, dat. nar. 7. října 1975  
V Podhradí 33, 250 73 Jenštejn

Ing. Mag. MICHAL PRISTAŠ, dat. nar. 14. dubna 1981  
2460 Bruckneudorf, Marc Aurel Strasse 2f, Rakouská republika

Ing. Mag. Michal Pristaš je oprávněn zastupovat Společnost spolu s dalším prokuristou. Toto zmocnění zahrnuje i oprávnění nabýt, zcizit nebo zatížit nemovitou věc.

MICHAL VANĚČEK, dat. nar. 27. března 1978  
Pod Nouzovem 1007/25, Kbely, 197 00 Praha 9

Ing. MICHAL KOPPER, dat. nar. 15. května 1979  
82104 Bratislava - Ružinov, Doležalova 3424/15F, Slovenská republika

Ing. Michal Kopper je oprávněn zastupovat Společnost spolu s dalším prokuristou. Toto zmocnění zahrnuje i oprávnění nabýt, zcizit nebo zatížit nemovitou věc.

Ing. TOMÁŠ RYS, dat. nar. 17. listopadu 1981  
U sanatoria 737/20, Radotín, 153 00 Praha 5

PETR KAFKA, dat. nar. 21. února 1962  
Sadová 246, Nemošice, 530 03 Pardubice

Ing. arch. JAN HAVELKA, dat. nar. 9. srpna 1988  
č.p. 228, 373 32 Jílovce

Ing. JIŘÍ SVOBODA, Ph.D., dat. nar. 27. září 1984



U Hřiště 456, Mladcová, 760 01 Zlín

Ing. KAREL KLOFÁČ, dat. nar. 18. června 1973

U Rybníčku 4041, 580 01 Havlíčkův Brod

Ing. MARTIN BAŠÁR, dat. nar. 3. září 1979

Dělnická 443, 252 41 Dolní Břežany

K zastupování a podepisování za společnost jsou oprávněni vždy dva prokuristé. Prokuristé podepisují tím způsobem, že k firmě společnosti připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru.

#### **Dozorčí rada:**

##### **předseda dozorčí rady:**

Dipl. Ing. (FH) ALFRED WATZL, dat. nar. 13. září 1970

05-080 Izabelin C, Krasinského 37, Polská republika

Den vzniku funkce: 13. června 2022

Den vzniku členství: 13. června 2022

##### **člen dozorčí rady:**

Mgr. KARIN BÍLKOVÁ, dat. nar. 18. dubna 1975

Bezručova 603, 250 91 Zeleneč

Den vzniku členství: 4. prosince 2018

##### **člen dozorčí rady:**

Mag. HERIBERT HERZOG, dat. nar. 15. září 1964

7423 Grafenschachen, Grafenschachen 22, Rakouská republika

Den vzniku členství: 12. ledna 2023

#### **Počet členů:**

3

#### **Jediný akcionář:**

Bau Holding Beteiligungs GmbH

9800 Spittal an der Drau, Ortenburgerstraße 27, Rakouská republika

Registrační číslo: FN 117476 i

Právní forma: společnost s ručeným omezeným

#### **Akcie:**

1 000 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč

11 096 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč

#### **Základní kapitál:**

1 119 600 000,- Kč

Splaceno: 1 119 600 000,- Kč

#### **Ostatní skutečnosti:**

Akciová společnost byla založena notářským zápisem osvědčenou zakladatelskou listinou tří zakladatelů, fyzických osob, ze dne 23.2.1994, rozdělením současně zrušené společnosti s ručením omezeným SAREMO, se sídlem České Budějovice, ul.Plachého 27, na dvě nově vzniklé společnosti SAREMO a.s. a HYDROLINE s.r.o., se sídlem České Budějovice, Lidická 1131.

Zakladatelé současně schválili stanovy a.s. a zvolili členy orgánů společnosti.

Notářský zápis, zakladatelská smlouva a stanovy a.s. byly přiloženy.

Základní jmění je splaceno v plném rozsahu.

Valná hromada společnosti rozhodla dne 30.6.1999 o sloučení se společností STRABAG ČR a.s.

Na společnost STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ 608 38 744, jako nástupnickou společnost, přešlo na základě smlouvy o fúzi sloučením ze dne 20. 11. 2006 s rozhodným dnem sloučení 1. 10. 2006 jmění společnosti ILBAU Plzeň a.s. se sídlem České Budějovice, Vrbenská 31,

IČ 648 34 352, jako zanikající společnosti.

Společnost STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00 , IČ 608 38 744 je právním nástupcem bez likvidace zrušené a zaniklé společnosti ILBAU Plzeň a.s. se sídlem České Budějovice, Vrbenská 31, IČ 648 34 352, dosud zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddílu B vložce 1148.

Na společnost STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ 608 38 744, jako nástupnickou společnost, přešlo na základě smlouvy o fúzi sloučením ze dne 20.11.2006 s rozhodným dnem sloučení 1.10.2006 jmění společnosti Stavební technologie, spol. s r.o. se sídlem Humpolec, Nádražní 729, okres Pelhřimov, PSČ 396 01, IČ 251 83 133, jako zanikající společnosti.

Společnost STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ 608 38 744 je právním nástupcem bez likvidace zrušené a zaniklé společnosti Stavební technologie, spol. s r.o. se sídlem Humpolec, Nádražní 729, okres Pelhřimov, PSČ 396 01, IČ 251 83 133, dosud zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích C 8266.

Obchodní společnost STRABAG a.s. jako společnost nástupnická převzala v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění zanikající společnosti STRABAG konstrukce s.r.o., IČ 252 63 579, se sídlem Chrudim, Tovární 209.

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Na společnost STRABAG a.s., jako na společnost nástupnickou, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikajících společností JHP spol. s r.o., se sídlem Ústřední 423/62, Štěrboholy, 102 00 Praha 10, identifikační číslo 45798290 a MiTTaG spol. s r.o. pozemní a průmyslové stavitelství, se sídlem Na Bělidle 198/21, Smíchov, 150 00 Praha 5, identifikační číslo 00547514. Rozhodným dnem fúze byl 1. leden 2016.

Na základě projektu vnitrostátní fúze sloučením ze dne 11.8.2017 došlo ke sloučení společnosti Dálniční stavby Praha, a.s., se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 15000, identifikační číslo 40614948, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 744, jako zanikající společnosti, do společnosti STRABAG a.s., jako nástupnické společnosti, přičemž na nástupnickou společnost STRABAG a.s. přešlo jmění zanikající společnosti Dálniční stavby Praha, a.s.

## **Odštěpné závody:**

### **Odštěpný závod:**

#### **Označení odštěpného závodu:**

STRABAG a.s. odštěpný závod Praha

#### **Sídlo nebo umístění:**

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

#### **Předmět podnikání:**

montáž, opravy údržba revize vyhrazených el. zařízení

výroba betonu a obalovaných živičných směsí

výkon zeměměřických činností

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

zámečnictví, nástrojářství

opravy silničních vozidel

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

#### **Vedoucí odštěpného závodu:**

Ing. MARTIN BAŠÁR, dat. nar. 3. září 1979

Dělnická 443, 252 41 Dolní Břežany

### **Odštěpný závod:**

#### **Označení odštěpného závodu:**

STRABAG a.s. odštěpný závod České Budějovice

#### **Sídlo nebo umístění:**

České Budějovice, Vrbenská 31, PSČ 37006

#### **Předmět podnikání:**

výkon zeměměřických činností

projektová činnost ve výstavbě

výroba betonu a obalovaných živičných směsí

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

zámečnictví, nástrojářství

opravy silničních vozidel

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

**Vedoucí odštěpného závodu:**

Ing. PAVEL KLAS, dat. nar. 22. listopadu 1964

č.p. 5, 386 01 Radošovice

**Odštěpný závod:**

**Označení odštěpného závodu:**

STRABAG a.s. odštěpný závod Morava

**Sídlo nebo umístění:**

Holická 1004/29, Hodolany, 779 00 Olomouc

**Předmět podnikání:**

výroba betonu a obalovaných živičných směsí

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

opravy silničních vozidel

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

**Vedoucí odštěpného závodu:**

Ing. JAN HÝZL, dat. nar. 6. ledna 1976

Profesora Fuky 1276/4, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

**Odštěpný závod:**

**Označení odštěpného závodu:**

STRABAG a.s. odštěpný závod pozemní a inženýrské stavitelství Praha

**Sídlo nebo umístění:**

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

**Předmět podnikání:**

výroba betonu a obalovaných živičných směsí

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

**Vedoucí odštěpného závodu:**

PETR KAFKA, dat. nar. 21. února 1962

Sadová 246, Nemošice, 530 03 Pardubice

**Odštěpný závod:**

**Označení odštěpného závodu:**

STRABAG a.s. odštěpný závod pozemní a inženýrské stavitelství České Budějovice

**Sídlo nebo umístění:**

České Budějovice, Vrbenská /31, PSČ 37006

**Předmět podnikání:**

- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

- projektová činnost ve výstavbě

- výkon zeměměřických činností

- zámečnictví, nástrojářství

- silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, -

nákladní mezinárodní provozovaná vozidla o největší povolené  
hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, -  
mezinárodní příležitostná osobní  
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3  
živnostenského zákona  
- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

---

**Vedoucí odštěpného závodu:**

Ing. JAN CHROMÝ, dat. nar. 30. června 1974  
Mokré 119, 370 01 Litvínovice

---

**Odštěpný závod:**

---

**Označení odštěpného závodu:**

STRABAG a.s. odštěpný závod STRABAG Real Estate

---

**Sídlo nebo umístění:**

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

---

**Předmět podnikání:**

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona  
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

---

**Vedoucí odštěpného závodu:**

Dipl. Ing. SONJA WERTITSCH, dat. nar. 29. září 1976  
1210 Vídeň, Kugelfanggasse 79a, Rakouská republika

**Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu** (<http://www.justice.cz>).

Dne: 7.9.2023 10:56

Údaje platné ke dni 7.9.2023 03:54

Naše značka: TD/258/19-120/VM/23

Vaše značka:

Vyřizuje: M. Valenta

Tel. [redacted]

e-mail: [redacted]

Datum: 30. 10. 2023

**KSÚS Středočeského kraje**

**Ing. Milan PEŠKA**

**Technicko-provozní náměstek**

**Zborovská 11**

**150 21 Praha 5**

**Stavba: II/102 hr. hl. m Prahy – Štěchovice, rekonstrukce, etapa II.**

**Věc: Stanovisko TDS k návrhu ZBV č. 38 SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice.**

Zhotovitel stavby dne 15. 8. 2023 předložil a 23. 8. 2023 doplnil návrh ZBV č. 38 SO 102 (102/13) Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice (Betonová svodidla).

Návrh změny řeší nahrazení poškozených betonových svodidel novými včetně provedení podkladního betonu v km 13,764 - 13,980 a dalších souvisejících prací (pokládka dlažby ze žulových kostek, osazení bet. ohrub) viz stanovisko AD č. 61 z 24. 5. 2023.

Dále byla na žádost objednatele osazena pamětní deska v km 13,892.

Změna ovlivnila výměry položek č. 63, 64, 93, 104, 119, 121, 122, 123, 126, 127, 128, 129 a nové položky č. 130, 140, 141, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172.

TDS potvrzuje skutečnosti uvedené v návrhu ZBV č. 38 (102/13) Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice (Betonová svodidla)

Položky oceněného soupisu prací SO 102 (102/13) budou fakturovány na základě skutečně provedených prací doložených geodetickým zaměřením ÚOZI-Z a záznamy ve stavebním deníku.

[redacted]  
M. Valenta

Technický dozor investora

Na vědomí:

Ing. Karel Šimek
