

**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
ze dne 17. 1. 2023**

(dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

I. Smluvní strany

Fakultní nemocnice Ostrava

se sídlem: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava

IČ: 00843989

DIČ: CZ00843989

zastoupena: MUDr. Jiřím Havrlantem, MHA, ředitelem

zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990, č. j. OP-054-25.11.90

(dále jen „**Objednatel**“)

a

MORYS s. r. o.

se sídlem: Korejská 894/9, 702 00 Ostrava

IČ: 42864771

DIČ: CZ42864771

zastoupena: [redacted] výkonným ředitelem, na základě Plné moci ze dne 4. 12. 2023

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1504

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně jako „**Smluvní strany**“)

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají výše uvedené Smluvní strany tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 17. 1. 2023, ve znění dodatku č. 1 ze dne 2. 11. 2023, ev. č. Objednatele 001/OVZ/23/002-OD, ev. č. Zhotovitele 230009 (dále jen „**Dodatek č. 2**“).

II. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly k dnešnímu dni na této změně Smlouvy o dílo ze dne 17. 1. 2023, ve znění dodatku č. 1 ze dne 2. 11. 2023, ev. č. Objednatele 001/OVZ/23/002-OD, ev. č. Zhotovitele 230009 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je provést stavební práce na akci pod názvem „**FN Ostrava – rekonstrukce oddělení ORL v objektu Polikliniky**“.

1. V důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba dodatečných prací, které nebyly obsaženy ve Smlouvě (dále jen „**vícepráce**“) a tyto dodatečné práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních prací podle Smlouvy. Zároveň se Smluvní strany dohodly na neprovedení některých původně sjednaných prací (dále jen „**méněpráce**“). Předmětem tohoto dodatku je tedy úprava předmětu Smlouvy o vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla.

2. V návaznosti na provedení víceprací a méněprací se dosavadní ustanovení článku V. odst. 1. Smlouvy ruší a nahrazuje textem:

1. V souladu se zněním zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly na ceně:



Celková cena bez DPH	45 613 983,38 Kč
DPH ve výši	9 578 936,51 Kč
Celková cena vč. DPH ve výši	55 192 919,89 Kč

3. Přesná specifikace víceprací a méněprací, navýšení ceny o 4.133.243,81 Kč bez DPH a s tím související snížení ceny o 1.890.718,69 Kč bez DPH je zaznamenáno v Oznámení o změnách akce č. 10 až č. 20, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „Příloha č. 1“).

III. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání Smlouvy, tímto Dodatkem č. 2 výslovně nedotčená, zůstávají i nadále v platnosti a účinnosti.
- Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že se Smluvní strany na elektronické podobě neshodnou, bude Dodatek č. 2 vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá ze Smluvních stran.
- Tento Dodatek č. 2 bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, v registru smluv. Uveřejnění Dodatku č. 2 v registru smluv zajistí Objednatel.
- Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.
- Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je Příloha č. 1 – Oznámení o změnách akce č. 10 až č. 20.
- Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Ostravě dne _____

 
Datum: 2024.03.07
10:12:28 +01'00'

Objednatel
MUDr. Jiří Havrlant, MHA
ředitel Fakultní nemocnice Ostrava

V Ostravě dne _____



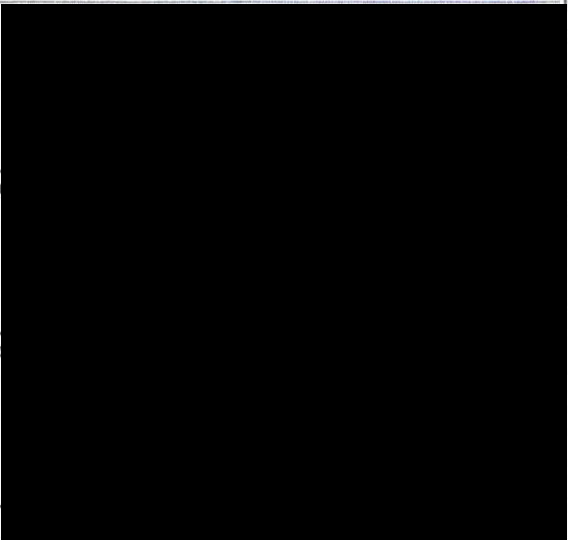


Zhotovitel

výkonny ředitel spol. MORYS s. r. o.



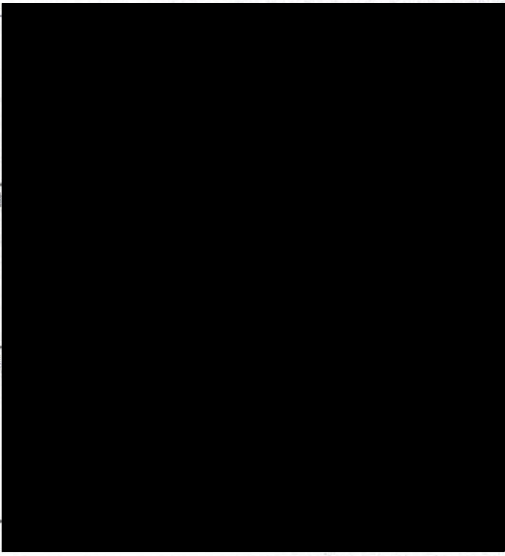
Oznámení o změnách akce č.10

Identifikační údaje akce			
Název	FN Ostrava – rekonstrukce oddělení ORL v objektu Polikliniky		
Objednatel:			
Název	Fakultní nemocnice Ostrava		
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba		
Zhotovitel			
Název	Morys s.r.o.		
Adresa	Korejská 894/9, 702 00 Ostrava - Přívoz		
Oznámení vystavil:			
Ing. Radim Schreiber			
Navrhované změny akce			
Sanace výztuže u nadpraží oken na chodbě			
Zdůvodnění navrhovaných změn			
Po dokončení bouracích prací – oklepání omítek – zůstala u nadpraží oken na chodbě obnažená výztuž. Je nezbytné nutné pro dokončení díla provést sanaci výztuže očištěním, ošetření antikoročním nátěrem a přestěrkování správkovou omítkou dle návrhu autorského dozoru.			
Tyto práce nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou přitom nezbytné pro naplnění účelu původní smlouvy. Změna dodavatele ve vztahu k těmto pracím by představovala pro zadavatele nepřiměřené obtíže na straně technické, jakož i ekonomické.			
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
0 Kč		16 946,33 Kč	
Výsledná cena změn bez DPH:			
		16 946,33 Kč	

	Výsledná celková cena změny DPH
	3 558,73 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	20 505,06 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Nerelevantní.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava 20. 7. 2023	  Ing. Marek Veselý náměstek ředitele pro techniku a provoz
Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Stanovisko TDI:	P
Stanovisko projektanta stavby: SOCHLASIM	P
Seznam příložených dokladů:	
1. Položkový rozpočet víceprací /méněprací 2. Fotodokumentace	



Oznámení o změnách akce č.11

Identifikační údaje akce			
Název	FN Ostrava – rekonstrukce oddělení ORL v objektu Polikliniky		
Objednatel:			
Název	Fakultní nemocnice Ostrava		
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba		
Zhotovitel			
Název	Morys s.r.o.		
Adresa	Korejská 894/9, 702 00 Ostrava - Přívoz		
Oznámení vystavil:			
Ing. Radim Schreiber			
Navrhované změny akce			
Doplnění koncových prvků SLP – el. zámky, čtečky u dveří, měření teplot			
Zdůvodnění navrhovaných změn			
<p>S ohledem na aktualizaci projektu interiérového vybavení a pokynu pro sledování a kontrolu teploty při skladování a přepravě léčiv (SÚKL). Došlo k úpravě koncových prvků slaboproudu a s tím související kabeláže a úpravy zárubní, doplnění elektrozámek a čteček u vybraných dveří, měření teplot lednic a místností pro skladování léčiv a zdravotnického materiálu – nezbytné pro dokončení díla dle platných legislativních norem.</p> <p>Čtečky doplněné na dveře ambulancí z provozního hlediska vyvolávání pacientů a z důvodu bezpečnosti zdravotnického personálu.</p>			
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Cena méněpráci bez DPH:		Cena vícepráci bez DPH:	
-42 699 Kč		1 050 617 Kč	
Výsledná cena změn bez DPH:			
		1 007 918 Kč	

	Výsledná celková cena změny DPH
	211 662,78 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	1 219 580,78 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Nerelevantní.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava 7.4.2023	 vedoucí odboru přípravy a realizace investic
	 Ing. Marek Veselý náměstek ředitele pro techniku a provoz
Podpis zmocněnce zhotovitele:	
	
Stanovisko TDI:	Pod
Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM	Pod
Seznam příložených dokladů:	
1. Položkové rozpočty víceprací /méněprací	



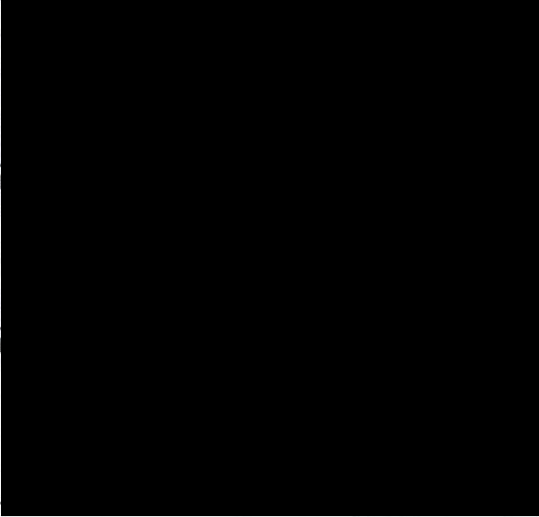
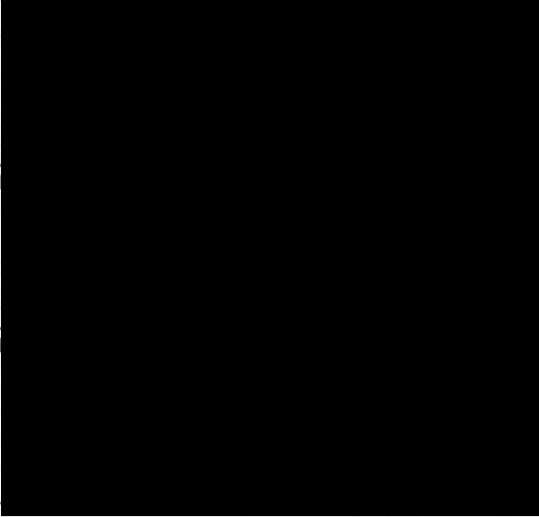
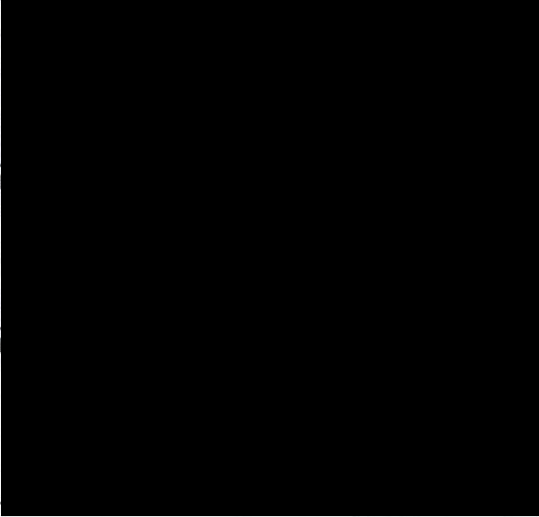
Oznámení o změnách akce č.12

Identifikační údaje akce			
Název	FN Ostrava – rekonstrukce oddělení ORL v objektu Polikliniky		
Objednatel:			
Název	Fakultní nemocnice Ostrava		
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba		
Zhotovitel			
Název	Morys s.r.o.		
Adresa	Korejská 894/9, 702 00 Ostrava - Přívoz		
Oznámení vystavil:			
Ing. Radim Schreiber			
Navrhované změny akce			
Záměna podlahové krytiny - vinyl za kaučuk			
Zdůvodnění navrhovaných změn			
Záměna podlahové krytiny vinyl za kaučuk uvedený v projektové dokumentaci. A to z důvodu sjednocení podlahových krytin v prostorách FNO. Kvalitativně jsou vinylové podlahy na stejné úrovni jako kaučukové, přínos je v její jednodušší údržbě. Záměna generuje finanční úsporu.			
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
-1 342 479,98 Kč		931 910,04 Kč	
Výsledná cena změn bez DPH:			
-410 569,94 Kč			

	Výsledná celková cena změny DPH
	-86 219,69 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	-496 789,63 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Nerelevantní.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace a kázky pro celé dílo.	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava N. J. 2023	 vedoucí odboru přípravy a realizace investic  Ing. Marek Veselý náměstek ředitele pro techniku a provoz
Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Stanovisko TDI:	Podpis TDI
Stanovisko projektanta stavby: SOUTH-CASIA	Podpis pr
Seznam příložených dokladů:	
1. Položkový rozpočet víceprací /méněprací	



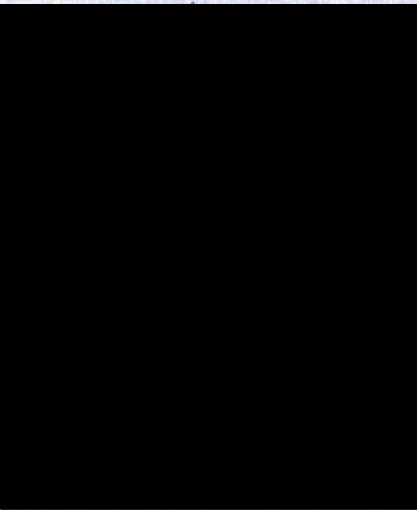
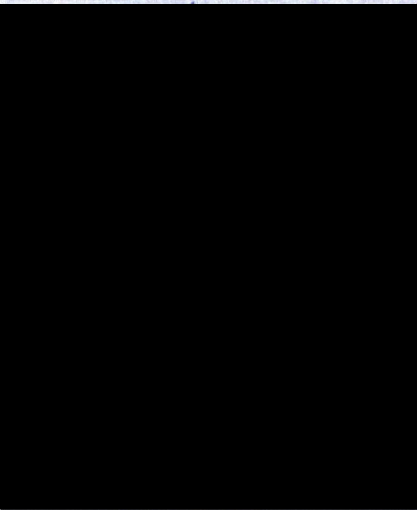
Oznámení o změnách akce č.13

Identifikační údaje akce			
Název	FN Ostrava – rekonstrukce oddělení ORL v objektu Polikliniky		
Objednatel:			
Název	Fakultní nemocnice Ostrava		
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Póruba		
Zhotovitel			
Název	Morys s.r.o.		
Adresa	Korejská 894/9, 702 00 Ostrava - Přívoz		
Oznámení vystavil:			
Ing. Radim Schreiber			
Navrhované změny akce			
Opláštění nadpraží a pilíře u oken			
Zdůvodnění navrhovaných změn			
<p>Po ukončení bouracích prací na obvodovém zdivu u oken vznikly díky prohnutému nosnému skeletu a obezdívkám pilířů oken z různých materiálů nerovnosti, které navrhnul zhotovitel vyrovnat opláštěním ze sádkartonu. Stavební úpravy jsou nezbytné pro provedení bezvadného díla.</p> <p>Tyto práce nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou přitom nezbytné pro naplnění účelu původní smlouvy. Změna dodavatele ve vztahu k těmto pracím by představovala pro zadavatele nepřiměřené obtíže na straně technické, jakož i ekonomické.</p>			
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
-95 451,28 Kč		305 728,41 Kč	
Výsledná cena změn bez DPH:			

	210 277,13 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	44 158,20 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	254 435,33 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Nerelevantní.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava M. J. Šolc	 vedoucí odboru přípravy a realizace investic  Ing. Marek Veselý / náměstek ředitele pro techniku a provoz
Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Stanovisko TDI:	
Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM	
Seznam příložených dokladů:	
1. Položkový rozpočet víceprací /méněprací 2. Fotodokumentace	



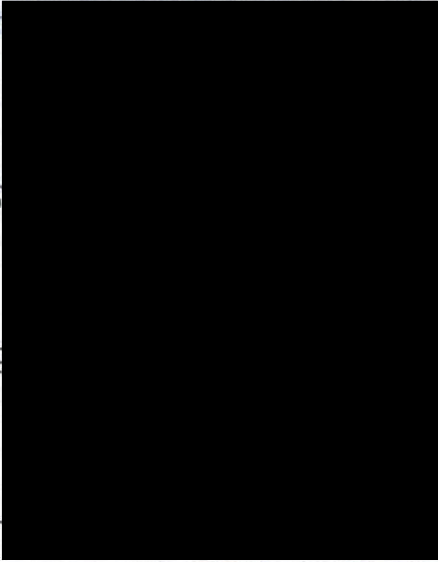
Oznámení o změnách akce č.14

Identifikační údaje akce			
Název	FN Ostrava – rekonstrukce oddělení ORL v objektu Polikliniky		
Objednatel:			
Název	Fakultní nemocnice Ostrava		
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba		
Zhotovitel			
Název	Morys s.r.o.		
Adresa	Korejská 894/9, 702 00 Ostrava - Přívoz		
Oznámení vystavil:			
Ing. Radim Schreiber			
Navrhované změny akce			
Doplnění datových zásuvek včetně související kabeláže			
Zdůvodnění navrhovaných změn			
Doplnění datových zásuvek v ambulancích z důvodu napojení vyšetřovacích přístrojů, propojeny vyšetřovací přístroje s obrazovkami a doplněny potřebné moduly v rozvaděčích a s tím souvisejících doplňků. Práce jsou nezbytně nutné pro funkčnost vybavení.			
Tyto práce nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou přitom nezbytné pro naplnění účelu původní smlouvy. Změna dodavatele ve vztahu k těmto pracím by představovala pro zadavatele nepřiměřené obtíže na straně technické, jakož i ekonomické.			
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
0 Kč		983 552,- Kč	
Výsledná cena změn bez DPH:			
		983 552,- Kč	

	Výsledná celková cena změny DPH
	206 545,92 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	1 190 097,92 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Nerelevantní.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava 30.8.2023	 vedoucí oddělení přípravy a realizace investic  Ing. Marek Veselý / náměstek ředitele pro techniku a provoz
Podpis zmocněnce zhotovitele:	
	
Stanovisko TDI:	Podpis TDI:
Stanovisko projektanta stavby:	Podpis projektanta stavby:
SOUTKLASIM	
Seznam příložených dokladů:	
1. Položkový rozpočet víceprací /méněprací	




Oznámení o změnách akce č.15

Identifikační údaje akce			
Název	FN Ostrava – rekonstrukce oddělení ORL v objektu Polikliniky		
Objednatel:			
Název	Fakultní nemocnice Ostrava		
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba		
Zhotovitel			
Název	Morys s.r.o.		
Adresa	Korejská 894/9, 702 00 Ostrava - Přívoz		
Oznámení vystavil:			
Ing. Radim Schreiber			
Navrhované změny akce			
Výměna 2 ks dveří a 2ks stávajících radiátorů na centrální chodbě C348			
Zdůvodnění navrhovaných změn			
V rámci ucelených stavebních úprav centrální chodby provedena výměna 2 ks dveří včetně zárubní do prostor oční kliniky a výměna 2ks stávajících radiátorových těles.			
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
0 Kč		103 536,16 Kč	
Výsledná cena změn bez DPH:			
		103 536,16 Kč	

	Výsledná celková cena změny DPH
	21 742,59 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	125 278,75 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Nerelevantní.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava 27. 9. 2023	 vedoucí oddělení přípravy a realizace investic  Ing. Marek Veselý / náměstek ředitele pro techniku a provoz
Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Stanovisko TDI:	Podpis TD
Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM	Podpis pro
Seznam příložených dokladů:	
1. Položkový rozpočet víceprací /méněprací	



Oznámení o změnách akce č.16

Identifikační údaje akce			
Název	FN Ostrava – rekonstrukce oddělení ORL v objektu Polikliniky		
Objednatel:			
Název	Fakultní nemocnice Ostrava		
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba		
Zhotovitel			
Název	Morys s.r.o.		
Adresa	Korejská 894/9, 702 00 Ostrava - Přívoz		
Oznámení vystavil:			
Ing. Radim Schreiber			
Navrhované změny akce			
Změna typu revizních dvířek ZTI na chodbě + doplnění 3 ks zatemňovacích rolet			
Zdůvodnění navrhovaných změn			
<p>S ohledem na lepší přístup k ventilům na rozvodech zdravotnické a sjednocení velikosti revizních dvířek na chodbě D350 dojde ke změně z plastových dvířek 200x300mm na dvířka truhlářské o velikosti 250x1690mm.</p> <p>Doplnění 3ks zatemňovacích rolet v m.č. C328 a C341, ve kterých bude probíhat promítání zdravotních zákroků a výuka.</p> <p>Provedení změny je nutné k funkčnosti celého díla.</p>			
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Cena méněpráci bez DPH:		Cena vícepráci bez DPH:	
-7 702,80 Kč		109 676,94 Kč	
Výsledná cena změn bez DPH:			

	101 974,14 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	21 414,57 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	123 388,71 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Nerelevantní.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava 4.10.2023	 vedoucí odboru přípravy a realizace investic  Ing. Marek Veselý náměstek ředitele pro techniku a provoz
Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Stanovisko TDI:	Podpis
Stanovisko projektanta stavby: 	Podpis
Seznam příložených dokladů:	
1. Položkový rozpočet víceprací /méněprací	



Oznámení o změnách akce č.17

Identifikační údaje akce			
Název	FN Ostrava – rekonstrukce oddělení ORL v objektu Polikliniky		
Objednatel:			
Název	Fakultní nemocnice Ostrava		
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba		
Zhotovitel			
Název	Morys s.r.o.		
Adresa	Korejská 894/9, 702 00 Ostrava - Přívoz		
Oznámení vystavil:			
Ing. Radim Schreiber			
Navrhované změny akce			
PSV – rozvody vody a kanalizace k pracovní lince N7 v m.č. C333			
Zdůvodnění navrhovaných změn			
<p>Revizí projektové dokumentace interiéru vyvstal požadavek v m. č. C333 – převlékárna lékaře doplnit pracovní linku N7 s dřezem a úložným prostorem pro čisté a špinavé prádlo. Z tohoto důvodu bylo nutné provést rozvody vody a kanalizace a související stavební práce.</p> <p>Tyto změny zadavatel s péčí řádného hospodáře nemohl v době tvorby PD a zadávání VZ předvídat.</p>			
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
0 Kč		6 295,04 Kč	
Výsledná cena změn bez DPH:			

	6 295,04 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	1 321,96 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	7 617,- Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Nerelevantní.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava 27. 12. 2023	 vedoucí odboru přípravy a realizace investic  Ing. Marek Veselý / náměstek ředitele pro techniku a provoz
Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Stanovisko TDI:	Podpis
Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍ	Podpis
Seznam příložených dokladů:	
1. Položkový rozpočet víceprací /méněprací	



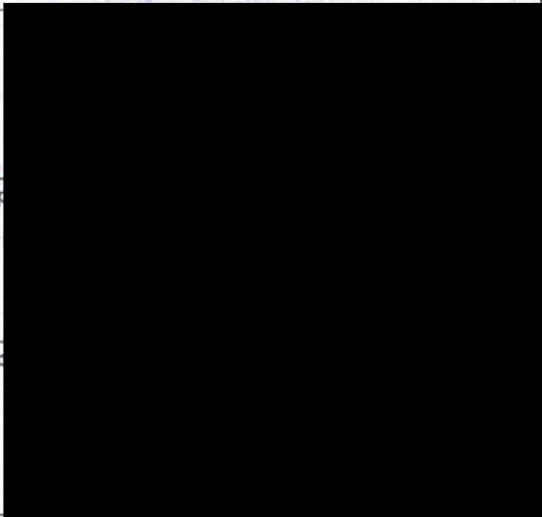
Oznámení o změnách akce č.18

Identifikační údaje akce			
Název	FN Ostrava – rekonstrukce oddělení ORL v objektu Polikliniky		
Objednatel:			
Název	Fakultní nemocnice Ostrava		
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba		
Zhotovitel			
Název	Morys s.r.o.		
Adresa	Korejská 894/9, 702 00 Ostrava - Přívoz		
Oznámení vystavil:			
Ing. Radim Schreiber			
Navrhované změny akce			
PSV – Změna větrání audiokabin			
Zdůvodnění navrhovaných změn			
<p>Změna vyvolaná požadavkem výrobce a dodavatele audiokabin. S ohledem na hygienické požadavky útlumu hluku ve vyšetřovacích audiokabinách byl doplněn projekt VZT a MaR pro větrání těchto kabin – doplněny tlumiče hluku, doplněny klapky pro uzavírání potrubí vzduchu a chladu a doplněno ovládání včetně monitorování poloh klapek.</p> <p>Tyto práce nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou přitom nezbytné pro naplnění účelu původní smlouvy. Změna dodavatele ve vztahu k těmto pracím by představovala pro zadavatele nepřiměřené obtíže na straně technické, jakož i ekonomické.</p>			
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
-37 785,63 Kč		278 082,44 Kč	
Výsledná cena změn bez DPH:			
		240 296,81 Kč	

	Výsledná celková cena změny DPH
	50 462,33 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	290 759,14 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Nerelevantní.	
Veškeré práce budou spíňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava 10. 11. 2023	 vedoucí odboru přípravy a realizace investic  Ing. Marek Veselý náměstek ředitele pro techniku a provoz
Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Stanovisko TDI:	Podpis
Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM	Podpis
Seznam příložených dokladů:	
1. Položkový rozpočet víceprací /méněprací	



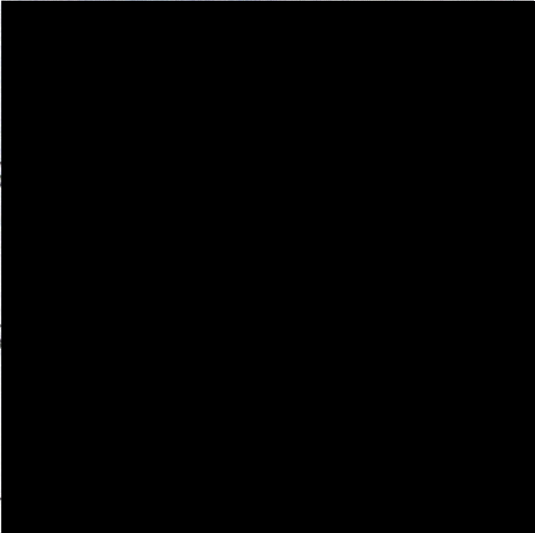
Oznámení o změnách akce č.19

Identifikační údaje akce			
Název	FN Ostrava – rekonstrukce oddělení ORL v objektu Polikliniky		
Objednatel:			
Název	Fakultní nemocnice Ostrava		
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba		
Zhotovitel			
Název	Morys s.r.o.		
Adresa	Korejská 894/9, 702 00 Ostrava - Přívoz		
Oznámení vystavil:			
Ing. Radim Schreiber			
Navrhované změny akce			
ZTI – Doplnění zařízovacích předmětů + záměna baterií			
Zdůvodnění navrhovaných změn			
<p>a) Záměna 30ks elektronických vodovodních baterií za pákové z důvodu častých provozních závad.</p> <p>b) Doplnění ZTI – zařízovacích předmětů.</p> <p>Do místnosti D314, D318 doplnění sprchové zástěny z důvodu bezpečnosti a ochrany truhlářských prvků proti vodě. Do místností č. C330, 331, 334, 336,337, D 303, 313, 314a, 317 (2x) doplnění polosloupu na zakrytí sifonu z provozních a hygienických důvodů. Ve vazbě na ZL17 , který řeší stavební úpravy související s doplněním pracovní linky, tento ZL řeší dodávku a montáž nerezového dřezu a vodovodní baterie.</p>			
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
-364 600,- Kč		134 487,09 Kč	
Výsledná cena změn bez DPH:			
		-230 112,91 Kč	

	Výsledná celková cena změny DPH
	-48 323,71 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	-278 436,62 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Nerelevantní.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava 14.12.2023	 vedoucí odboru přípravy a realizace investic  Ing. Marek Veselý náměstek ředitele pro techniku a provoz
Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Stanovisko TDI:	Podp
Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM	Podp
Seznam příložených dokladů:	
1. Položkový rozpočet víceprací /méněprací	

Oznámení o změnách akce č.20

Identifikační údaje akce			
Název	FN Ostrava – rekonstrukce oddělení ORL v objektu Polikliniky		
Objednatel:			
Název	Fakultní nemocnice Ostrava		
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba		
Zhotovitel			
Název	Morys s.r.o.		
Adresa	Korejská 894/9, 702 00 Ostrava - Přívoz		
Oznámení vystavil:			
Ing. Radim Schreiber			
Navrhované změny akce			
HSV + SIL – změna umístění serverovny SLB – z m.č. C228 do m.č. C225			
Zdůvodnění navrhovaných změn			
<p>Z důvodu kybernetické bezpečnosti a s ohledem na plánovanou rekonstrukci oddělení laboratoří genetiky v 2.NP objektu Polikliniky došlo ke změně umístění serverovny SLB z m.č. C 228, ve které jsou umístěny rozvaděče silnoproudu do místnosti C225. Původně plánovaná místnost by velikostně neodpovídala požadavkům na umístění dalšího vybavení SLB pro oddělení genetiky. V místnosti C225 se provedenou nezbytně nutné stavební úpravy a to výměna dveří za protipožární, přemístí se klimatizace, úprava silnoproudu a výmalba.</p> <p>Tyto změny zadavatel s péčí řádného hospodáře nemohl v době tvorby PD a zadávání VZ předvídat.</p>			
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč		212 412,36 Kč	
Výsledná cena změn bez DPH:			
		212 412,36 Kč	

		Výsledná celková cena změny DPH
		44 606,60 Kč
		Výsledná celková cena změny vč. DPH
		257 018,96 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
Nerelevantní.		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava 15.9.2023		
		
		
		Ing. Marek Veselý náměstek ředitele pro techniku a provoz
Podpis zmocněnce zhotovitele:		
		
Stanovisko TDI:		Podp
Stanovisko projektanta stavby:		Podp
SOUHLASÍM		
Seznam příložených dokladů:		
1. Položkový rozpočet víceprací /méněprací		
