

**Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo
ze dne 14. 02. 2023**

(dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

I. Smluvní strany

Fakultní nemocnice Ostrava

se sídlem: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava

IČ: 00843989

DIČ: CZ00843989

jednající: MUDr. Jiří Havrlant, MHA, ředitel Fakultní nemocnice Ostrava

zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č.j. OP-054-25.11.90

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Metrostav DIZ s.r.o.

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČ: 25021915

DIČ: CZ25021915

jednající: Ing. Karel Volf, předseda sboru jednatelů a Ing. Tomáš Erhard, jednatel

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně jako „**Smluvní strany**“)

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají výše uvedené Smluvní strany tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo ze dne 14. 02. 2023, evidenční číslo 001/OVZ/23/011 – OD (dále jen „**Dodatek č. 4**“).

Veřejná zakázka je realizována v rámci výzvy č. 135 Operačního programu životního prostředí. Projekt je veden pod reg. č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006311.

II. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly k dnešnímu dni na této změně Smlouvy o dílo ze dne 14. 2. 2023, 001/OVZ/23/011 – OD (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je „**FN Ostrava – Lůžkový blok, energeticky úsporná opatření – technologické řešení budovy**“

1. V důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba dodatečných prací, které nebyly obsaženy ve Smlouvě (dále jen „**vícepráce**“) a tyto dodatečné práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních prací podle Smlouvy. Zároveň se Smluvní strany dohodly na neprovedení některých původně sjednaných prací (dále jen „**méněpráce**“). Předmětem tohoto dodatku je tedy úprava předmětu Smlouvy o vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla, a také posun termínu plnění.

2. V návaznosti na provedení víceprací, méněprací a posun termínu plnění se dosavadní ustanovení článku **III. Termín plnění, odstavce 1** a ustanovení článku **V. Cena a platební podmínky, odstavce 1**. Smlouvy ruší a nahrazuje textem:

III. Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dodržet termín uvedený v následující tabulce:

<i>Termín předání a převzetí staveniště:</i>	<i>do 5 pracovních dnů od převzetí písemné výzvy objednatele (pokud se smluvní strany nedohodnou jinak)</i>
<i>Termín zahájení plnění díla:</i>	<i>bezprostředně po předání staveniště</i>
<i>Termín pro dokončení, předání a převzetí díla:</i>	<i>předání díla k řádnému užívání do max. 15.6.2024</i>

V. Cena a platební podmínky

1. V souladu se zněním zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly na ceně:

<i>Celková cena bez DPH</i>	<i>213 943 011,75 Kč</i>
<i>DPH ve výši</i>	<i>44 928 032,47 Kč</i>
<i>Celková cena vč. DPH ve výši</i>	<i>258 871 044,22 Kč</i>

3. Přesná specifikace víceprací a méněprací, navýšení ceny o 22.137.430,11 Kč bez DPH a s tím související snížení ceny o 578.931,80 Kč bez DPH je zaznamenáno ve Oznámení o změně akce č. 16 až č. 28, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 4 (dále jen „**Příloha č. 1**“). Posun termínu plnění je zakomponován v harmonogramu díla, který tvoří Přílohu č. 2 tohoto Dodatku č. 4 (dále jen „**Příloha č. 2**“), a stává se tak nedílnou součástí Smlouvy.
4. Ostatní ujednání této Smlouvy zůstávají beze změny.

III. Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany souhlasí, že Dodatek č. 4 bude zveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „**Registr smluv**“).
- Dodatek č. 4 se stává platným podpisem obou Smluvních stran a účinným nejdříve dnem zveřejnění v Registru smluv. Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy.
- Ostatní ujednání Smlouvy Dodatkem č. 4 nedotčená, zůstávají v platnosti a účinnosti.
- Dodatek č. 4 je vyhotoven v jednom elektronickém stejnopise s platností originálu.
- Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4 je Příloha č. 1 – Oznámení o změně akce č. 16 až č. 28 a Příloha č. 2 – Harmonogram díla

6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 4 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Přílohy: Příloha č. 1 - Oznámení o změně akce č. 16 až č. 28
Příloha č. 2 – Harmonogram díla

V Ostravě dne _____

MUDr. Jiří Havrlant
Digitálně podepsal
MUDr. Jiří Havrlant
Datum: 2024.04.17
12:16:14 +02'00'

Objednatel

MUDr. Jiří Havrlant, MHA
ředitel Fakultní nemocnice Ostrava

V Praze dne _____

Ing. Karel Volf
Digitální podpis:
15.04.2024 14:08:50

Zhotovitel

Ing. Karel Volf
předseda sboru jednatelů
Metrostav DIZ s.r.o.


Ing. Tomáš Erhard
Digitální podpis:
15.04.2024 15:32:36

Zhotovitel

Ing. Tomáš Erhard
jednatel
Metrostav DIZ s.r.o.

Oznámení o změnách akce č 16.

Identifikační údaje akce			
Název		„FN Ostrava - lůžkový blok, energeticky úsporná opatření - technologické řešení budovy“	
SOD ev.č. 001/OVZ/23/011-OD ze dne 09.02.2023 a 14.02.2023			
Objednatel:			
Název		Fakultní nemocnice Ostrava	
Adresa		17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba	
Zhotovitel			
Název		Metrostav DIZ s.r.o.	
Adresa		Koželušská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8	
Oznámení vystavil:			
[REDACTED]			
Navrhované změny akce			
Výměna otopných těles a kompenzátorů.			
Zdůvodnění navrhovaných změn			
Požadavek objednatele na výměnu stávajících otopných těles za nové tělesa v souladu s energetickou úsporou budovy. Řeší příložený rozpočet č. 50a-3. Požadavek objednatele na výměnu stávajících kompenzátorů na potrubí ÚT, které jsou v havarijním stavu. Řeší příložený rozpočet č. 50b. Cena víceprací byla stanovena na základě cen sjednaných ve smlouvě nebo ceníkem ÚRS – varianta je vyznačena v rozpočtech (poslední sloupec – SOD nebo ÚRS). Provedení dodatečných prací je nezbytné k dokončení ve smlouvě zamýšleného účelu díla a změna dodavatele by pro zadavatele představovala nepřiměřené technické i ekonomické obtíže.			
Odkazy na		specifikací:	---
		na výkresy:	---
		na rozpočtové podklady:	---
		na jinou část smlouvy:	---
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☒		odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐
			odstavec 7, § 222 ☐
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
0 Kč		6 988 303,00 Kč	
Výsledná cena změn bez DPH:			

	6 988 303,00 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	1 467 543,63 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	8 455 846,63 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Má vliv na posun termínu dokončení díla o 30 dní.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava	
Datum: 3.4.2024	
Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 28.3.2024	
Stanovisko TDI:	
Datum: 2.4.2024	
Stanovisko projektanta stavby:	
Datum: 3.4.2024	
Seznam příložených dokladů:	
1. Položkový rozpočet víceprací / méněprací. 2. Fotodokumentace – pokud je přiložena, pak je součástí jednotlivých změnových rozpočtů.	

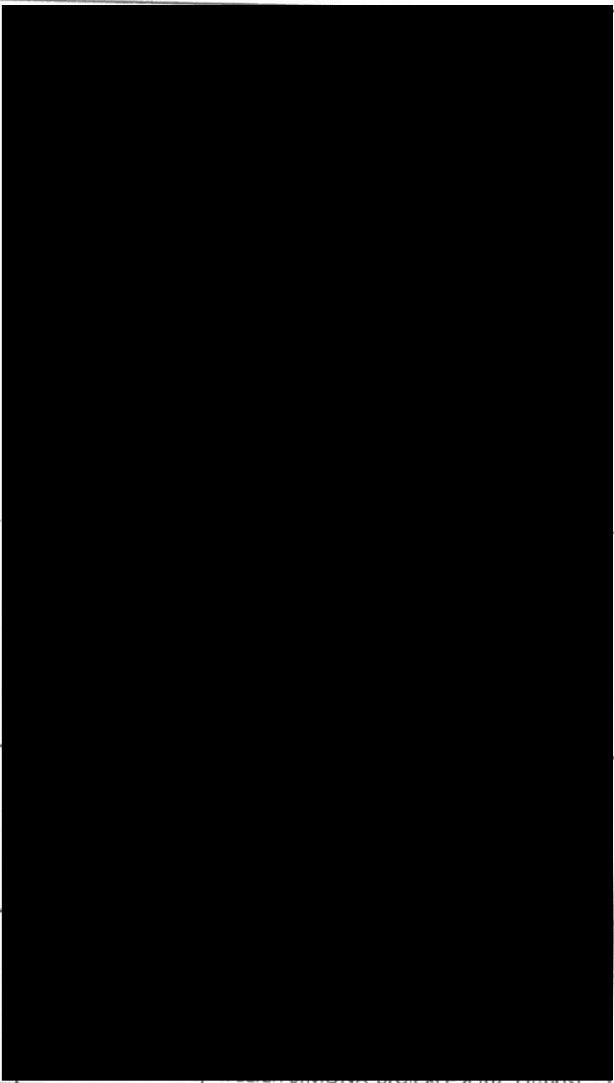
Oznámení o změnách akce č 17.

Identifikační údaje akce			
Název	„FN Ostrava - lůžkový blok, energeticky úsporná opatření - technologické řešení budovy“		
SOD ev.č. 001/OVZ/23/011-OD ze dne 09.02.2023 a 14.02.2023			
Objednatel:			
Název	Fakultní nemocnice Ostrava		
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba		
Zhotovitel			
Název	Metrostav DIZ s.r.o.		
Adresa	Koželušská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8		
Oznámení vystavil:			
[REDACTED]			
Navrhované změny akce			
Stavební úpravy a práce vzniklé při realizaci z důvodu změn, či chybějících položek stavebního řešení.			
Zdůvodnění navrhovaných změn			
Příprava pro vedení potrubí ke SPLIT jednotkám. Řeší příložený rozpočet č. 137. Objednatel požaduje z bezpečnostních důvodů v rámci rekonstrukce pokojů demontáž stávajících dřevěných obkladů. Řeší příložený rozpočet č. 143. Požadavek objednatele na dispoziční úpravu v 1.NP, realizace dvou denních místností. Řeší příložený rozpočet č. 209_3_a. Požadavek objednatele na omyvatelný nátěr na podhledech v oddělení popálenin, tak aby odpovídaly zvýšeným hygienickým požadavkům. Řeší příložený rozpočet č. 215. Cena víceprací byla stanovena na základě cen sjednaných ve smlouvě, ceníkem ÚRS nebo cenovou nabídkou - varianta je vyznačena v rozpočtech (poslední sloupec – SOD, ÚRS nebo CN). Provedení dodatečných prací je nezbytné k dokončení ve smlouvě zamýšleného účelu díla a změna dodavatele by pro zadavatele představovala nepřiměřené technické i ekonomické obtíže.			
Odkazy na	specifikaci:	---	
	na výkresy:	---	
	na rozpočtové podklady:	---	
	na jinou část smlouvy:	---	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč		492 997,82 Kč	
Výsledná cena změn bez DPH:			

	492 997,82 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	103 529,54 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	596 527,36 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava	
Datum: 3.4.2024	
Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 28.3.2024	
Stanovisko TDI:	
Datum: 2.4.2024	
Stanovisko projektanta stavby:	
Datum: 3.4.24	
Seznam příložených dokladů:	
1. Položkový rozpočet víceprací / méněprací. 2. Fotodokumentace – pokud je přiložena, pak je součástí jednotlivých změnových rozpočtů.	


Oznámení o změnách akce č 18.

Identifikační údaje akce			
Název		„FN Ostrava - lůžkový blok, energeticky úsporná opatření - technologické řešení budovy“	
SOD ev.č. 001/OVZ/23/011-OD ze dne 09.02.2023 a 14.02.2023			
Objednatel:			
Název		Fakultní nemocnice Ostrava	
Adresa		17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba	
Zhotovitel			
Název		Metrostav DIZ s.r.o.	
Adresa		Koželušská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8	
Oznámení vystavil:			
[REDACTED]			
Navrhované změny akce			
Podhledy a příčka - demontáže a úprava konstrukce.			
Zdůvodnění navrhovaných změn			
Pro realizace trasy EPS, rozvodů chladu a VZT dle PD je nutno demontovat stávající podhled. Řeší příložený rozpočet č. 140. V rámci koordinace se související stavbou (nově budované trasy VZT k CHÚC) bylo pro vytvoření nového SDK podhledu, nutné použít systém nonius, který umožňuje více úrovně zavěšení. Řeší příložený rozpočet č. 210_2. Požadavek objednatele vybudování SDK příčky s požární odolností ve 4.NP na chodbě, severní část LB. Řeší příložený rozpočet č. 252. Cena víceprací byla stanovena na základě cen sjednaných ve smlouvě nebo ceníkem ÚRS - varianta je vyznačena v rozpočtech (poslední sloupec – SOD nebo ÚRS). Provedení dodatečných prací je nezbytné k dokončení ve smlouvě zamýšleného účelu díla a změna dodavatele by pro zadavatele představovala nepřiměřené technické i ekonomické obtíže.			
Odkazy na	specifikaci:	---	
	na výkresy:	---	
	na rozpočtové podklady:	---	
	na jinou část smlouvy:	---	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☒	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč		135 865,54 Kč	
Výsledná cena změn bez DPH:			

	135 865,54 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	28 531,76 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	164 397,30 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava	
Datum: 3.4.2024	
Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 28.3.2024	
Stanovisko TDI:	
Datum: 2.4.2024	
Stanovisko projektanta stavby:	
Datum: 3.4.24	
Seznam příložených dokladů:	
1. Položkový rozpočet víceprací / méněprací. 2. Fotodokumentace – pokud je přiložena, pak je součástí jednotlivých změnových rozpočtů.	

Oznámení o změnách akce č 19.

Identifikační údaje akce			
Název		„FN Ostrava - lůžkový blok, energeticky úsporná opatření - technologické řešení budovy“	
SOD ev.č. 001/OVZ/23/011-OD ze dne 09.02.2023 a 14.02.2023			
Objednatel:			
Název		Fakultní nemocnice Ostrava	
Adresa		17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba	
Zhotovitel			
Název		Metrostav DIZ s.r.o.	
Adresa		Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8	
Oznámení vystavil:			
[REDAKCE]			
Navrhované změny akce			
Podhledy v 1.PP - pomocná kce pro zavěšení svítidel, doplnění revizních dvířek.			
Zdůvodnění navrhovaných změn			
V souladu s PBR a požadavky objednatele je v prostorech 1.PP navržen kazetový oboustranný protipožární podhled. Pro tento typ podhledu je potřeba provést pomocnou kci pro zavěšení svítidel, v souladu s technickými požadavky výrobce. Řeší příložený rozpočet č. 228. Na základě skutečně provedených prací, je dopřesněna výměra změnového listu č. 3 v dodávku č. 2 (a změnový list č. 15, dodatku č. 3) ke smlouvě o dílo vč. dodání 2 ks revizních dvířek. Viz příložený rozpočet č. 229. Cena víceprací byla stanovena na základě cen sjednaných ve smlouvě nebo ceníkem ÚRS - varianta je vyznačena v rozpočtech (poslední sloupec – SOD nebo ÚRS). Provedení dodatečných prací je nezbytné k dokončení ve smlouvě zamýšleného účelu díla a změna dodavatele by pro zadavatele představovala nepřiměřené technické i ekonomické obtíže.			
Odkazy na		specifikaci:	---
		na výkresy:	---
		na rozpočtové podklady:	---
		na jinou část smlouvy:	---
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☒	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
- 0,00 Kč		58 899,90 Kč	
Výsledná cena změn bez DPH:			

	58 899,90 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	12 368,98 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	71 268,88 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava	
Datum: 3.4.2024	
Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 28.3.2024	
Stanovisko TDI:	
Datum: 2.4.2024	
Stanovisko projektanta stavby:	
Datum: 3.4.24	
Seznam příložených dokladů:	
1. Položkový rozpočet víceprací / méněprací. 2. Fotodokumentace – pokud je přiložena, pak je součástí jednotlivých změnových rozpočtů.	

Oznámení o změnách akce č 20.

Identifikační údaje akce			
Název		„FN Ostrava - lůžkový blok, energeticky úsporná opatření - technologické řešení budovy“	
SOD ev.č. 001/OVZ/23/011-OD ze dne 09.02.2023 a 14.02.2023			
Objednatel:			
Název		Fakultní nemocnice Ostrava	
Adresa		17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba	
Zhotovitel			
Název		Metrostav DIZ s.r.o.	
Adresa		Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8	
Oznámení vystavil:			
[REDAKCE]			
Navrhované změny akce			
Stavební úpravy a práce vzniklé při realizaci z důvodu změn, či chybějících položek profesí.			
Zdůvodnění navrhovaných změn			
V souvislosti s realizací nového podhledu požaduje objednatel realizovat i nová svítidla. Uvedená VCP řeší prostory 1.NP a 1.PP; bližší specifikace dotčených místností viz. příložený rozpočet č. 175. Požadavek objednatele na doplnění osvětlení JIH 1.NP-1.PP a JIP 2.NP a 7.NP v rámci oddělení. Řeší příložený rozpočet č. 175b. Požadavek objednatele na dobrojení rozvaděče HRVZT-N pro výtahy. Řeší příložený rozpočet č. 178. Položkový rozpočet neobsahoval odstranění prvků VZT v rámci náhradního provozu. Řeší příložený rozpočet č. 235. Cena víceprací byla stanovena na základě cen sjednaných ve smlouvě, ceníkem ÚRS nebo cenovou nabídkou - varianta je vyznačena v rozpočtech (poslední sloupec – SOD, ÚRS nebo CN). Provedení dodatečných prací je nezbytné k dokončení ve smlouvě zamýšleného účelu díla a změna dodavatele by pro zadavatele představovala nepřiměřené technické i ekonomické obtíže.			
Odkazy na		specifikaci:	

		na výkresy:	

		na rozpočtové podklady:	

		na jinou část smlouvy:	

Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☒		odstavec 5, § 222 ☐	
		odstavec 6, § 222 ☐	
		odstavec 7, § 222 ☐	
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
- 0,00 Kč		1 149 339,23 Kč	
Výsledná cena změn bez DPH:			

	1 149 339,23 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	241 361,24 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	1 390 700,47 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava	
Datum: 3.4.2024	
Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 28.3.2024	
Stanovisko TDI:	
Datum: 2.4.2024	
Stanovisko projektanta stavby:	
Datum: 2.4.24	
Seznam příložených dokladů:	
1. Položkový rozpočet víceprací / méněprací. 2. Fotodokumentace – pokud je přiložena, pak je součástí jednotlivých změnových rozpočtů.	

Oznámení o změnách akce č 21.

Identifikační údaje akce

Název

„FN Ostrava - lůžkový blok, energeticky úsporná opatření - technologické řešení budovy“

SOD ev.č. 001/OVZ/23/011-OD ze dne 09.02.2023 a 14.02.2023

Objednatel:

Název

Fakultní nemocnice Ostrava

Adresa

17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba

Zhotovitel

Název

Metrostav DIZ s.r.o.

Adresa

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Oznámení vystavil:

Navrhované změny akce

Úpravy na rozvodech chladu.

Zdůvodnění navrhovaných změn

Při realizaci nových rozvodů chladu byla zjištěna kolize se stávajícím vedením nefunkčního parovodu, po dohodě s objednatelem budou trasy páry demontovány. Řeší příložený rozpočet č. 181.

Na základě PBŘ, došlo k přemístění nově budovaných rozvaděčů MAR mimo prostor CHÚC. Řeší příložený rozpočet č. 214_2.

Při realizaci rozvodu chladu bylo zjištěno, že je nutné doplnění armatur pro napojení ve 2.PP na diferenciální péči. Řeší příložený rozpočet č. 238.

V rámci probíhajících prací na rozvodech chladu, je nutné doplnit armatury, tak aby mohly být prováděny dílčí tlakové zkoušky a navazující práce vč. izolačních. Je nutno provést z důvodu postupného zprovoznování jednotlivých oddělení. Řeší příložený rozpočet č. 239.

Cena víceprací byla stanovena na základě cen sjednaných ve smlouvě, ceníkem ÚRS nebo cenovou nabídkou - varianta je vyznačena v rozpočtech (poslední sloupec - SOD, ÚRS nebo CN).

Provedení dodatečných prací je nezbytné k dokončení ve smlouvě zamýšleného účelu díla a změna dodavatele by pro zadavatele představovala nepřiměřené technické i ekonomické obtíže.

Odkazy na

specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 ☐

odstavec 5, § 222 ☒

odstavec 6, § 222 ☐


odstavec 7, § 222 ☐

Cena méněprací bez DPH:

Cena víceprací bez DPH:

- 0,00 Kč

307 710,96 Kč

Výsledná cena změn bez DPH:	
	307 710,96 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	64 619,30 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	372 330,26 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava	
Datum: 3.4.2024	
Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 28.3.2024	
Stanovisko TDI:	
Datum: 2.4.2024	
Stanovisko projektanta stavby:	
Datum: 3.4.2024	
Seznam přiložených dokladů:	
1. Položkový rozpočet víceprací / méněprací. 2. Fotodokumentace – pokud je přiložena, pak je součástí jednotlivých změnových rozpočtů.	

Oznámení o změnách akce č. 22.

Identifikační údaje akce	
Název	„FN Ostrava - lůžkový blok, energeticky úsporná opatření - technologické řešení budovy“
SOD ev.č. 001/OVZ/23/011-OD ze dne 09.02.2023 a 14.02.2023	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	Metrostav DIZ s.r.o.
Adresa	Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Oznámení vystavil:	
[REDAKCE]	
Navrhované změny akce	
Stavební úpravy a práce vzniklé při realizaci z důvodu změn, či chybějících položek profesí.	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
VV neobsahuje odvod kondenzátu pro VZT zařízení č. 4 a 5. Nutné doplnit pro správnou funkci zařízení. Řeší příložený rozpočet č. 116. Stávající dispozice v 5.NP na západní straně LB neodpovídá PD. Nutná demontáž stávajícího osvětlení a doplnění nového. Řeší příložený rozpočet č. 141. Demontovaný stávající podhled m.č. A_31b na 10.NP-1.PP nelze montovat zpět, a proto je nahrazen novým. V souvislosti s touto změnou je nutno realizovat i nová svítidla do rastrového podhledu. Řeší příložený rozpočet č. 142. Požadavek objednatele na doplnění svítidla do denní místnosti ve 3.NP západní strana LB. Řeší příložený rozpočet č. 170. V návaznosti na demontáž podhledů ve 2.NP chodeb u intermediálních pokojů vznikl požadavek objednatele na doplnění nového osvětlení a doplnění nového podhledu. Řeší příložený rozpočet č. 173. Z důvodu zajištění plné funkčnosti technologie bylo nutné vyměnit koncové prvky VZT (anemostaty, vč. přívodního potrubí) a doplnit revizní dvířka k servisním úkonům. Řeší příložený rozpočet 202. V trase nových rozvodů VZT a chladu vzniká kolize se stávajícími rozvody mediálních plynů. Z uvedeného důvodu je nutné tyto rozvody přeložit. Řeší příložený rozpočet č. 203. Cena víceprací byla stanovena na základě cen sjednaných ve smlouvě, ceníkem ÚRS nebo cenovou nabídkou - varianta je vyznačena v rozpočtech (poslední sloupec – SOD, ÚRS nebo CN). Provedení dodatečných prací je nezbytné k dokončení ve smlouvě zamýšleného účelu díla a změna dodavatele by pro zadavatele představovala nepřiměřené technické i ekonomické obtíže.	
Odkazy na	specifikaci: ---
	na výkresy: ---
	na rozpočtové podklady: ---
	na jinou část smlouvy: ---
Důvod vícepráce / méněpráce:	
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.	

odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☒	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Cena méněpráci bez DPH:		Cena vícepráci bez DPH:	
- 0,00 Kč		720 770,67 Kč	
Výsledná cena změn bez DPH:			
		720 770,67 Kč	
		Výsledná celková cena změny DPH	
		151 361,84 Kč	
		Výsledná celková cena změny vč. DPH	
		872 132,52 Kč	
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:			
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava			
Datum: 3.4.2024			
Podpis zmocněnce zhotovitele:			
Datum: 29.3.2024			
Stanovisko TDI:			
Datum: 2.4.2024			

Stanovisko projektanta stavby:

Datum:

3.6. 2021

Seznam příložených dokladů:

1. Položkový rozpočet víceprací / méněprací.
2. Fotodokumentace – pokud je přiložena, pak je součástí jednotlivých změnových rozpočtů.

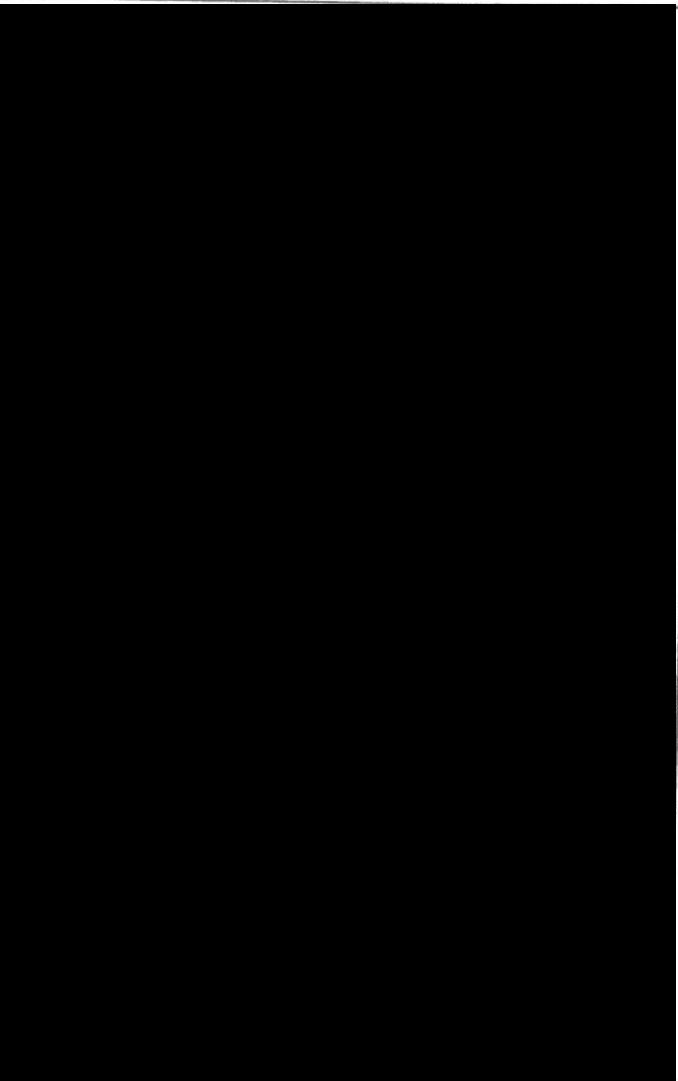
Oznámení o změnách akce č 23.

Identifikační údaje akce			
Název		„FN Ostrava - lůžkový blok, energeticky úsporná opatření - technologické řešení budovy“	
SOD ev.č. 001/OVZ/23/011-OD ze dne 09.02.2023 a 14.02.2023			
Objednatel:			
Název		Fakultní nemocnice Ostrava	
Adresa		17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba	
Zhotovitel			
Název		Metrostav DIŽ s.r.o.	
Adresa		Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8	
Oznámení vystavil:			
[REDACTED]			
Navrhované změny akce			
Podlaha strojovny VZT ve 2.PP - bourání, sanace sloupů a realizace nové podlahy.			
Zdůvodnění navrhovaných změn			
Při realizaci nových tras kanalizace ve strojovně VZT ve 2.PP bylo zjištěno, že stávající skladba podlahy je nesoudržná. Nevyhovující stav původní podlahy je nutné nahradit novou. Řeší příložený rozpočet č. 201-KD_2_ASŘ_N_2_M_2024 a 201-KD_2_BOUR_3. V návaznosti na nově realizovanou podlahu bude provedena i sanace patek ŽB sloupů. 201-KD_2_ASŘ SLOUP. Cena víceprací byla stanovena na základě cen sjednaných ve smlouvě nebo ceníkem ÚRS - varianta je vyznačena v rozpočtech (poslední sloupec – SOD nebo ÚRS). Provedení dodatečných prací je nezbytné k dokončení ve smlouvě zamýšleného účelu díla a změna dodavatele by pro zadavatele představovala nepřiměřené technické i ekonomické obtíže.			
Odkazy na		specifikaci:	---
		na výkresy:	---
		na rozpočtové podklady:	---
		na jinou část smlouvy:	---
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☐		odstavec 5, § 222 ☒	odstavec 6, § 222 ☐
			odstavec 7, § 222 ☐
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
- 578 931,80 Kč		1 522 104,37 Kč	
Výsledná cena změn bez DPH:			

	943 172,57 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	198 066,24 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	1 141 238,81 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava Datum: 3.4.2024	
Podpis zmocněnce zhotovitele: Datum: 28.3.2024	
Stanovisko TDI: Datum: 2.4.2024	
Stanovisko projektanta stavby: Datum: 3. 4. 24	
Seznam příložených dokladů:	
1. Položkový rozpočet víceprací / méněprací. 2. Fotodokumentace – pokud je přiložena, pak je součástí jednotlivých změnových rozpočtů.	



Oznámení o změnách akce č 24.

Identifikační údaje akce			
Název		„FN Ostrava - lůžkový blok, energeticky úsporná opatření - technologické řešení budovy“	
SOD ev.č. 001/OVZ/23/011-OD ze dne 09.02.2023 a 14.02.2023			
Objednatel:			
Název		Fakultní nemocnice Ostrava	
Adresa		17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba	
Zhotovitel			
Název		Metrostav DIZ s.r.o.	
Adresa		Koželušská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8	
Oznámení vystavil:			
[REDACTED]			
Navrhované změny akce			
Silnoprůdové přívody vč. nového rozvaděče.			
Zdůvodnění navrhovaných změn			
Stávající rozvaděč neumožňuje napojení nových požárních ventilátorů v souladu s platnou legislativou. Řeší příložený rozpočet č. 204_CN_K_VV. Z důvodu dodávky nových ventilátorů a nového rozvaděče je nutné doplnit silnoprůdový přívod. Řeší rozpočet č. 184_K_VV. Cena víceprací byla stanovena na základě cen sjednaných ve smlouvě, ceníkem ÚRS nebo cenovou nabídkou - varianta je vyznačena v rozpočtech (poslední sloupec – SOD, ÚRS nebo CN). Provedení dodatečných prací je nezbytné k dokončení ve smlouvě zamýšleného účelu díla a změna dodavatele by pro zadavatele představovala nepřiměřené technické i ekonomické obtíže.			
Odkazy na	specifikaci:	---	
	na výkresy:	---	
	na rozpočtové podklady:	---	
	na jinou část smlouvy:	---	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☒		odstavec 5, § 222 ☐	
		odstavec 6, § 222 ☐	
		odstavec 7, § 222 ☐	
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
- 0,00 Kč		1 807 815,54 Kč	
Výsledná cena změn bez DPH:			

	1 807 815,54 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	379 641,26 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	2 187 456,80 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava	
Datum: 3.4.2024	
Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 28.3.2024	
Stanovisko TDI:	
Datum: 2.4.2024	
Stanovisko projektanta stavby:	
Datum: 3.4.2024	
Seznam příložených dokladů:	
1. Položkový rozpočet víceprací / méněprací. 2. Fotodokumentace – pokud je přiložena, pak je součástí jednotlivých změnových rozpočtů.	

Oznámení o změnách akce č 25.

Identifikační údaje akce			
Název		„FN Ostrava - lůžkový blok, energeticky úsporná opatření - technologické řešení budovy“	
SOD ev.č. 001/OVZ/23/011-OD ze dne 09.02.2023 a 14.02.2023			
Objednatel:			
Název		Fakultní nemocnice Ostrava	
Adresa		17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba	
Zhotovitel			
Název		Metrostav DIZ s.r.o.	
Adresa		Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8	
Oznámení vystavil:			
[REDACTED]			
Navrhované změny akce			
Doplnění a změny v rámci 1.PP - chráněné únikové cesty.			
Zdůvodnění navrhovaných změn			
Demontované (původní) podhledy nelze montovat zpět, a proto jsou nahrazeny podhledy novými, které zároveň sjednotí stropy s nově realizovanými prostory. V souvislosti s realizací nových podhledů je nutno osadit i nová svítidla do rastrového podhledu. Uvedená VCP řeší prostory 1.PP (bližší specifikace dotčených místností viz. příložené rozpočty č. 205a - d). Z důvodu dodržení požadavků PBŘ je nutno nově instalované anemostaty požárně oddělit od zbývajících rozvodů VZT. Pro správnou funkci požárního předělu je nutné provést napojení na systém EPS a MAR vč. SLN. Řeší příložený rozpočet č. 234a - d. Cena víceprací byla stanovena na základě cen sjednaných ve smlouvě, ceníkem ÚRS nebo cenovou nabídkou - varianta je vyznačena v rozpočtech (poslední sloupec - SOD, ÚRS nebo CN). Provedení dodatečných prací je nezbytné k dokončení ve smlouvě zamýšleného účelu díla a změna dodavatele by pro zadavatele představovala nepřiměřené technické i ekonomické obtíže.			
Odkazy na			
specifikaci:		---	
na výkresy:		---	
na rozpočtové podklady:		---	
na jinou část smlouvy:		---	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☒	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
- 0,00 Kč		2 137 280,04 Kč	
Výsledná cena změn bez DPH:			

	2 137 280,04 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	448 828,81 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	2 586 108,85 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava	
Datum: 3.4.2024	
Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 28.3.2024	
Stanovisko TDI:	
Datum: 2.4.2024	
Stanovisko projektanta stavby:	
Datum: 3.4.2024	
Seznam příložených dokladů:	
1. Položkový rozpočet víceprací / méněprací. 2. Fotodokumentace – pokud je přiložena, pak je součástí jednotlivých změnových rozpočtů.	


Oznámení o změnách akce č 26.

Identifikační údaje akce												
Název		„FN Ostrava - lůžkový blok, energeticky úsporná opatření - technologické řešení budovy“										
SOD ev.č. 001/OVZ/23/011-OD ze dne 09.02.2023 a 14.02.2023												
Objednatel:												
Název		Fakultní nemocnice Ostrava										
Adresa		17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba										
Zhotovitel												
Název		Metrostav DIZ s.r.o.										
Adresa		Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8										
Oznámení vystavil:												
[REDACTED]												
Navrhované změny akce												
Nefunkční stávající rozvody pitné vody - 8 stoupacích vedení.												
Zdůvodnění navrhovaných změn												
Na základě požadavku objednatele proběhne výměna 8 stoupacích vedení pitné vody. Řeší příložený rozpočet č. 217_2 a 246. Cena víceprací byla stanovena na základě cen sjednaných ve smlouvě nebo ceníkem ÚRS - varianta je vyznačena v rozpočtech (poslední sloupec – SOD nebo ÚRS). Provedení dodatečných prací je nezbytné k dokončení ve smlouvě zamýšleného účelu díla a změna dodavatele by pro zadavatele představovala nepřiměřené technické i ekonomické obtíže.												
<table border="1"> <tr> <td rowspan="4">Odkazy na</td> <td>specifikaci:</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>na výkresy:</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>na rozpočtové podklady:</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>na jinou část smlouvy:</td> <td>---</td> </tr> </table>				Odkazy na	specifikaci:	---	na výkresy:	---	na rozpočtové podklady:	---	na jinou část smlouvy:	---
Odkazy na	specifikaci:	---										
	na výkresy:	---										
	na rozpočtové podklady:	---										
	na jinou část smlouvy:	---										
Důvod vícepráce / méněpráce:												
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.												
<table border="1"> <tr> <td>odstavec 4, § 222 ☒</td> <td>odstavec 5, § 222 ☐</td> <td>odstavec 6, § 222 ☐</td> <td>odstavec 7, § 222 ☐</td> </tr> </table>				odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐					
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐									
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:										
- 0,00 Kč		2 590 500,15 Kč										
Výsledná cena změn bez DPH:												

	2 590 500,15 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	544 005,03 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	3 134 505,18 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava Datum: 3.4.2024	[Redacted Signature Area]
Podpis zmocněnce zhotovitele: Datum: 28.3.2024	
Stanovisko TDI: Datum: 2.4.2024	
Stanovisko projektanta stavby: Datum: 3.4.2024	
Seznam příložených dokladů:	
1. Položkový rozpočet víceprací / méněprací. 2. Fotodokumentace – pokud je přiložena, pak je součástí jednotlivých změnových rozpočtů.	


Oznámení o změnách akce č 27.

Identifikační údaje akce			
Název		„FN Ostrava - lůžkový blok, energeticky úsporná opatření - technologické řešení budovy“	
SOD ev.č. 001/OVZ/23/011-OD ze dne 09.02.2023 a 14.02.2023			
Objednatel:			
Název		Fakultní nemocnice Ostrava	
Adresa		17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba	
Zhotovitel			
Název		Metrostav DIZ s.r.o.	
Adresa		Koželušská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8	
Oznámení vystavil:			
[REDACTED]			
Navrhované změny akce			
Podhledy sever - havarijní stav.			
Zdůvodnění navrhovaných změn			
Po odřezání balkonových těles na severní straně došlo a dochází k neočekávanému odpadávání části omítek stropních konstrukcí. Na stavbu byl přivolán statik stavby a nezávislá osoba odborně způsobilá v oboru statiky a dynamiky staveb od zhotovitel. Oba statici došli ke stejnému závěru, že dochází vlivem přetvoření ŽB stropní konstrukce ke změně průběhu momentů a napětí vnitřní síl. Na základě těchto nepředvídatelných skutečností dochází ke zvýšenému množství pádu omítek ze stropů. Toto úzce souvisí i se zjištěnou technologickou nekází při provádění omítek v minulosti je nezbytně nutné zajistit tento havarijní stav dodatečným provedením SDK podhledů. Uvedenou VCP řeší přiložený položkový rozpočet 250_(128). Cena víceprací byla stanovena na základě cen sjednaných ve smlouvě - varianta je vyznačena v rozpočtech (poslední sloupec – SOD). Provedení dodatečných prací je nezbytně k dokončení ve smlouvě zamýšleného účelu díla a změna dodavatele by pro zadavatele představovala nepřiměřené technické i ekonomické obtíže.			
Odkazy na	specifikaci:	---	
	na výkresy:	---	
	na rozpočtové podklady:	---	
	na jinou část smlouvy:	---	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☐		odstavec 5, § 222 ☒	
		odstavec 6, § 222 ☐	
		odstavec 7, § 222 ☐	
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč		2 550 316,70 Kč	
Výsledná cena změn bez DPH:			

	2 550 316,70 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	535 566,51 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	3 085 883,21 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Má vliv na posun termínu dokončení díla o 46 dní.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava	
Datum: 3.4.2024	
Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 28.3.2024	
Stanovisko TDI:	
Datum: 2.4.2024	
Stanovisko projektanta stavby:	
Datum: 3.4.24	
Seznam příložených dokladů:	
1. Položkový rozpočet víceprací / méněprací. 2. Fotodokumentace – pokud je přiložena, pak je součástí jednotlivých změnových rozpočtů.	

Oznámení o změnách akce č 28.

Identifikační údaje akce			
Název		„FN Ostrava - lůžkový blok, energeticky úsporná opatření - technologické řešení budovy“	
SOD ev.č. 001/OVZ/23/011-OD ze dne 09.02.2023 a 14.02.2023			
Objednatel:			
Název		Fakultní nemocnice Ostrava	
Adresa		17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba	
Zhotovitel			
Název		Metrostav DIZ s.r.o.	
Adresa		Koželušská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8	
Oznámení vystavil:			
[REDACTED]			
Navrhované změny akce			
Doplnění osvětlení sever.			
Zdůvodnění navrhovaných změn			
V souvislosti s realizací nového podhledu požaduje objednatel realizovat i nová svítidla. Uvedená VCP řeší prostory 2.PP až 10.NP (kromě 9.NP, 1.NP a 1.PP) sever. Bližší specifikace dotčených místností viz. příložený rozpočet č. 248. Cena víceprací byla stanovena na základě cen sjednaných ve smlouvě, ceníkem ÚRS nebo cenovou nabídkou - varianta je vyznačena v rozpočtech (poslední sloupec – SOD, ÚRS nebo CN). Provedení dodatečných prací je nezbytné k dokončení ve smlouvě zamýšleného účelu díla a změna dodavatele by pro zadavatele představovala nepřiměřené technické i ekonomické obtíže.			
Odkazy na		specifikaci:	---
		na výkresy:	---
		na rozpočtové podklady:	---
		na jinou část smlouvy:	---
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
- 0,00 Kč		1 675 526,19 Kč	
Výsledná cena změn bez DPH:			

	1 675 526,19 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	351 860,50 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	2 027 386,69 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Má vliv na posun termínu dokončení díla o 30 dní.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava	
Datum: 3.4.2024	
Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 28.3.2024	
Stanovisko TDI:	
Datum: 2.4.2024	
Stanovisko projektanta stavby:	
Datum: 7.4.24	
Seznam příložených dokladů:	
1. Položkový rozpočet víceprací / méněprací. 2. Fotodokumentace – pokud je přiložena, pak je součástí jednotlivých změnových rozpočtů.	
