

DOHODA O NAROVNÁNÍ (dále jen „Dohoda“)

uzavřená v souladu s ust. § 1903 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

STRANY DOHODY:

1. **Městský dopravní podnik Opava, a.s.**, IČO: 646 10 250, se sídlem Bílovecká 1127/98, Kylešovice, 747 06 Opava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl: B, vložka 1234, zastoupen: Milan Semera, předseda představenstva
(dále jen „Objednatel“, nebo „MDPO“)

a
2. **Bohemia Müller s.r.o.**, IČO: 250 15 265, se sídlem Loupnická 139, Janov, 435 42 Litvínov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl: C, vložka 11885, zastoupen: Ing. Václav Langheinrich, jednatel
(dále jen „Zhotovitel“ nebo „Bohemia Müller“)

(MDPO a Bohemia Müller společně dále jen „Strany dohody“ a každá z nich jednotlivě také jako „Strana dohody“)

PREAMBULE:

- (A) MDPO v pozici zadavatele zahájila výběrové řízení k zakázce na stavební práce s názvem „**Rekonstrukce a modernizace technologického vybavení měnárny Kylešovská a vlastního objektu měnárny**“ (dále jen „zakázka“). Předmětem zakázky byla v rámci technické a stavební části rekonstrukce, revitalizace a jiné zásahy do objektu měnárny Kylešovská;
- (B) Vzhledem na výsledek zadávacího řízení Strany dohody spolu uzavřely Smlouvu o dílo ze dne 10.02.2022 dále jen „Smlouva“ včetně Dodatku č.1 ze dne 11.08.2022 a Dodatku č. 2 ze dne 05.10.2022 (dále jen společně jako „Dodatky“, nebo samostatně jako „Dodatek č. 1“ a „Dodatek č. 2“);
- (C) Dílo bylo ze strany Zhotovitele odevzdané Objednateli dne 15.11.2022 na základě Protokolu o předání a převzetí díla (dále jen „Protokol“). Skutečná uhrazená cena díla ke dni podpisu Protokolu činila částku 7.364.091 Kč bez DPH.
- (D) Na Smlouvu se vztahuje povinnost jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jako „zákon o registru smluv“), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Vzhledem na kontrolu vykonanou ze strany Ministerstva dopravy České republiky bylo zjištěno, že Smlouva (včetně Dodatků) nebyla řádně uveřejněna ve smyslu podmínek dle § 5 odst. 1 zákona o registru smluv, a proto platí zákonná domněnka, že Smlouva (včetně Dodatků) byla zrušena od počátku v souladu s § 7 odst. 1 zákona o registru smluv;
- (E) Tato Dohoda se uzavírá za účelem postavení na jisto právních vztahů mezi Stranami dohody, předcházení hrozící újmě, případným soudním sporům, ujednání oprávněnosti fakturace Zhotovitele dle Smlouvy a oprávněnosti dosud uhrazených částek, zachování vymezených práv Objednatele vyplývajících ze Smlouvy, včetně práv vyplývajících z případné odpovědnosti za vady, práv Objednatele na případné budoucí smluvní pokuty, případné budoucí náhrady újmy a za účelem maximálního možného naplnění zásad 3E (hospodárnosti, účelnosti a efektivit).

1. Předmět a účel Dohody

- 1.1. Předmětem této Dohody je narovnání všech sporných nebo pochybných nároků vzniklých v souvislosti se Smlouvou a Dodatky, respektive v souvislosti s realizací předmětu Smlouvy a úhradou ceny díla. Sporná nároky jsou blíže popsána v čl. 2 této Dohody.
- 1.2. Účelem této Dohody je odstranění sporných a pochybných práv, respektive vypořádání možných sporných nároků, jak jsou níže definovány. Účelem této Dohody je zabránění vzniku nejasností vzhledem na vzniklou situaci tak jako je popsáné v Preambule.

2. Sporná práva

- 2.1. Mezi Stranami dohody je sporné, jestli vzhledem na uplatnění zákonné domněnky o zrušení Smlouvy od počátku dle § 7 odst. 1 zákona o registru smluv vznikla:
 - Bohemia Müller povinnost vrátit úhrady provedené dle Smlouvy MDPO, a to z jakéhokoliv právního titulu, zejména z titulu bezdůvodného obohacení
 - MDPO povinnost vrátit Bohemia Müller poskytnuté plnění, resp. poskytnout peněžní náhradu za vykonané dílo
- 2.2. Mezi Stranami dohody je rovněž sporné, jaká náhrada případně přináleží Bohemia Müller z titulu nemožnosti vrácení vykonaných prací na díle, respektive v jaké výši.
- 2.3. Sporné nároky Stran dohody popsáné v čl. 2.1 a 2.2 jsou dále souhrnně označovány jako „**Sporné nároky**“.

3. Narovnání

- 3.1. Strany dohody tímto mezi sebou **narovnávají Sporné nároky**, a to tak, že tyto Sporné nároky zanikají a jsou v plném rozsahu **nahrazeny** právy a povinnostmi stanovenými v čl. 4 této Dohody.
- 3.2. Strany dohody potvrzují, že tato Dohoda řeší s konečnou platností veškeré existující i potenciální, aktuální i budoucí vzájemné nároky Stran dohody jakkoli související se Smlouvou o dílo, Spornými nároky, není-li v této Dohodě výslovně stanoveno jinak.

4. Závazky z narovnání

- 4.1. Strany dohody se dohodly v rámci narovnání Sporných nároků na následujícím:
 - (a) MDPO nemá povinnost vrátit Bohemia Müller poskytnuté plnění, resp. poskytnout peněžní náhradu za vykonané dílo dle Smlouvy
 - (b) Bohemia Müller nemá povinnost vrátit MDPO již uhrazenou cenu za dílo dle Smlouvy z titulu bezdůvodného obohacení či jakéhokoliv jiného právního titulu
 - (c) MDPO činí nesporným, že od Bohemia Müller převzala dílo řádně vykonané v rozsahu dle čl. III odst. 3.1 a 3.2 Smlouvy
 - (d) Bohemia Müller činí nesporným, že od MDPO přijala částku ve výši 7.364.091 Kč bez DPH, přičemž tato částka není bezdůvodným obohacením, jde o úhradu ceny díla dle Smlouvy

- (e) Pro odstranění pochybností Strany dohody výslovně prohlašují a sjednávají, že ke dni účinnosti této Dohody jsou veškeré možné nároky MDPO na vrácení částky odpovídající uhrazené ceně za dílo, zejména z titulu bezdůvodného obohacení a možné nároky Bohemia Müller na náhradu vykonaných prací za **zcela vypořádané**.
- 4.2. Strany dohody se dohodly, že v části záruky za jakost, odpovědnosti za vady, nároku na smluvní pokuty se Strany dohody řídí, zejména články XIV – XVI Smlouvy o dílo a Dodatky, které jsou přílohou č. 1 této Dohody. Strany se dále budou řídit všemi ustanoveními Smlouvy o dílo a Dodatky, z jejichž povahy plyne závaznost mezi Stranami i po odevzdání díla a zaplacení ceny díla.

5. Prohlášení Stran dohody

- 5.1. Každá ze Stran dohody prohlašuje, že žádné nároky přímo nebo nepřímo související se Smlouvou nepostoupila před Dnem podpisu na třetí osobu, ani je neposkytla jako předmět zajištění.
- 5.2. Strany dohody prohlašují, že nepodaly vůči druhé Straně dohody žádné žaloby, návrhy na předběžná opatření ani jiná podání k orgánům veřejné moci a ke dni podpisu Dohody nemají žádné další nároky, které by zakládaly důvod pro podání takových žalob nebo návrhů.
- 5.3. Každá Strana dohody, že je oprávněna tuto Dohodu uzavřít a plnit. Každá Strana dohody dále prohlašuje, že získala veškeré potřebné souhlasy, povolení a potvrzení k uzavření a plnění této Dohody a že jí v uzavření ani plnění této Dohody nebrání žádné smluvní, zákonné nebo jiné překážky.
- 5.4. Strany dohody se zavazují zajistit správnost a úplnost příslušných prohlášení uvedených v tomto článku.

6. Závěrečná ustanovení

- 6.1. Tato Dohoda nabývá platnost jejím podpisem poslední Stranou dohody.
- 6.2. Tato Dohoda nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv postupem podle zákona o registru smluv. Strany dohody se dohodly, že její uveřejnění zajistí MDPO.
- 6.3. Pokud některé z ustanovení této Dohody je nebo se stane neplatným, neúčinným či zdánlivým, neplatnost, neúčinnost či zdánlivost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost Dohody jako celku ani jiných ustanovení této Dohody, pokud je takovéto ustanovení oddělitelné od zbytku této Dohody. Strany dohody se zavazují takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení.
- 6.4. Tato Dohoda může být měněna pouze písemnou dohodou Stran dohody.
- 6.5. Tato Dohoda se řídí a bude vykládána v souladu právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem.
- 6.6. Strany dohody se tímto zavazují, že vynaloží veškeré úsilí, které po nich lze požadovat, aby urovnaly veškeré spory související s touto Dohodou smírnou cestou. Pokud se jim spor nepodaří vyřešit smírnou cestou ve lhůtě dvaceti (20) dne ode dne, kdy se kterákoli Strana zahájí jednání o smíru písemnou výzvou anebo ve lhůtě, na níž se Strany dohodnou, je kterákoli ze Stran oprávněna předložit spor na rozhodnutí příslušnému soudu.

- 6.7. Veškeré spory z této Dohody nebo v souvislosti s ní budou řešeny věcně a místně příslušným soudem České republiky.
- 6.8. Tato Dohoda je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce, z nichž každá Strana dohody obdrží po jednom (1) vyhotovení.
- 6.9. Zástupci Stran dohody prohlašují, že se s obsahem Dohody před jejím podpisem seznámili, a že s ní bezvýhradně souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.
- 6.10. Nedílnou součástí této Dohody jsou její následující přílohy:
- (a) Příloha č. 1 – Smlouva o dílo a Dodatky.

V Opavě dne _____

V _____ dne _____

Městský dopravní podnik Opava, a.s.:

**Milan
Semera**

Digitálně podepsal
Milan Semera
Datum: 2024.04.24
11:18:32 +02'00'

Milan Semera
předseda představenství

Bohemia Müller s.r.o.:

**Ing. Václav
Langheinrich**

Digitálně podepsal Ing. Václav
Langheinrich
Datum: 2024.04.24 10:22:21
+02'00'

Ing. Václav Langheinrich
jednatel

SMLOUVA O DÍLO

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: **Městský dopravní podnik Opava, a.s.**
Sídlo: **Bílovecká 1127/98, Kylešovice, 747 06 Opava**
IČ: **64610250**
DIČ: **CZ64610250**
Datová schránka: **h49e6w2**
Číslo účtu: **[REDACTED]**
Bankovní spojení: **ČSOB, a.s.**
Zastoupen: **Ing. Vladimír Schreier, předseda představenstva společnosti**
Zapsán: **v OR vedeném KS v Ostravě oddíl B, vložka 1234**
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: **[REDACTED]**
Kontaktní osoby ve věcech technických: **[REDACTED]**
dále jen „objednatel“

a	
Zhotovitel:	Bohemia Müller s.r.o.
Sídlo:	Loupnická 139, Janov, 435 42 Litvínov
IČ:	25015265
DIČ:	CZ25015265
Datová schránka:	gskrg86
E-mailová adresa:	sekretariat@bohemiamura.cz
Číslo účtu:	[REDACTED]
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Zastoupen:	Karel Müller, jednatel
Zapsán:	v OR vedeném KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 11885
Kontaktní osoby ve věcech smluvních:	Ing. Václav Langheinrich, jednatel
Kontaktní osoby ve věcech technických:	[REDACTED]
dále jen „zhotovitel“	

Článek II.

Základní ustanovení

- 2.1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v článku I. této smlouvy jsou v souladu se skutečností a že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
- 2.2. Zhotovitel prohlašuje, že má a po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy bude mít sjednánu pojistnou smlouvu o odpovědnosti za škodu pokrývající škodu vzniklou porušením povinností podle této smlouvy nebo v souvislosti s plněním této smlouvy.

Článek III.

Předmět smlouvy

- 3.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo - stavbu s názvem:

„Rekonstrukce a modernizace technologického vybavení měřírny Kylešovská včetně vlastního objektu měřírny“

jehož součástí je:

D.Technologická část:

- PS1 Střídavá část
- PS2 Trakční technologie
- PS3 Vlastní spotřeba
- PS4 Hromosvod
- PS5 Stavební elektroinstalace

E.Stavební část

Revitalizace obvodového pláště zahrnující výměnu vratových, okenních a dveřních otvorů, zateplení obvodových stěn budovy

Sanace svislého obvodového zdiva, izolace proti zemní vlhkosti

Klempířské a zámečnické práce

Opravy vnitřních stěn a omítek

Oprava přístupových zpevněných ploch kolem objektu

Vše v rozsahu dle projektové dokumentace pro provádění stavby
(dále také jen "dílo").

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu a v rozsahu Zadávací dokumentace a stanoveném, projektovou dokumentací pro provádění stavby z 08/2017 zpracovanou Ing. Petrem Tillem, OHS ŽS, a.s., Dopravní stavby, divize technologie, ul. Světlá 5, 614 00 Brno (dále také jen „zadávací dokumentace“ nebo „projektová dokumentace“), předpisy upravujícími provádění stavebních děl, nabídkou zhotovitele ze dne 15.11.2021, touto smlouvou a případnými dalšími pokyny objednatele.

Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, že mu jsou všechny výše uvedené dokumenty známy a že má tyto dokumenty od objednatele k dispozici.

3.2. Součástí díla je rovněž:

- odvoz, případná recyklace vybouraných hmot mimo staveniště, uložení na skládce, přičemž poplatky za skládku vybouraných hmot hradí zhotovitel. Veškeré doklady o likvidaci odpadů budou předloženy objednateli. Objednatel nezajišťuje zhotoviteli skládky vybouraných hmot,
- zajištění úklidu celého objektu a zahrady.

3.3. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu sjednanou v této smlouvě.

Článek IV.

Cena díla

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku III. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran takto:

4.1. **Cena díla činí bez daně z přidané hodnoty**

6 721 234 Kč

(slovy: šestmilionůsedmsetdvacetjednatísícdvěstětřicetčtyři korun českých)

4.2. **Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % činí z ceny díla uvedené v odst. 4.1. tohoto článku částku**

1 411 459, 14 Kč

4.3. **Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě 15 % činí z ceny díla uvedené v odst. 4.1. tohoto článku částku**

0 Kč

4.4. **Celková cena díla (součet ceny uvedené v odst. 4.1. + 4.2. + 4.3.) činí včetně daně z přidané hodnoty celkem**

8 132 693, 14 Kč

(slovy: osmmilionůstřicetdvatisícšestsetdevadesáttři korun českých a čtrnáct haléřů)

- 4.5. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky a veškeré další náklady uvedené v této smlouvě a nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla, jakož i náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž staveniště a nutnou koordinaci s provozem měřírny.
- 4.6. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.
- 4.7. Cena je konečná, může být měněna pouze dohodou smluvních stran v případě nepředvídatelné změny množství prací a dodávek a jen za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.
- 4.8. V případě nezbytnosti překročit cenu díla z důvodu provedení nutných víceprací z důvodu na straně objednatele je zhotovitel povinen oznámit rozsah těchto prací včetně jejich cen objednateli bez zbytečného odkladu ihned poté, co nutnost překročení zjistil.
- 4.9. Veškeré vícepráce budou zhotovitelem zrealizovány na základě předchozí písemné dohody smluvních stran. Za vícepráce budou považovány pouze dodatečné změny technologií, materiálů a rozsahu prací, které nebylo možno znát v době zpracování nabídky a jsou nad rámec zadávací dokumentace.
- 4.10. Cena víceprací bude stanovena pomocí jednotkové ceny podle rozpočtu – pokud jde o práce v tomto rozpočtu uvedené. Práce v tomto rozpočtu neuvedené budou oceněny dohodou smluvních stran před jejich provedením.
- 4.11. V případě, že se některé práce budou provádět v menším, než v původním rozsahu (méněpráce), zhotovitel je povinen je odečíst z ceny díla ve výši podle položek rozpočtu.
- 4.12. Rozpočet jednotlivých prací s určením jejich jednotkových cen je přílohou č.1 a nedílnou součástí této smlouvy.
- 4.13. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sazby DPH bude k ceně díla uvedené v odst. 4.1. tohoto článku připočtena DPH v aktuálně platné výši.

Článek V. Platební podmínky

- 5.1. Zálohy nebudou objednatelem poskytovány.
- 5.2. Smluvní strany se dohodly na postupné splatnosti ceny díla v závislosti na skutečně
a řádně provedených pracích na díle, a to tak, že zhotovitel je oprávněn vždy po skončení daného kalendářního měsíce daňovým dokladem – fakturou vyúčtovat cenu prací, které na díle v daném kalendářním měsíci řádně provedl. Tyto práce budou považovány za dílčí zdanitelné plnění ve smyslu § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Součástí faktury musí být soupis skutečně a řádně provedených prací, který musí být písemně odsouhlasen objednatelem. Cena provedených prací musí být vyúčtována podle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. Smluvní strany se dále dohodly,
že zhotovitel je oprávněn takto vyúčtovat cenu skutečně a řádně provedených prací
až do výše 90 % celkové ceny díla; Zbýlých 10 % z celkové ceny díla je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli po splnění poslední z následujících podmínek:
1. objednatel dílo podpisem zápisu o předání a převzetí díla převezme, 2. na díle budou odstraněny veškeré případné vady a nedodělky uvedené v protokolu o předání a převzetí díla.
- 5.3. Lhůta splatnosti faktur je 14 kalendářních dní od jejich doručení objednateli. Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany při úhradě jiných plateb podle této smlouvy.
- 5.4. Jednotlivé faktury budou obsahovat tyto údaje:
a) adresa objednatele pro doručování faktur: Městský dopravní podnik Opava, a.s., Bílovecká 1127/98, 747 06 Opava-Kylešovice;
b) Název a číslo dotačního projektu: Rekonstrukce a modernizace technologického vybavení měníren Čajkovského a Kylešovská a vlastních objektů měníren, číslo projektu: CZ.04.1.40/0.0/18_0570000401
c) označení zhotovitele, jeho sídlo, IČ a DIČ;
d) číslo faktury;
e) den vystavení a den splatnosti;
f) označení peněžního ústavu a čísla účtu, na který se má platit;
g) soupis provedených prací za fakturační období;
h) fakturovanou částku;
i) označení díla, označení názvu a čísla projektu;
j) razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby.
- 5.5. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu v případě, že zhotovitel přeruší v rozporu s touto smlouvou práce, práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací nebo ustanoveními této smlouvy, zejména je v prodlení s jejich

dodávkou oproti harmonogramu, a to do doby, než budou tyto nedostatky odstraněny.

- 5.6. Nebude-li faktura obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo bude chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění, přičemž ve vadné faktuře vyznačí důvod vrácení. V takovém případě se ruší doba splatnosti stanovená vadnou fakturou a nová lhůta splatnosti započne běžet doručením bezvadné faktury objednateli.
- 5.7. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
- 5.8. Smluvní strany se dohodly na datu uskutečnění zdanitelného plnění u dílčího plnění
do 30-tého dne daného kalendářního měsíce.
- 5.9.
- 5.10. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy správce daně nevydal podle § 106a ZDPH rozhodnutí o tom, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem. Pokud takové rozhodnutí správce daně vydá je zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně písemně oznámit objednateli. Smluvní strany se v této souvislosti výslovně dohodly, že pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebo poskytnutí úplaty správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, objednatel je oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty zaplatit přímo na účet správce daně ve smyslu § 109a ZDPH. Taková úhrada bude považována za řádné splnění dluhu objednatele vůči zhotoviteli.
- 5.11. Smluvní strany se dále výslovně dohodly, že pokud číslo účtu zhotovitele, na který bude objednatel povinen uhradit cenu díla, nebude zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 ZDPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty zaplatit přímo na účet správce daně ve smyslu § 109a ZDPH. Taková úhrada bude považována za řádné splnění dluhu objednatele vůči zhotoviteli.

Článek VI.

Vlastnictví

- 6.1. Vlastníkem stavebních objektů a pozemků, jejichž úpravy jsou předmětem plnění dle této smlouvy, je objednatel.
- 6.2. Po předání výše uvedených stavebních objektů a pozemků zhotoviteli k provedení díla nese nebezpečí škody na stavebních objektech a pozemcích zhotovitel, a to

až do doby převzetí dokončeného díla objednatelem. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které v souvislosti s prováděním díla způsobí.

- 6.3. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
- 6.4. Vlastníkem věcí, které zhotovitel opatří k provedení díla, se objednatel stane okamžikem, kdy se tyto věci stanou součástí díla.

Článek VII.

Doba plnění

- 7.1. Smluvní strany se dohodly, že stavební práce na díle dle této smlouvy zhotovitel zahájí v den, kdy převzal či dle této smlouvy měl nejpozději od objednatele převzít staveniště.
O předání staveniště zhotoviteli bude vyhotoven zápis. Den předání staveniště se nezapočítává do doby plnění díla.
- 7.2. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat je objednateli bez vad a nedodělků,
s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, do 365 kalendářních dní od dohodnutého dne zahájení prací na díle. Toto ujednání o době plnění má v případě rozporu přednost před orientačním harmonogramem, který je nedílnou přílohou č. 2 této smlouvy.
- 7.3. Objednatel má právo vyzvat zhotovitele k přerušení provádění díla, přičemž o tomto je povinen objednatel provést zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen provádění díla ihned přerušit. Trvá-li přerušení prací na díle na žádost objednatele déle než 2 měsíce, je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotoviteli nenáleží vůči objednateli nárok na jakékoliv plnění, včetně nároku na náhradu škody, z důvodu takového přerušení provádění díla. O dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené. Bude-li toto přerušení trvat déle než dva měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce v plné výši.
- 7.4. Před započítáním prací po přerušení práce na díle podle odst. 7.3. tohoto článku vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již zhotovených konstrukcí a určí rozsah a cenu jejich nezbytných úprav.
- 7.5. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo, jeho řádným zhotovením, předáním objednateli bez jakýchkoliv vad a nedodělků a dnem, kdy bude možno dílo (stavbu) v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), legálně užívat.

- 7.6. Objednatel se zhotovitelem dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění:
- a) při podstatném zvýšení prací a dodávek;
 - b) nebude-li možno práce zahájit nebo v nich plynule pokračovat z důvodu ležících na straně objednatele;
 - c) nastanou-li během provádění neočekávané povětrnostní podmínky, které neumožní realizovat práce v technologicky vhodném období.
- 7.7. Pro předání a převzetí díla platí postup podle článku XI. této smlouvy.

Článek VIII.

Místo plnění

Místem plnění je:

-objekt měřírny na ul. Kylešovská 2695/31, 746 01 Opava-předměstí, pozemek parcela číslo 892/2 v k.ú. Opava-předměstí a parcelách sousedních. předmětu díla a projektové dokumentace, která je samostatnou přílohou této smlouvy.

Článek IX.

Jakost díla

- 9.1. Zhotovitel se zavazuje, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, zadání zakázky (zadávací dokumentaci) a této smlouvě.
- 9.2. K tomu se zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě.
- 9.3. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti použitých materiálů.
- 9.4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

Článek X.

Provádění díla

- 10.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří provedením části díla jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám.
- 10.2. Jakékoliv změny oproti schválené projektové dokumentaci musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem.

- 10.3. Zhotovitel je povinen respektovat a plnit podmínky obsažené v pravomocných rozhodnutích správních orgánů a ve všech dalších vyjádřeních vydaných oprávněnými orgány a správci vč. správců sítí dotčených prováděnou stavbou.
- 10.4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli poplatky, sankce, škody a náklady vzniklé z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy zhotovitelem. Rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením obvodu staveniště.
- 10.5. Zhotovitel na vlastní náklady zabezpečí veškerá povolení nezbytná k provedení díla.
- 10.6. Zhotovitel zajistí dílo tak, aby nedošlo k ohrožování a nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby a ke znečišťování komunikací.
- 10.7. Zhotovitel bude v dostatečném časovém předstihu informovat dotčené subjekty - vlastníky popř. nájemce přilehlých nemovitostí o časovém harmonogramu stavby a s tím spojených omezeních.
- 10.8. Zhotovitel bude minimálně znečišťovat okolí stavby a zabezpečí každodenní úklid staveniště. Zhotovitel se zavazuje minimalizovat také jakékoliv další imise směrem k okolí ve smyslu § 1013 občanského zákoníku.
- 10.9. Zhotovitel zajistí obslužný provoz a přístup pohotovostním a požárním vozidlům.
- 10.10. Zhotovitel je povinen se řídit pokyny vydanými státními orgány v průběhu povolování stavby a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající. Příslušné pokyny (např. podmínky správců inženýrských sítí) a doklady vydané příslušnými orgány státní správy, související s předmětem díla, se objednatel zavazuje předat zhotoviteli nejpozději ke dni podpisu této smlouvy.
- 10.11. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
- 10.12. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části objednateli, a to na vlastní náklady.
- 10.13. Zhotovitel vyzve objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele.

- 10.14. Zhotovitel vyzve písemně kromě objednatele i správce inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před zakrytím inženýrských sítí zajistí geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením stavby předá objednateli.
- 10.15. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.
- 10.16. Zhotovitel je povinen staveniště zajistit v souladu s příslušnými právními předpisy o bezpečnosti práce a technických zařízení.
- 10.17. Zhotovitel se zavazuje zaznamenávat všechny provedené změny podle skutečného provedení stavby. Takto zaznamenané změny v jednom písemném a grafickém provedení předá objednateli při předání a převzetí díla objednatelům.
- 10.18. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.
- 10.19. Zhotovitel je povinen bez odkladu písemně upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací.
- 10.20. Kvalitu prací bude zhotovitel průběžně dokladovat výsledky zkoušek, vzorků, atestů, měření, a to v rozsahu stanoveném příslušnými ČSN, EN (evropské technické normy) a dalšími platnými předpisy.
- 10.21. Kvalitu vstupních materiálů, polotovarů a dalších prací bude zhotovitel průběžně dokladovat.
- 10.22.
- 10.23. Betony musí být vyrobeny v betonárnách, jejich kvalita musí být doložena s platnou certifikací.
- 10.24. Vlivem stavební činnosti nesmí dojít ke škodám na objektech a inženýrských sítích. Případně vzniklé škody hradí zhotovitel.
- 10.25. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě tyto škody uhradí.
- 10.26. Zhotovitel zajistí pro objednatele fotodokumentaci místa plnění před zahájením prací (původní stav), průběh výstavby a po ukončení prací (nový stav). Fotky budou pořízeny ze stejného místa či pohledu.

- 10.27. V případě, že budou při realizaci díla naplněny podmínky stanovené zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) pro vznik povinnosti objednatele určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (§ 14 odst. 1 uvedeného zákona), pro vznik povinnosti objednatele doručit oznámení o zahájení prací (§ 15 odst. 1 uvedeného zákona) nebo vznik povinnosti objednatele zajistit zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (§ 15 odst. 2 uvedeného zákona), je zhotovitel o takové skutečnosti povinen objednatele neprodleně písemně informovat. Tuto povinnost má zhotovitel i v případě, že bude vzhledem ke všem okolnostem realizace díla zřejmé, že se tyto podmínky naplní později. Pokud v důsledku nesplnění této povinnosti zhotovitelem bude objednateli udělena sankce dle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, zhotovitel objednateli tuto sankci uhradí.
- 10.28. Zhotovitel se zavazuje provádět práce v úzké koordinaci s provozovatelem objektu dle jeho pokynů a nařízení.
- 10.29. Zhotovitel je povinen zabezpečit, po vzájemné dohodě s objednatelem, bez omezení fungování všech technologických zařízení umístěných v objektu stavby.
- 10.30.
- 10.31. Zhotovitel je povinen respektovat a plnit podmínky obsažené v pravomocných rozhodnutích správních orgánů a ve všech dalších vyjádřeních vydaných oprávněnými orgány a správci vč. správců sítí dotčených prováděnou stavbou.
- 10.32. Zhotovitel je povinen veškeré viditelné zařizovací předměty, výrobky a materiály před jejich pořízením a zabudováním nechat odsouhlasit objednatelem.
- 10.33.
- 10.34.
- 10.35.
- 10.36. Zhotovitel zajistí na své náklady odvoz veškerého stávajícího využitelného materiálu
- kovových částí a konstrukcí dle pokynů objednatele zastoupeného správcem majetku objednatele. Množství využitelného materiálu (kov apod.) včetně odvozu

veškerého přebytečného materiálu a zeminy na patřičné skládky bude dokladovat potvrzenými doklady, vážními listky atd.

Po odevzdání kovových částí (kovového odpadu) do sběrný určené objednatelem bude jeho množství objednateli doloženo dodacími listy, vážními listky apod., které budou vystaveny na IČ a DIČ objednatele. Zhotovitel předá tyto doklady objednateli

do 7 kalendářních dnů od data jejich vystavení. Objednatel poté vystaví fakturu – daňový doklad a zašle jej příslušné sběrně k úhradě.

- 10.37. Zhotovitel zajistí na své náklady odvoz veškerého stávajícího využitelného materiálu dle pokynů objednatele.
- 10.38. Zhotovitel bude dodržovat obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu a regulaci hlučných činností, platnou pro území města Opavy.
- 10.39. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat veškeré materiály a poddodávky v souladu s pravidly hospodářské soutěže a písemně informovat objednatele o dodávkách, pracích a službách zajišťovaných poddodavateli, a to vždy bezodkladně po uzavření příslušné smlouvy nebo vystavení objednávky. Písemná informace dle předchozí věty musí obsahovat mj. jmenovité uvedení poddodavatelů, činností, které budou vykonávat a musí být doložena kopiemi příslušných živnostenských či jiných oprávnění poddodavatelů, nezbytných pro výkon těchto činností. Informační povinnost dle tohoto odstavce se vztahuje pouze na poddodavatele, kteří se podílejí na realizaci díla.
- 10.40. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace v rámci zadávacího řízení a zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím uvedeným v nabídce zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokazoval splnění části kvalifikace, stavbyvedoucího či jinou osobu, prostřednictvím které prokázal odbornou způsobilost/kvalifikaci (dále jen „odborná osoba“) pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele. Žádost o souhlas se změnou poddodavatele, stavbyvedoucího či jiné odborné osoby bude obsahovat údaje a bude doložena doklady dle odst. 10.39, věta druhá tohoto článku a případně dalšími doklady potřebnými k prokázání potřebné kvalifikace. Nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou původní poddodavatel prokázal za zhotovitele; nový stavbyvedoucí či jiná odborná osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací jako původní stavbyvedoucí, resp. původní odborná osoba.

Článek XI.

Předání díla

- 11.1. Objednatel je povinen dílo převzít po jeho dokončení, jen je-li bez jakýchkoliv vad a nedodělků s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
- 11.2. Předávací řízení bude objednatelem zahájeno po obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne zahájení.
- 11.3. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis, který sepiše zhotovitel a který bude obsahovat:
- a) označení díla
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla
 - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo
 - d) zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle
 - e) prohlášení objednatele o převzetí díla
 - f) datum a místo sepsání zápisu
 - g) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele
 - h) seznam převzaté dokumentace
 - i) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla
 - j) termín vyklizení staveniště
 - k) datum ukončení záruky za dílo
 - l) soupis vad a nedodělků (§ 2628 občanského zákoníku) s termínem jejich odstranění, který je za objednatele oprávněn odsouhlasit správce majetku.
- 11.4. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy, jakož i technickými normami.
- 11.5. Nedodělkem se rozumí neprovedené práce a dodávky oproti projektové dokumentaci.
- 11.6. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě (nebo písemné ujištění o shodě).
- 11.7. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné v souvislosti s provedením díla.
- 11.8. Zápis musí být podepsán smluvními stranami.

Článek XII.

Staveniště

- 12.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy o dílo. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis. Smluvní strany se výslovně dohodly, že o době předání staveniště je oprávněn rozhodnout výhradně objednatel. Zhotovitel se zavazuje tuto skutečnost respektovat a na výzvu objednatele staveniště nejpozději do sedmi kalendářních dnů ode dne doručení této výzvy převzít a zahájit realizaci díla.
- 12.2. Zhotovitel umístí na viditelném a přístupném místě na stavbě tabuli s textem obsahující následující údaje:
 - název zhotovitele
 - termín stavby – zahájení a ukončení
 - jméno a kontakt na odpovědného stavbyvedoucího
- 12.3. Obvod staveniště vymezí objednatel. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla větší prostor, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 12.4. Zhotovitel platí vodné, stočné a cenu dalších odebraných médií. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru.
- 12.5. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od převzetí díla objednatelem. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 12.6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, a dodržování bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště.
- 12.7. Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu staveniště.

Článek XIII.

Stavební deník

- 13.1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, který se skládá z úvodního listu, denních záznamů a příloh, a bude jej na požádání předkládat objednateli.
- 13.2. Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v souladu s ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a dále

zajistí, že stavební deník bude objednateli přístupný na stavbě v pracovní době, tj. v době od 7.00 do 15.00 hod. každý pracovní den a dále vždy, kdy bude zhotovitel na díle provádět práce.

- 13.3. Zhotovitel zajistí včasný zápis všech skutečností rozhodných pro plnění této smlouvy do stavebního deníku, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje o provedených zkouškách a další údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy a objednatelem. Každý zápis musí být datován a zhotovitelem podepsán.
- 13.4. Objednatel a osoby jím pověřené jsou oprávněni stavební deník kontrolovat a k zápisům připojit svoje stanovisko.
- 13.5. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. Oddělitelné průpisy stavebního deníku budou vždy opatřeny originálním podpisem.
- 13.6. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu.
- 13.7. Do deníku je oprávněn provádět záznamy také státní stavební dohled, technický dozor objednatele a projektant.
- 13.8. Má-li zhotovitel k zápisu objednatele výhrady, připojí k tomuto zápisu své vyjádření. Totéž platí i pro objednatele.
- 13.9. Zhotovitel bude objednateli předávat druhý průpis denních záznamů ve stavebním deníku.
- 13.10. Zápisy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

Článek XIV.

Záruka za jakost, odpovědnost za vady

- 14.1. Dílo má vady, jestliže jeho vlastnosti neodpovídají požadavkům uvedeným v této smlouvě nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla.
- 14.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době.

- 14.3. Zhotovitel poskytuje na dílo, tj. na provedené práce a dodávky, záruku za jakost se záruční dobou v délce 60 měsíců od převzetí díla objednatelem.
- 14.4. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí celého díla.
- 14.5. Smluvní strany se dohodly, že práva z odpovědnosti za vady zůstanou objednateli zachována, pokud vady díla oznámí objednatel zhotoviteli kdykoliv během trvání záruční doby.
- 14.6. Odstranění případných vad bude zhotovitelem provedeno ve lhůtách sjednaných bezodkladně po jejich oznámení objednatelem, nejpozději však do 14 kalendářních dnů od oznámení vady objednatelem zhotoviteli, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Článek XV.

Odpovědnost za škodu

- 15.1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem. Toto ustanovení se nevztahuje na tu část díla, kterou objednatel převzal a začal užívat před předáním celého díla.
- 15.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- 15.3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.

Článek XVI.

Smluvní pokuty

- 16.1. V případě prodlení zhotovitele s řádným dokončením díla a jeho včasným předáním objednateli (článek XI. odst. 11.1. této smlouvy) se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti ve výši [REDACTED] za každý i započatý kalendářní den prodlení s tím, že po uplynutí 10 kalendářních dnů prodlení se smluvní pokuta zvyšuje na [REDACTED] za každý další i započatý kalendářní den prodlení s předáním díla.
- 16.2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši.

- 16.3. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti ve výši ■■■■■
■■■■■
- 16.4. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti ve výši ■■■■■ za každý kalendářní den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, platí, že vada musí být odstraněna do 14 kalendářních dnů ode dne oznámení vady zhotoviteli.
- 16.5. Pokud závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
- 16.6. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
- 16.7. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná smluvní strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně v plné výši.
- 16.8. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti ve výši ■■■■■ za každý zjištěný případ.
- 16.9. V případě, že bude zjištěno, že informační tabule nebude umístěna na stavbě, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli za porušení této smluvní povinnosti smluvní pokutu ■■■■■ za každé jednotlivé porušení.
- 16.10. V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost uvedenou v článku X. odst. 10.27. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel za porušení této smluvní povinnosti zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši ■■■■■
- 16.11. Smluvní strany se dohodly, že přeruší-li zhotovitel bezdůvodně práce na díle na dobu delší než pět pracovních dnů, nebo nezahájí-li zhotovitel práce na díle do sedmi kalendářních dnů ode dne, kdy zhotovitel převzal či dle této smlouvy měl nejpozději od objednatele převzít staveniště, anebo nedodrží-li zhotovitel při provádění díla opakovaně i přes upozornění objednatele ČSN, EN, technologické předpisy a předpisy na úseku bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zavazuje se zhotovitel za každý jednotlivý případ porušení kterékoli z výše uvedených povinností zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši ■■■■■
- 16.12. Smluvní strany prohlašují, že nepovažují smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy

za pohledávky nejisté nebo neurčité ve smyslu § 1987 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a proto se dohodly, že objednatel je oprávněn smluvní pokuty započíst proti pohledávce zhotovitele.

Článek XVII.

Závěrečná ustanovení

- 17.1. Podstatným porušením povinnosti zhotovitele se rozumí zejména prodlení s prováděním díla nebo předáním díla delší než 10 kalendářních dnů.
- 17.2. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu této smlouvy, neposkytne třetím osobám.
- 17.3. Objednatel může odstoupit od této smlouvy ze zvlášť závažných důvodů. Za zvlášť závažné důvody bude považováno zejména:
- bezdůvodné přerušení práce na dobu delší než pět pracovních dnů,
 - nezahájení práce do sedmi kalendářních dnů od předání staveniště,
 - opakované nedodržení ČSN, EN, technologických předpisů a předpisů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, i přes upozornění ze strany objednatele.
- 17.4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
- 17.5. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen vypořádat nároky zhotovitele spojené s realizací části díla podle příslušných ustanovení občanského zákoníku (zejména § 2599 a násl.).
- 17.6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva plynoucí z této smlouvy třetí osobě.
- 17.7. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv změna smlouvy bude učiněna až po ověření skutečnosti, zda je taková změna smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o zadávání veřejných zakázek.

- 17.8. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
- 17.9. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
- 17.10. Zhotovitel přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 17.11. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednateelských oprávnění.
- 17.12. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 17.13. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly,
že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
V případě rozporu textu této smlouvy s textem jejích příloh, mají přednost ustanovení této smlouvy.
- 17.14. Zhotovitel se zavazuje přijmout veškerá nezbytná a přiměřená opatření k zamezení korupce a úplatkářství. V souladu s tím se zhotovitel zavazuje, že nebude nabízet, neslíbí ani neposkytne a nedá ani třetí straně pokyn k tomu, aby nabízela,
slibovala
či poskytovala jakékoli výhody (peníze, cenné dary apod.) zaměstnancům objednatele, a to včetně rodinných příslušníků těchto osob a dalších osob uvedeným osobám blízkých. Smluvní strany se dohodly, že poruší-li zhotovitel tento svůj závazek, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny díla včetně DPH.
Smluvní strany se dále dohodly, že poruší-li zhotovitel svůj závazek uvedený v tomto odstavci smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit nebo ji vypovědět s účinností ke dni doručení výpovědi zhotoviteli. Tím nejsou dotčeny případné trestněprávní důsledky takového jednání.
- 17.15. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je uzavřena dnem, kdy ji podepíše poslední ze smluvních stran.
- 17.16. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o registru smluv, či nikoli – bude natrvalo uveřejněna v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření

Městský dopravní podnik Opava, a.s. Strana uveřejňující smlouvu se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění smlouvy také druhé smluvní straně.

17.17.

Přílohy:

- příloha č. 1 položkový rozpočet
- příloha č. 2 orientační časový a finanční harmonogram prací
- příloha č. 3 projektová dokumentace v tištěné podobě (1 x paré)

V Opavě dne 3.2.2022

V Litvínově dne 10-02-2022

Za objednatele

Ing. Vladimír Schreier

předseda představenstva společnosti
Městský dopravní podnik Opava, a.s.

Za zhotovitele

Karel Müller

jednatel
Bohemia Müller s.r.o.

Městský dopravní podnik Opava
akciová společnost (8)
747 06 OPAVA, Bílovecká 98
DIČ: CZ64610250



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 132B

Stavba: MR Kylešovská

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 12.11.2021

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Bohemia Müller s.r.o.

IČ:

25015265

DIČ:

CZ25015265

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	6 721 234,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	6 721 234,00
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	6 721 234,00	1 411 459,14
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	8 132 693,14
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Městský právní podnik Opava
 742 004 společnost s r.o.
 OPAVA, Bílovecká 98
 DIČ: CZ64610250

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 132B

Stavba: MR Kylešovská

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Bohemia Müller s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	6 721 234,00	8 132 693,14
PS 01	Střídavá část	1 129 803,52	1 367 062,26
PS 02	Trakční technologie	1 580 517,69	1 912 426,40
PS 03	Vlastní spotřeba	185 452,58	224 397,62
PS 04	Hromosvod a uzemnění	33 605,00	40 662,05
PS 05	Stavební elektroinstalace	538 911,80	652 083,28
SO 01	Rekonstrukce budovy	3 046 943,41	3 686 801,53
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	206 000,00	249 260,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		6 721 234,00	8 132 693,14

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: MR Kylešovská
 Objekt: PS 01 - Střídavá část

JKSO:
 Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:
 Bohemia Müller s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
 Datum:

IČ:
 DIČ:

IČ: 25015265
 DIČ: CZ25015265

IČ:
 DIČ:

IČ:
 DIČ:

Náklady z rozpočtu				1 129 803,52
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				1 129 803,52
DPH základní	21,00%	ze	1 129 803,52	237 258,74
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	1 367 062,26

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Městský úřad Opava
 Město Opava
 747 01
 Městská společnost
 AVA, Bílovecká 98
 CZ64610250

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MR Kylešovská

Objekt: PS 01 - Střídavá část

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Bohemia Müller s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	1 129 803,52
D1 - PS1 Střídavá část	1 129 803,52
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 129 803,52

ROZPOČET

Stavba: MR Kylešovská

Objekt: PS 01 - Střídavá část

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Bohemia Müller s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 129 803,52

D1 - PS1 Střídavá část

1 129 803,52

1	K	Pol1	Trifázový suchý trakční transformátor dvouvintuřový pro šestipulsní usměrňovač bez nulové tlumivky s parametry, dle položky č. 1 TOS oddílu 1.1	kpl	1,000	942 640,00	942 640,00
2	K	Pol2	Výroba a montáž svařovaných konstrukcí z ocelových C profilů. Tato konstrukce bude natřena a opatřena podpěrnými izolátory (3x izolátor 25kV, 3x izolátor 1kV). Konstrukce bude pro primární i sekundární stranu transformátoru. Více viz výkresová dokumentace	kpl	1,000		
3	K	Pol3	Napojení pasovin na transformátory s použitím pružných spojek viz. výkresová dokumentace	kpl	1,000		
4	K	Pol4	Přestavení 4 ks ochran, výměna 1 ks relé A11/3A za nový typ papř. A11/5A.	kpl	1,000		
5	K	Pol5	Drobný montážní materiál a montáž vyspecifikované technologie	kpl	1,000		
6	K	Pol6	Montáž kabeláže průřezů 10 mm ² a menší	kpl	1,000		
7	K	Pol7	Dodavatelská dokumentace vyspecifikované technologie včetně dokumentace skutečného stavu	kpl	1,000		
8	K	Pol8	Zkoušky, měření, revize včetně získání průkazu způsobilosti UTZ	kpl	1,000		
9	K	Pol9	Demontáž a ekologická likvidace stávajícího trakčního transformátoru T1	kpl	1,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: MR Kylešovská

Objekt: PS 02 - Trakční technologie

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Bohemia Müller s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12.11.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

25015265

DIČ:

CZ25015265

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	1 580 517,69
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	1 580 517,69
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	1 580 517,69	331 908,71
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 912 426,40
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Mě:

dopravní podnik Opava
sílčivá společnost (B)
06 OPAVA, Bílovecká 98
DIČ: CZ64610250

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MR Kylešovská

Objekt: PS 02 - Trakční technologie

Místo:

Datum:

12.11.2021

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Bohemia Müller s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	1 580 517,69
D1 - PS2 Trakční technologie	1 580 517,69
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 580 517,69

ROZPOČET

Stavba: MR Kylešovská

Objekt: PS 02 - Trakční technologie

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Bohemia Müller s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------


Náklady z rozpočtu

1 580 517,69

D1 - PS2 Trakční technologie

1 580 517,69

1	K	Pol10	Diodový šestipulzní usměrňovač skříňového provedení pro zástavbu do řady napáječových skříní včetně odpojitelného připojení k přípojnícím, dle položky č. 1 TOS oddílu 1.2	kpl	2,000		
2	K	Pol11	Úprava napojení pasovín na usměrňovač	kpl	1,000		
3	K	Pol12	Lisovací kabelové oko pro připojení kabelu AYKFY 500 mm2	ks	16,000		
4	K	Pol13	Protipožární ucpávka prostupů pod usměrňovací cca 0,25m2	kpl	1,000		
5	K	Pol14	Demontáž a ekologická likvidace stávajících usměrňovačů U1 a U2	kpl	1,000		
6	K	Pol15	Napěťová zemní ochrana, nap. napětí 24V DC, včetně předřadného odporu a redukčního plechu	kpl	1,000		
7	K	Pol16	Drobný montážní materiál a montáž vyspecifikované technologie	kpl	1,000		
8	K	Pol17	Montáž kabeláže průřezů 10 mm2 a menší	kpl	1,000		
9	K	Pol18	Dodavatelská dokumentace vyspecifikované technologie včetně dokumentace skutečného stavu	kpl	1,000		
10	K	Pol19	Zkoušky, měření, revize včetně získání průkazu způsobilosti UTZ	kpl	1,000		
11	K	Pol20	Odpojení stávající zemní ochrany. Ochrana ale bude ponechána ve dveřích.	kpl	1,000		

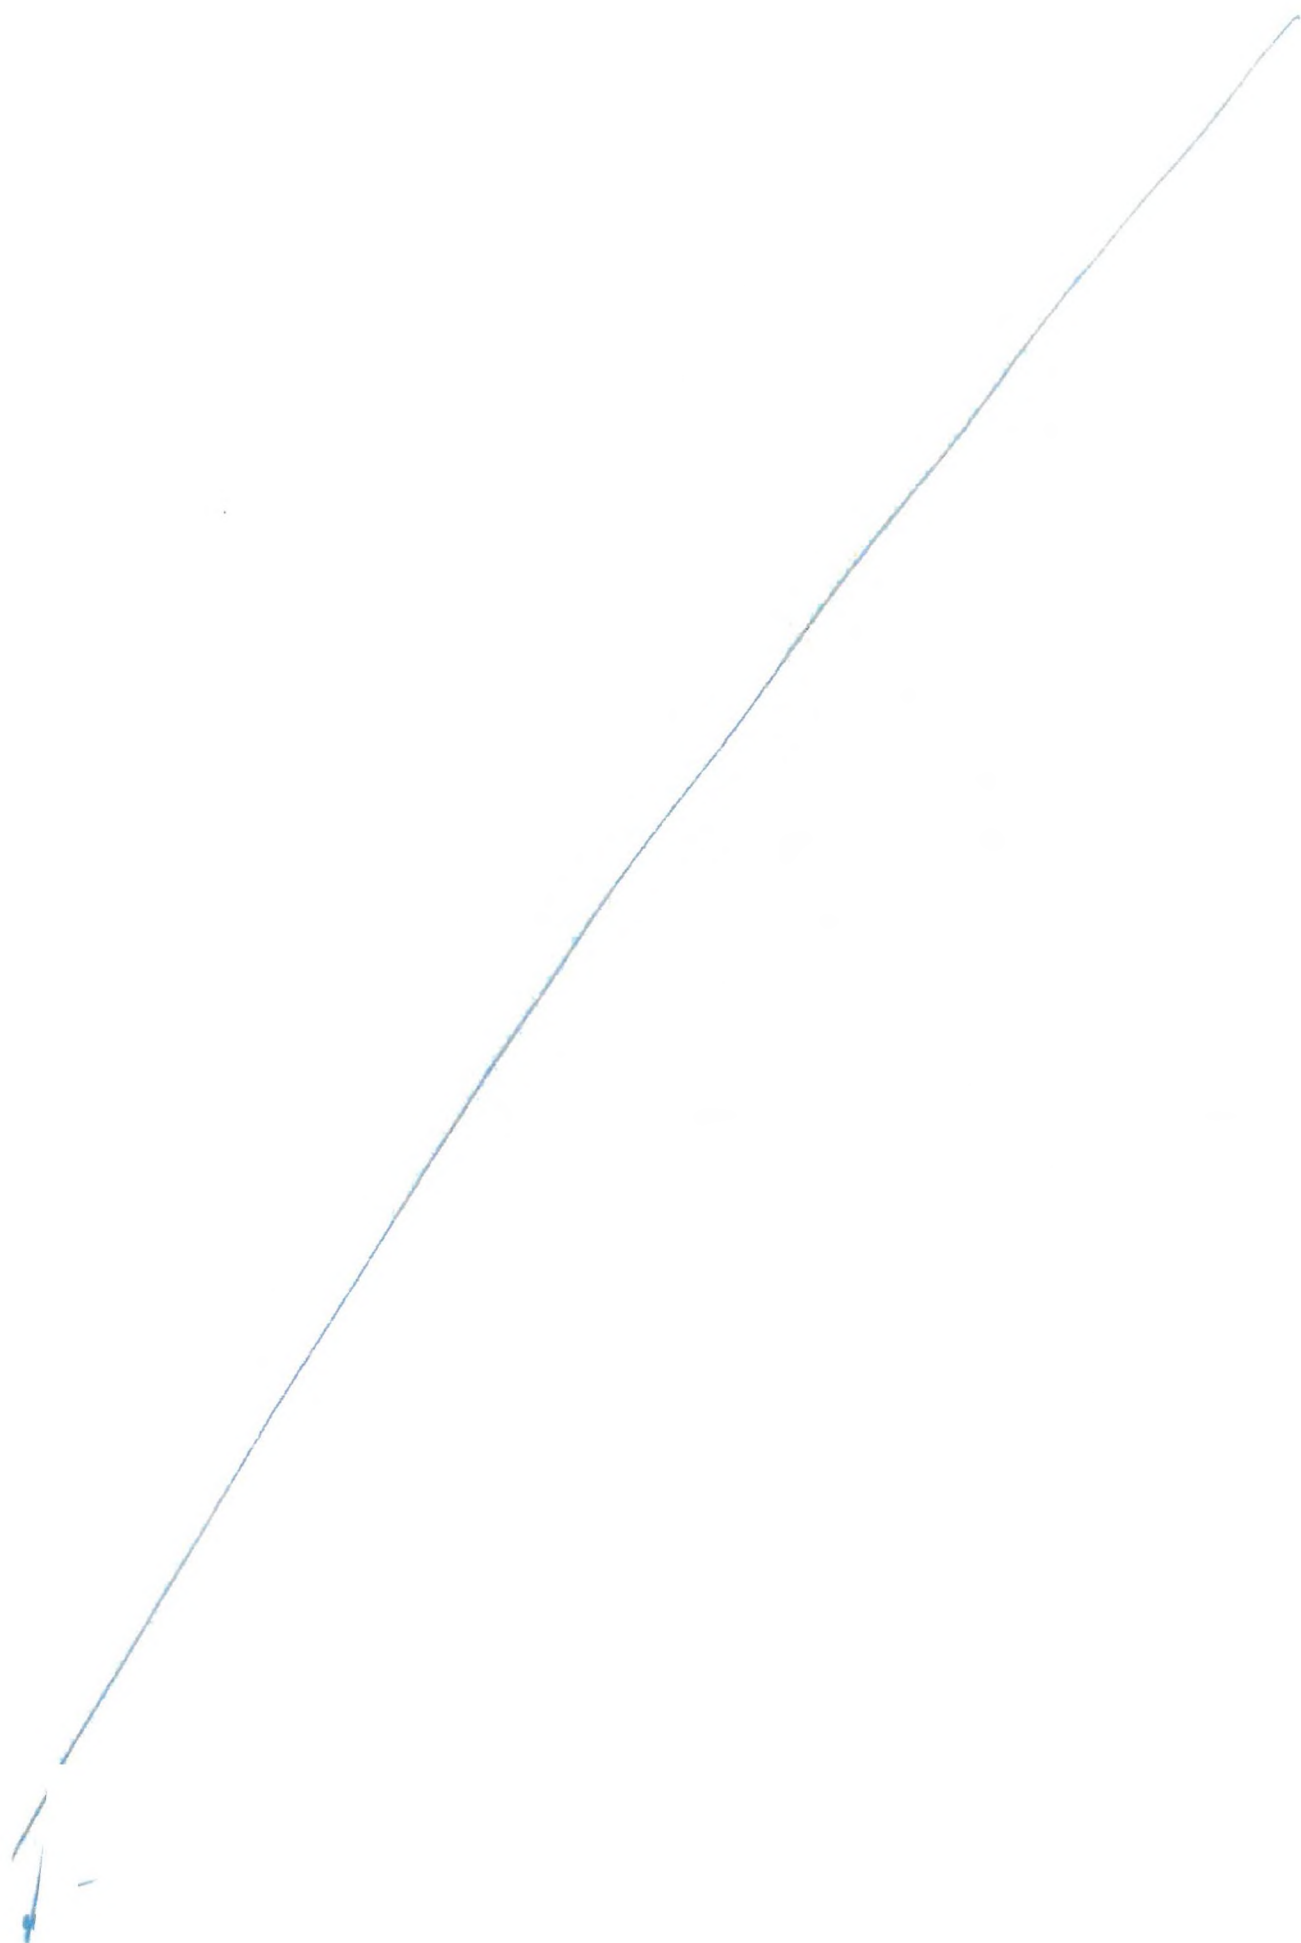

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: MR Kylešovská

Objekt: PS 03 - Vlastní spotřeba

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Bohemia Müller s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12.11.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

25015265

DIČ:

CZ25015265

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				185 452,58
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				185 452,58
DPH základní	21,00%	ze	185 452,58	38 945,04
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v CZK	224 397,62

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Město: Místní úřad
702 001
Správní podnik Opava
tová společnost
OPAVA, Bílovecká 98
IČ: CZ64610250

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MR Kylešovská

Objekt: PS 03 - Vlastní spotřeba

Místo:

Datum: 12.11.2021

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Bohemia Müller s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	185 452,58
D1 - PS3 Vlastní spotřeba	185 452,58
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	185 452,58

ROZPOČET

Stavba: MR Kylešovská

Objekt: PS 03 - Vlastní spotřeba

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Bohemia Müller s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu


185 452,58

D1 - PS3 Vlastní spotřeba

185 452,58

1	K	Pol21	Demontáž stávajících 4 kusů akumulátorů a jejich ekologická likvidace a dodávka a montáž 4 kusů nových akumulátorů 12V, 100Ah, životnost min. 10 let, nosná konstrukce na uchycení baterií	kpl	1,000		
2	K	Pol22	Demontáž stávajících, dodávka a montáž nových přístrojů, dle položky č. 2 TOS oddílu 1.3	kpl	1,000		
3	K	Pol23	Drobný montážní materiál a montáž vyspecifikované technologie	kpl	1,000		
4	K	Pol24	Dodávka a montáž ostatní kabeláže průřezu 10 mm ² a menší	kpl	1,000		
5	K	Pol25	Dodavatelská dokumentace vyspecifikované technologie včetně dokumentace skutečného stavu	kpl	1,000		
6	K	Pol26	Zkoušky, měření, revize včetně získání průkazu způsobilosti UTZ	kpl	1,000		

ut

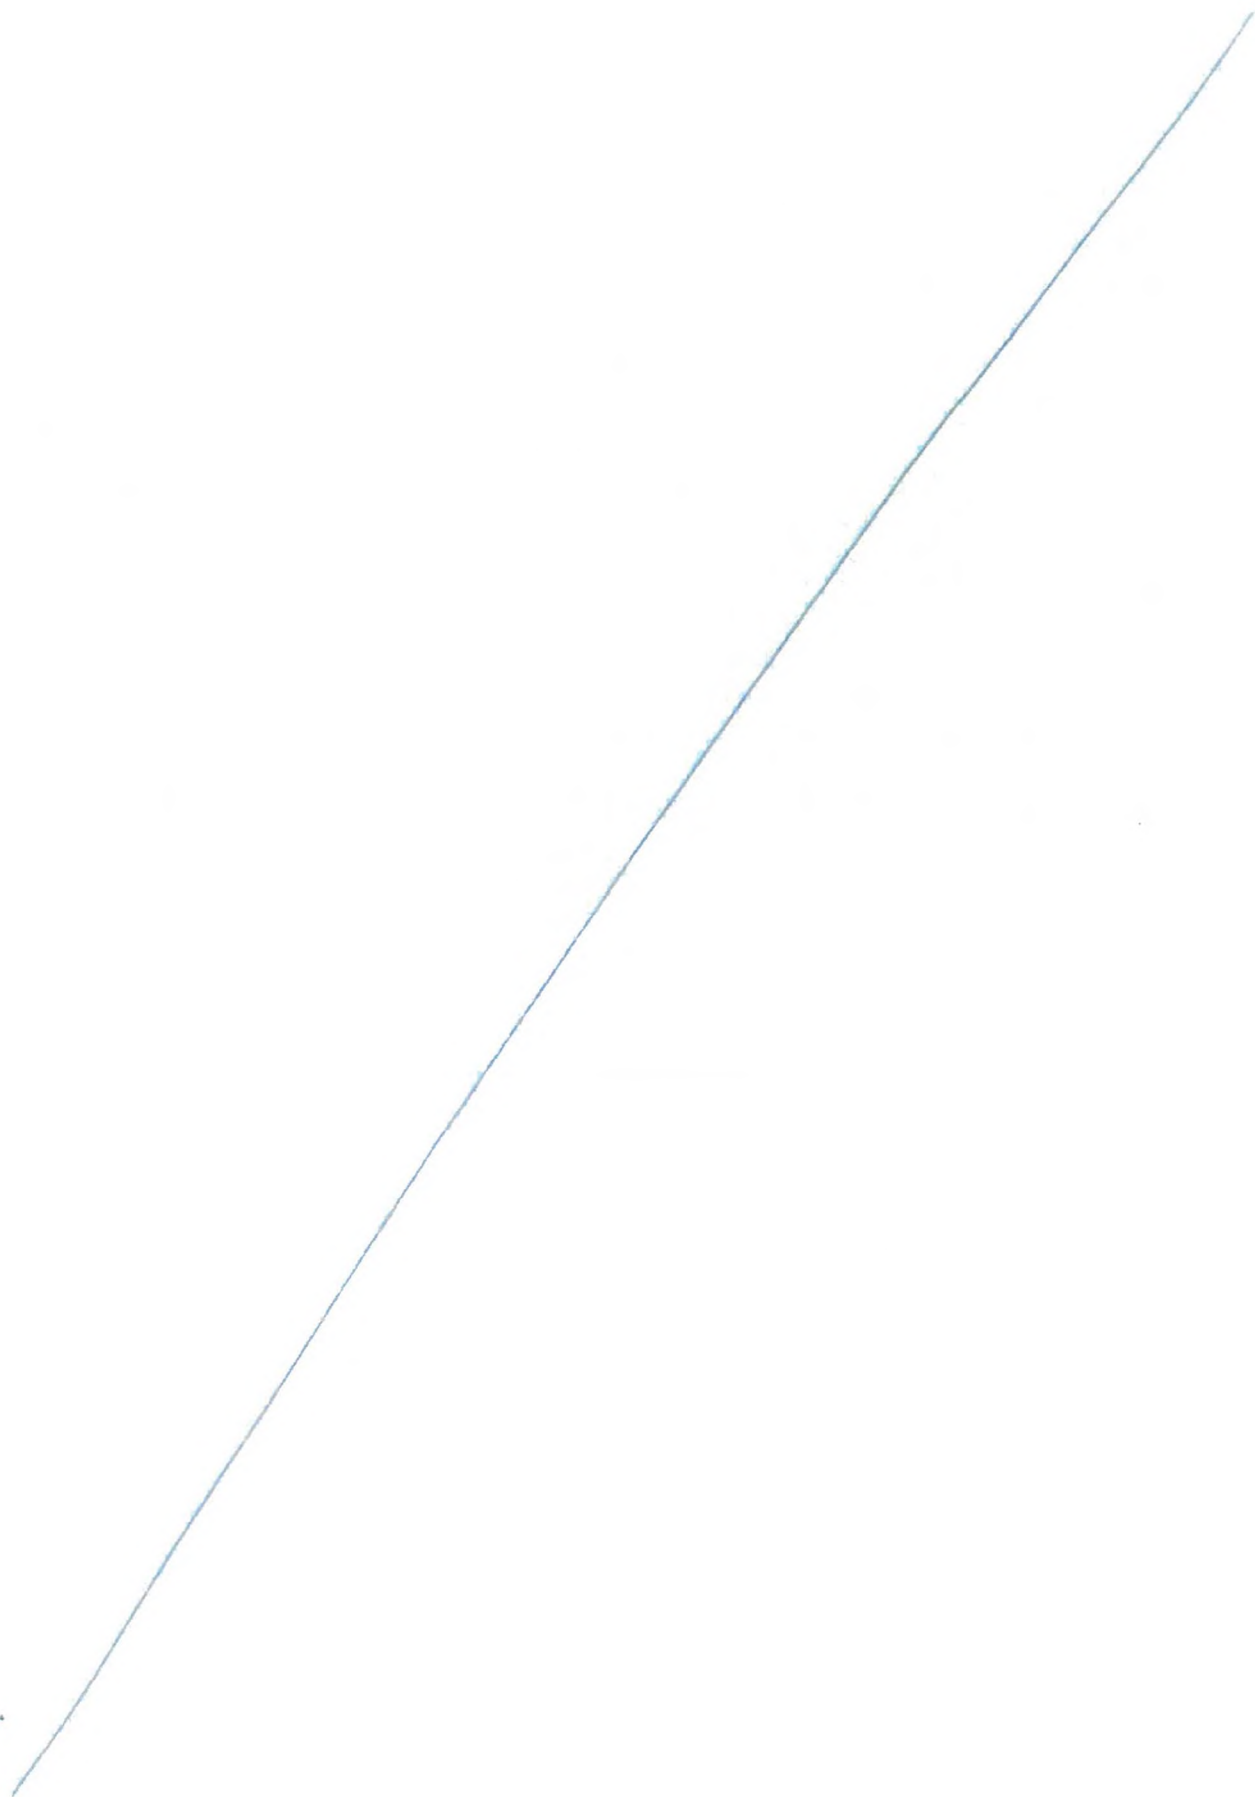

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: MR Kylešovská

Objekt: PS 04 - Hromosvod a uzemnění

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Bohemia Müller s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12.11.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

25015265

DIČ:

CZ25015265

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

33 605,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

33 605,00

DPH základní

21,00%

ze

33 605,00

7 057,05

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

40 662,05

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Městský úřad Opava
Právní podnik Opava
ová společnost ⑧
747 00 PAVA, Bílovecká 98
DIČ: CZ64610250

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MR Kylešovská

Objekt: PS 04 - Hromosvod a uzemnění

Místo:

Datum: 12.11.2021

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Bohemia Müller s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	33 605,00
D1 - PS4 Hromosvod a uzemnění	33 605,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	33 605,00

ROZPOČET

Stavba: MR Kylešovská

Objekt: PS 04 - Hromosvod a uzemnění

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Bohemia Müller s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

33 605,00

D1 - PS4 Hromosvod a uzemnění

33 605,00

1	K	Pol27	Uprava hromosvodu spojená s rekonstrukcí atiky objektu	kpl	1,000		
2	K	Pol28	Oprava uzemnění poškozeného při výkopových pracích	kpl	1,000		
3	K	Pol29	Zkoušky, měření, revize včetně získání průkazu způsobilosti UTZ	kpl	1,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: MR Kylešovská

Objekt: PS 05 - Stavební elektroinstalace

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Bohemia Müller s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ: 25015265

DIČ: CZ25015265

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				538 911,80
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				538 911,80
DPH základní	21,00%	ze	538 911,80	113 171,48
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				652 083,28

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Městský **opravní podnik Opava**
stavební společnost 
74 OPAVA, Bílovecká 98
DIČ: CZ64610250

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MR Kylešovská

Objekt: PS 05 - Stavební elektroinstalace

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Bohemia Müller s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

538 911,80

D1 - PS5 Stavební elektroinstalace

538 911,80

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

538 911,80

ROZPOČET

Stavba: MR Kylešovská

Objekt: PS 05 - Stavební elektroinstalace

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Bohemia Müller s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------


Náklady z rozpočtu

538 911,80

D1 - PS5 Stavební elektroinstalace

538 911,80

1	K	Pol30	Nástěnný rozváděč stavební elektroinstalace, dle položky č. 1 TOS oddílu 1.6	kpl			
2	K	Pol31	Demontáž a ekologická likvidace stávajícího rozváděče pro elektroinstalaci RMS-1	kpl			
3	K	Pol32	LED svítidlo stropní 1x 54 W, 230V AC	ks			
4	K	Pol33	LED svítidlo nástěnné 2x 24 W, 230V AC	ks			
5	K	Pol34	LED nástěnné svítidlo 1x60 W, E27, 230V AC	ks			
6	K	Pol35	LED stropní svítidlo 1x100 W, E27, 230V AC	ks			
7	K	Pol36	LED venkovní nástěnné svítidlo 1x100W, 230V AC, IP43	ks			
8	K	Pol37	LED svítidlo 24V DC (náhradní osvětlení), např. SVD-02 WW 24VDC 30LED od firmy ELECO	ks			
9	K	Pol38	vypínač jednopólový, řazení 1	ks			
10	K	Pol39	přepínač střídavý, řazení 6	ks			
11	K	Pol40	přepínač střídavý, řazení 6, IP43	ks			
12	K	Pol41	přepínač křížový, řazení 7	ks			
13	K	Pol42	zásuvka 230V AC, 16A	ks			
14	K	Pol43	Elektrický přímotopný konvertor s termostatem od +5 °C, 230V AC, 2000 W	ks			
15	K	Pol44	Zásuvková skříň s proudovým chráničem a jističi osazená zásuvkami: 3 ks 230V AC, 16A	ks			
16	K	Pol45	Zásuvková skříň s proudovým chráničem a jističi osazená zásuvkami: 1 ks 400V AC, 16A; 3 ks 230V AC, 16A	ks			
17	K	Pol46	Demontáž a ekologická likvidace stávajících zásuvkových skříní, svítidel, vypínačů, zásuvek a akumulčních kamen.	kpl			
18	K	Pol47	Kabel CYKY-J 4x16 mm ²	m			
19	K	Pol48	Kabel CYKY-J 5x2,5 mm ²	m			
20	K	Pol49	Kabel CYKY-O 2x1,5 mm ²	m			
21	K	Pol50	Kabel CYKY-J 3x1,5 mm ²	m			
22	K	Pol51	Kabel CYKY-J 4x1,5 mm ²	m			
23	K	Pol52	Kabel CYKY-J 3x2,5 mm ²	m			
24	K	Pol53	Odstranění a ekologická likvidace stávajících dielektrických kobereců	m			
25	K	Pol54	Dodávka a pokládka nových dielektrických kobereců	m			
26	K	Pol55	Elektroinstalační trubky, lišty, příchytky, atd.	kpl			
27	K	Pol56	Drobný montážní materiál a montáž vyspecifikované technologie	kpl			
28	K	Pol57	Dodavatelská dokumentace vyspecifikované technologie včetně výpočtu osvětlení a dokumentace skutečného stavu	kpl			
29	K	Pol58	Zkoušky, měření, revize včetně získání průkazu způsobilosti UTZ	kpl			

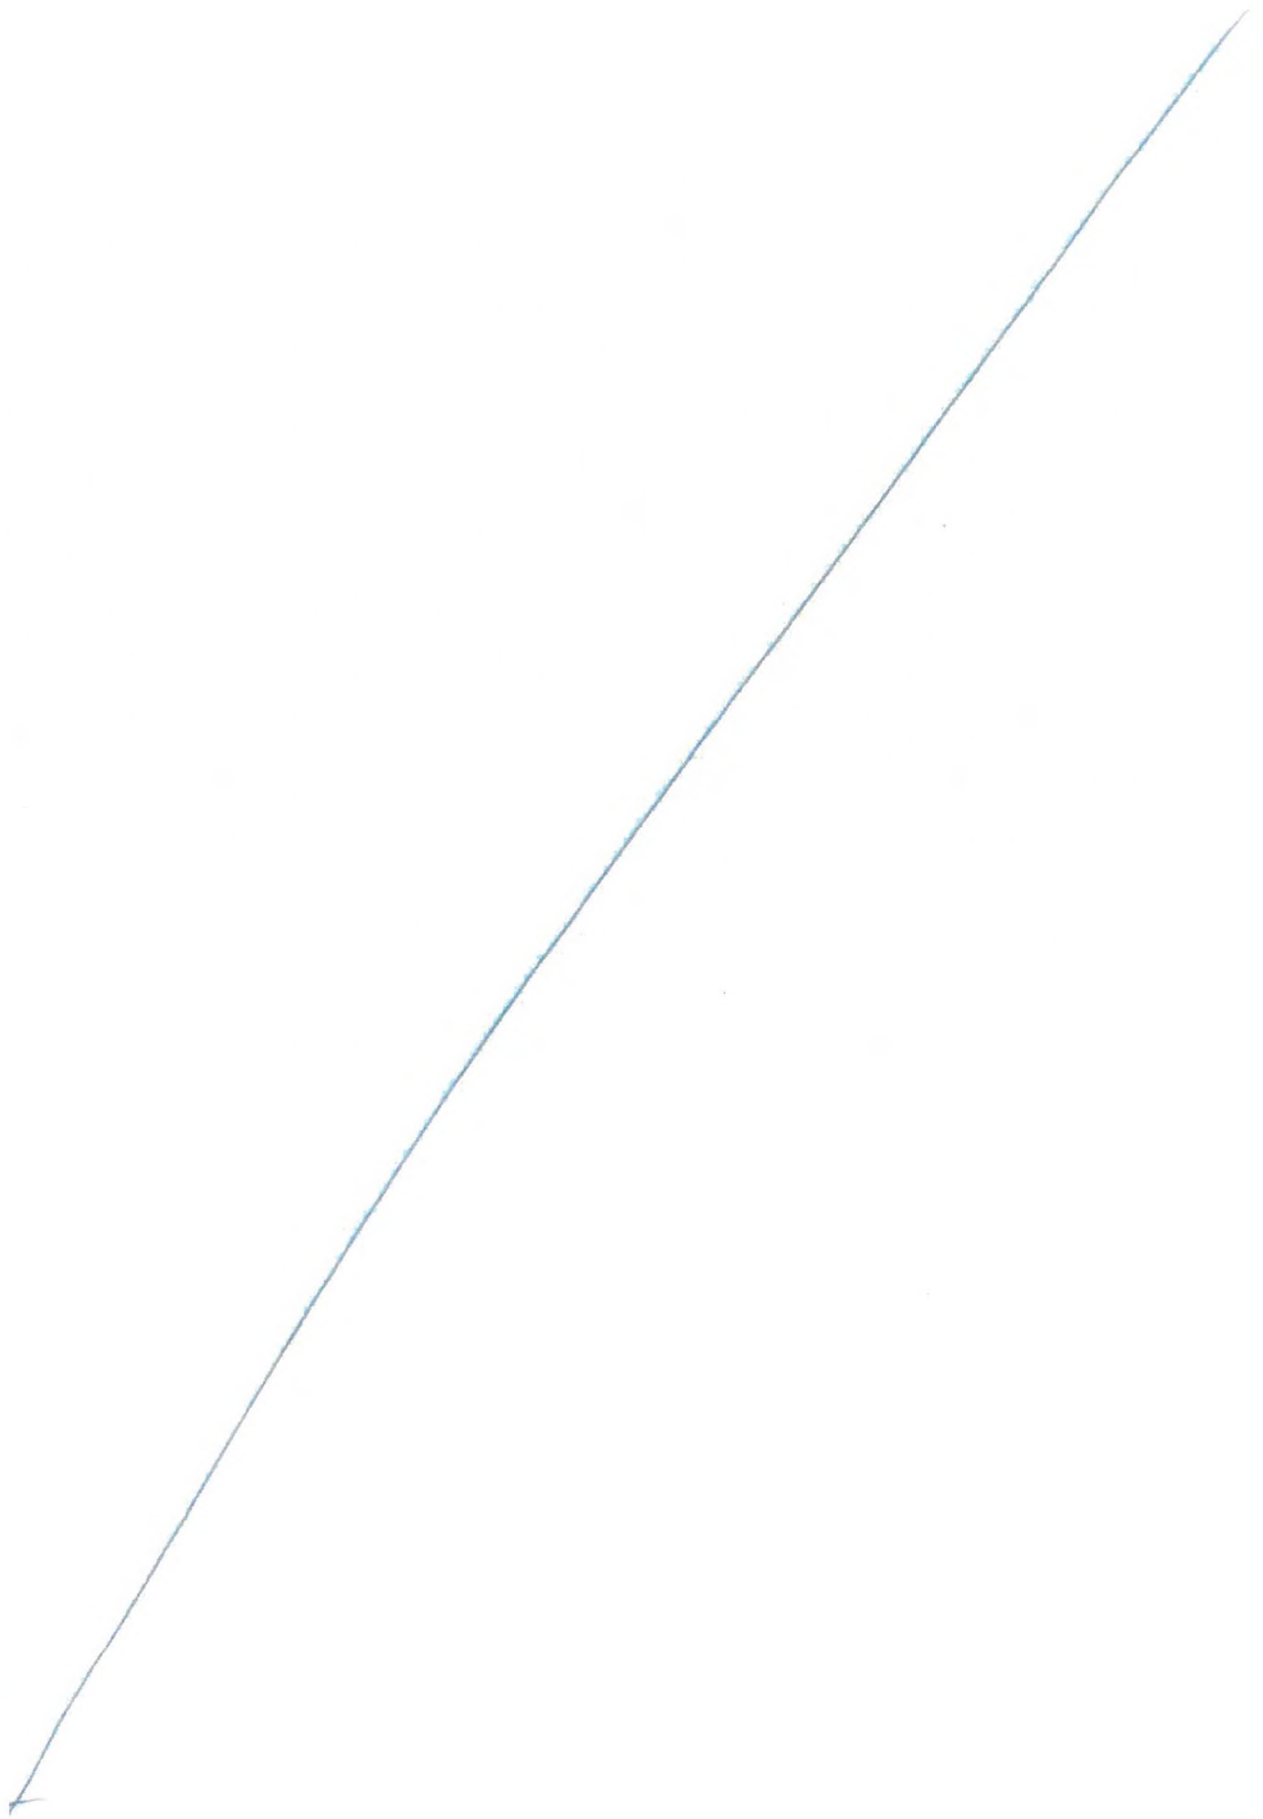

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: MR Kylešovská

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Bohemia Müller s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

25015265

DIČ:

CZ25015265

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				206 000,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				206 000,00
DPH základní	21,00%	ze	206 000,00	43 260,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		249 260,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MR Kylešovská

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Bohemia Müller s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	206 000,00
N00 - MR Kylešovská	206 000,00
N01 - Vedlejší rozpočtové náklady	206 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	206 000,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: MR Kylešovská

Objekt: SO 01 - Rekonstrukce budovy

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Bohemia Müller s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

25015265

DIČ:

CZ25015265

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				3 046 943,41
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				3 046 943,41
DPH základní	21,00%	ze	3 046 943,41	639 858,12
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v CZK	3 686 801,53

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Město: **opravní podnik Opava**
Obecní úřad
Obecní úřad Opava, Bílovecká 98
DIČ: CZ64610250

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MR Kylešovská

Objekt: SO 01 - Rekonstrukce budovy

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Bohemia Müller s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

3 046 943,41

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 2 - Zakládání
- 3 - Svislé a kompletní konstrukce
- 4 - Vodorovné konstrukce
- 5 - Komunikace pozemní
- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 997 - Přesun sutě
- 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

- 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
- 713 - Izolace tepelné
- 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
- 764 - Konstrukce klempířské
- 766 - Konstrukce truhlářské
- 767 - Konstrukce zámečnické
- 771 - Podlahy z dlaždic
- 777 - Podlahy lité
- 781 - Dokončovací práce - obklady
- 783 - Dokončovací práce - nátěry
- 784 - Dokončovací práce - malby a tapety

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

3 046 943,41

ROZPOČET

Stavba: MR Kylešovská

Objekt: SO 01 - Rekonstrukce budovy

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Bohemia Müller s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 046 943,41

HSV - Práce a dodávky HSV

1 817 179,29

1 - Zemní práce

189 503,10

1	K	1-1	Zajištění stávajícího potrubí kanalizace	m	10,000		
2	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	15,934		
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	11,000		
4	K	120001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	56,764		
5	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	10,017		
6	K	132212201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	98,430		
7	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	15,288		
8	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	15,288		
9	K	151101401	Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m2	15,288		
10	K	151101411	Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m2	15,288		
11	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	13,430		
12	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	67,150		
13	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	13,430		
14	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	t	21,488		
15	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	85,000		
16	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	80,136		
17	K	181411121	Založení lučního travníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	80,136		
18	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	1,202		

2 - Zakládání

4 385,08

19	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	27,343		
20	M	693110420	geotextilie netkaná geoNetex M/B, 400 g/m2, šíře 300 cm	m2	31,444		
21	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	0,065		
22	K	275311127	Základové patky a bloky z betonu prostého C 25/30 XF2	m3	0,311		
23	K	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek	m2	2,340		
24	K	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	m2	2,340		

3 - Svislé a kompletní konstrukce

50 027,58

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	
■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	kg/m3	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	6 959,75

4 - Vodorovné konstrukce

36 396,53

30	K	411321515	Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25 XC1	m3	1,620	■	■
31	K	411351101	Zřízení bednění stropů deskových	m2	10,800	■	■
32	K	411351102	Odstranění bednění stropů deskových	m2	10,800	■	■
33	K	411354171	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m2	10,800	■	■
34	K	411354172	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m2	10,800	■	■
35	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,115	■	■
36	K	411388531	Zabetonování otvorů pl do 1 m2 ve stropěch	m3	0,120	■	■
37	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22 - Z18,20	t	0,066	■	■
38	M	4-1	Ocelový profil pro dobetonávku otvoru	kg	66,000	■	■
39	K	451541111-1	Podsypaní a obsyp potrubí otevřený výkop pískem	m3	3,840	■	■

5 - Komunikace pozemní

28 758,55

40	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	18,243	■	■
41	K	564861111-1	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm - okapový chodník	m2	24,715	■	■
42	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	9,100	■	■
43	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikaci pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	18,243	■	■
44	M	592453150	dlažba desková betonová 30x30x3,5 cm sedá	m2	18,243	■	■

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

45	K	6-1	Rekrystalizační nátěr 2*na beton	m2	2,979	■	■
46	K	612323111	Vápenocementová omítka hladkých vnitřních stěn tloušťky do 5 mm nanášená ručně - pod obklady	m2	14,160	■	■
47	K	612331101	Cementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	15,360	■	■
48	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	5,000	■	■
49	K	622211011-1	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm vč. ukončovacích a rohových lišt	m2	281,429	■	■
50	M	283759460	deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 500 x 60 mm	m2	287,058	■	■
51	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrenu tl do 40 mm	m	141,900	■	■
52	M	283759430	deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 500 x 30 mm	m2	29,799	■	■
53	K	622221111	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s kolmou orientací tl do 80 mm vč. rohových a zakládacích lišt	m2	60,560	■	■
54	M	631515090	deska minerální izolační ISOVER NF 333 tl. 60 mm	m2	61,771	■	■
55	K	622321101	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	342,019	■	■

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
56	K	622331101	Cementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně - doplnění pod KZS nové zdivo, doplněný obklad	m2	52,680		
57	K	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	349,989		
58	K	622821012	Vnější sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	m2	6,600		
59	K	629135102-1	Vyrovňovací vrstva pod klempířské prvky z vysokopevnostní reprofilační malty tl. 10 - 30 mm š do 300 mm - atika	m	39,460		
60	K	629991011	Zakrytí vyplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	79,180		
61	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou - fasáda	m2	349,989		
62	K	6-3	Zřízení fabionu z cementové malty	m	60,280	97,90	
63	K	631311135	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	1,442		
64	K	6-4	Plošná hydroizolační chemická injektáž stěn	m2	15,325		
65	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2 - Z1,2	kus	5,000		
66	M	553311430	záručeň ocelová pro běžné zdění H 145 800 L/P	kus	2,000		
67	M	553311450	záručeň ocelová pro běžné zdění H 145 900 L/P	kus	3,000		
68	K	6-5	Armovaná vodotěsná malta tl. 10 mm - skladba b	m2	102,476		
69	K	6-6	Očištění a vyrovnaní povrchu stěn pod izolaci - skladba b	m2	102,476		
70	K	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	39,560		
71	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	18,000		
72	K	612821012	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	m2	14,712		
73	K	629995201	Očištění vnějších ploch otryskáním - nadstřešní konstrukce	m2	54,400		
74	K	6-7	Nátěr stávající fasády - nadstřešní konstrukce 2°silikonový	m2	54,400		
75	K	631311134	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 - pod okapový chodník	m3	2,565		
76	K	637211112	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm na MC 10	m2	17,100		
77	K	6-8	Nátěr fasády 2° hydrofobní	m2	342,019		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

332 975,34

78	K	9-1	Demont+zpětná montáž s doplněním oplocení z drátěného pletiva	m	8,000		
79	K	9-2	Demont+ zpětná montáž s doplněním oplocení z vlnitého plechu	m	3,000		
80	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	13,000		
81	M	592172100	obrubník betonový šedý 100 x 5 x 25 cm	kus	13,000		
82	K	931626212	Úprava dilatační spáry těžkými asfaltovými pásy	m2	20,715		
83	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m - fasáda	m2	443,000		
84	K	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	26 580,000		
85	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	443,000		
	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	150,000		
7	K	952901221	Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží	m2	341,272		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
88	K	95331-1	Dilatace xps tl. 100 mm	m2	0,270		
89	K	953943123	Osazování výrobků do 15 kg/kus do betonu bez jejich dodání - Z7	kus	1,000		
90	M	9-3	Lemování rampy z ocelových úhelníků - Z7	kg	11,850		
91	K	953943124	Osazování výrobků do 30 kg/kus do betonu bez jejich dodání - Z17	kus	1,000	462,54	
92	M	9-5	Lemování z ocelových profilů - Z17	kg	25,500		
93	K	953943125	Osazování výrobků do 120 kg/kus do betonu bez jejich dodání - Z16	kus	2,000		
94	M	9-4	Lemování z ocelových úhelníků - Z16	kg	136,200		
95	K	953961113	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	64,000		
96	K	9-6	Dod+Mont plastové větrací mřížky se sítí 150*150 mm - Z13	ks	2,000		
97	K	9-7	Dod+Mont plastové větrací mřížky se sítí D 125 mm	ks	19,000		
98	K	985231111	Spárování zdiva	m2	5,280		
99	K	961044111	Bourání schodiště z betonu prostého	m3	1,100		
100	K	96-2	Demontáž ventilátoru	ks	3,000		
101	K	96-3	Demontáž průvětrníku	ks	2,000		
102	K	962031132	Bourání přiček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm - přízdívky	m2	98,658		
103	K	962081131	Bourání přiček ze skleněných tváric tl do 100 mm	m2	0,400		
104	K	964072221	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva smíšeného dl do 4 m hmotnosti do 20 kg/m	t	0,020		
105	K	965042241			1,306		
106	K	965081213			5,000		
107	K	966079871			6,000		
108	K	967041112			4,750		
109	K	968062354			0,900		
110	K	968062356					
111	K	968072244					2
112	K	968072455					
113	K	968072558		m2			
114	K	968072559					
115	K	968072875-1					
116	K	971033621					
117	K	971033641					
118	K	972054141		kus			
119	K	972054491		m3			
120	K	974031664		m			
121	K	977312114		m			
122	K	978013191					
123	K	978036191					
124	K	978059541					
125	K	978059641					
126	K	978071221					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
127	K	96-4	Ostatní nepodchycené bourání	hod			

997 - Přesun sutě

107 997,64

							53 113,15
							15 166,55
	K						9 305,38

998 - Přesun hmot

34 927,05

133	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	55,672	627,37	34 927,05
-----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV

1 229 764,12

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

151 419,55

134	K	711-1	Dod+Mont 2*bezešvá pružná asfaltová hydroizolační stěrka s armovacím roumem - b	m2	108,504		
135	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	217,008		
136	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg	t	0,076		
137	K	711161321	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nepovými pro těžké podmínky tl. 1,0 mm	m2	130,205		
138	K	711193121	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí kaší AQUAFIN 2K	m2	5,000		
139	K	711193131	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší AQUAFIN 2K	m2	19,840		
140	K	711-2	Utěsnění prostupu (penetrace, butylkaučukový tmel, nalepení pásu z butylkaučuku na nepovou folii)	soub	1,000		
141	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	1 393,648		

713 - Izolace tepelné

12 720,32

142	K	713130811	Odstranění tepelné izolace stěn volně kladené z vláknitých materiálů tl do 100 mm - fasáda	m2	286,716		
143	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	52,182		

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

37 054,91

146	K	721-4	Napojení lapače střešních splavenin	ks	4,000		
147	M	552441020	lapač střešních splavenin - geiger DN 150 mm	kus	4,000		
148	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	330,400		

764 - Konstrukce klempířské

149	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdi a nadezdívek do suti	m	39,440		
150	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	21,100		
151	K	764003801	Demontáž lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a jiných kusových prvků do suti	kus	1,000		
152	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	44,600		
	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	32,000		
4	K	764-1	Demontáž ostatních klempířských konstrukcí	soub	1,000		
55	K	764-2	Dod+Mont větracího komínku D 100 mm s povrch. úpravou vč. oplechování - K2	ks	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
156	K	764214604	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 330 mm - K3	m	39,500		
157	K	764216604	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm - K1	m	22,150		
158	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm - K4	m	44,600		
159	K	764511643	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/120 mm	kus	5,000		
160	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	24,000		
161	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	578,555		

766 - Konstrukce truhlářské

88 284,39

162	K	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíracích výšky do 1,5 m s rámem do zdiva - OP1	ks	1,000		
163	M	766-1	Okno plastové 1500*1500 otevíravé, izol. dvojsklo - OP1	ks	1,000		
164	K	766622216	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíracích s rámem do zdiva - OP2,3,4	kus	17,000		
165	M	766-2	Okno plastové 600*1500 otevíravé, sklápěcí, izol. dvojsklo - OP2	ks	1,000		
166	M	766-3	Okno plastové 600*600 sklápěcí, izol. dvojsklo, síťka proti hmyzu, ovládání z podlahy - OP3	ks	13,000		
167	M	766-4	Okno plastové 900*600 sklápěcí, izol. dvojsklo, síťka proti hmyzu - OP4	ks	3,000		
168	K	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	11,100		
169	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	1,500		
170	M	607941010	deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING 0,2 x 1 m	m	12,600		
171	M	607941210	koncovka PVC k parapetním deskám 600 mm	kus	34,000		
172	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm	kus	5,000		
173	M	611871560	prah dveří dřevěný dubový tl 2 cm dl. 82 cm š 10 cm	kus	2,000		
174	M	611871760	prah dveří dřevěný dubový tl 2 cm dl. 92 cm š 10 cm	kus	3,000		
175	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	792,242		

767 - Konstrukce zámečnické

323 323,36

176	K	767134831	Demontáž obložení stěn lamelami	m2	286,716		
177	K	767135831	Demontáž roštu pro oplechování příček z lamel	m2	286,716		
178	K	767220210	Montáž zábradlí schodiště z trubek na ocelovou konstrukci hmotnosti do 15 kg - Z22	m	3,700		
179	M	767-10	Zábradlí z ocelových trubek - Z22	kg	58,150		
180	K	767640111	Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlení - Z1	kus	2,000		
181	M	767-1	Vnější ocelové dveře jednokř. otočné 800*1970 zateplené 800*1970, bezpeč. kování - Z1	ks	2,000		
182	K	767640311	Montáž dveří ocelových vnitřních jednokřídlových - Z2	kus	3,000		
183	M	767-2	Vnitřní ocelové dveře jednokř. otočné, plně 900*1970 zámek vložkový - Z2	ks	3,000		
184	K	767651210	Montáž vrat garážových otočných do ocelové zárubně plochy do 6 m2 - Z5	kus	2,000		
185	M	767-4	Vrata ocelová otevíravá 1750*2460, zateplená vč. zárubně, bezpečnostní kování - Z5	ks	2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
186	K	767833100	Montáž žebříků do zdi s bočnicemi s profilové oceli	m	4,000		
187	K	767-1	Úprava žebříku - prodloužení kotvení	celk	1,000		
188	K	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg - Z14	kg	8,100		
189	M	767-6	Okapnička u ocelového profilu - Z14	kg	8,100		
190	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg - Z4,10,15	kg	61,350		
191	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg - Z3	kg	29,750		
192	M	767-3	mříž vnější z ocelových profilů - Z3,4,10,15	kg	91,100		
193	K	767995114-1	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg - Z17	kg	25,500		
194	M	767-7	Ocelový úhelník - Z17	kg	25,500		
195	K	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg - Z16	kg	136,200		
196	K	767995115-1	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg - Z8	kg	75,900		
197	M	767-5	Ocelové profily úpravy žebříku - Z8	kg	75,900		
198	K	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg - Z21	kg	223,150		
199	M	767-9	Ocelová konstrukce schodiště - Z21	kg	223,150		
200	K	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg - Z18	kg	431,200		
201	M	767-8	Ocelová konstrukce rampy - Z18	kg	431,200		
202	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	2 027,952		

771 - Podlahy z dlaždic

5 495,03

203	K	771574112	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2	m2	5,000	502,50	2 512,49
204	K	771579191	Příplatek k montáži podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	5,000		
205	K	771579196	Příplatek k montáži podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m2	5,000		
206	M	771-1	Dlažba keramická	m2	5,200		
207	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	37,206		

777 - Podlahy lité

18 879,27

208	K	777551111	Podlahy lité tloušťky 5 mm Nivelit	m2	5,000		
209	K	777615114-1	Nátěry epoxidové podlah betonových	m2	58,300		
210	K	998777202	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 12 m	%	153,632		

781 - Dokončovací práce - obklady

42 514,88

211	K	781414112	Montáž obkladaček vnitřních pórovinných pravoúhlých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	15,360		
212	K	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za plochu do 10 m2	m2	15,360		
213	K	781419195	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za spárování	m2	15,360		
214	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	21,000		
215	M	781-1	Obklady keramické vnitřní	m2	15,821		
216	K	781774119	Montáž obkladů vnějších z dlaždic keramických do 50 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem - doplnění obkladu	m2	16,000		
217	K	781779191	Příplatek k montáži obkladů vnějších z dlaždic keramických za plochu do 10 m2	m2	16,000		
218	K	781779196	Příplatek k montáži obkladů vnějších z dlaždic keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m2	16,000		
	M	781-2	Obklady vnější kabřinec	m2	16,640		
0	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	292,046		

783 - Dokončovací práce - nátěry

356 510,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
221	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	7,800		
222	K	783314201	Základní nátěr syntetický	m2	125,556		
223	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	125,556		
224	K	783401303	Bezoplachové odrezivění klempířských konstrukcí před provedením nátěru - střecha	m2	402,002		
225	K	783414201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	402,002		
226	K	783417101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	804,004		
227	K	783506805	Odstranění nátěru z krytiny sklonu do 10° oškrábáním	m2	402,002		

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

92 098,81

228	K	784-1	Malby z maliřských směsí vč. očištění a penetrace podkladu	m2	1 676,200		
-----	---	-------	--	----	-----------	--	--

ROZPOČET

Stavba: MR Kylešovská

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Bohemia Müller s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

206 000,00

N00 - MR Kylešovská

206 000,00

N01 - Vedlejší rozpočtové náklady

206 000,00

1	K	001	Zařízení staveniště	kpl	1,000		
2	K	002	Provozní vlivy	kpl	1,000		

Orientační návrh harmonogramu realizace díla – Kylešovská

Činnost	Trvání kalendářních dnů	Datum zahájení	Datum ukončení
Vypracování projektové dokumentace ke schválení	45 dnů	T	T+45 dnů
Schvalovací proces dokumentace	10 dnů	T+45 dnů	T+55 dnů
Výroba + dodávka technologických dodávek	180 dnů	T+55 dnů	T+235 dnů
Stavební úpravy + rekonstrukce elektroinstalace	150 dnů	T+85 dnů	T+235 dnů
Montáž technologie	30 dnů	T+235 dnů	T+265 dnů
Výchozí revize, individuální zkoušky, oživení	10 dnů	T+265 dnů	T+275 dnů
Předání díla včetně dokladové části a dokumentace skutečného stavu	10 dnů	T+275 dnů	T+285 dnů

Finanční harmonogram - vyjádření

Souhlasíme s návrhem podmínek uvedených SoD v článku V. platební podmínky, a to:

Smluvní strany se dohodly na postupné splatnosti ceny díla v závislosti na skutečně a řádně provedených pracích na díle, a to tak, že zhotovitel je oprávněn vždy po skončení daného kalendářního měsíce daňovým dokladem – fakturou vyúčtovat cenu prací, které na díle v daném kalendářním měsíci řádně provedl.

Bohemia Müller s.r.o.
Loupnická 139, Janov
435 42 Litvínov

Tel.: +420 476 742 881
Fax: +420 476 742 882
sekretariat@bohemiಾಮuller.cz
Datová schránka: 9skr986

IČ 25015265
DIČ CZ25015265
ČS 3781842/0800

▲ Zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 11885

www.bohemiಾಮuller.cz

DODATEK ČÍSLO 1

SMLOUVY O DÍLO UZAVŘENÉ DNE 10.2.2022

(DÁLE TÉŽ „SMLOUVA“)

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: **Městský dopravní podnik Opava, a.s.**
Sídlo: **Bílovecká 1127/98, Kylešovice, 747 06 Opava**
IČ: **64610250**
DIČ: **CZ64610250**
Datová schránka: **h49e6w2**
Číslo účtu: **[REDACTED]**
Bankovní spojení: **ČSOB, a.s.**
Zastoupen: **Ing. Vladimír Schreier, předseda představenstva společnosti**
Zapsán: **v OR vedeném KS v Ostravě oddíl B, vložka 1234**
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: **[REDACTED]**
Kontaktní osoby ve věcech technických: **[REDACTED]**
[REDACTED]
dále jen „objednatel“

a	
Zhotovitel:	Bohemia Müller s.r.o.
Sídlo:	Loupnická 139, Janov, 435 42 Litvínov
IČ:	25015265
DIČ:	CZ25015265
Datová schránka:	gskrg86
E-mailová adresa:	sekretariat@bohemiamura.cz
Číslo účtu:	[REDACTED]
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Zastoupen:	Karel Müller, jednatel
Zapsán:	v OR vedeném KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 11885
Kontaktní osoby ve věcech smluvních:	Ing. Václav Langheinrich, jednatel

Kontaktní osoby ve věcech technických:	
dále jen „zhotovitel“	

Článek II.

Předmět dodatku číslo 1

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy, a to v článku IV. Cena díla, v odstavcích 4.1.-4.4., které se ruší v původním znění a nahrazují se následujícím novým zněním:

4.1. Cena díla bez daně z přidané hodnoty

7 247 848,91 Kč

(slovy: sedmmilionůdvěstěčtyřicetsedmtisícsmsetčtyřicetosm korun
českých a 91 haléřů)

Z toho:

Cena z původní SOD 6 721 234 Kč

Cena dle Dodatku číslo 1 526 614,91 Kč

Cena díla podle odst. 4.1. nezahrnuje daň z přidané hodnoty, která bude Zhotovitelem účtována podle platných daňových předpisů. Předmět plnění díla je zařazen pod číslo klasifikace produkce VZ CPA 42.22.22 a podléhá od režimu přenesené daňové povinnosti.

4.2. Celková cena díla

7 247 848,91 Kč

(slovy: sedmmilionůdvěstěčtyřicetsedmtisícsmsetčtyřicetosm korun
českých a 91 haléřů)

Článek III.

Ostatní ujednání k dodatku číslo 1

- 3.1. Dodatek číslo 1 Smlouvy vzniká dohodou smluvních stran o celém jeho rozsahu, nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., o registru smluv.

- 3.2. Dodatek číslo 1 je nedílnou součástí Smlouvy.
- 3.3. Smluvní strany se dohodly, že ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.
- 3.4. Tento dodatek číslo 1 Smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po podpisu jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek číslo 1 tak jak je sepsán, odpovídá jejich pravé vůli, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy: - příloha č. 1 položkový rozpočet více a méně prací

V Opavě dne 11.8.2022

V Litvínově dne _____

Za objednatele
Ing. Vladimír Schreier
předseda představenstva společnosti
Městský dopravní podnik Opava, a.s.

Městský dopravní podnik Opava
akciová společnost (8)
747 06 OPAVA, Bílovecká 98
DIČ: CZ64610250

Za zhotovitele
Ing. Václav Langheinrich
jednatel
Bohemia Müller s.r.o.



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 132B

Stavba: MR Kylešovská

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 04.08.2022

Objednatel:

Městský dopravní podnik Opava, a.s.

IČ: 646510250

DIČ: CZ64610250

Zhotovitel:

Bohemia Müller s.r.o.

IČ: 25015265

DIČ: CZ25015265

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	526 614,91
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	526 614,91
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	526 614,91
------------	---	-----	------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 132B

Stavba: MR Kylešovská

Místo:

Datum: 04.08.2022

Objednatel: Městský dopravní podnik Opava, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Bohemia Müller s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		526 614,91	526 614,91
PS 05	Stavební elektroinstalace	██████████	██████████
SO 01	Rekonstrukce budovy	██████████	██████████
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	██████████	██████████
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		██████████	██████████
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		526 614,91	526 614,91

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: MR Kylešovská

Objekt: PS 05 - Stavební elektroinstalace

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Městský dopravní podnik Opava, a.s.

Zhotovitel:

Bohemia Müller s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.08.2022

IČ: 646510250

DIČ: CZ64610250

IČ: 25015265

DIČ: CZ25015265

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				-10 844,15
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-10 844,15
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				-10 844,15
v CZK				

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MR Kylešovská

Objekt: PS 05 - Stavební elektroinstalace

Místo:

Datum:

04.08.2022

Objednatel: Městský dopravní podnik Opava, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Bohemia Müller s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-10 844,15
D1 - PS5 Stavební elektroinstalace	-10 844,15
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-10 844,15

ROZPOČET

Stavba: MR Kylešovská

Objekt: PS 05 - Stavební elektroinstalace

Místo:

Datum:

04.08.2022

Objednatel: Městský dopravní podnik Opava, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Bohemia Müller s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-10 844,15

D1 - PS5 Stavební elektroinstalace

-10 844,15

1	K	Pol30	Nástěnný rozváděč stavební elektroinstalace, dle položky č. 1 TOS oddílu 1.6	kpl	0,000		
2	K	Pol31	Demontáž a ekologická likvidace stávajícího rozváděče pro elektroinstalaci RMS-1	kpl	0,000		
3	K	Pol32	LED svítidlo stropní 1x 54 W, 230V AC	ks	2,000		
4	K	Pol33	LED svítidlo nástěnné 2x 24 W, 230V AC	ks	0,000		
5	K	Pol34	LED nástěnné svítidlo 1x60 W, E27, 230V AC	ks	-1,000		
6	K	Pol35	LED stropní svítidlo 1x100 W, E27, 230V AC	ks	0,000		
7	K	Pol36	LED venkovní nástěnné svítidlo 1x100W, 230V AC, IP43	ks	-3,000		
8	K	Pol37	LED svítidlo 24V DC (náhradní osvětlení), např. SYD-02 WW 24VDC 30LED od firmy ELECO	ks	0,000		
9	K	Pol38	vypínač jednopólový, řazení 1	ks	4,000		
10	K	Pol39	přepínač střídavý, řazení 6	ks	-2,000		
11	K	Pol40	přepínač střídavý, řazení 6, IP43	ks	-4,000		
12	K	Pol41	přepínač křížový, řazení 7	ks	0,000		
13	K	Pol42	zásuvka 230V AC, 16A	ks	0,000		
14	K	Pol43	Elektrický přímotopný konvertor s termostatem od +5 °C, 230V AC, 2000 W	ks	2,000		
15	K	Pol44	Zásuvková skříň s proudovým chráničem a jističi osazená zásuvkami: 3 ks 230V AC, 16A	ks	0,000		
16	K	Pol45	Zásuvková skříň s proudovým chráničem a jističi osazená zásuvkami: 1 ks 400V AC, 16A; 3 ks 230V AC, 16A	ks	0,000		
17	K	Pol46	Demontáž a ekologická likvidace stávajících zásuvkových skříní, svítidel, vypínačů, zásuvek a akumulčních kamen.	kpl	0,000		
18	K	Pol47	Kabel CYKY-J 4x16 mm2	m	0,000		
19	K	Pol48	Kabel CYKY-J 5x2,5 mm2	m	0,000		
20	K	Pol49	Kabel CYKY-O 2x1,5 mm2	m	0,000		
21	K	Pol50	Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2	m	0,000		
22	K	Pol51	Kabel CYKY-J 4x1,5 mm2	m	0,000		
23	K	Pol52	Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2	m	300,000		
24	K	Pol53	Odstranění a ekologická likvidace stávajících dielektrických kobereců	m	-55,000		
25	K	Pol54	Dodávka a pokládka nových dielektrických kobereců	m	-55,000		
26	K	Pol55	Elektroinstalační trubky, lišty, přichytky, atd.	kpl	0,000		
27	K	Pol56	Drobný montážní materiál a montáž vyspecifikované technologie	kpl	0,000		
28	K	Pol57	Dodavatelská dokumentace vyspecifikované technologie včetně výpočtu osvětlení a dokumentace skutečného stavu	kpl	0,000		
29	K	Pol58	Zkoušky, měření, revize včetně získání průkazu způsobilosti UTZ	kpl	0,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	K	Pol59	Zásuvka 400V AC	ks	1,000		
31	K	Pol60	Drat FeZN p10	m	26,000		
32	K	Pol61	Štítek c. pro označ. Svodu	ks	5,000		
33	K	Pol62	Pásek uzemňovací FeZn 30x40 mm	m	75,000		
34	K	Pol63	Svorka spoj SS	ks	10,000		
35	K	Pol64	Svorka zkušeb SZ	ks	5,000		
36	K	Pol65	Svorka vod SR 02 30x4 mm pas	ks	10,000		
37	K	Pol66	Svorka vodov SR 03	ks	10,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VCP Rekonstrukce budovy Kylešovská

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Městský dopravní podnik Opava, a.s.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

04.08.2022

IČ:

64610250

DIČ:

CZ64610250

IČ:

42869285

DIČ:

CZ42869285

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

516 719,06

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

516 719,06

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

516 719,06

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

2

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VCP Rekonstrukce budovy Kylešovská

Místo:

Datum: 04.08.2022

Zadavatel:

Městský dopravní podnik Opava, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

FUS a HARAZIM s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							516 719,06
D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	1		Zemní práce				
6	K	132212201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3			
15	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypavinou se zhutněním	m3			
D	2		Zakládání				
19	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2			
20	M	693110420	geotextilie netkaná geoNetex M/B, 400 g/m2, šíře 300 cm	m2			
22	K	275311127	Základové patky a bloky z betonu prostého C 25/30 XF2	m3			5
23	K	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek	m2			
24	K	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	m2			57
1041	K	27931111R	Postupné obetonování dešťové kanalizace prostým betonem tř. C 12/15	m3			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				26 567,95
1026	K	31027884R	Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu z nepálených tvárcí YTONG tl. 375 mm	m3	4,556		
27	K	311273409	Zdivo nosné tl 375 mm z pórabetonových přesných tvárcí PDK Ytong hmotnosti 300 kg/m3	m3	-3,251		
28	K	317944321	Válcované nosníky do č. 12 dodatečně osazované do připravených otvorů - Z6.11.12.19	t	-0,076		
1063	K	340271021	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m2 tvárnicemi pórabetonovými tl 100 mm	m2	4,800		
D	4		Vodorovné konstrukce				-31 984,95
30	K	411321515	Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25 XC1	m3	-1,620		
31	K	411351101	Zřízení bednění stropů deskových	m2	-10,800		
32	K	411351102	Odstranění bednění stropů deskových	m2	-10,800		
33	K	411354171	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m2	-10,800		
34	K	411354172	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m2	-10,800		
35	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	-0,115		
36	K	411388531	Zabetonování otvorů pl do 1 m2 ve stropích	m3	-0,120		
37	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22 - Z18.20	t	-0,066		
38	M	4-1	Ocelový profil pro dobetonávku otvoru	kg	-66,000		
D	5		Komunikace pozemní				
1037	K	564811011	Podklad ze štěrkodrtě SD plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2	42,958		
43	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	24,715		
44	M	592453150	dlažba desková betonová 30x30x3,5 cm sedá	m2	25,951		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1066	K	61231114R	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá malých ploch vnitřních stěn nanášená ručně	ks	4,000		
1038	K	61232522R	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1 m2 na stěnách	kus	15,000		
47	K	612331101	Cementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	24,300		
1054	K	62221100R	Montáž kontaktního zateplení soklu lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do 40 mm	m2	80,000		
1055	M	2837641R	deska z polystyrénu XPS tl 40mm	m2	84,000		
49	K	622211011-1	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm vč. ukončovacích a rohových lišt	m2	44,520		
50	M	283759460	deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 500 x 60 mm	m2	45,410		

Zhotovitel:			FUS a HARAZIM s.r.o.		Zpracovatel:		
1065	K	62233521R	Oprava malých ploch cementové škrábané omítky vnějších stěn	ks	4,000		
1056	K	62251111R	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka vnějších stěn	m2	80,000		
57	K	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	44,520		
61	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou - fasáda	m2	44,520		
65	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 - Z1.2	kus	-3,000		
67	M	553311450	záрубеň ocelová pro běžné zdění H 145 900 L/P	kus	-3,000		
77	K	6-8	Nátěr fasády 2* hydrofobní	m2	44,520		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				26 874,69
80	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	9,000		
81	M	592172100	obrubník betonový šedý 100 x 5 x 25 cm	kus	9,000		
1033	K	94611211R	Montáž pojízdných věží dílcových š 2 m dl 2 m v 4,0 m	kus	2,000		
1034	K	946112214	Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 4,5 m za první a ZKD den použití	kus	20,000		
1035	K	94611281R	Demontáž pojízdných věží dílcových	kus	2,000		
88	K	95331-1	Dilatace xps tl. 100 mm	m2	1,080		
91	K	953943124	Osazování výrobků do 30 kg/kus do betonu bez jejich dodání - Z17	kus	-1,000		
92	M	9-5	Lemování z ocelových profilů - Z17	kg	-25,500		
93	K	953943125	Osazování výrobků do 120 kg/kus do betonu bez jejich dodání - Z16	kus	-2,000		
94	M	9-4	Lemování z ocelových úhelníků - Z16	kg	-136,200		
99	K	961044111	Bourání schodiště z betonu prostého, vč. podesty	m3	1,980		
1039	K	96104411R	Bourání patek oplocení	m3	0,486		
1040	K	96105511R	Bourání základů ve výkopech	m3	0,698		
103	K	962081131	Bourání přiček ze skleněných tvárníc tl do 100 mm	m2	5,790		
117	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	-1,025		
1060	K	971042251	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,0225 m2 tl do 450 mm	kus	1,000		
1061	K	972054691	Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 4 m2 tl přes 80 mm	m3	0,486		
1062	K	97604733R	Vybourání železného poklopu 600x600 mm	ks	1,000		
D 997			Přesun sutě				
128	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	6,599		
129	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,599		
130	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	92,386		
132	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	6,599		
D 998			Přesun hmot				
133	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	12,231		
D PSV			Práce a dodávky PSV				191 220,87
D 713			Izolace tepelné				4 051,11
1027	K	71311112R	Montáž izolace tepelné stropů s mechanickým kotvením rohoží	m2	1,920		
1028	M	63152108R	minerální rohož tl. 400 mm	m2	1,958		
1029	K	71319113	Montáž parozábrany stropů - překrytí fólií	m2	3,840		
1030	M	28329028	fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150a/m2 s integrovanou lepicí páskou	m2	4,476		
1036	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	%	34,553		
D 763			Konstrukce suché výstavby				
1031	K	76313298R	Vyspravení SDK podhledu, pl přes 0,5 do 1 m2 deska 1xH2DF 15	kus	1,920		
1032	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	16,819		
D 764			Konstrukce klempířské				
2070	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	6,000		
152	K	764214604	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 330 mm - K3	m	-39,500		
2071	K	764214606	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 450 mm	m	39,500		
2069	K	764242404	Oplechování štítu závětrnou lištou z TiZn předzvětralého plechu rš 330 mm	m	6,000		

Zhotovitel:

FUS a HARAZIM s.r.o.

Zpracovatel:

158	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	142,108		
	D	766	Konstrukce truhlářské				
164	K	76622216	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdíva	kus	-4,000		
166	M	766-3	Okno plastové 600*600 sklápěcí, izol. dvojsklo, síťka proti hmyzu, ovládání z podlahy - OP3	ks	-13,000		
1042	M	766-3R	Okno plastové 1000*600 fixní	ks	7,000		
167	M	766-4	Okno plastové 900*600 sklápěcí, izol. dvojsklo, síťka proti hmyzu - OP4	ks	-3,000		
1043	M	766-4R	Okno plastové 1000*600 sklápěcí, izol. dvojsklo, síťka proti hmyzu ovládání z podlahy	ks	5,000		
1052	M	766-5R	D+M vnitřní dveře 800*1970 mm vč. kování	ks	3,000		
1053	M	766-6R	D+M vnitřní dveře 600*1970 mm vč. kování	ks	2,000		
175	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	343,931		
	D	767	Konstrukce zámečnické				
187	K	767-1	Úprava žebříku - prodloužení kotvení	celk	-1,000		
178	K	767220210	Montáž zábradlí schodiště z trubek na ocelovou konstrukci hmotnosti do 15 kg - Z22	m	-3,700		
179	M	767-10	Zábradlí z ocelových trubek - Z22	kg	-58,150		
182	K	767640311	Montáž dveří ocelových vnitřních jednokřídlových - Z2	kus	-3,000		
183	M	767-2	Vnitřní ocelové dveře jednokř. otočné, plné 900*1970 zámek vložkový - Z2	ks	-3,000		
184	K	767651210	Montáž vrat garážových otočných do ocelové zárubně plochy do 6 m2 - Z5	kus	-2,000		
185	M	767-4	Vrata ocelová otevíravá 1750*2460, zateplená vč. zárubně, bezpečnostní kování - Z5	ks	-2,000		
1045	K	76765221R	Montáž vrat vč. osazení a zazdění úhelníkové zárubně plochy do 6 m2	kus	5,000		
1046	M	767-01R	Vrata ocelová zateplená 1730*1970 mm vč. bezpeč. kování a zárubně		1,000		
1047	M	767-02R	Vrata ocelová zateplená 1430*1970 mm vč. bezpeč. kování a zárubně		1,000		
1048	M	767-03R	Vrata ocelová nezateplená 1750*1970 mm vč. bezpeč. zámku a zárubně		2,000		
1049	M	767-04R	Vrata ocelová nezateplená 900*1970 mm vč. bezpeč. zámku a zárubně		1,000		
1044	K	76766181R	Demontáž plechových žaluzií oken	m2	11,520		
1050	K	76783211R	Montáž venkovních žebříků bez suchovodu	m	4,200		
1051	M	4498300R	žebřík venkovní bez suchovodu v provedení žárový Zn	m	4,200		
186	K	767833100	Montáž žebříků do zdi s bočnicemi s profilové oceli	m	-4,000		
190	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg - Z4,10,15	kg	-46,000		
192	M	767-3	mříž vnější z ocelových profilů - Z3,4,10,15	kg	-46,000		
193	K	767995114-1	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg - Z17	kg	-25,500		
194	M	767-7	Ocelový úhelník - Z17	kg	-25,500		
195	K	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg - Z16	kg	-136,200		
196	K	767995115-1	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg - Z8	kg	-75,900		
197	M	767-5	Ocelové profily úpravy žebříku - Z8	kg	-75,900		
198	K	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg - Z21	kg	446,300		
199	M	767-9	Ocelová konstrukce schodiště - Z21	kg	446,300		
202	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	1 650,353		
	D	781	Dokončovací práce - obklady				
216	K	781774119	Montáž obkladu vnějších z dlaždic keramických do 50 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem - doplnění obkladu	m2	-16,000		
217	K	781779191	Příplatek k montáži obkladů vnějších z dlaždic keramických za plochu do 10 m2	m2	-16,000		
218	K	781779196	Příplatek k montáži obkladů vnějších z dlaždic keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m2	-16,000		
219	M	781-2	Obklady vnější kabřinec	m2	-16,640		
220	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	-220,473		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: MR Kylešovská

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 04.08.2022

Objednatel:

Městský dopravní podnik Opava, a.s.

IČ: 646510250

DIČ: CZ64610250

Zhotovitel:

Bohemia Müller s.r.o.

IČ: 25015265

DIČ: CZ25015265

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				20 740,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				20 740,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v CZK	20 740,00

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MR Kylešovská

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum:

04.08.2022

Objednatel: Městský dopravní podnik Opava, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Bohemia Müller s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	20 740,00
N00 - MR Kylešovská	20 740,00
N01 - Vedlejší rozpočtové náklady	20 740,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	20 740,00

ROZPOČET

Stavba: MR Kylešovská

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum:

Objednatel: Městský dopravní podnik Opava, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Bohemia Müller s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

20 740,00

N00 - MR Kylešovská

N01 - Vedlejší rozpočtové náklady

1	K	001	Zařízení staveniště	kpl	1,000		
2	K	002	Provozní vlivy	kpl	1,000		0

DODATEK ČÍSLO 2
SMLOUVY O DÍLO UZAVŘENÉ DNE 10.2.2022
VE ZNĚNÍ DODATKU ČÍSLO 1 UZAVŘENÉHO DNE
11.8.2022
(DÁLE TÉŽ „SMLOUVA“)

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: **Městský dopravní podnik Opava, a.s.**
Sídlo: **Bílovecká 1127/98, Kylešovice, 747 06 Opava**
IČ: **64610250**
DIČ: **CZ64610250**
Datová schránka: **h49e6w2**
Číslo účtu: **■**
Bankovní spojení: **ČSOB, a.s.**
Zastoupen: **Ing. Vladimír Schreier, předseda představenstva společnosti**
Zapsán: **v OR vedeném KS v Ostravě oddíl B, vložka 1234**
Kontaktní osoba ve
věcech smluvních: **■**
Kontaktní osoby ve
věcech technických: **■**
dále jen „objednatel“

a	
Zhotovitel:	Bohemia Müller s.r.o.
Sídlo:	Loupnická 139, Janov, 435 42 Litvínov
IČ:	25015265
DIČ:	CZ25015265
Datová schránka:	gskrg86
E-mailová adresa:	■
Číslo účtu:	■
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Zastoupen:	Karel Müller, jednatel

Zapsán:	v OR vedeném KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 11885
Kontaktní osoby ve věcech smluvních:	Ing. Václav Langheinrich, jednatel
Kontaktní osoby ve věcech technických:	
dále jen „zhotovitel“	

Článek II.

Předmět dodatku číslo 2

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy, a to v článku IV. Cena díla, v odstavcích 4.1.-4.4., které se ruší v původním znění a nahrazují se následujícím novým zněním:

4.1. Cena díla bez daně z přidané hodnoty

7 364 091 Kč

(slovy: sedmmiliónůtřistašedesátčtyřitisícdevadesátjedna korun českých)

Z toho:

Cena z původní SOD 6 721 234,00 Kč

Cena dle Dodatku číslo 1 526 614,91 Kč

Cena dle Dodatku číslo 2 116 242,09 Kč

Cena díla podle odst. 4.1. nezahrnuje daň z přidané hodnoty, která bude Zhotovitelem účtována podle platných daňových předpisů. Předmět plnění díla je zařazen pod číslo klasifikace produkce VZ CPA 42.22.22 a podléhá od režimu přenesené daňové povinnosti.

4.2. Celková cena díla

7 364 091 Kč

(slovy: sedmmiliónůtřistašedesátčtyřitisícdevadesátjedna korun českých)

Článek III.

Ostatní ujednání k dodatku číslo 2

- 3.1. Dodatek číslo 2 Smlouvy vzniká dohodou smluvních stran o celém jeho rozsahu, nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 3.2. Dodatek číslo 2 je nedílnou součástí Smlouvy.
- 3.3. Smluvní strany se dohodly, že ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.
- 3.4. Tento dodatek číslo 2 Smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po podpisu jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek číslo 2 tak jak je sepsán, odpovídá jejich pravé vůli, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy: - položkový rozpočet více a méně prací

V Opavě dne 29.9.2022

V Litvínově dne 05.10.2022

Za objednatele

Ing. Vladimír Schreier


předseda představenstva společnosti
Městský dopravní podnik Opava, a.s.

Městský dopravní podnik Opava
akciová společnost (8)
747 06 OPAVA, Bílovecká 98
DIČ: CZ64610250

Za zhotovitele

Ing. Václav Langheinrich

jednatel
Bohemia Müller s.r.o.



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 132B

Stavba: MR Kylešovská

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 19.09.2022

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Bohemia Müller s.r.o.

IČ: 25015265

DIČ: CZ25015265

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

116 242,09

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

116 242,09

DPH základní	21,00%	ze	24 410,84
snížená	15,00%	ze	0,00

24 410,84

0,00

Cena s DPH

v

CZK

140 652,93

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 132B

Stavba: MR Kylešovská

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Bohemia Müller s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		116 242,09	140 652,93
SO 01	Rekonstrukce budovy	114 382,09	138 402,33
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	1 860,00	2 250,60
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		116 242,09	140 652,93

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VCP Rekonstrukce budovy Kylešovská

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

FUS a HARAZIM s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19.09.2022

IC:

DIČ:

IC:

42869285

DIČ:

CZ42869285

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

114 382,09

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

114 382,09

DPH základní

Základ daně

114 382,09

Sazba daně

21,00%

Výše daně

24 020,24

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

138 402,33

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: _____ Razítko

Datum a podpis: _____ Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VCP Rekonstrukce budovy Kylešovská

Místo:

Datum:

19.09.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

FUS a HARAZIM s.r.o.

Zpracovatel:

PČ

Ty
p

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

114 382,09

D HSV

Práce a dodávky HSV

492,81

D 997

Přesun sulě

4 788,81

Zhotovitel:		FUS a HARAZIM s.r.o.	Zpracovatel:	
128	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t 2,687
129	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t 2,687
130	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t 37,618
132	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t 2,687
D 998		Přesun hmot		
133	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t 2,768 627,37
144	K	721-2	Napojení liniového žlabu na kanalizaci	ks -5,000
148	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	% -8,572
D PSV		Práce a dodávky PSV		
D 777		Podlahy lité		
209	K	777615114-1	Nátary epoxidové podlah betonových	m2 -58,300
210	K	998777202	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 12 m	% -151,110
D HSV		Práce a dodávky HSV		
D 2		Zakládání		
836	K	27531371R	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3 0,480
837	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2 4,800
838	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2 4,800
D 3		Svislé a kompletní konstrukce		
801	K	31766114R	Výplň spár rampy tmelem polyuretanovým	m 19,500
802	K	317944321	Valcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t 0,084
839	K	338171123	Osazování sklopku a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním	kus 3,000
840	K	5534225R	sloupek plotový průběžný 2500/38x1,5mm	kus 3,000
803	K	346244381	Plnění jedné strany v do 200 mm valcovaných nosníků pihlami	m2 3,800
D 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		
804	K	612135101	Úprava výplní v sádkách malou jakostní směsí	m2 1,950
805	K	61232512R	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2 1,950
806	K	61332114R	Vápenocementová omítka štuková dvourvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2 9,000
807	K	622142001	Potážení vnějších stěn sklováknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2 24,665
808	K	622321141	Vápenocementová omítka štuková dvourvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2 24,665
809	K	62232114R	Vápenocementová omítka dvourvrstvá vnějších stěn nanášená ručně tl. 50 mm	m2 10,109
810	K	62232115R	Vápenocementová omítka dvourvrstvá vnějších stěn nanášená ručně tl. 20 mm	m2 14,556
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání		
811	K	97303133R	Výsekání kapes ve zdivu cihelném na MVC pl do 0.16 m2 hl do 500 mm	kus 4,000
812	K	974031155	Výsekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 200 mm	m 13,000
813	K	978036191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu přes 50 do 100 %	m2 10,109
814	K	978059641	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkladaček plochy přes 1 m2	m2 14,556
D PSV		Práce a dodávky PSV		
D 721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		
815	K	72117180R	Demontáž HT potrubí D50	m 2,000
816	K	72117181R	Demontáž HT potrubí D110	m 1,000
817	K	72117404R	Potrubí kanalizační z HT přípojovací DN 50	m 2,000
818	K	72117405R	Potrubí kanalizační z HT přípojovací DN 110	m 1,000
819	K	72121081R	Demontáž vpustí podlahových	kus 1,000
820	K	72121145R	Vpust' podlahová	kus 1,000
D 722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod		
821	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 25	m 11,000
822	K	72213082R	Demontáž ventilů 3/4"	kus 3,000
823	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm	m 11,000
824	K	72223114R	Ventili závitový rohový G 1/2"	kus 3,000
825	K	72224010R	Ventily plastové PPR DN 25	kus 3,000
826	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	% 90,682
D 725		Zdravotechnika - zařizovací předměty		

81 196,47

Zhotovitel:		FUS a HARAŽIM s.r.o.	Zpracovatel:			
827	K	72511081R	Demontáž klozetů	soubor	1,000	
828	K	72511217R	Kombi klozet, vč. sedátka	soubor	1,000	
829	K	72521082R	Demontáž umyvadel	soubor	1,000	
830	K	72521163R	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm	soubor	1,000	
841	K	72553210R	D+M Elektrický ohřívač vody 10 l	soubor	1,000	
831	K	72582083R	Demontáž baterie	soubor	2,000	
832	K	72582261R	Baterie umyvadlová	soubor	1,000	
833	K	72584132R	Baterie sprchová s roztečí 150 mm, vč. hadice a růžice	soubor	1,000	
834	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	1,000	
835	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	243,980	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: MR Kylešovská

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Bohemia Müller s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19.09.2022

IČ:

DIČ:

IČ: 25015265

DIČ: CZ25015265

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

1 860,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

1 860,00

DPH základní

21,00%

ze

1 860,00

390,60

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

2 250,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MR Kylešovská

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Bohemia Müller s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	1 860,00
N00 - MR Kylešovská	1 860,00
N01 - Vedlejší rozpočtové náklady	1 860,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 860,00

ROZPOČET

Stavba: MR Kylešovská

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Bohemia Müller s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu							1 860,00
--------------------	--	--	--	--	--	--	----------

N00 - MR Kylešovská

N01 - Vedlejší rozpočtové náklady

1	K	001	Zařízení staveniště	kpl	1,000		
2	K	002	Provozní vlivy	kpl	1,000		

