

**Dodatek č. 2 ke Kupní smlouvě
ze dne 18. 12. 2023**

(dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

(dále jen „**Dodatek č. 2**“)

I. Smluvní strany

Fakultní nemocnice Ostrava

se sídlem: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava

IČ: 00843989

DIČ: CZ00843989 (je plátcem DPH)

zastoupená: Ing. Marek Veselý, náměstek ředitele pro techniku a provoz

bankovní spojení: Česká národní banka; č. ú.: 66332761 /0710

zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990, č. j. OP-054-25.11.90

(dále jen „**Kupující**“)

a

Obchodní společnost KREDIT, spol. s.r.o.

se sídlem: Slavkov 284, 687 64 Horní Němčí

IČ: 18188494

DIČ: CZ18188494 (je plátcem DPH)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1828.

zastoupená: [REDACTED]

bankovní spojení: UniCredit Bank, č. ú.: 2102307133 /2700

(dále jen „**Prodávající**“)

(společně jako „**Smluvní strany**“)

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají výše uvedené Smluvní strany tento Dodatek č. 2 ke Kupní smlouvě uzavřené dne 18. 12. 2023, evidenční číslo Kupujícího 001/RS/23/010-K (dále jen „**Smlouva**“).

II. Předmět Dodatku

1. V důsledku okolností, které Kupující jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba dodatečného navýšení ceny. Z důvodu zachování, byť omezeného provozu MTZ, došlo po vzájemné dohodě Smluvních stran k úpravě provedení návozu a montáže regálů, která nemůže oproti předpokladu proběhnout najednou v jednom dni, ale musí být z uvedených důvodů rozložena do několika dní. Bližší specifikace je uvedena v Oznámení o změně akce č. 1, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „Příloha č. 1“).
2. V návaznosti na navýšení ceny se dosavadní ustanovení článku 2. Cena odstavce 2.2. Smlouvy ruší a nahrazuje textem:

2. Cena

2.2 V souladu se zněním zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, se Smluvní strany dohodly na celkové kupní ceně:

a. Nabídková cena bez DPH	187.640,00 Kč
b. DPH	39.440,40 Kč
c. Nabídková cena celkem vč. DPH	227.044,40 Kč

3. Přesná specifikace a navýšení ceny o 41.400,- Kč bez DPH je zaznamenáno v Oznámení o změně akce č. 1, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2.
4. Ostatní ujednání této Smlouvy zůstávají beze změny.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy, tímto Dodatkem č. 2 výslovně nedotčená, zůstávají i nadále v platnosti a účinnosti.
2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že se Smluvní strany na elektronické podobě neshodnou, bude Dodatek č. 2 vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá ze Smluvních stran.
3. Tento Dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dodatku č. 2 v registru smluv zajistí Kupující.
4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je Příloha č.1 – Oznámení o změně akce č. 1

6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Přílohy: Příloha č. 1 – Oznámení o změně akce č. 1

V Ostravě dne 29.4.2024


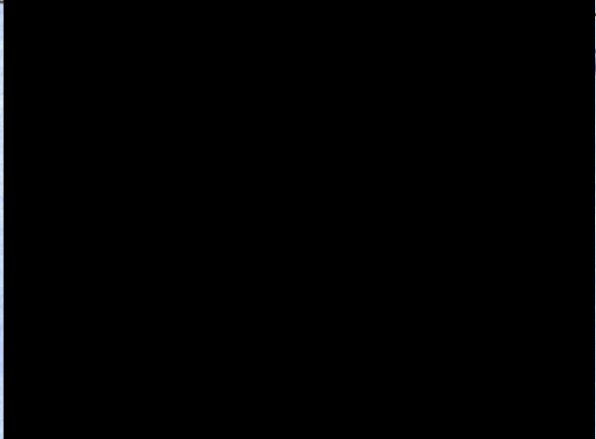



V Horním Němčí dne 22.4.2024

Ing. Marek Veselý
náměstek ředitele pro techniku a provoz

FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA
Ing. Marek Veselý
Náměstek ředitele pro techniku a provoz
17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava-Poruba

Oznámení o změnách akce č 1.

Identifikační údaje akce			
Název	Dodávka a montáž stacionárních paletových regálů R – 4 ks		
Objednatel:			
Název	Fakultní nemocnice Ostrava		
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba		
Zhotovitel			
Název	KREDIT, spol. s.r.o.		
Adresa	Slavkov 284, 687 64 Horní Němčí		
Oznámení vystavil:			
[REDAKCE]			
Navrhované změny akce			
Prodloužení doby realizace			
Zdůvodnění navrhovaných změn			
<p>Po dohodě s uživatelem a vzhledem k nutnosti zachování byť omezeného provozu MTZ (zásobování o klinik a oddělení FNO) došlo povzájemné domluvě k úpravě provedení návozu a montáže regálů.</p> <p>A to následovně :</p> <p>22.04.2024 08:00 - uvolnění prostor pro postavení 1 řady regálů; 23.04.2024 07:00 - zaplnění 1 řady postavených regálů; 23.04.2024 08:00 - uvolnění prostor pro postavení 2 řady regálů; 24.04.2024 07:00 - zaplnění 2 řady postavených regálů; 24.04.2024 08:00 - uvolnění prostor pro postavení 3 řady regálů; 25.04.2024 07:00 - zaplnění 3 řady postavených regálů; 25.04.2024 08:00 - uvolnění prostor pro postavení 4 řady regálů; 26.04.2024 07:00 - zaplnění 4 řady postavených regálů;</p> <p>400km x 13kč = 5.200kč 2 montéři 10h vč. jízdy – 20h x 430kč = 8.600kč Celkem 13.800kč / den x 3 dny = 41 400,- Kč bez DPH</p>			
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	

Kč 0,00	Kč 41 400,- Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	
	Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	Kč 41 400,-
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	Kč 50 094,-
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava 	
	Ing./Marek Veselý náměstek ředitele pro techniku a provoz
Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Stanovisko TDI:	Podpis TDI: 
Stanovisko projektanta stavby:	Podpis projektanta stavby: 
Seznam příložených dokladů:	
