

DODATEK č. 2

č.j.: KRPL-80425-22/ČJ-2023-1800VZ

SMLOUVY O DÍLO

č.j.: KRPL-80425-13/ČJ-2023-1800VZ

uzavřené**dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „NOZ“)****I. Smluvní strany****Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje**

zastoupené: Ing. David Pokorný, vedoucí oddělení správy nemovitého majetku

se sídlem: Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město

IČ: 72 05 05 01

DIČ: CZ 72 05 05 01

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: 84548881/0710

osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. David Pokorný, vedoucí oddělení správy nemovitého majetku

Ing. Miloslava Břicháčková, oddělení správy nemovitého majetku

dále jen "**objednatel**"

a

KVAPRO spol. s r.o.

zastoupený: Jana Kvapilová, jednatel

se sídlem: Nádražní 343, 463 65 Nové Město pod Smrkem

IČ: 254 79 946

DIČ: CZ25479946

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Frýdlant

číslo účtu: 986822309/0800

zapsaný: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 20079

dále jen "**zhotovitel**"**„KŘP Lbk – P 2.0 – Hejnice – rekonstrukce sociálního zařízení a kanalizace“****II. Předmět dodatku:**

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo z důvodu úpravy předmětu smlouvy, ceny za dílo a platebních podmínek vyvolané změnami vedenými ve změnovém listu č. 2, které vznikly během realizace díla.

III. K článku 2. Předmět smlouvy, odstavec 2.1. se doplňuje text ve znění

Předmět smlouvy se dodatkem č. 2 upravuje o změny provedené ve změnovém listu č. 2, ke kterým došlo během realizace díla.

Podrobný popis změn, jejich zdůvodnění i vliv na cenu díla je uveden ve změnovém listu č. 2, který tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.

IV. V článku 3. Cena za dílo, odstavci 3.1 se nahrazuje*text dle smlouvy o dílo*

Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná takto:

celková cena díla bez DPH 1 647 134,39 Kč

DPH 21%: 345 898,22 Kč

Celková cena díla včetně DPH 21% 1 993 032,61 Kč

slovy: jedenmiliondevětsetdevadesátřítisícčtyřicetdvakorunčeskýchšedesátjedenhaléf

textem:

Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná takto:	
celková cena díla bez DPH	1 401 434,22 Kč
DPH 21%:	294 301,19 Kč
Celková cena díla včetně DPH 21%	1 695 735,41 Kč

slovy: jeden milion šest set devadesát pět tisíc sedm set čtyřicet pět korun českých čtyřicet jeden haléř

V. K článku 5. Platební podmínky, pojištění, smluvní pokuty se doplňuje odstavec 5.5 ve znění

5.5.

Na práce, které jsou předmětem změn dle dodatku č. 2, bude vystavena samostatná faktura s datem vystavení totožným s datem účinnosti dodatku č. 2 nebo pozdějším.

VI. Závěrečná ustanovení dodatku

Ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech. Objednatel obdrží 2 stejnopisy, zhotovitel obdrží 1 stejnopis. V případě elektronického podpisu je smlouva vyhotovena pouze v elektronické podobě – souboru ve formátu pdf.

Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný uveřejněním v Registru smluv. Zveřejnění dodatku smlouvy v Registru smluv zajistí objednatel. Smluvní strany výslovně prohlašují, že pokud bude ze smlouvy plněno před jejím uveřejněním v Registru smluv, pak nepovažují toto plnění za bezdůvodné obohacení.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Příloha – změnový list č.2

V Liberci dne: 14 -05- 2024

objednatel:




ajetku

V Novém Městě pod Smrkem dne:

14 -05- 2024

zhotovitel:



Jana Kv

Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo

2

Identifikace akce

Název akce:	KŘP Lbk – P 2.0 – Hejnice – rekonstrukce sociálního zařízení a kanalizace
Číslo akce SMVS:	114v35200 3096
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel:	KVAPRO spol. s r.o., IČ 254 79 946
Projektant:	Ing. arch. Tomáš Myslivec, IČ 413 16 541

Změna č.2.01

Předmět změny č.2.01

zatravnění

Část díla dotčená změnovým listem

venkovní kanalizace, vsakování

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

v soupisu prací nejsou položky na zatravnění plochy v trase nové kanalizace, vsakování a po odstranění pařezů

Nové řešení :

bude provedeno zatravnění plochy v trase nové kanalizace, vsakování a po odstranění pařezů

Zdůvodnění změny :

Změna 2.01

Dle projektové dokumentace byla provedena nová kanalizační přípojka, vsakování a odstranění stromů včetně pařezů. Po provedení zemních prací je nutné tyto plochy zatravnit.

méněpráce (bez DPH)	0,00 Kč	vícepráce (bez DPH)	4 087,04 Kč
---------------------	---------	---------------------	-------------

Změna celkem za 2.01: vícepráce 4 087,04 Kč

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby

Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Ke změně nebyl zpracován žádný doplněk PD.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

zápis ve SD dne 9.2.2023

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Ne

Vliv na kvalitu: Ne

Vliv na cenu: Ano

Změna č.2.02

Předmět změny č.1.02

doplnění položek venkovní kanalizace


Část díla dotčená změnovým listem

venkovní kanalizace

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Dle projektové dokumentace má být provedena nová kanalizační přípojka napojená do kanalizačního řadu v Lužické ulici			
Nové řešení :			
Bude provedeno vše dle projektové dokumentace			
Zdůvodnění změny :			
Změna 2.02			
Do soupisu prací jsou doplněny položky pro zbudování nové kanalizační přípojky a pro vyspravení podkladu po překopech a krytu komunikace.			
méněpráce (bez DPH)	0,00 Kč	vícepráce (bez DPH)	3 732,20 Kč
Změna celkem za 2.02: vícepráce		3 732,20 Kč	
Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby			
Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :			
Ke změně nebyl zpracován žádný doplněk PD.			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:			
zápis ve SD dne 9.2.2023			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :			
Vliv na termín: Ne			
Vliv na kvalitu: Ne			
Vliv na cenu: Ano			
Změna č.2.03			
Předmět změny č.2.03			
odpočet neprováděných položek			
Část díla dotčená změnovým listem			
SO 01 - Vlastní objekt rekonstrukce stávající budovy			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :			
dle projektové dokumentace mají být provedeny práce související s rekonstrukcí sociálního zařízení			
Nové řešení :			
budou provedeny práce související s rekonstrukcí sociálního zařízení			
Zdůvodnění změny :			
Změna 2.03			
v soupisu prací jsou položky, které nesouvisí s rekonstrukcí sociálního zařízení. Původně byl soupis prací i na vybudování bezbariérové přístavby a při oddělování soupisu prací na rekonstrukci sociálních zařízení nebyly odstraněny všechny položky, které nejsou součástí realizované části stavby.			
méněpráce (bez DPH)	-253 519,40 Kč	vícepráce (bez DPH)	0,00 Kč
Změna celkem za 2.03: méněpráce		-253 519,40 Kč	
Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby			
Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :			
Ke změně nebyl zpracován žádný doplněk PD.			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:			
zápis z KD č.13			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :			
Vliv na termín: Ne			
Vliv na kvalitu: Ne			

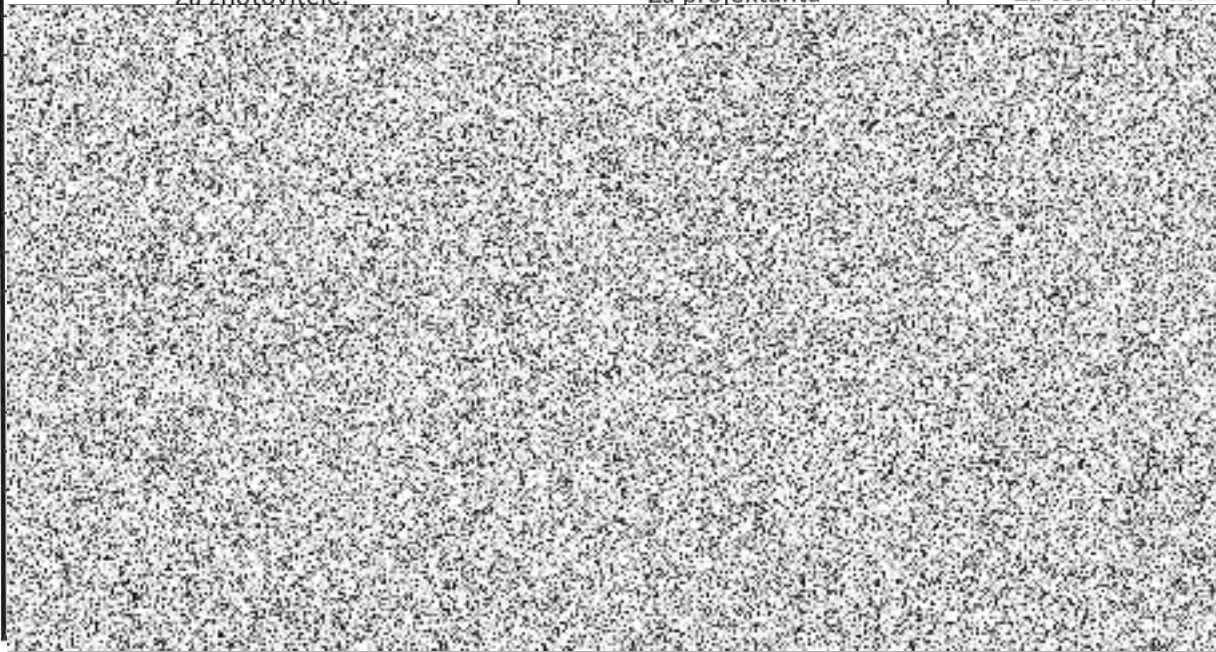Vliv na cenu: Ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	7 819,24 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	-253 519,40 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	-245 700,17 Kč	
DPH:	-	
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	-297 297,20 Kč	
Za zhotovitele:	Za projektanta	Za technický dozor stavebníka:
		alický

ZMĚNOVÝ LIST č. 2**PŘÍPOČTY****REKAPITULACE**

Stavba:

KŘP Lbk – P 2.0 – Hejnice – rekonstrukce sociálního zařízení a kanalizace

Objednatel:

ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

Zhotovitel:

KVAPRO spol. s r.o., IČ 254 79 946

Projektant:

Ing. arch. Tomáš Myslivec, IČ 413 16 541

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
Změna 2.1.	4 087,04				
Změna 2.2.	3 732,20				
CELKEM OBJEKT	7 819,24	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			7 819,24	0,00
CELKEM VRN				0,00

ODPOČTY**REKAPITULACE**

Stavba:

KŘP Lbk – P 2.0 – Hejnice – rekonstrukce sociálního zařízení a kanalizace

Objednatel:

ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

Zhotovitel:

KVAPRO spol. s r.o., IČ 254 79 946

Projektant:

Ing. arch. Tomáš Myslivec, IČ 413 16 541

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
Změna 2.3.	-253 519,40				
CELKEM OBJEKT	-253 519,40	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			-253 519,40	0,00
CELKEM VRN				0,00

ZMĚNOVÝ LIST č. 2

PŘÍPOČTY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba: KŘP Lbk – P 2.0 – Hejnice – rekonstrukce sociálního zařízení a kanalizace

Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

Zhotovitel: KVAPRO spol. s r.o., IČ 254 79 946

Projektant: Ing. arch. Tomáš Myslivec, IČ 413 16 541

Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7
Změna 1.1.							4 087,04
HSV		Práce a dodávky HSV				4 087,04	
1		Zemní práce				4 083,20	
URS	1 013	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	160,000	23,50	3 760,00
			10*16		160,000		
			Součet		160,000		
URS	1 014	00572410	osivo směs travní parková	kg	3,200	101,00	323,20
			160 * 0,02		3,200		
998		Přesun hmot				3,84	
URS	1 015	998231411	Přesun hmot pro sadovnické a krajinnářské úpravy ručně (bez užití mechanizace) dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,003	1 280,00	3,84
Změna 1.2.							3 732,20
HSV		Práce a dodávky HSV				3 732,20	
1		Zemní práce				261,80	
URS	1016	113106123	Rozebrání diažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	1,400	101,00	141,40
URS	1017	113107411	Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	1,400	45,40	63,56
URS	1018	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,098	304,00	29,79
URS	1019	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	0,098	164,00	16,07
URS	1020	171152501	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudružných	m2	1,400	7,84	10,98
5		Komunikace pozemní				2 316,58	
URS	1021	566901161	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhuštěním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	1,400	1 050,00	1 470,00
URS	1022	572340111	Vyspravení krytu komunikací po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhuštění tl. přes 30 do 50 mm	m2	1,400	592,00	828,80
URS	1023	573211109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	1,400	12,70	17,78
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 109,20	
URS	1024	919124121	Dilatační spáry vkládané v cementobetonovém krytu s odstraněním vložek, s vyčištěním a vyplněním spár asfaltovou záplavkou	m	4,700	236,00	1 109,20
998		Přesun hmot				44,62	
URS	1025	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živiným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	0,572	78,00	44,62
Celkem změnový list							7 819,24

ZMĚNOVÝ LIST č. 2
ODPOČTY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba: KŘP Lbk – P 2.0 – Hejnice – rekonstrukce sociálního zařízení a kanalizace

Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

Zhotovitel: KVAPRO spol. s r.o., IČ 254 79 946

Projektant: Ing. arch. Tomáš Myslivec, IČ 413 16 541

Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7
Změna 1.3.							-253 519,40
01 Bourací práce							-100 836,46
3 Svislé a kompletní konstrukce							-16 339,82
SoD	1	310231051	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém děrovanými cihlami plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm	m2	-0,630	2 600,00	-1 638,00
SoD	2	310239211	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou	m3	-1,342	7 090,00	-9 514,78
SoD	3	317944321	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12	t	-0,019	70 000,00	-1 330,00
SoD	4	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranně cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	-0,360	864,00	-311,04
SoD	5	349231811	Přizdívká z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání přes 80 do 150 mm	m2	-2,364	1 500,00	-3 546,00
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							-56 650,90
SoD	6	612325225	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2	kus	-2,000	2 160,00	-4 320,00
SoD	7	612325302	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	-2,904	924,00	-2 683,30
SoD	8	615142002	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým provizorním přichycením nosníků	m2	-0,720	180,00	-129,60
SoD	9	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	-15,560	250,00	-3 890,00
SoD	10	619996117	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek podlahy	m2	-82,960	550,00	-45 628,00
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							-5 990,06
SoD	12	962032240	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou, objemu do 1 m3	m3	-0,568	1 870,00	-1 062,16
SoD	15	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojitých, plochy do 4 m2	m2	-4,460	200,00	-892,00
SoD	16	968062455	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	-1,182	250,00	-295,50
SoD	17	968062456	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	-2,640	235,00	-620,40
SoD	18	973042251	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu betonovém kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm	kus	-4,000	780,00	-3 120,00
997 Přesun sutě							-12 811,67
SoD	21	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	-3,866	928,00	-3 587,87
SoD	22	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-3,866	360,00	-1 391,84
SoD	23	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlátek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-114,448	13,50	-1 545,05
SoD	24	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	-3,810	1 650,00	-6 286,91
998 Přesun hmot							-8 894,01
SoD	25	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	-5,358	1 660,00	-8 894,01
766 Konstrukce truhlářské							-150,00

SoD	33	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky přes 1 m	kus	-1,000	80,00	-80,00
SoD	34	766662812	Demontáž dveřních konstrukcí k opětovnému použití prahů dveří dvoukřídlových	kus	-1,000	70,00	-70,00
		02	Stavební práce	-113 357,95			
		HSV	Práce a dodávky HSV	-382,39			
		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-371,00			
SoD	11	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	-0,007	53 000,00	-371,00
		998	Přesun hmot	-11,39			
SoD	13	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	-0,007	1 660,00	-11,39
		PSV	Práce a dodávky PSV	-112 975,56			
		766	Konstrukce truhlářské	-5 297,00			
SoD	23	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	-1,000	830,00	-830,00
SoD	24	61160052	dveře jednokřídlové dřevěné bez povrchové úpravy plně 800x1970mm	kus	-1,000	3 200,00	-3 200,00
SoD	25	766660733	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního štítu s klikou	kus	-1,000	200,00	-200,00
SoD	26	54914620	kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK viz. 04	kus	-1,000	1 050,00	-1 050,00
SoD	28	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	-0,017	1 000,00	-17,00
		771	Podlahy z dlaždic	-3 201,22			
SoD	33	771151014	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm	m2	-5,288	595,00	-3 146,36
SoD	43	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	-0,080	690,00	-54,86
		776	Podlahy povlakové	-21 275,89			
SoD	44	776111112	Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového	m2	-9,812	50,00	-490,60
SoD	45	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	-9,812	10,00	-98,12
SoD	46	776121112	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah	m2	-9,812	60,00	-588,72
SoD	47	776141112	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	-9,812	390,00	-3 826,68
SoD	48	776221221	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem ze čtverců elektrostaticky vodivých	m2	-9,812	350,00	-3 434,20
SoD	49	28411025	PVC vinyl homogenní zátěžová antistatické tl 2,00mm, R <1000MQ, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl S1	m2	-10,795	890,00	-9 607,55
SoD	50	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	-10,300	160,00	-1 648,00
SoD	51	28411010	lišta soklová PVC 20x100mm	m	-10,506	145,00	-1 523,37
SoD	54	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	-0,105	560,00	-58,65
		784	Dokončovací práce - malby a tapety	-83 201,45			
SoD	63	784111011	Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-535,833	23,00	-12 324,16
SoD	64	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-529,708	40,00	-21 188,32
SoD	65	784181111	Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-421,093	33,00	-13 896,07
SoD	66	784211111	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-421,093	85,00	-35 792,91
		04	Zdravotechnika	-6 750,00			
		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	-4 750,00			
		D1	ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY	-2 750,00			
SoD	10	Pol142	Dřez	ks	-1,000	2 750,00	-2 750,00
		D8	OSTATNÍ	-2 000,00			
SoD	47	Pol178	Technický dozor na stavbě	hod	-2,000	1 000,00	-2 000,00
		D8	OSTATNÍ	-2 000,00			
SoD	63	Pol178	Technický dozor na stavbě	hod	-2,000	1 000,00	-2 000,00

		05	Venkovní kanalizace					-20 000,00
		D1	VENKOVNÍ KANALIZACE					-20 000,00
		D2	POTRUBÍ					-18 000,00
SoD	6	Pol99	Liniové odvodnění 135x175 - 1000 rošt- nerez,ocel	m	-9,000	2 000,00		-18 000,00
		D3	OSTATNÍ					-2 000,00
SoD	13	Pol106	Technický dozor na stavbě	hod	-2,000	1 000,00		-2 000,00
		06	Vytápění					-9 575,00
		D1	ROZVOD POTRUBÍ					-7 950,00
SoD	1	Pol107	Potrubí Cu z trubek polotvrdých včetně tvarovek , fitinek a objímek 15x1	m	-25,000	263,00		-6 575,00
SoD	2	Pol109	Tlakové zkoušky potrubí do DN 50	m	-25,000	55,00		-1 375,00
		D5	IZOLACE					-1 625,00
SoD	7	Pol116	Návrhová izolace z Pe 15/13	m	-25,000	65,00		-1 625,00
		07	Vzduchotechnika					-3 000,00
		D1	VZDUCHOTECHNIKA					-3 000,00
		D2	ZAŘÍZENÍ Č.1					-1 800,00
SoD	4	Pol127	Dveřní mřížka 480x82	ks	-3,000	600,00		-1 800,00
		D3	OSTATNÍ					-1 200,00
SoD	9	Pol132	Technický dozor na stavbě	hod	-2,000	600,00		-1 200,00
Celkem změnový list								-253 519,40
