

NÁVRH NA ZMĚNU STAVBY

Stavba: Výměna pohyblivých schodů, revitalizace stanice a vybudování bezbariérového přístupu ve stanici Jiřího z Poděbrad

Číslo stavby:

Pořadové číslo změnového listu:

16

Změna:

R

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

OBJEKT:	ET - STANICE ; BEZBARIÉR + TT	Číslo objektu:	SO 05	Název:	informační systém
Popis změny:					
<p>Popisované změny zahrnují finální podrobně technické a grafické řešení informačního systému provedeního v souladu s dopracováním realizací dokumentace stavby a požadavků na vzhled informačního systému Magistrátu hlavního města Prahy (Příloha č. 8). Změny vznikly z důvodu upřesnění technického řešení, použité grafiky a konečného rozsahu prací. V návaznosti na aktuální stav zastřešených konstrukcí a prvků byla doplněna repase či obnova dalších komponent systému, a to zejména na základě místního řešení ze dne 3.2.2023 ze strany zástupce objednatelů objednatka 100170, v jehož rámci byl také proveden typ svítidla pro repasované světelné moduly v UL a UV - Zápis z místního řešení (Příloha č. 9). Následně vydal dne 19.9.2023 Objednatel pokyn k aktualizaci výkazu výměr na základě požadavků jednotky 100170 (Příloha č. 6).</p>					
Zdůvodnění změny:					
<p>Tato změna reaguje na aktuální požadavky objednatelů na informační systém provedeního v rámci stanice Jiřího z Poděbrad viz Příloha č. 3 a Příloha č. 6. Rozsahový výkaz výměr pro tyto změny (Příloha č. 1) byl sestaven dle podmínek SÚD, kdy byly použity položky současně smluvního rozpočtu a pro nové položky pak nejvýhodnější smluvní nabídky (nabídky v Příloze č. 4a, 4b, 4c) - viz pokračování nabídek Příloha č. 5.</p>					
<p>MASTROPROJEKT Praha a.s. Hlavní inženýr projektu</p>					
<p>Souhlasím s použitými výměrami, materiály i výše uvedenými zdůvodněními</p>					

Stavba: Výměna pobytových technologií, revitalizace stanice a vybudování bezbariérového přístupu ke stánku č. 10 v Požárcích	Číslo projektu: 4400021	SO 07/01 ; SO 07/02 ; 01/03 ; 07/06	Změnový list č. 16
---	----------------------------	---	-----------------------

POSOZENÍ NAVRHU ZMĚNY

DŮPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace: **ano**

Do časového plánu stavby: **ne**

Do ceny stavby: **zvýšení o 1.566.948,95 Kč**

NAVŘÍVATEL ZMĚNY:

Střabag, a.s. [redacted] technický vedoucí projektu	Podp.	AZD Praha s.r.o. [redacted] vedoucí úřadní stavba	[redacted]
Zhotovitel: [redacted] technický vedoucí projektu	SO Podp.	SOCH TECHNICKÝCH: Příkazník: [redacted] INFRAM a.s. technický dozor objednatel	
Zhotovitel: [redacted] ekonomický vedoucí projektu	SO Podp.	SOCH FINANČNÍCH: Příkazník: [redacted] INFRAM a.s. technický dozor objednatel	
Zhotovitel: [redacted] technický vedoucí projektu	SO Podp.		

CELKOVÝ NAVR H ZHOTOVITELE PŘEDKLÁDÁ:

[redacted] Střabag, a.s. ekonomický vedoucí projektu	[redacted]
--	------------

CELKOVÉ DOPORUČENÍ: Doporučuji ke schválení

Za Příkazníka: [redacted] INFRAM a.s. technický dozor objednatel	Za Objednatel: [redacted] Dopravní podnik vedoucí odběra	[redacted] [redacted]
Za Objednatel: [redacted] Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost projektový manažer	Za Objednatel: [redacted] Dopravní podnik technický ved.	

Seznam příloh k návrhu na změnu stavby:

Číslo přílohy	Název	Počet listů
Příloha č. 1	Rozdílový výkaz výměr SO 05	1x A4
Příloha č. 2	Zápis z kontrolního č. 48 ze dne 7.9.2023	5x A4
Příloha č. 3	Záznam z místního sezení ze dne 3.9.2023	2x A4
Příloha č. 4a	Nabídky subdodavatele Ravyko	1x A4
Příloha č. 4b	Nabídky subdodavatele Moltas	1x A4
Příloha č. 4c	Nabídky subdodavatele BTV	1x A4
Příloha č. 5	Porovnání subdodavatelských nabídek	1x A4
Příloha č. 6	Úprava výkazu výměr na základě pokrytí jednotky 10B710	4x A4

Celkem počet stran návrhu změny stavby	16x A4
--	--------

ZÁPIS z KD č. 48

akce Výměna pohyblivých schodů 613-1-119 až 121, revitalizace stanice
Jiřího z Poděbrad včetně bezbariérového zpřístupnění
konaného dne: 7.9.2023

Přítomní: dle prezentační listiny v příloze

Předání a převzetí staveniště

Staveniště pro akci „Výměna pohyblivých schodů 613-1-119 až 121, revitalizace stanice Jiřího z Poděbrad včetně bezbariérového zpřístupnění“ bylo zhotovitelem převzato dne 1.9.2021, se zahájením prací téhož dne.

Provádění prací, provedené práce od minulého KD**provedené práce k 6.9.2023 do 18 hod:**

zabetonováno BS 10 Š2.1
mříž armatury BS5 v UN
mříž bednění BS 11 v Š2.1
mříž bednění BS 19 (strop) v profilu A
betonáž BS 11 v Š2.1 a BS 19 strop v profilu A

plán prací na 37 T (11.9. - 17.9.2023)

mříž armatury BS 22 v Š1
mříž bednění a betonáž BS3 UPCH v profilu B
mříž armatury DNO3 kříž kolem Š2.1
mříž bednění BS 18 strop v profilu A
mříž bednění BS 5 v UN
betonáž DNO3 kříž kolem Š2.1

plán prací na 38 T (18.9. - 24.9.2023)

mříž armatury Dno 3 kolem Š2.1
mříž bednění a betonáž BS 22 v Š1
betonáž BS 5 v UN
mříž bednění BS 3 strop v UN
mříž armatury BS 23 v Š1

Pozn.: mříž rozvodů: oprava povrchů pro izolaci

Harmonogram stavby

Probíhají izolační práce v chodbě UPCH a zároveň práce v šachtě Š1 a v šachtách Š2.1 a Š2.2 - izolační práce a montáž armatury.

Podle vyhodnocení aktuálního harmonogramu podle dodatku č.1 vyplývá, že zpoždění prací k dnešnímu dni na bezbariérovém zpřístupnění do stanice zůstává cca 30 dní - 1 týž.

INSET předložil závěrečnou zprávu o Zhodnocení provedených ražeb a provádění trhacích prací vůči zadání. Objednatel zprávu bere na vědomí. Zhotovitel ke zprávě zpracoval vyjádření, zajišťuje stanovisko Metroprojektu a následně vyzve k vyjádření (se souhlasem objednatele) pan: [redacted] novisko Metroprojektu vydáno, čeká se na vydání

stanov [redacted] Dosavadní závěr konstatuje zpoždění na razbách v délce cca 35 dní. Následně Zhotovitel předloží v této věci změnový list.

- SO 01/01 Vestibul a SO 01/02 Escalátorový tunel – stavební práce v souladu s HMG
- SO 01/03 Stanice – stavební práce v souladu s HMG, část podhledů v předstihu oproti HMG
- UN 1 TK – podhledy v souběhu s montáží krycí osvětlení v souladu s HMG, podhledy v souladu s HMG
- UN 2 TK – mlž obkladů a podhledů, podhledy – v souladu s HMG
- SO D1/04 Hygiena – montáž ZTI, stavební úpravy místností – dle HMG
- SO 01/05 FGT – stavební úpravy v rozvodnách ÚPN, VZT nové prostupy v souladu s HMG
- SO 01/08 Komora dodatečného vstupu – dle HMG
- SO 03 Osvětlení – UN, ÚPN – montáže nových rozvodů dle HMG
- SO 04 ZTI – práce probíhají dle HMG
- SO 08 Vytápění – práce dle HMG
- PS 82 Dálkové ovládání a signalizace OSM – práce na rozvodech včetně rozváděčů dle HMG
- PS 85 VZT – dimtz a mlž vzduchotechnických rozvodů v UN, ÚPN, ÚV, ÚPV v souladu s HMG
- PS 92 Zabezpečovací zařízení a PS 93 Slaboproudé zařízení – mlž nových zařízení dle HMG
- PS 94-1 Strojní zařízení – zahájení navoru dlouhých eskalátorů – v ET osazeny všechny tři – zpoždění oprávi HMG cca 10-14 dní z důvodu montáže nových obkladů v ET, bez dopadu na konečného termínu
- PS 96-3 ASDR-T – práce v souladu s HMG

Finanční plnění zhotovitele

Fakturace za měsíc srpen 2023 - byla předložena zhotovitelem ke kontrole DP a TDI a odsouhlasena.

Úkoly z předšlých jednání KD

- 1.1. TDI upozorňuje na nutnost zachování čistoty komunikace při výjezdu ze ZS.
 - úkol kvality, čištění komunikace podle aktuální situace.
- 19.2. Zhotovitel zaslal na DP oficiální žádost o zahájení jednání ve věci úpravy ceny díla v závislosti na probíhajícím válečném konfliktu na Ukrajině a konečných dopadech pandemie COVID-19. Probíhá posouzení oprávněnosti požadavku na DP.

Dne 30.9.2022 zhotovitel vyzván k doplnění žádosti. – zhotovitel pracuje na odpovědi a doplnění informací pro objednatele. Výpočet návrhu změny ceny a textová část bude předložena do příštího KD. – reakce zhotovitele byla odeslána 7.12.2022 – zástupce investora doporučuje kontaktovat adresáta za DPP Ing. Váňová.

Provedeno, probíhá posouzení na DPP. Investor požádal TDI o kontrolu předloženého výpočtu k navýšení ceny od zhotovitele. TDI zpracovává odpověď. Bude předáno na podatelnu DPP případně zastáno do konce příštího týdne. Odpověď zaslána dne 9.6.2023. Zhotovitel předložil nové zpracování výpočtu inflačního vlivu podle požadavků TDI, který jej předá objednateli ke stanovení dalšího postupu v této věci. Předáno objednateli, trvá
- 28.1. Zhotovitel žádá projektanta o aktualizaci termínu zpracování RDS.

Dokumentace pro Sadové úpravy, Definitivní povrchy a Veřejné osvětlení nebude prozatím vydána, až podle závěrů jednání na MČ Praha 3 v souvislosti s připravovanou revitalizací náměstí Jiřího z Poděbrad. Podle informace z MČ Praha 3 započnou práce na obnově náměstí v listopadu letošního roku. 4.9.2023 má rada P-3 schválit investiční záměr Rekonstrukce náměstí Jiřího z Poděbrad. Investiční záměr schválen – koncem září 2023 proběhne jednání s vybraným dodavatelem ohledně repasportizace parku Jiřího z Poděbrad.
- 31.1. Zástupce investora požaduje po TDI svolat jednání ohledně koordinace postupu prací implementace informačních panelů nad oděvovými čarou (IFOC), kterou

zpracovává

provádí pro DP firma COLSYS s.r.o. v rámci jiné investiční akce v dalších stanicích metra. Probíhá zpracování projektové dokumentace, zadávkem úroveň bude svoláno místní setkání za účasti zainteresovaných osob. Dokumentace bude vydána do cca 14 dní - konec března. Zástupce investora a TDI požádají vydání dokumentace

pro IPOC. Dokumentace vyřazena k připomínkám, pro zhotovitele uvádím kontakt na projektového manažera DP pro tuto akci

Koordinace s firmou COLSYS ohledně nástupu na vlastní práce. TDI bude i nadále sledovat - bod trvá. Podle vyjádření zhotovitele chybí projektová dokumentace - TDI prověřil. PD byla předána projektovému manažerovi DP pro tuto akci - Zástupce investora žádá TDI o důslednou koordinaci prací. Práce subdodavky proběhly, čeká se na zaklopení podhledů.

- 32.1. Zástupce investora zdůrazňuje zákaz zhotovitel poskytovat vytežené materiály (kazety, ucelené formáty kamenných obkladů, dlažby, butony s držáky) ze stanice Jiřího z Reděbrat dalším osobám bez souhlasu DPP. Zástupce investora žádá zhotovitele, o vyspecifikování vytežených materiálů - (kamenné obklady, butony atd.) - proběhlo. Zástupce investora požaduje doplnit specifikaci vytežených materiálů - upřesnit rozměry, počty kusů a provést fotoobjektivní vybraných kusů. Seznam předán zástupci objednatel. Zákaz investora trvá i nadále.
- 32.2. Zhotovitel požaduje prověřit na MTP stav výkazu výměr hledných proudů případně nesrovnalosti zpracuje společně se zhotovitelem do revize VV. Podklady předány DP k posouzení a určení dalšího postupu. Předáno na p. Jarolínka - čeká se na vyjádření. Přípomínky DP k dokumentaci zaslány na MTP a zhotovitele. MTP zpracovává aktualizaci PD k posouzení dalšího postupu. PD vydána - DP vznesl další požadavky ohledně úpravy rozsahu PD - zhotovitel a TDI vznesl dotaz na zástupce investora ohledně dalšího postupu. Rozsah bude ještě upřesněn ve smyslu nové TZ a doplňkového výkresy pro monolit výstupu, zhotovitel následně zpracuje ocenění. Zhotovitel požádal projektanta o urgentní součinnost dodavatele PD i prací - firmy JEKJ. - Potvrzena správnost výkazu výměr projektanta - chybí cenová nabídka od firmy JEKJ pro zhotovitele - nová urgence prostřednictvím projektanta. PD vydána, proběhla schůzka zástupce firmy JEKJ se zhotovitelem. Na základě této schůzky proběhne ocenění nové části dodávky - specializované měřicí pracoviště. Toto ocenění bude následně předáno ke stanovisku objednatel. Ocenění bylo předáno objednateli dne 15.8.2023. Následně zasláno na dotčené služby DP (800430) k vyjádření.
- 32.3. Zhotovitel informuje, že zpracovává další ZL - DřQ na dočasné zrušení a následně obnovení přechodu v ulici Slavětova. Bylo předloženo v pracovní verzi. Na základě připomínek DP bude zhotovitelem opraveno a opětovně předloženo. Dnes na KD bylo předloženo zástupci investora ke kontrole. Zástupce investora vrátil ZL k formální úpravě zhotoviteli, tento jej předloží opětovně do příštího KD. Zhotovitel předložil změnové listy 11, 12, 13, 14. Změnové listy odsouhlaseny a podepsány. Zhotovitel informuje o dalších připravovaných změnových listech - liakové ucpávky a změna postupu rezeb.
- 40.1. Zástupce investora předává kontakt na [redacted] žádá TDI o svolání schůzky ohledně prací firmy T-Mobile ve stanici Jiřího z Reděbrat v rámci vlastní zakázky. Schůzka proběhla, řeší zhotovitel přímo s firmou COLSYS. - nadále sledováno. - trvá
- 45.1. Zástupce investora požaduje navýšit pracovní kapacity na SO, PS s ohledem na otevření stanice pro cestující na přelomu října / listopadu 2023! Úkol trvá
- 46.1. Do 8.9. 2023 rozdělí zhotovitel ve spolupráci s projektantem dokumentaci skutečného provedení na část pro zkušební provoz a na část bezbariérový Metropojekt připravuje návrh rozdělení PD dle potřeby - návrh rozdělení předán

leno týden. Projektant požaduje po zhotoviteli podklady, aby mohl vydat DSPS, nejpozději do 21.9.2023.

Dne 4.9.2023 proběhne schůzka na M+M+P předně dokladů a podmínek uvedení stanice Jiřího z Poděbrad do provozu začátkem listopadu 2023. Schůzka se uskutečnila, byly stanoveny další postupy k uvedení stanice Jiřího z Poděbrad do zkušebního provozu.

Nové úkoly:

48.1. Objednatel urguje u zhotovitele ZL na informační systém.

48.2. Objednatel požaduje po zhotoviteli naplnit hrubé prací a předpoklad finančního plnění zakázky v tomto roce.

Ostatní informace

Koordinátor BOZP a PO

Koordinátor BOZP nemá podstatné připomínky k provádění stavebních prací a montážních prací na staveništi. Zjištěné drobné nedostatky jsou průběžně odstraňovány.

Zástupce investora a IOI zároveň upozorňují zhotovitele na zákaz kouření v prostorách rekonstruované stanice Jiřího z Poděbrad – trvá

Příští KD č. 49B proběhne ve středu 20.9.2023 od 13:00 hod.

Příští KD č. 49 proběhne ve čtvrtek 21.9.2023 od 13:00 hod.

Zapsal:



Přílohy:

1. Prezenční listina

Stavba:

**Výměna pohyblivých schodů 013-1-119 až 121,
revitalizace stanice Jiřího z Poděbrad, včetně bezbariérového zpřístupnění**


kontrolní deník:

48

Datum:

07.09.2023

Prezentní listina

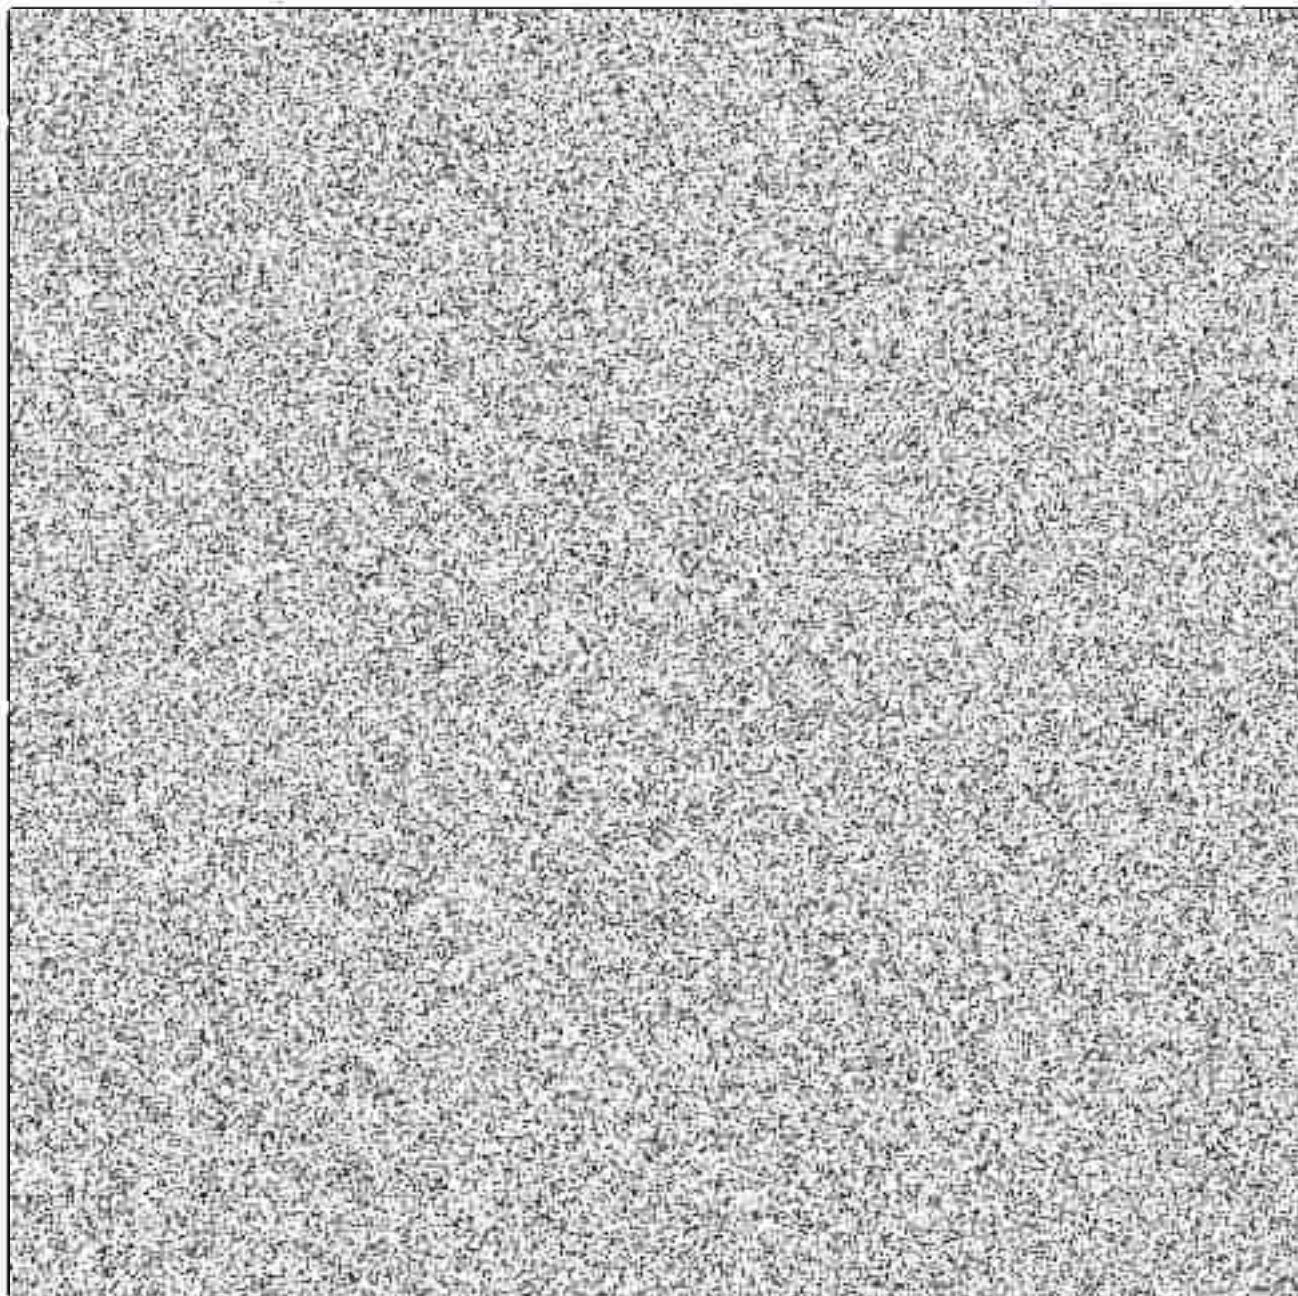




Wierit: STRABAG a.s. + A20 a.s.
Projekt: B125 - Rekonstrukce stanice Mětro z Počebčic - RbS

03.02.2023

Věc: Záznam z místního setření - Informační systém - použití svítidel

Účastník: 
Místo: 
Svolavatel: 

Účastníkům byl předveden vzorek rekonstruovaného informačního systému s:
1/ novým svítidlem

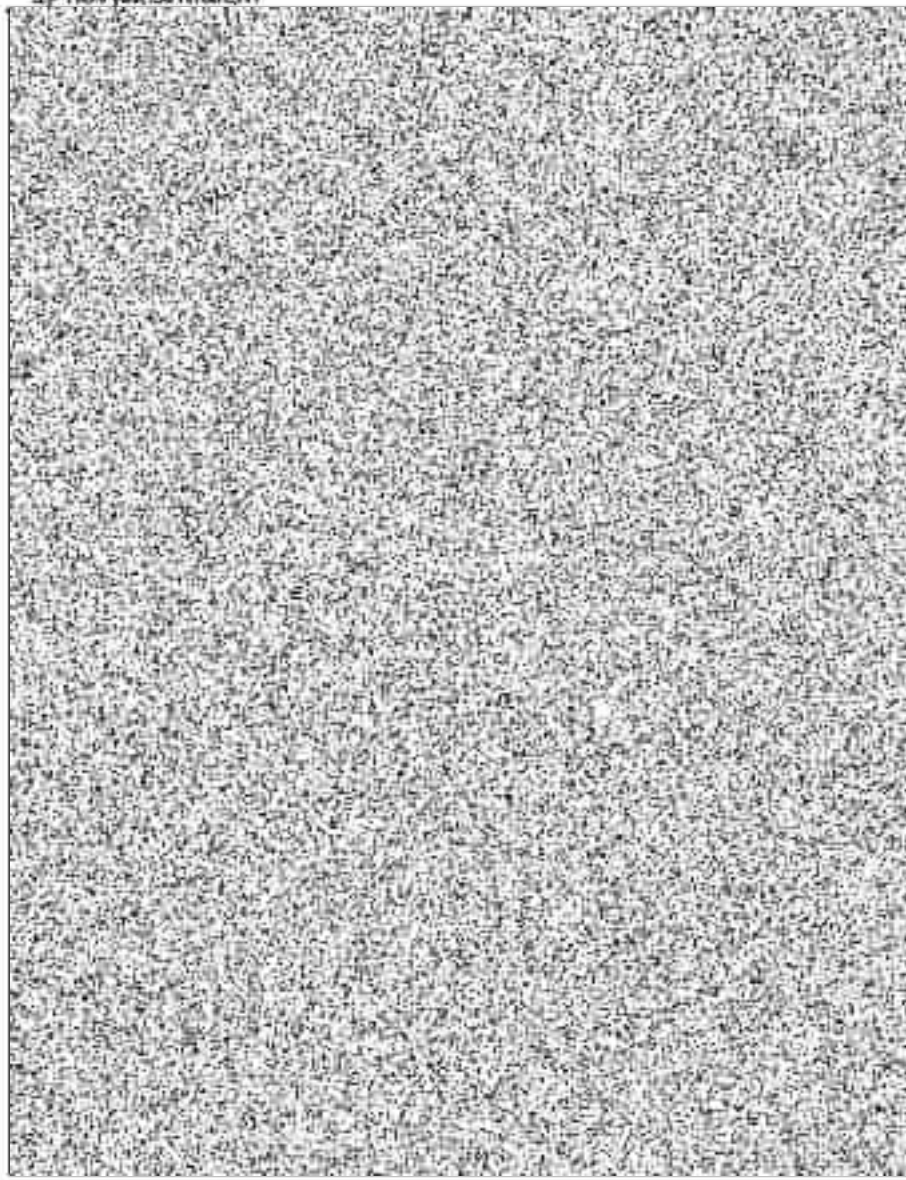

Veškeré k se požadavky na úpravách aštidia v pracovní den, po obědě, je zápis považován za pšsouhlasný a závazný.
Terminy dalšíh jednání, termíny úkčích pění a tčdní uvedené v zápisu jsou závazné a nšstají oškladný zámek při změně času zápis, tečdně
spřobá, opšepaná zapisovatelem, bude všem účastníkům předána na další jednání.


METROPOLNÍ PROJEKT Praha a.s.
AOL Argentináká 36, 120 00 Praha 7
Tel.: +420 296 154 226; Fax: +420 296 325 993
E-mail: info@metropolitni.cz URL: www.metropolitni.cz

Klient: STRABAG a.s. + A2D a.s.

Projekt: 6125 - Rekonstrukce stanice Jiřího z Poděbrad - RDS



2) s. repasovanýe starym svidlen

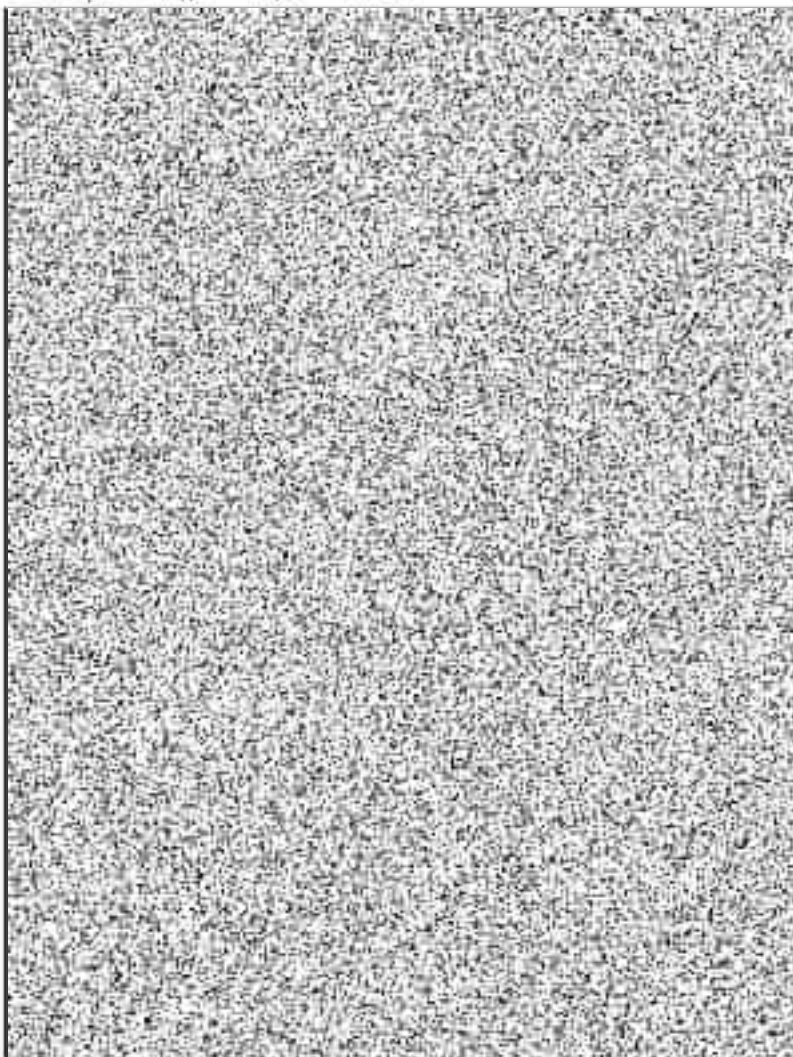

Účastníci se shodli, že použití nového svítidla do „váškovky“ stávajícího informačního systému je z hlediska designu neakceptovatelné a shodli se na použití repasovaného starého osvětlení 18.

Světelný zdroj LED zůstává dle zadání. Specifikace viz přiložený informační list výrobku.

Zapsáno



Neplatná a nepožadavky na úpravu 18. 6125 (v pracovní době, po obědi) je zápis pověřen za odsouhlasení a závazky. Účastníci dle 18. 6125, termíny dílčích plnění a úkolů uváděných v zápisu jsou závazné a nejsou editovatelné. Účastníci při změně termínů, zápisů, uspořádání podoba, podání a/nebo obsahu, bude všem účastníkům předána na jejich účet.

METACOPACIT Praha a.s.
AČB, Argeatinská 26, 170 00 Praha 7
Tel: +420 399 154 228, Fax: +420 296 326 153

E-mail: info@metropojeka.cz URL: www.metropojeka.cz

Jan Panuska

Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:
Přílohy:




Důležitost: Vysoká

Dobrý den,


v rámci Vámi předloženého vyčíslení IS byla ze strany interního zákazníka 100720 provedena kontrola úplnosti požadovaných příloh.

V příloze zprávy vám posílám v otevřeném formátu konečný VV (po úpravě projektanta), který požádám aktualizovat a zpětně předložit k vyjádření.

Děkuji za spolupráci




posílám upravený VV na Info systém dle komunikace




Ahej,
Změny jsou vyznačeny červeně (odstranění) a modře (opravy).



Subject: FW: Změna grafiky Jirka z Početbrad

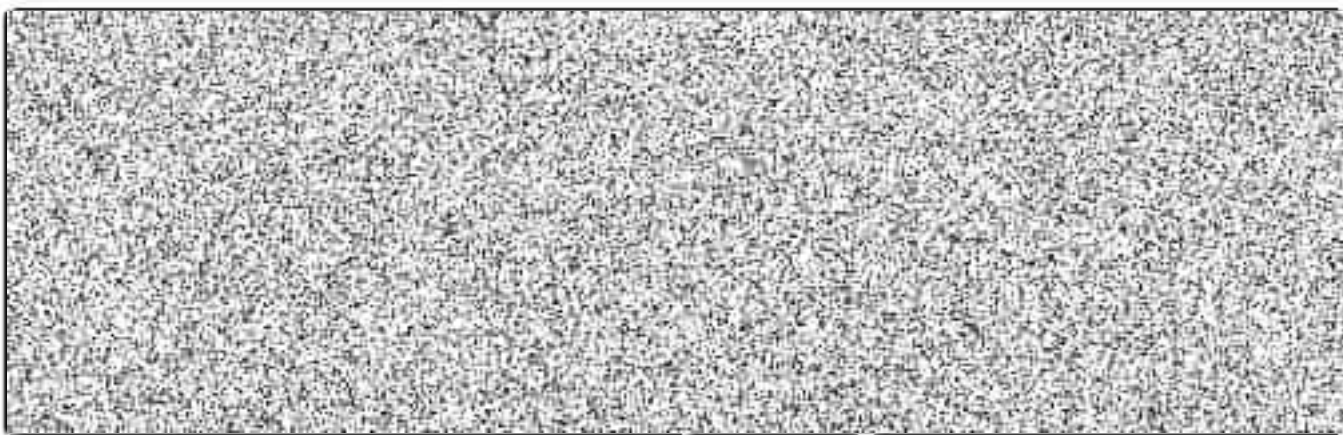


[redacted] s projektantem jsem posel [redacted] detail ještě drobné spravy. Předpokládám, že ti WP předá.



pokud si s projektantem dovedete/zkontrolujete vztah určité spulhas.
VV připravila [redacted] kam bych dotazy směřoval.
V případě potřeby se mi ozvi



projektový manažer
Dopravní podnik hl. m. Prahy




subject: zse: změna hranic území z Povodí



bohužel nejsem schopn z VV pochopit zda je tam zse. Podle mě jsou tam věci i navíc. Pokusím se domluvit z MP,
můžete to prosit.





Prosím, jak jsme daleko obědne zmešny prahky ve stanicí Jirihov z Poděbrad? MZ MP zpracoval nejakou změnu.

Děkují za informaci



Upozornění

Tento e-mail je určen výhradně adresátovi (adresátům) a může obsahovat důvěrné informace. Neoprávněná distribuce, úprava nebo zveřejnění jeho obsahu je nezákonná. Pokud jste tento e-mail obdrželi omylem, neproděně o tom, prosím, informujte adresatele zpátečním e-mailem. Poté, prosím, odstraněte tento e-mail včetně všech jeho příloh ze svého systému a nekopírujte ani nezveřejňujte jeho obsah žádné osobě.

Tento e-mail není nabídkou na uzavření smlouvy, včetně dodatků, nebo přijetím nabídky, není-li v něm dále uvedeno jinak. Je-li tento mail součástí obchodního jednání, jakékoli smlouvy uzavírané DP a.s., musí být sjednány v písemné listinné podobě, dosazením úplné shody a obsahu smlouvy a všech jejích náležitostí. Uzavření smlouvy, včetně dodatků, v jiné než písemné listinné podobě není platné. Jakékoli písemné potvrzení určitého ustáhlého jednání nevyhraňuje sjednání smlouvy v písemné listinné podobě. DP a.s. si vyhrazuje právo kdykoli ukončit jednání a uzavření smlouvy, a to z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu. Ukončení vyjednávání o smlouvě nemůže být považováno za protiprávní jednání umožňující vznik jakýchkoli závazků nebo nároků vůči DP a.s.

Obsah výše uvedené zprávy má pouze informační a nezávazný charakter. Společnost METAPROJEKT Praha a.s., limitová vyřaditelná společnost, a to též obědnu obsah výše uvedené zprávy, že tato zpráva není závažným právním jednáním vztahující se k vaniků, zániků či změně jakéhokoli smluvního vztahu se společností METAPROJEKT Praha a.s., ani její povinnosti platit nabídky a její služby. Obsahu této zprávy může rovněž přispívat zřetelnost jakéhokoli právního jednání pro společnost MIBEROPROJEKT Praha a.s., za kteréhož bylo možné uzavřít na právní jednání ve smyslu ustanovení § 172b a § 172g zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění. Předchází této neplatí jen v případech jednání předstedy a následně předstedy občanské osoby za podmínky, že výslovně v obsahu zprávy uvádí, že se jedná o závazující charakter obsahu této zprávy. Pro vznik, zánik či zánik smluvního vztahu nebo úplné změny či odstoupení nabídky je obvyklým písemná listinná podobě potřebná a platná za účasti společnosti METAPROJEKT Praha a.s. Disclaimers ID: 18 05 04 2014

Upozornění

Tento e-mail je určen výhradně adresátovi (adresátům) a může obsahovat důvěrné informace. Neoprávněná distribuce, úprava nebo zveřejnění jeho obsahu je nezákonná. Pokud jste tento e-mail obdrželi omylem, neproděně o tom, prosím, informujte adresatele zpátečním e-mailem. Poté, prosím, odstraněte tento e-mail včetně všech jeho příloh ze svého systému a nekopírujte ani nezveřejňujte jeho obsah žádné osobě.

Tento e-mail není nabídkou na uzavření smlouvy, včetně dodatků, nebo přijetím nabídky, není-li v něm dále uvedeno jinak. Je-li tento mail součástí obchodního jednání, jakékoli smlouvy uzavírané DP a.s., musí být sjednány v písemné listinné podobě, dosazením úplné shody a obsahu smlouvy a všech jejích náležitostí. Uzavření smlouvy, včetně dodatků, v jiné než písemné listinné podobě není platné. Jakékoli písemné potvrzení určitého ustáhlého jednání nevyhraňuje sjednání smlouvy v písemné listinné podobě. DP a.s. si vyhrazuje právo kdykoli ukončit jednání a uzavření smlouvy, a to z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu. Ukončení vyjednávání o smlouvě nemůže být považováno za protiprávní jednání umožňující vznik jakýchkoli závazků nebo nároků vůči DP a.s.
