

DODATEK Č. 2 PROVÁDĚCÍ SMLOUVY

č. smlouvy **Objednatele**: 01PU-005221

č. smlouvy **Zhotovitele**: 210050

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 125 0002

název veřejné zakázky: PD D2 Oprava mostů D2-012, D2-030..1, D2-033

uzavřené na základě Rámcové dohody „Rámcová dohoda na projektové práce pro provoz a údržbu pozemních komunikací“, č. 01PU-003737

(dále jen „**Smlouva**“)

mezi

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

státní podnik

bankovní spojení:

datová schránka:

zastoupeno:

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Morava – RD PP pro provoz a údržbu PK (2019)

s vedoucím společníkem (pro konkrétní Dílčí veřejnou zakázku) společnosti **Stráský, Hustý a partneři s.r.o.**

se sídlem:

Bohunická 133/50, 61900 Brno

IČO:

18827527

DIČ:

CZ18827527

zápis v obchodním rejstříku:

Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 1558

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

se společníkem **DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**

se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

zastoupeným na základě zmocnění vedoucím společníkem (pro konkrétní Dílčí veřejnou zakázku) **Stráský, Hustý a partneři s.r.o.**

bankovní spojení:

IČO: 42767377, DIČ: CZ42767377

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

společník společnosti s názvem „**Morava – RD PP pro provoz a údržbu PK (2019)**“

se společníkem společnosti **SHB, akciová společnost**

se sídlem Masná 1493/8, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

zastoupeným na základě zmocnění vedoucím společníkem (pro konkrétní Dílčí veřejnou zakázku) **Stráský, Hustý a partneři s.r.o.**

bankovní spojení:

IČO: 25324365, DIČ: CZ25324365

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4477
společník společnosti s názvem „**Morava – RD PP pro provoz a údržbu PK (2019)**“
se společníkem společnosti **PK OSSENDORF s.r.o.**

se sídlem Tomešova 503/1, 602 00 Brno-Staré Brno

zastoupeným na základě zmocnění vedoucím společníkem (pro konkrétní Dílčí veřejnou zakázku) Stráský, Hustý a partneři s.r.o.

bankovní spojení:

IČO: 25564901, DIČ: CZ25564901

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 33954
společník společnosti s názvem „**Morava – RD PP pro provoz a údržbu PK (2019)**“

se společníkem společnosti **VIAPONT, s.r.o.**

se sídlem Vodní 258/13, 602 00 Brno-Staré Brno

zastoupeným na základě zmocnění vedoucím společníkem (pro konkrétní Dílčí veřejnou zakázku) Stráský, Hustý a partneři s.r.o.

bankovní spojení:

IČO: 46995447, DIČ: CZ46995447

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8917
společník společnosti s názvem „**Morava – RD PP pro provoz a údržbu PK (2019)**“

se společníkem společnosti **G-Consult, spol. s r.o.**

se sídlem Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava-Vítkovice

zastoupeným na základě zmocnění vedoucím společníkem (pro konkrétní Dílčí veřejnou zakázku) Stráský, Hustý a partneři s.r.o.

bankovní spojení:

IČO: 64616886, DIČ: CZ64616886

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 9104
společník společnosti s názvem „**Morava – RD PP pro provoz a údržbu PK (2019)**“

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

Smluvní strany se v souladu s čl. 23., odst. 23.1. Všeobecných obchodních podmínek, které jsou nedílnou součástí Rámcové dohody jako její příloha, dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke jmenované Smlouvě, kterým dochází k úpravě doby plnění u konceptu dokumentace DSP+VD-ZDS pro Dílčí veřejnou zakázku:

PD D2 Oprava mostů D2-012, D2-030..1, D2-033.

Článek I.

1. Z důvodu nutnosti projednání a schválení nového technického řešení mostu D2-012 vyplývajícího z jednání 20. 3. 2023 a v souladu s plněním projektové dokumentace ve stupni DUSP+VD-ZDS se Smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy takto:

Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění služeb: Na základě výzvy (pokynu k zahájení prací) Objednatele.

Dokončení plnění služeb:

- Dokumentace DUSP – koncept: nejpozději do 7. 2. 2024.
- Dokumentace DUSP – čistopis: nejpozději do 1 měsíce od předání připomínek Objednatele ke konceptu DUSP.
- Podání žádosti o stavební povolení: nejpozději do 12 týdnů od schválení čistopisu dokumentace DUSP Objednatelem.
- Dokumentace VD-ZDS – koncept: nejpozději do 3. 6. 2024.
- Dokumentace VD-ZDS – čistopis: nejpozději do 1 měsíce od předání připomínek Objednatele ke konceptu VD-ZDS.
- Výkon autorského dozoru: na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby.

2. Smluvní strany na základě nového technického řešení sjednávají cenu za vícepráce v této výši:

- Dokumentace DUSP
- Výkon IČ ke stavebnímu povolení
- Dokumentace VD-ZDS
- Majetkoprávní činnost

maximální počet 50 hodin

fakturováno dle skutečnosti na základě odsouhlaseného výkazu hodin jednou za projekt

- **Celkem za vícepráce** **610.490,- Kč bez DPH**

Cena za vícepráce nezahrnuje položky vyplývající ze stávající smlouvy, které doposud nebyly vyfakturovány.

Článek II.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu posledních smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Brně dne

PODEPSÁN

za Objednatele: **Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

V Brně dne

PODEPSÁN

za Zhotovitele: **Stráský, Hustý a partneři s.r.o.**

Vedoucí společník (pro konkrétní Dílčí veřejnou zakázku)
společnosti „**Morava – RD PP pro provoz a údržbu PK (2019)**“

Podepsal
DN: cn=
c=CZ, o=Stráský, Hustý a partneři
s.r.o., ou=242,
email=
Datum: 2024.03.07 11:12:17 +01'00'

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TĚTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.



ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ

| | |
|--------------------|---|
| AKCE: | PD D2 oprava mostů D2-012, D2-030..1, D2-033 (č. 01PU-005221) |
| ČÍSLO ZAKÁZKY: | 21029 |
| ÚČEL JEDNÁNÍ: | Projednání technického řešení |
| MÍSTO JEDNÁNÍ: | Ředitelství silnic a dálnic ČR, Šumavská 31, 602 00 Brno |
| DATUM: | 20. 3. 2023 |
| ČAS: | 9.00 |
| ÚČASTNÍCI JEDNÁNÍ: | Viz prezenční listina |


PŘEDMĚT JEDNÁNÍ

Jednání bylo svoláno k projednání a zvolení vhodné varianty způsobu výstavby mostu D2-012 za účasti zástupce investora (dále investor).

OBSAH JEDNÁNÍ

- V projektu DSP opravy mostu D2-012 byl uvažován postup opravy po jednotlivých objektech SO 201 a SO 202. Tedy během opravy je doprava svedena na jeden objekt, na kterém jsou pak převáděny oba směry jízdy - 2+1. Následně investor vznesl požadavek na zachování dopravy ve čtyřech jízdních pruzích (2+2) během celé doby výstavby obou mostů.
- Na předešlém jednání se diskutovalo o 2 variantách výstavby mostů – stavět každý most po polovinách nebo rozšířit jeden z mostů a vedlejší most postavit v šířce pro dopravu 2+2.
- Projektant představil obě varianty způsobu výstavby včetně dopadu na harmonogram výstavby. Na jednání byla pro podrobnější zpracování zvolena varianta s rozšířením stávajícího mostu.
- Způsoby rozšíření stávajícího mostu jsou následující:
 - Vybourání stávající římsy se svodidlem, odstranění podkladové desky nad nosníky, zhotovení nové užší římsy s ocelovým svodidlem, vyasfaltování prostoru mezi římsou a stávající vozovkou)
 - Vybourání stávající římsy se svodidlem, odstranění podkladové desky nad nosníky, zhotovení nové přímopojížděné spřažené desky, do které bude kotvené betonové svodidlo) – zvolená varianta

NÁVRH ROZŠÍŘENÍ

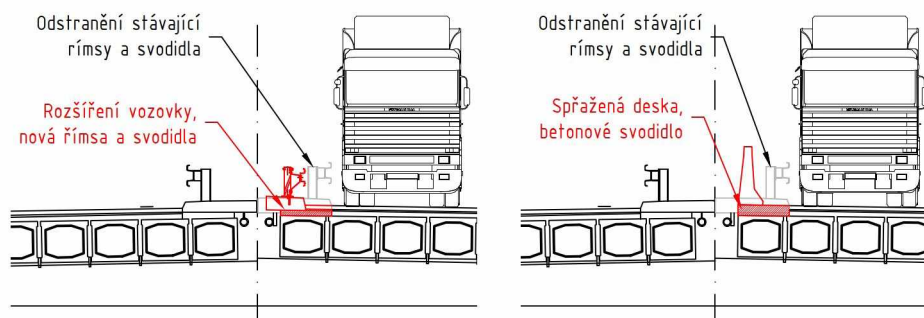

Stráský, Hustý a partneři s.r.o.

Bohunická 50, 619 00 Brno, tel.: +420 547 101 811, fax: +420 547 101 881, mail: shp@shp.eu, www.shp.eu
IČ:18827527, DIČ: CZ 18827527, bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., č.ú.: 106170024/2700
Zápis v OR Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 1558





- Postup výstavby je následující:
 - Rozšíření stávajícího pravého mostu směrem k SDP na minimální volnou šířku pro převedení dopravy 2+2, tzn. na šířku min. 12,50 m
 - Převedení dopravy na tento stávající most
 - Demolice nosné konstrukce levého mostu
 - Výstavba nového mostu s volnou šířkou 12,50 m
 - Převedení dopravy 2+2 na nově postavený most
 - Demolice původně rozšířeného stávajícího pravého mostu
 - Výstavba nového mostu opět s volnou šířkou 12,50 m
- Při rozšíření stávajícího pravého mostu směrem k SDP se bude muset zúžit SDP před a za mostem. Nové (širší) mosty se postaví tak, aby finální šířka SDP byla 4,0 m. Jelikož volná šířka nových mostů bude o 0,75 m širší než volná šířka mostů stávajících (12,50 m oproti 11,75 m), pro zachování šířky SDP 4,0 m (3,0 m vzdálenost líce svodnic mezi mosty) bude rozšíření mostů směrem k vnější římse. Za mostními závěry se vozovka rozšíří pomocí konzol na křídlech stávajících opěr.
- DIO bude zpracováno pro následující etapy:
 - Etapa 0 – přípravné práce – úprava SDP, vybudování přejezdů před a za mostem, rozšíření levého mostu dle „*Označování pracovních míst na dálnicích, příručka – I. díl*“, schéma DD 242.
 - Etapa 1 – budování levého mostu s volnou šířkou 12,50 m pro převedení dopravy 2+2 dle „*Označování pracovních míst na dálnicích, příručka – III. díl*“, schéma DP 421a a DP 421b.
 - Etapa 2 – vybudování pravého mostu s volnou šířkou 12,50 m – převedení dopravy 2+2 dle „*Označování pracovních míst na dálnicích, příručka – III. díl*“, schéma DP 421a a DP 421b.
 - Etapa 3 – znovuobnovení SDP dle „*Označování pracovních míst na dálnicích, příručka – I. díl*“, schéma DD 242.
- V projektové dokumentaci bude rozšíření levého mostu řešeno jako samostatný objekt.
- Přejezdy před a za mostem budou trvalé, s délkou 120 m a budou umístěny co nejbliže k mostu. Umístění těchto přejezdů bude v koordinaci s CETINem.
- Nový SDP bude proveden jako bezúdržbový. Projektant navrhne vhodné způsoby prostorového uspořádání na mostě a mimo most a předloží investorovi ke schválení.
- Projektant prověří, jestli návrh širších mostů nebude vyžadovat nové územní rozhodnutí.

Zapsal:

Stráský, Hustý a partneři s.r.o.

Bohunická 50, 619 00 Brno, tel.: +420 547 101 811, fax: +420 547 101 881, mail: shp@shp.eu, www.shp.eu
IČ:18827527, DIČ: CZ 18827527, bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., č.ú.: 106170024/2700
Zápis v OR Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 1558





Evidenční číslo:

Počet listů: 1
Vyhотовeno ve: výt.
Výtisk číslo:
Klasifikace: PI

Presenční listina

Název akce:

Projednáni technického řešení rekonstrukce mostů D2-012

Místo konání: Šumavská 31

Datum konání: 20.03.2023

| Jméno, příjmení, titul | Organizace, funkce | Telefon, e-mail | Podpis |
|------------------------|--------------------|-----------------|--------|
| | ŘSD ČR, OSDM | | |
| | ŘSD ČR, OSDM | | |
| | SHV | | |
| | ŘSD ČR, 50120 | | |
| | ŘSD ČR 12210 | | |
| | ŘSD ČR | | |
| | ŘSD ČR PÚ | | |
| | ŘSD ČR PÚ | | |
| | ŘSD ČR 12210 | | |
| | M.D | | |

MS TEAM

| | | |
|--------------------------------|---------------------------------|-------------|
| ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR | PRESENČNÍ LISTINA | |
| EVIDENČNÍ ČÍSLO: | | F.04.00.01 |
| | KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE | STRANA: 1/1 |

Tabulka č. 4

Dokumentace ke společnému povolení - DUSP

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ (dále pouze Směrnice), schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018 v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

PD D2 Oprava mostů D2-012, D2-030..1, D2-033 / D2-012 - nové technické řešení na základě požadavku investora pro zachování dopravy ve čtyřech jízdních pružích (2+2)

Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbou

| Popis prací | Zadavatelem předpokládaný počet hod | Hodinová sazba Kč/hod. | Cena Kč |
|---|-------------------------------------|------------------------|---------|
| A. Průvodní zpráva | | | |
| 1. Identifikační údaje | 0 | | |
| 2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení | 4 | | |
| 3. Seznam vstupních podkladů | 4 | | |
| B. Souhrnná technická zpráva | | | |
| 1. Popis území stavby | 4 | | |
| 2. Celkový popis stavby | 8 | | |
| 3. Připojení na technickou infrastrukturu | 4 | | |
| 4. Dopravní řešení | 12 | | |
| 5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav | 0 | | |
| 6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana | 0 | | |
| 7. Ochrana obyvatelstva | 0 | | |
| 8. Zásady organizace výstavby | 8 | | |
| 9. Celkové vodohospodářské řešení | 0 | | |
| C. Situační výkresy | | | |
| 1. Situační výkres širších vztahů | 0 | | |
| 2. Katastrální situační výkres | 8 | | |
| 3. Koordinační situační výkres | 16 | | |
| 4. Speciální situační výkres | neoceňuje se | | |
| D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební část | | | |
| 1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků | | | |
| 1.1 Technická zpráva | 16 | | |
| 1.2 Výkresy | 60 | | |
| 2. Mostní objekty a zdi | | | |
| 2.1 Technická zpráva | 30 | | |
| 2.2 Výkresy | 280 | | |
| 3. Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace | | | |
| 3.1 Technická zpráva | neoceňuje se | | |
| 3.2 Hydrotechnické výpočty | neoceňuje se | | |
| 3.3 Statické výpočty | neoceňuje se | | |
| 3.4 Výkresy | neoceňuje se | | |
| 4. Objekty osvětlení PK , elektro a sdělovací objekty | | | |
| 4.1 Technická zpráva | 16 | | |
| 4.2 Výkresy | 80 | | |
| 5. Objekty podzemních staveb | | | |
| 5.1 Technická zpráva | neoceňuje se | | |
| 5.2 Výkresy | neoceňuje se | | |
| 5.3 Statická část | neoceňuje se | | |
| 6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro inteligentní dopravní | | | |
| 6.1 Technická zpráva | neoceňuje se | | |
| 6.2 Výkresy | neoceňuje se | | |
| 7. Objekty drah | | | |
| 8. Objekty pozemních staveb | | | |
| 9. Ostatní stavební objekty | | | |
| 10. Požárně bezpečnostní řešení | | | |
| 10. Požárně bezpečnostní řešení | | | |
| 10. Požárně bezpečnostní řešení | | | |
| 10. Požárně bezpečnostní řešení | | | |
| D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - technologická | | | |
| 2.1 Technická zpráva | | | |
| 2.2 Výkresy | | | |
| 2.2 Výkresy | | | |
| 2.2 Výkresy | | | |
| Dokladová část | | | |
| Dokladová část | | | |
| Dokladová část | | | |
| Dokladová část | | | |
| 1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených | 0 | | 0 |
| 2. Doklad podle jiného právního předpisu | 0 | | 0 |
| 3. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury | 0 | | 0 |

| | | | |
|--|--------------|--|----------|
| 4. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů (zaměření území) | 0 | | 0 |
| 5. Projekt zpracovaný báňským projektantem | neoceňuje se | | |
| 6. Inženýrskogeologické, diagnostické a dopravní průzkumy | 0 | | 0 |
| 7. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v | 0 | | 0 |
| Související dokumentace, podklady a průzkumy | | | 0 |
| 1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF | neoceňuje se | | |
| 2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL | neoceňuje se | | |
| 3. Projekt odpadového hospodářství | 0 | | 0 |
| 4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy | 0 | | 0 |
| 5. Dendrologický průzkum nebo jeho aktualizace | neoceňuje se | | |
| 6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci | 0 | | 0 |
| 7. Podrobný pedologický průzkum | neoceňuje se | | |
| 8. Hluková studie nebo její aktualizace | neoceňuje se | | |
| 9. Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie | neoceňuje se | | |
| 10. Rozptylová studie nebo její aktualizace | neoceňuje se | | |
| 11. Rešerše geotechnického průzkumu | neoceňuje se | | |
| 12. Hydrogeologický posudek | neoceňuje se | | |
| 13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby | neoceňuje se | | |
| 14. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní | neoceňuje se | | |
| 15. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA) | neoceňuje se | | |
| 16. Další průzkumy dle zadavatele/objednatele | neoceňuje se | | |
| Odhad stavebních nákladů | 16 | | |
| | neoceňuje se | | |
| Plán BOZP | 16 | | |
| Reprografie | | | |
| SOUČET celkem za DUSP (bez DPH) | | | |

V Brně dne

Inženýrská činnost k SP včetně majetkoprávního projednání

PD D2 Oprava mostů D2-012, D2-030..1, D2-033 / D2-012 - nové technické řešení na základě požadavku investora pro zachování dopravy ve čtyřech jízdnicích pruzích (2+2)

Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbou

| Služba | Zadavatelem předpokládaný počet hod | Hodinová sazba Kč / hod | Cena Kč |
|--|-------------------------------------|-------------------------|---------|
| SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A | | | |
| Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby | neoceňuje se | | x |
| Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání žádosti s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání stavebních povolení, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony, zejména | | | |
| - závazný posudek hygienika dle zák. 258/2000 Sb., v platném znění | 4 | | |
| - změny a doplňky vlnění ze ZPF dle zák. 334/1992 Sb. a zák. 231/1999 Sb. § 9 odst. 6), v platném znění a vyhl. 13/1994 Sb., a aktualizace výpočtů výše odvodů ze ZPF | neoceňuje se | | x |
| - stanovisko silničního správního úřadu dle zák. 13/1997 Sb. v platném znění | 4 | | |
| - souhlas k zásahu do PUPFL, výpočet náhrad za odnětí v souladu se zák. 289/1995 Sb., souhlas k dotčení pozemků do 50m od okraje lesa | neoceňuje se | | x |
| - vyjádření dle § 18 zák. 254/2001 o vodách | 8 | | |
| - rozhodnutí dle § 8 zák. 254/2001 o vodách - povolení k nakládání s povrchovými vodami a podzemními vodami | neoceňuje se | | x |
| - rozhodnutí podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb. O vodách – zásah do vodních toků | 8 | | |
| - zajištění vyjádření a rozhodnutí dle §8, §9 zák. 114/1992 Sb. v platném znění o ochraně přírody a krajiny - povolení kácení zeleně rostoucí mimo les | 8 | | |
| - vyjádření, souhlasy a rozhodnutí zák.114/1992 Sb. v platném znění | neoceňuje se | | x |
| - rozhodnutí podle ust. § 76 a 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny – souhlas se zásahem do VKP | neoceňuje se | | x |
| - rozhodnutí podle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. . O ochraně přírody a krajiny – výjimka ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin a silně ohrožených druhů | neoceňuje se | | x |
| - rozhodnutí podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích – souhlas s dotčením pozemků určených k plnění funkcí lesa, využití území do 50 m od okraje lesa | neoceňuje se | | x |
| - rozhodnutí podle § 13 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích – trvalé a dočasné odnětí PUPFL | neoceňuje se | | x |
| - rozhodnutí podle § 29 odst. 2 písm.d zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči – výjimka z ochranného pásma národní kulturní památky | neoceňuje se | | x |
| - rozhodnutí podle § 6 odst. 2) zákona o drahách – změna rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací | neoceňuje se | | x |
| - rozhodnutí podle § 10 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích – povolení zřízení křižovatky | neoceňuje se | | x |
| - rozhodnutí podle § 40 odst. 2 písm.c , odst. 4 písm a) zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích – povolení připojení k silnici | neoceňuje se | | x |
| - rozhodnutí podle § 77 odst. 1, písm. a) zákona č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích – místní úprava provozu | neoceňuje se | | x |
| - souhlas s odnětím půdy ze ZPF | neoceňuje se | | x |
| - zajištění vyjádření či vydání výjimek z jiných právem chráněných zájmů stáv. staveb (např. narušení ochranných pásem, bezpeč. pásem apod.) dle zákona č.458/2000Sb., z.č.151/2000Sb., z.č.266/1994 Sb. z.č.61/1988 Sb.-všech v platném znění | 8 | | |
| -vyjádření dle zákona č. 133/1985 Sb. § 31 odst.1 zákona v platném znění – požární ochrana | 8 | | |
| -stanovisko dle vyhl. 369/2001 Sb. o tech. podmínkách pro zdravotně postižené občany | 8 | | |
| - verifikační závazné stanovisko dle zákona 100/2001 Sb. v platném znění (spolupráce, zajišťuje objednatel) | neoceňuje se | | x |

| | | | |
|--|---|--|--|
| - a dalších dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení | 8 | | |
| ČÁST A – CELKEM | | | |

| SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B | | Hodinová sazba Kč/hod | Cena Kč |
|---|---|-----------------------|---------|
| seznamění všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně prospěšnou stavbu | | neoceňuje se | x |
| obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí | 8 | | |
| zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov | | neoceňuje se | x |
| zajištění znaleckých posudků o ceně porostů v dočasných záborech a pod věčným břemenem | | neoceňuje se | x |
| obstarání potřebných nabývacích listin u pozemků, kdy právní účinky k pozemku nastaly před 1.lednem 1993 | | neoceňuje se | x |
| dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků | | neoceňuje se | x |
| Sestavení návrhu všech typů smluv, jejich projednání s objednatelem (investorem) zejména smlouvy typu: | | neoceňuje se | x |
| <i>A) kupní smlouvy na pozemky, porosty a budovy v trvalém záboru</i> | | neoceňuje se | x |
| <i>B) směnné smlouvy, smlouvy o převodu příslušnosti hospodaření, smlouvy o výpůjčce, smlouvy nájemní aj.</i> | | neoceňuje se | x |
| <i>C) kupní smlouvy na porosty v dočasném záboru a pod VB</i> | | neoceňuje se | x |
| jednání s vlastníky – fyz. i práv. osobami, příp. konkursními správci a likvidátory vedoucí k uzavření smlouvy | | neoceňuje se | x |
| jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních práv (jednání s věřiteli), odstranění duplicitních vlastnictví a jiných překážek bránících uzavření smlouvy popř. vkladu do KN | | neoceňuje se | x |
| jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geom.plánů do KN a povolení vkladu do KN | | neoceňuje se | x |
| podávání návrhů na vklad (kupní smlouvy, aj.) a na záznam do KN (smlouvy o převodu aj.) | | neoceňuje se | x |
| zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí | | neoceňuje se | x |
| projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správci IS a investorem | | neoceňuje se | x |
| zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a povinným z věcného břemene | | neoceňuje se | x |
| Podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene | | neoceňuje se | x |
| zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO (obce, kraje, ZVHS apod.) | | neoceňuje se | x |
| sestavení návrhu na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením vlastnického práva | | neoceňuje se | x |
| zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma lesa (50 m od okraje lesa) a - zajištění souhlasu vlastníků ke změně souhlasu s vynětím ze ZPF a k uložení přebytečné ornice | | neoceňuje se | x |
| zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění | | neoceňuje se | x |
| Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů pro podání žádosti o stavební povolení. | | neoceňuje se | x |
| ČÁST B CELKEM | | | |

| SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C | | Hodinová sazba Kč/hod | Cena Kč |
|---|----|-----------------------|---------|
| Zajištění vydání stavebního povolení, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádosti o vydání stavebního povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení, účast na jednáních, předání pravomocného stavebního povolení | 14 | | |
| ČÁST C CELKEM | | | |

| SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D | | Hodinová sazba Kč/hod | Cena Kč |
|---|----|-----------------------|---------|
| Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ. | 10 | | |
| Technická pomoc objednateli v rámci doplňování všech údajů do aplikace majetkoprávní přípravy | 10 | | |
| ČÁST D CELKEM | | | |
| CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k SP | | | |

| MAJETKOPRÁVNÍ ČINNOST | | Hodinová sazba Kč/hod | Cena Kč |
|------------------------------|--|-----------------------|---------|
| | | | |

| | | |
|--|----|--|
| Případný výkon majetkoprávní činnosti, fakturovaný dle skutečnosti na základě odsouhlaseného výkazu hodin jednou za projekt. Maximální počet 50 hodin. | 50 | |
| ČÁST MPČ CELKEM | | |

V Brně dne

VD-ZDS

PD D2 Oprava mostů D2-012, D2-030..1, D2-033 / D2-012 - nové technické řešení na základě požadavku investora pro zachování dopravy ve čtyřech jízdních pružích (2+2)

Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbou

| | | Popis prací | Zadavatelem předpokládaný počet hod | Kč/hod | Cena v Kč |
|--|-------------------------|--|-------------------------------------|------------|-----------|
| Pozn: Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno") | | | | | |
| A. Souhrnné řešení stavby | | | | | |
| | | 0. Průvodní zpráva | 8 | | |
| | | 1. Přehledná situace | 8 | | |
| | | 2. Koordináční situace | 8 | | |
| | | 3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres) | | Neobsazeno | |
| | | 4. Bilance zemních prací | | Neobsazeno | |
| Pozn. Pro zpracovatele: Je-li k dispozici skutečný seznam SO z předchozího projektového stupně, bude tento doplněn níže a to včetně SN bez DPH | | 5. Zásady organizace výstavby | 7 | | |
| | | 6. Celkové vodohospodářské řešení | | Neobsazeno | |
| | | B. Stavební část | | | |
| Označení stavebního objektu | Předp. výše SN bez DPH* | Příprava staveniště | | Neobsazeno | |
| SO řady 0xx | | Pozemní komunikace | 10 | | |
| SO řady 1xx | | Mostní objekty, zdi | 36 | | |
| SO řady 2xx | | Vodohospodářské objekty | | Neobsazeno | |
| SO řady 3xx | | Elektro a sdělovací objekty | 20 | | |
| SO řady 4xx | | Objekty trubních vedení | | Neobsazeno | |
| SO řady 5xx | | Pozemní objekty (vč. PHS) | | Neobsazeno | |
| SO řady 6xx | | Objekty úpravy území | | Neobsazeno | |
| SO řady 7xx | | Objekty zařízení staveniště | | Neobsazeno | |
| SO řady 8xx | | | | | |
| D. Doklady | | | | | |
| E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr) | | | | | |
| | | | 10 | | |
| F. Kontrolní rozpočet | | | | | |
| | | | 10 | | |
| G. Souvisící dokumentace | | | | | |
| H. ZTKP | | | | | |
| Rešerše geotechnického průzkumu | | | | | |
| | | Reprografie v počtu dle VOP | | x | |
| Celkem VD-ZDS bez DPH | | | | | |

* Předběžné ocenění dle cenových normativů MDČR pro rok 2015

V Brně dne

Digitálně podepsal:

Datum: 10.05.2024 9:33:46 +02:00
