



MHMPXPO1MCTM

DODATEK č. 6
ke Smlouvě o dílo
Stavba č. 44151 TV Rekonstrukce stoky D,
(dále jen „Smlouva“)

číslo smlouvy objednatele: **DIL/21/08/007142/2021**

číslo smlouvy zhotovitele: **SOD00200592**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 20028-5157998/6000

zastoupeno: Ing. arch. Tomášem Veselým, zástupcem ředitele Magistrátu pro sekci rozhodování o území, pověřeným řízením odboru investičního
(dále jen „**Objednatel**“)

pro vybrané činnosti dle této Smlouvy zastoupené příkazníkem (TDI/TDS):

ISTAR s.r.o.

se sídlem: Donatellova 2003/6, 100 00 Praha 10, Strašnice

IČO 49623061

DIČ CZ49623061, registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

zastoupený: Ing. Zdeňkem Frelichem, jednatelem společnosti

(dále jen „**Příkazník**“)

a

OHLA ŽS, a.s.

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 46342796

DIČ: CZ46372796, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

zapsána: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B vložka 695

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.

číslo účtu: 1014501513/5500

zastoupena: Ing. Romanem Kocůrkem, 1. místopředsedou představenstva

a Jiřím Procházkou, MBA, členem představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“)

I. Obecná ujednání

Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen „**Smluvní strany**“ uzavírají tento Dodatek č. 6 (dále jen „**Dodatek**“) ke smlouvě o dílo, vedené pod č. objednatele DIL/21/08/007142/2021 (dále jen „**Smlouva**“), ze dne 10.8.2021 včetně Dodatku č. 1 Smlouvy ze dne 11.10.2021, Dodatku č. 2 Smlouvy ze dne 22.7.2022, Dodatku č. 3 Smlouvy ze dne 5.12.2022, Dodatku č. 4 Smlouvy ze dne 1.10.2023 a Dodatku č. 5 ze dne 5.12.2023.

II. Předmět dodatku

2.1. Původní znění části III. PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO, odst. 3.1 Smlouvy se doplňuje následovně:

Předmět Díla se rozšiřuje o dodatečné stavební práce, jejichž specifikace je uvedena ve změnových listech (dále jen „**ZL**“) a formulářích OZ č. 3, NOZ č. 3, OZ č. 10, NOZ č. 10, OZ č. 11, NOZ č. 11, OZ č. 12, NOZ č. 12, OZ č. 13 a NOZ č. 13, které jsou uvedené v příloze č. 1 tohoto Dodatku včetně jejich ocenění v členění na vícepráce a méněpráce. Jedná se o změnu zatřídění stavebního odpadu ze zemních prací z důvodů zjištěných skutečností při jejich provádění, změnu vodovodní přípojky a změny ve finálních terénních a povrchových úpravách vzniklých v důsledku požadavků budoucích správců a místních spolků. Vzhledem k tomu, že dodatečné stavební práce byly již oběma smluvními stranami odsouhlaseny z důvodu neodkladnosti v minulosti (viz jednotlivé ZL), tak tento Dodatek pouze deklaruje již zasmluvněné ZL s tím, že případně upřesňuje cenu jednotlivých ZL. Smluvní strany s tímto cenovým upřesněním vyjadřují svůj souhlas.

ZL číslo / cena v Kč bez DPH	vícepráce	méněpráce	celkem
ZL 10	2 324 059,47	- 2 107 967,42	216 092,05
ZL 11	93 612,25	- 74 820,79	18 791,46
ZL 12	808 767,23	- 676 631,35	132 135,88
ZL 13	176 445,44	- 11 379,15	165 066,29
ZL 3	7 766 400,00	- 3 214 228,73	4 552 171,27
CELKEM	11 169 284,39	- 6 085 027,44	5 084 256,95

2.2. Původní znění části IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY odst. 6.1. se nahrazuje tímto zněním:

Rekapitulace ceny Díla	cena bez DPH v Kč	21% DPH v Kč	cena vč. DPH v Kč
cena základní Smlouvy	133 271 504,00	27 987 015,84	161 258 519,84
Stávající cena (Smlouva včetně dodatků č. 1 – 5) celkem	151 536 527,99	31 822 670,88	183 359 198,87
Navýšení ceny dle dodatku č. 6	5 084 256,95	1 067 693,96	6 151 950,91
z toho:		-	-
Dodatek č. 6 - cena víceprací	11 169 284,39	2 345 549,72	13 514 834,11
Dodatek č. 6 - cena méněprací	- 6 085 027,44	- 1 277 855,76	- 7 362 883,20
Nová cena Díla včetně Dodatku č. 6	156 620 784,94	32 890 364,84	189 511 149,78

2.3. V návaznosti na změnu ceny Díla se upravuje původní příloha č. 2 Smlouvy – Specifikace Díla a kalkulace ceny dle budoucích správců – provozovatelů a nahrazuje se přílohou č. 2 tohoto Dodatku.

2.4. Původní znění části IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY odst. 7.7. se rozšiřuje tímto zněním:

U přijatých stavebních a montážních prací, která Objednatel nepoužije ke své ekonomické činnosti, nebude při fakturaci použit režim přenesení daňové povinnosti dle ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „**zákon o dani z přidané hodnoty**“), ale bude použit standardní režim – daňové doklady budou obsahovat i vyšší daně z přidané hodnoty.

2.5. Změny v tomto Dodatku jsou ve smyslu § 222 zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek, nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Nárůst ceny Díla v Dodatcích Smlouvy č. 1-6 činí celkem 23 349 280,94 Kč bez DPH, tj. 17,52 % z původní ceny Díla.

III. Závěrečná ustanovení

3.1. Tento Dodatek č. 6 je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají nadále beze změny v platnosti.

3.2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, který je veřejně přístupný a který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany dohody výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí hl. m. Praha.

3.3. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je podle zákona č. 106/1999 Sb., o poskytování informací, povinen poskytnout třetí osobě informace a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě vč. dodatků byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.

3.4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem připojení platných uznávaných elektronických podpisů dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o službách vytvářejících důvěru“) obou Smluvních stran, příp. jejich zástupců, do tohoto Dodatku, a to dnem připojení posledního z nich.

3.5. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž toto uveřejnění zajistí Objednatel. Tento Dodatek je oprávněn uveřejnit v registru smluv též

Zhotovitel, přičemž v takovém případě je o tom povinen Objednatele bez zbytečného odkladu uvědomit.

3.6. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku k němu Smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy podle zákona o službách vytvářejících důvěru a určily, že tímto způsobem tento Dodatek uzavřely.

3.7. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly, jeho obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tento Dodatek nemohl být řádně plněn nebo které by způsobovaly neplatnost tohoto Dodatku a že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné způsobilosti právně jednat, a dále že tento Dodatek nebyl ujednán v rozporu se zákonem a nepřichází se dobrým mravům a veškerá prohlášení odpovídají skutečnosti, což vše níže stvrzují svými podpisy.

3.8. Na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 2537 ze dne 6.11.2023, k návrhu na svěřením nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy, je uzavření tohoto Dodatku v kompetenci ředitele zadávajícího odboru Magistrátu hl. m. Prahy.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 3 a č. 10-13

Příloha č. 2 - Specifikace díla a kalkulace ceny dle budoucích správců – provozovatelů

Za Objednatele :

Za Zhotovitele :

.....

Ing. arch. Tomáš Veselý
zástupce ředitele Magistrátu pro sekci rozhodování o území,
pověřen řízením odboru investičního
elektronicky podepsáno

.....

Ing. Roman Kocúrek
1. místopředseda představenstva
OHLA ŽS, a.s.
elektronicky podepsáno

.....

Jiří Procházka, MBA
člen představenstva
OHLA ŽS, a.s.
elektronicky podepsáno

stavba č. 44151 TV Rekonstrukce stoky D		FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZ č. 3	
Komu: INV MHMP		Datum:	
Odesláno/ předáno:	osobně		osobně
Týká se:		SOD č. DIL/21/08/007142/2021	
Odkazy: na specifikaci:			
na výkresy:		-	
na rozpočtové podklady:		Specifikace prací zpracoval: Zhotovitel	
na jinou část smlouvy:		-	
kategorizace položek:		Smlouva o dílo, ÚRS	
<p>Dokumentace pro výběr zhotovitele v 12/2010 byla zpracována pouze na základě geologické rešerše z archivních podkladů, to znamená bez provedení podrobného vrtaného IG průzkumu.</p> <p>Po zahájení stavby byla při hloubení těžní šachty na odtoku z nádrže, v rámci probíhajícího geotechnického monitoringu, zjištěna geologická skladba neodpovídající dostupným archivním podkladům. Z tohoto důvodu bylo navrženo doplnění geologických podkladů o dva geologické vrty. Inženýrskogeologický průzkum provedla v lednu 2022 firma INSET s.r.o., návazně v 04/2023 vydala spol. AQUATEST a.s. zprávu k zatřídění odpadu k zakázce.</p> <p>V rámci těchto vrtů byla zastižena mocnost různorodých navážek od 5,5m do 8,5 m charakterizovaná jako navážka s příměsí stavebních materiálů jako jsou úlomky cihel, betonu atd. Tento typ stavebního odpadu nelze deponovat na tzv. "recyklační skládce", jak předpokládala projektová dokumentace a rozpočet (kód odpadu 17 05 04), ale je nutné jej kategorizovat jako tzv. Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků (kód odpadu 17 01 07) a deponovat jej na příslušné skládce, která umožňuje přijímat tento typ odpadů.</p> <p>Provádění výkopových prací na objektu SO 01 výsledky inženýrskogeologického průzkumu potvrdily.</p> <p>Příloha č. 1: změnový rozpočet Příloha č. 2: zpráva o zatřídění odpadu k zakázce spol. AQUATEST</p>			
Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno:			
<p>Foto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ).</p>			

stavba č. 44151 TV Rekonstrukce stoky D			FO 2	
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			NOZ č. 3	
NOZ zpracoval: Zhotovitel			Datum: 16.2.2024	
NOZ č. navazuje na:	OZ č. 3	PZ č. -	PL č.: -	
Odesláno/ předáno:	osobně			osobně
<p>V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/08/007142/2021 předkládáme návrh úpravy</p> <p>dohodnuté ceny</p> <p>zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady: Příloha k NOZ č. 3 – Změnový rozpočet</p> <p>Cena stavebních prací:</p> <p>Cena odpočty - 3 214 228,73 Kč</p> <p>Cena přípočty 7 766 400,00 Kč</p> <p>Cena celkem 4 552 171,27 Kč</p> <p>V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/08/007142/2021 Zhotovitel provede Odkladnou-Neodkladnou změnu dle čl. 4 Smlouvy, zpracuje a předloží Příkazníkovi Specifikaci díla a kalkulaci ceny Odkladné-Neodkladné změny. Příkazník provede kontrolu její věcné i množství správnosti i určení ceny podle pravidel uvedených v SOD.</p> <p>Počet listů příloh: 1</p>				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy):				
čtyři miliony pět set padesát dva tisíc sto sedmdesát jedna korun českých dvacet sedm haléřů				
C				
D				

ZMĚNOVÝ ROZPOČET

Příloha č. 1 - Změnový rozpočet

Stavba: stavba č. 44151 TV Rekonstrukce stoky D
 Číslo ZL: 3
 Název ZL:
 Objekt: SO 01 Retenční nádrž OK_3D Evropská

Poř. č.	Kód	POPIS	M/J	SoD		Po změně		Víceprací/měnné práce	
				Množství celkem	Cena jednotková	Množství celkem	Cena celkem	Množství celkem	Cena celkem
	1	SO 01 Retenční nádrž OK_3D Evropská							
		Zemní práce							
ZL_3_1	997013609	Poplatek za uložení na skládce (svlédkovné) stavebního odpadu za směsí nebo odštěpených frakcí betonu, cihel a keramik, kón. výrobků kód odstavu 17 01 07	1	0,000	0,00	12 135,000	640,00	12 135,000	7 766 400,00
19	171201231R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na nepřírodní svádce (skladovné) zeminy a kamení zař. dlešho do Katalogu materiálů pod kódem 17 05 04	T	25 152,079	264,87	13 017,079	264,87	-12 135,000	-3 214 226,73
CELKEM (BEZ DPH)					6 862 006,01		11 214 267,27		4 552 171,27

měnípráce

vícepráce - nové položky

vícepráce - stávající položky



stavba č. 44151 TV Rekonstrukce stoky D		FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZ č. 10	
Komu: INV MHMP		Datum: 17.10.2023	
Odesláno/ předáno:	osobně		osobně
Týká se:		SOD č. DIL/21/08/007142/2021	
Odkazy: na specifikaci:		-	
na výkresy:	Výkres č. D08 a D03 TECHNICKÁ ZPRÁVA (v revizi ze dne 20.6.2023), Výkres č. D8.1 DEFINITIVNÍ ÚPRAVY POVRCHU SITUACE (v revizi ze dne 16.8.2023)		
na rozpočtové podklady:	Specifikace prací zpracoval: projektant		
na jinou část smlouvy:	-		
kategorizace položek:	Smlouva o dílo, ÚRS, kalkulace		
<p>Na základě požadavků budoucích správců a místních spolků byl provedena změna návrhu objektu SO 08 Terénní úpravy. Ta spočívá mj. ve změně zpevněných ploch kolem nádrže původně navržených s povrchem z vegetačních prvků, které jsou nahrazeny za mechanicky zpevněné kamenivo (včetně doplnění části těchto ploch o stabilizační geomříže), zrušení navrženého oplocení a svodidla nahrazeného kamennou opěrnou zídou (z čediče), v doplnění zábradlí nad výústním objektem a změně řešení hrubých terénních úprav. Z předmětu díla je dále vyjmuto osázení novými dřevinami a založení trávníků v rámci navržených ploch zeleně. Dále bylo zrušeno vybudování nového přístřešku autobusové zastávky.</p>			
Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno: Požadavky budoucích správců			
[REDACTED]			
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ).			

stavba č. 44151 TV Rekonstrukce stoky D			FO 2	
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			NOZ č. 10	
NOZ zpracoval: Zhotovitel			Datum: 17.10.2023	
NOZ č. 10 navazuje na:	OZ č. 10	PZ č. -	PL č.: -	
Odesláno/ předáno:	Osobně			osobně

V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/08/007142/2021 předkládáme návrh úpravy

dohodnuté ceny

zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady:
Příloha k NOZ č. 10 – Změnový rozpočet

Cena stavebních prací:

Cena odpočty	- 2 107 967,42 Kč
Cena přípočty	2 324 059,47 Kč
Cena celkem	216 092,05 Kč

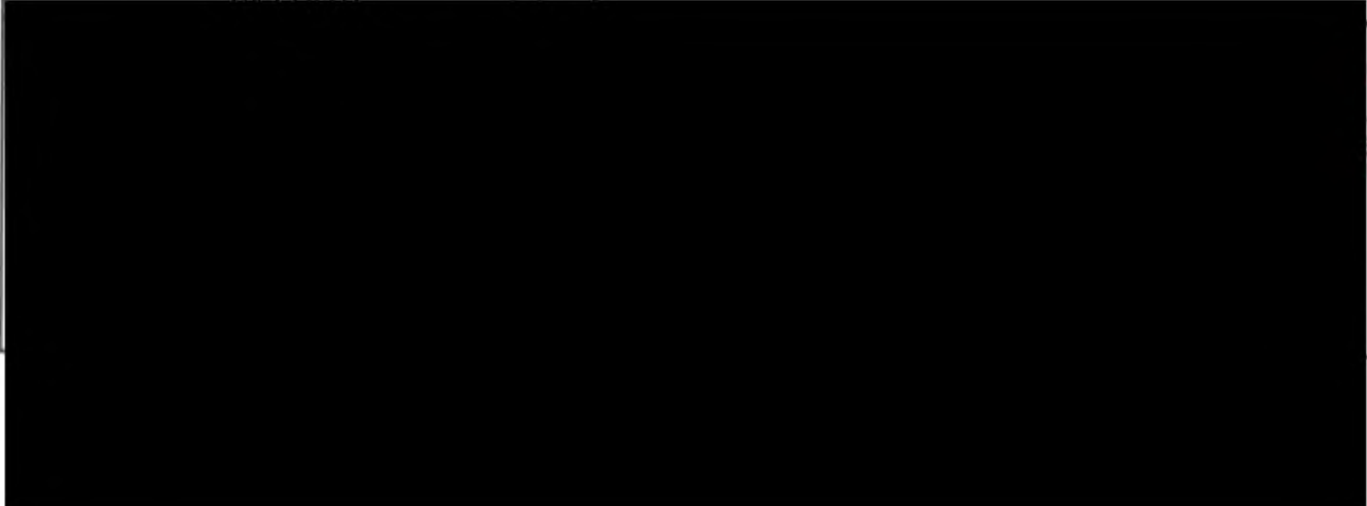
V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/08/007142/2021 Zhotovitel provede Odkladnou-~~Neodkladnou~~ změnu dle čl. 4 Smlouvy, zpracuje a předloží Příkazníkovi Specifikaci díla a kalkulaci ceny Odkladné-~~Neodkladné~~ změny. Příkazník provede kontrolu její věcné i množství správnosti i určení ceny podle pravidel uvedených v SOD.

Počet listů příloh: 4

Navrhovaná změna ceny díla (slovy):

Dvě stě šestnáct tisíc devadesát dva korun českých pět haléřů

(bez DPH)



ZMĚNOVÝ ROZPOČET

Příloha č. 1 - Změnový rozpočet

Stavba: stavba č. 44151 TV Rekonstrukce stoky D
 Číslo ZL: 10
 Název ZL: Změna povrchových úprav terénu
 Objekt: SO 08a Povrchové úpravy - komunikace, SO 08b Povrchové úpravy - zeleň, SO 03 Výstřižní objekt a Přítoková stoka DN2000

Poř. č.	Kód	POPIS	MJ			SoD			Po změně			Vícepracíméněpráce		
			Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem			
1	10371500	SO 08a Povrchové úpravy - komunikace Zemní práce Substrát pro trávníky, VL	M3	6,351	1 162,00	7 379,86	0,000	1 162,00	0,00	0,00	-6,351	1 162,00	-7 379,86	
2	113107225	Odstranění podkladů nebo krytí strojně jednolitě přes 200 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenná trubého dřevěho, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm	m2	0,000	0,00	0,00	320,000	108,00	34 560,00	0,00	108,00	34 560,00	0,00	
3	13111322	Vrtání jámků ručně mechanickým vrtačem průměru přes 100 do 200 mm	M	42,000	144,71	6 077,82	0,000	144,71	0,00	0,00	-42,000	144,71	-6 077,82	
4	16275117R	Vodorovné přemístění výkopku nebo vypánný po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se naložením bez rozhrnutí z horniny třídy I až II	M3	131,319	305,27	40 087,75	0,000	305,27	0,00	0,00	-131,319	305,27	-40 087,75	
5	167151101	Naladění, skládání a třískování neuhlihlého výkopku nebo vypánný strojně nakládání, množství do 100 m ³ , z horniny třídy I až III	M3	65,000	169,06	10 988,90	0,000	169,06	0,00	0,00	-65,000	169,06	-10 988,90	
6	167151111	Naladění, skládání a třískování neuhlihlého výkopku nebo vypánný strojně nakládání, množství přes 100 m ³ , z horniny třídy I až III	m3	535,501	54,64	29 259,77	534,531	54,64	46 598,77	0,000	54,64	16 339,00	0,00	
7	174101101	Zlepš. svahování z impozitov horniny strojní s naložením výkopku ve vrstvách se zhutněním sam. šachet, stb nebo jiným objektem v těchto výškových pásch	M3	650,000	153,85	10 020,25	208,830	153,85	47 506,32	0,000	153,85	37 476,07	0,00	
8	184301113	Rekonstruce a úprava omítky v rovně nebo ve svahu sítěru do 1,5 strčné při souvisej. práce přes 500 m ² , tl. vrstvy do 200 mm	M2	866,000	30,99	26 838,14	866,000	30,99	26 840,99	0,000	30,99	1 953,49	0,00	
9	184961111	Úprava stěně vyvozáčím výškových rozestů strojní v hornině třídy I až III, skupiny I až 3, bez zhutnění	M2	730,000	16,38	11 957,40	730,000	16,38	12 000,70	0,000	16,38	573,30	0,00	
10	182911131	Vypánný otvorů zpevněných prefabrikátů omítkou nebo substrátem vrstvou tloušťky přes 100 do 150 mm pro výsadbu rostlin na svahu přes 1:2 do 1:1	M2	730,000	65,16	47 566,80	0,000	65,16	0,00	0,00	-730,000	65,16	-47 566,80	
11	113107161	Odstranění podkladů z kamenná dřevěho tl. do 100 mm strojní pl přes 50 do 200 m ² odstranění rubovní mlátové cest, vrtní vrstva	m2	0,000	0,00	0,00	180,000	40,20	7 236,00	0,000	40,20	7 236,00	0,00	
12	113107152	Odstranění podkladů nebo krytí strojně jednolitě přes 50 m ² do 200 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenná dřevěho, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	M2	140,000	36,90	5 166,00	280,000	36,90	10 308,00	0,000	36,90	5 142,00	0,00	
13	113107163	Odstranění podkladů nebo krytí strojně jednolitě přes 50 m ² do 200 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenná trubého dřevěho, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	M2	325,000	88,37	28 720,25	145,000	88,37	12 813,65	0,000	88,37	-15 906,60	0,00	
14	113107172	Odstranění podkladů z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojní pl přes 50 do 200 m ² odstranění rubovní mlátové cest, - mlákladní vrstva	m2	0,000	0,00	0,00	180,000	342,00	61 560,00	0,000	342,00	61 560,00	0,00	
15	274542212	Zakládání Podšyp pod základovú konstrukce se zhutněním a uvozním povrchu z kamenná trubého kalcie, tl. 16 - 32 mm VV: 4070.1	m3	371,533	1 981,64	735 645,80	371,533	1 981,64	743 674,96	0,000	1 981,64	7 029,16	0,00	
16	3482121R1	Svislé a kompletní konstrukce Zdivo plotových zdí a podzdivků z lomového kamene (čedič - tefrit, lom Dubičná) na suchu z travěliných kamenů objemu 1, kusu kamene do 0,02 m ³	m3	0,000	0,00	0,00	18,000	35 232,82	634 190,76	0,000	35 232,82	634 190,76	0,00	
17	31327516R	pleno drátěné plastifikované se čtvercovými oky 552,5mm x 250cm	M	221,550	220,17	48 778,66	0,000	220,17	0,00	0,00	-221,550	220,17	-48 778,66	
18	338171123	Montáž sloupku a vzáp plotových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 60 m se zabetonováním do 0 08 m ³ do přípravných jamek	KUS	84,000	373,38	31 363,92	0,000	373,38	0,00	0,00	-84,000	373,38	-31 363,92	
19	348101220	Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivé přes 2 do 4 m ²	KUS	1,000	369,23	369,23	0,000	369,23	0,00	0,00	-1,000	369,23	-369,23	
20	348101250	Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivé přes 8 do 10 m ²	KUS	1,000	2 360,87	2 360,87	0,000	2 360,87	0,00	0,00	-1,000	2 360,87	-2 360,87	
21	348272512R	Přisřešek autobusové zastávky s lavici a stojanem jižním řádu, kompletní dodávka	KUS	1,000	112 530,19	112 530,19	0,000	112 530,19	0,00	0,00	-1,000	112 530,19	-112 530,19	
22	348401140	Montáž oplocení z pletve strojového s napínacími dráty přes 2 do 4 0 m	M	210,000	119,47	25 088,70	0,000	119,47	0,00	0,00	-210,000	119,47	-25 088,70	
23	55342255	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2500/38x1,5mm	KUS	50,000	244,63	12 231,50	0,000	244,63	0,00	0,00	-50,000	244,63	-12 231,50	
24	55342263	sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2500/48x1,5mm	KUS	-4,000	244,63	-978,52	0,000	244,63	0,00	0,00	-4,000	244,63	-978,52	

ZMĚNOVÝ ROZPOČET

Stavba: stavba č. 44151 TV Rekonstrukce stoky D

Číslo ZL: 10

Název ZL: Změna povrchových úprav terénu

Objekt: SO 08a Povrchové úpravy - komunikace, SO 08b Povrchové úpravy - zeleň, SO 03 Výústní objekt a Přítoková stoka DN2000

Por. č.	Kód	POPIS	SoD			Po změně			Vícepráce/němnější práce		
			MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková
25	55342274	Výběr plošová 38x15mm včetně krytky s uchtem 2500mm	KUS	30,000	8 935,40	0,000	231,18	0,00	-30,000	231,18	-6 935,40
26	55342326	sloupek pro branku 70x70mm v 2,2m včetně patky	KUS	2,000	4 515,88	0,000	2 257,94	0,00	-2,000	2 257,94	-4 515,88
27	55342332	branka plošová jednokřídlá Pz 1000x2030mm	KUS	1,000	8 562,08	0,000	8 562,08	0,00	-1,000	8 562,08	-8 562,08
28	55342420R	brána vjezdová kovová dvoukřídlá	KUS	1,000	26 909,39	0,000	26 909,39	0,00	-1,000	26 909,39	-26 909,39
4		Vodorovné konstrukce									
29	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1-5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého	m ²	0,000	0,00	26,000	306,00	7 956,00	26,000	306,00	7 956,00
5		Komunikace									
30	56245141	dlažba zahradňovací recyklovány PE nosnost 350N/m ² 330x330x50mm	M ²	748,295	375 239,89	0,000	501,49	0,00	-748,295	501,49	-375 239,89
31	564201111	Podklad nebo podvýp ze šleřkopisku SP s rozprostřením, vhlbením a zhuštění, po ztuhnutí tl. 40 mm	M ²	180,000	9 894,60	0,000	54,97	0,00	-180,000	54,97	-9 894,60
32	564211111	Podklad nebo podvýp ze šleřkopisku SP s rozprostřením, vhlbením a zhuštěním, po ztuhnutí tl. 50 mm	M ²	730,000	87 595,40	0,000	65,06	0,00	-730,000	65,06	-87 595,40
		VV: 765-730									
33	564740011	Podklad nebo kryt z kamenná hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhuštěním, po ztuhnutí tl. 50 mm	M ²	180,000	15 073,20	0,000	83,74	0,00	-180,000	83,74	-15 073,20
34	564811111	Podklad ze šleřkopisku SD s rozprostřením a zhuštěním, po ztuhnutí tl. 120 mm	M ²	190,000	24 905,20	0,000	160,59	0,00	-190,000	160,59	-24 905,20
35	564851111	Podklad ze šleřkopisku SD s rozprostřením a zhuštěním, po ztuhnutí tl. 150 mm	M ²	735,000	144 184,55	0,000	196,17	0,00	-735,000	196,17	-144 184,55
36	564861111	Podklad ze šleřkopisku SD s rozprostřením a zhuštěním plochy zima 100 m ² , po ztuhnutí tl. 200 mm	m ²	990,000	238 483,00	0,000	255,90	0,00	-990,000	255,90	-238 483,00
		VV: 2765+175									
37	564871111	Podklad ze šleřkopisku SD s rozprostřením a zhuštěním, po ztuhnutí tl. 250 mm	M ²	235,000	234 070,00	0,000	316,83	0,00	-235,000	316,83	-234 070,00
		VV: 2380+735									
38	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kamenná MKZ (minerální beton) s rozprostřením a zhuštěním, po ztuhnutí tl. 150 mm	m ²	0,000	0,00	765,000	307,00	234 855,00	765,000	307,00	234 855,00
39	591241111	Kladení dlažby z kosek s provedením lože do tl. 50 mm, s vypínáním spár, s dvojným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamenná, do lože z cementové malty	m ²	0,000	0,00	26,000	812,00	21 112,00	26,000	812,00	21 112,00
40	58381014	kostka rezanostříhaná dlažební žula 10x10x8cm	m ²	0,000	0,00	26,000	2 310,00	60 060,00	26,000	2 310,00	60 060,00
41	59246010	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm barevná	M ²	5,125	3 134,35	0,000	611,58	0,00	-5,125	611,58	-3 134,35
42	59246013	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní	M ²	46,125	23 695,34	0,000	513,72	0,00	-46,125	513,72	-23 695,34
43	596211210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikaci pro pěší s ložem z kamenná těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vypínáním spár s dvojným hutněním	M ²	50,000	22 148,50	0,000	442,97	0,00	-50,000	442,97	-22 148,50
44	596411114	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic komunikaci pro pěší s ložem z kamenná těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vypínáním spár a vegetačních otvor	M ²	730,000	193 822,30	0,000	265,51	0,00	-730,000	265,51	-193 822,30
6		Úpravy povrchů, podlaží a osazování výpnlí									
45	628613611	Žárové zinkování, ponorem dílů ocelových konstrukcí hmotnosti do 100 kg	kg	0,000	0,00	161,380	53,60	8 649,97	161,380	53,60	8 649,97
		VV: 47,14+14,31+0,9+30,48+36,16+3,96+3,36+17,95+14,98+8,76+3 (viz dílenské dokumentace zábradlí)									
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání									
46	55391468	svodidlo sítiníč, jednostranné KB1 RH3 se zabíraněním sloupků po 1,9m	M	88,000	344 439,92	0,000	3 914,09	0,00	-88,000	3 914,09	-344 439,92
47	50217001	obrubník betonový, zahradní, 1000x50x250mm	M	41,000	4 764,20	0,000	116,20	0,00	-41,000	116,20	-4 764,20
48	59217017	obrubník betonový chodníkový, 1000x100x250mm	M	384,375	64 882,50	92,250	169,80	15 571,80	-292,125	168,80	-49 310,70
49	911331155	Sítiníč, svodidlo s osazením sloupků zabíraněním ocelové úroveň zádržnost H3 vzdálenost sloupků přes 2 do 4 m jednostranné	M	88,000	116 894,80	0,000	1 328,35	0,00	-88,000	1 328,35	-116 894,80
50	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřizováním lože, s vypínáním a zateplením spár cementovou maltou spojatého s boční okrajou z betonu prostého, do lože z	M	375,000	99 461,25	90,000	265,23	23 870,70	-285,000	265,23	-75 590,55
51	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tl. C-12/15	M	196,238	36 730,12	0,000	188,13	0,00	-196,238	188,13	-36 730,12
52	911121111	Montáž zábradlí ocelového řířichového vřuly do betonového podkladu	m	0,000	0,00	10,450	983,00	10 272,35	0,000	983,00	10 272,35
53	55391420R	Vřoba a dodávka ocelového zábradlí nad výštiním objektem (vč. povrchové úpravy)	kpl	0,000	0,00	1,000	69 031,69	69 031,69	0,000	69 031,69	69 031,69
54	953961112	Kolový chemický kámen M 10 tl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamenná s vyvrtáním otvoru	kus	0,000	0,00	24,000	51,40	1 233,60	0,000	51,40	1 233,60
55	912111121	Montáž zábrany parkovací tvaru U řířichové šrouby	kus	0,000	0,00	2,000	380,00	760,00	0,000	380,00	760,00
56	74910161	šroubek parkovací sítiníč 500x800x350mm uzamkatelný kontaktil 3 nohy	kus	0,000	0,00	2,000	3 680,00	7 360,00	0,000	3 680,00	7 360,00
57	919721231	Geotextil pro vyztlužení asfaltového povrchu ze skejních vláken s geotextilií, poddáné pvnost v tahu 25 kN/m	m ²	0,000	0,00	535,000	673,00	360 055,00	535,000	673,00	360 055,00

ZMĚNOVÝ ROZPOČET

Stavba: stavba č. 44151 TV Rekonstrukce stoky D
 Číslo ZL: 10
 Název ZL: Změna povrchových úprav terénu
 Objekt: SO 08a Povrchové úpravy - komunikace, SO 08b Povrchové úpravy - zeleň, SO 03 Výústní objekt a Přítoková stoka DN2000

Por. č.	Kód	POPIS	MJ	SoD		Po změně		Vícepráce/méněpráce		
				Množství celkem	Cena jednotková	Množství celkem	Cena jednotková	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
87	18141133	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m ² výševem včetně uiazení povrchového na svahu přes 1:2 do 1:1	M2	303,968	43,14	0,000	43,14	-303,968	43,14	-13 113,18
88	00572410	osivo směs travní parkova	KG	15,198	183,47	0,000	183,47	-15,198	183,47	-2 788,38
89	89991113	Trubní vedení Osvětlení ocelových, souběžně zavěšených a údržbných pro potrubí na mostech, rampových a pod. hmotnosti jednotlivě přes 10 kg Hmotnost nové míže dle výkresu D3.3 z 08/2023: 203,4 kg	KG	125,000	73,89	203,400	73,89	15 697,36	73,89	6 296,11
90	424424100R	Mříž ocelová pro potrubí 2000mm	KUS	1,000	18 775,42	0,000	18 775,42	-1,000	18 775,42	-18 775,42
91	424424100R2	Ochranná ocelová výklopová mříž dle výkresu D3.3 z 08/2023	kus	0,000	0,00	1,000	53 826,21	1,000	53 826,21	53 826,21
92	628613611	Žárové zinkování ponorem ocelových konstrukcí hmotnosti do 100 kg	kg	0,000	0,00	203,400	53,60	203,400	53,60	10 902,24
		SO 04 Přítoková stoka DN2000								
		Zemní práce								
93	18141131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m ² výševem včetně uiazení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	M2	272,120	22,03	0,000	22,03	0,000	22,03	-5 994,80
94	00572410	osivo směs travní parkova	KG	13,606	107,55	0,000	107,55	-13,606	107,55	-1 463,33
CELKEM (BEZ DPH)					3 716 133,68		3 932 225,73			216 092,05

méněpráce

vícepráce - nové položky

vícepráce - stávající položky

Příloha č. 1b - Individuální kalkulace R - položek

Slavba: stavba č. 44151 TV Rekonstrukce stoky D
 10
 Číslo ZL: Změna povrchových úprav terénu
 Název ZL: SO 08a Povrchové úpravy - komunikace, SO 08b Povrchové úpravy - zeleň, SO 03 Výústní objekt a Přítoková stoka DN2000
 Objekt:

Č. p.	Položka	MJ	Přímé náklady			Nepřímé náklady			Zisk	Odbytová cena	
			Přímý materiál	Přímé mzdy	Stroje	OPN	Subdodávky	Výrobní režie			Správní režie
3482121R1	Zdivo plochých zdí a podezdívek z lomového kamene (šedic - leřit, lom Dubičná) na sucho z pravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene do 0.02 m3	m3	0,00	0,00	0,00	0,00	28 850,00	3 211,87	1 937,81	1 233,15	35 232,82
55391420.R	Výroba a dodávka ocelového zábradlí nad výústním objektem (vč. povrchové úpravy)	kpl	9 679,42	46 846,40	0,00	0,00	0,00	6 293,02	3 796,74	2 416,11	69 031,69
424424100R2	Ochranná ocelová výklopná mříž dle výkresu D3.3 z 08/2023	kus	10 628,59	33 446,40	0,00	0,00	0,00	4 906,87	2 960,44	1 863,92	53 826,21

ROZBOR PŘÍMÝCH NÁKLADŮ

Pol. č.

55391420.R

MJ:

kpl

Výroba a dobývka ocelového zábradlí nad výústním objektem (vč. povrchové úpravy)

PŘÍMÝ MATERIÁL					
Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem
	trubka ocelová bežešvá hladká jakost 11 353 44,5x3,2mm	m	10,87	258,00	2 804,72
	tyč ocelová čtvercová jakost S235JR (11 375) 30x30mm	kg	77,64	36,50	2 833,86
	tyč ocelová čtvercová jakost S235JR (11 375) 20x20mm	kg	32,91	36,50	1 201,22
	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 30x8mm	kg	11,16	36,70	409,57
	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 30x5mm	kg	3,36	36,70	123,31
	tyč ocelová kruhová jakost S235JR (11 375) D 50mm	kg	3,96	36,50	144,54
	ztratiné, proféz, pomocny a montážní materiál (15%)	kpl	1,00	1 127,58	1 127,58
	KOVÁŘSKÁ BARVA S2160/0950 KOVÁŘSKÁ ČERN 2,5 L	ks	1,00	1 034,62	1 034,62
Celkem přímý materiál					9 679,42

PŘÍMÉ MZDY

Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem
	zámečnick	Nh	84,00	390,00	32 760,00
	technik pro vypracování dílenské dokumentace zábradlí	Nh	4,00	550,00	2 200,00
	odvody	%	34,00		11 886,40
Celkem přímé mzdy					46 846,40

ROZBOR PŘÍMÝCH NÁKLADŮ

Pol. č.

424424100R2

MJ:

kpl


Ochranná ocelová výklopná mříž dle výkresu D3.3 z 08/2023

PŘÍMÝ MATERIÁL						
Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem	
	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 50x8mm	kg	96,10	37,30	3 584,53	
	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 60x10mm	kg	8,90	37,10	330,19	
	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 100x10mm	kg	10,00	37,20	372,00	
	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 12mm tabule	kg	56,40	38,40	2 165,76	
	tyč ocelová kruhová jakost S235JR (11 375) D 25mm	kg	12,90	38,80	500,52	
	tyč ocelová kruhová jakost S235JR (11 375) D 30mm	kg	6,10	38,80	236,68	
	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x60x6mm	kg	6,90	36,70	253,23	
	zřetavné, profez, pomocný a montážní materiál (15%)	kpl	1,00	1 116,44	1 116,44	
	KOVÁŘSKÁ BARVA SZ160/0950 KOVÁŘSKÁ ČERNĚ 2,5 L	ks	2,00	1 034,62	2 069,24	
Celkem přímý materiál					10 628,59	

PŘÍMÉ MZDY					
Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem
	zámečnick	Nh	64,00	390,00	24 960,00
	odvody	%	34,00		8 486,40
Celkem přímé mzdy					33 446,40

stavba č. 44151 TV Rekonstrukce stoky D		FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY			OZ č. 11
Komu: INV MHMP		Datum: 17.10.2023	
Odesláno/ předáno:	osobně		osobně
Týká se:		SOD č. DIL/21/08/007142/2021	
Odkazy: na specifikaci:		-	
na výkresy:	Výkres č. D5.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA, Výkres č. D5.2 - ARMATURNÍ KOMORA,		
na rozpočtové podklady:	Specifikace prací zpracoval: projektant		
na jinou část smlouvy:	-		
kategorizace položek:	Smlouva o dílo, kalkulace, ÚRS		
<p>Z důvodu zrušení oplocení objektu je nutné upravit návrh objektu SO-05 Přípojka vodovodu. Hydranty určené k proplachu a udržovacím pracím by mohly být veřejností zaměněny za zdroj k hašení, ale tyto parametry nesplňují. Proto budou umístěny dovnitř retenční nádrže, bude proveden jádrový vrt a odbočka z vodovodnímu řádu do spádu k zimnímu vypouštění.</p>			
<p>Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno: Změnou povrchových úprav terénu</p>			
[REDACTED]			
změny (1 OZ).			

111
156

stavba č. 44151 TV Rekonstrukce stoky D			FO 2						
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			NOZ č. 11						
NOZ zpracoval: Zhotovitel		Datum: 3.11.2023							
NOZ č. 11 navazuje na:	OZ č. 11	PZ č. -	PL č.: -						
Odesláno/ předáno:	Osobně		osobně						
<p>V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/08/007142/2021 předkládáme návrh úpravy</p> <p>dohodnuté ceny</p> <p>zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady: Příloha k NOZ č. 11 – Změnový rozpočet</p> <p>Cena stavebních prací:</p> <table> <tr> <td>Cena odpočty</td> <td>- 74 820,79 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena přípočty</td> <td>93 612,25 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem</td> <td>18 791,46 Kč</td> </tr> </table> <p>V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/08/007142/2021 Zhotovitel provede Odkladnou-Neodkladnou změnu dle čl. 4 Smlouvy, zpracuje a předloží Příkazníkovi Specifikaci díla a kalkulaci ceny Odkladné-Neodkladné změny. Příkazník provede kontrolu její věcné i množství správnosti i určení ceny podle pravidel uvedených v SOD.</p> <p>Počet listů příloh: 3</p>				Cena odpočty	- 74 820,79 Kč	Cena přípočty	93 612,25 Kč	Cena celkem	18 791,46 Kč
Cena odpočty	- 74 820,79 Kč								
Cena přípočty	93 612,25 Kč								
Cena celkem	18 791,46 Kč								
Navrhovaná změna ceny díla (slovy):									
Osmnáct tisíc sedm set devadesát jedna korun českých čtyřicet šest haléřů									
_____ (bez DPH)									
									
Da									

ZMĚNOVÝ ROZPOČET

Příloha č. 1 - Změnový rozpočet

Stavba: stavba č. 44151 TV Rekonstrukce stoky D
 Číslo ZL: 11
 Název ZL: Úprava vodovodní přípojky
 Objekt: SO 05a Přípojka vodovodu

Poř. č.	Kód	POPIS	MJ	SoD			Po změně			Vícepráce/měněnípráce		
				Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
3		SO 05a Přípojka vodovodu										
		Svislé a kompletní konstrukce										
62	311101215	Vytvoření prostupů nebo suchých kanáliků z betonových zádek nosných z monolitického betonu a železobetonu vodotěsných, šikmých, obloukových, zalomených, svislých	M	7,000	1 191,84	8 342,88	9,000	1 191,84	10 726,56	2,000	1 191,84	2 383,68
63	28342000R	systemový přístup	KUS	7,000	7 023,35	49 163,45	9,000	7 023,35	63 210,35	2,000	7 023,35	14 046,70
8		Trubní vedení										
27	851241131	Montáž potrubí z trub línových tlakových hrubových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 80	M	7,200	161,47	1 162,58	0,000	161,47	0,00	-7,200	161,47	-1 162,58
28	55252015	troubá vodovodní línová hrdlová dl 6m DN 80	M	5,640	1 009,10	5 718,62	0,000	1 009,10	0,00	-5,640	1 009,10	-8 718,62
29	857242122	Montáž línových tvarovek na potrubí línovým tlakovým jednotných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	KUS	6,000	856,64	5 139,84	0,000	856,64	0,00	-6,000	856,64	-5 139,84
30	550005006316	PRÍRUBA ISO 5063	KUS	2,000	1 724,61	3 449,22	0,000	1 724,61	0,00	-2,000	1 724,61	-3 449,22
31	5050080020016	KOLENO PATNI PRÍRUBOVÉ DLOUHÉ 80	KS	2,000	2 665,25	5 330,50	0,000	2 665,25	0,00	-2,000	2 665,25	-5 330,50
32	8550080005016	TVAROVKA REDUKČNÍ PFR 80-50	KS	2,000	1 175,45	2 350,90	0,000	1 175,45	0,00	-2,000	1 175,45	-2 350,90
33	883001607000	SROUB S MATICÍ NEREZ A2 M16/70	KS	80,000	27,77	2 221,60	32,000	27,77	888,64	-48,000	27,77	-1 332,96
34	8872016000003	PODLOŽKA NEREZ M16	KS	160,000	1,71	273,60	62,000	1,71	106,32	-98,000	1,71	-167,58
45	891247111	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	KUS	2,000	327,68	655,36	0,000	327,68	0,00	-2,000	327,68	-655,36
46	422723665	Hydrant podzemní DN 100 PN 16 dvojitý uzavěr s koulí krycí v 1500mm	KUS	2,000	19 899,71	39 779,42	0,000	19 899,71	0,00	-2,000	19 899,71	-39 779,42
69	899401113	Osazení kolenů línových hydrantových	KUS	2,000	1 014,06	2 028,12	0,000	1 014,06	0,00	-2,000	1 014,06	-2 028,12
70	42291452	potrubí línových hydrantových DN 80	KUS	2,000	1 489,80	2 979,60	0,000	1 489,80	0,00	-2,000	1 489,80	-2 979,60
71	3482000000000	PODKLAD DESKA POD HYDRANT POKLCP	KS	2,000	325,36	650,72	0,000	325,36	0,00	-2,000	325,36	-650,72
36	871211211	Montáž vodovodního potrubí z plastu v otevřeném výkopu z polyetylénu PE 100 svařovanými elektrovarovkami SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm	M	77,000	117,86	9 075,22	93,600	117,86	11 031,70	16,600	117,86	1 956,48
37	109983100	plná voda - roura PE100 d63x5,8mm SDR11/PN16, návrh 100m	M	78,155	76,97	6 015,59	85,004	76,97	7 312,46	16,849	76,97	1 296,87
38	000612665	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylénu PE 100 elektrovarovkou SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 63	KUS	6,000	292,99	1 757,94	8,000	292,99	2 343,92	2,000	292,99	885,98
ZL11_1	877261000.R	elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 d 63 s držádem	KUS	6,000	124,76	748,56	8,000	124,76	988,04	2,000	124,76	249,52
ZL11_2	28654292	koleno uzavřené d 63	kus	0,000	0,00	0,00	2,000	596,00	1 192,00	2,000	596,00	1 192,00
ZL11_3	877200000.R	koleno kanovek d 63	kus	0,000	0,00	0,00	2,000	1 250,00	2 500,00	2,000	1 250,00	2 500,00
ZL11_4	28654292.R	balonová koncovka B75 s vnitřním závitem + záselečka B75	kus	0,000	0,00	0,00	2,000	596,00	1 192,00	2,000	596,00	1 192,00
ZL11_5	596235300.R	kolenní potrubí	kus	0,000	0,00	0,00	2,000	898,83	1 797,66	2,000	898,83	1 797,66
ZL11_6	891211222	Montáž vodovodních armatur na potrubí soupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s průřezem DN 50	kus	0,000	0,00	0,00	6,000	85,00	510,00	6,000	85,00	510,00
ZL11_7	42221300.R	elektrormainetický ventil na vodu DN 50	kus	0,000	0,00	0,00	2,000	6 941,54	13 883,08	2,000	6 941,54	13 883,08
ZL11_8	891181295	Montáž vodovodních armatur na potrubí Příplatek k ceně za montáž v objektech DN od 40 do 1200	kus	0,000	0,00	0,00	2,000	51,80	103,20	2,000	51,80	103,20
ZL11_9	891261222.R	Osazení čerpadla	kus	0,000	0,00	0,00	1,000	1 230,00	1 230,00	1,000	1 230,00	1 230,00
ZL11_10	56241093.R	mlsle kalové čerpadlo	kus	0,000	0,00	0,00	1,000	39 140,80	39 140,80	1,000	39 140,80	39 140,80
	998	Přesun hmot										
86	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo skloaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu (dobrávní vzdálenost do 15	T	240,107	1 147,67	275 563,60	239,170	1 147,67	274 488,23	-0,937	1 147,67	-1 075,37

ZMĚNOVÝ ROZPOČET

Stavba: stavba č. 44151 TV Rekonstrukce stoky D
 Číslo ZL: 11
 Název ZL: Úprava vodovodní přípojky
 Objekt: SO 05a Přípojka vodovodu

Poř. č.	Kód	POPIS	MJ	SoD		Po změně		Vícepráce/měněpráce	
				Množství celkem	Cena jednotková	Množství celkem	Cena jednotková	Množství celkem	Cena jednotková
	767	Konstrukce zámečnické							
ZL11_11	767995114	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotností přes 20 do 50 kg	kg	0,000	0,00	50,000	52,10	50,000	52,10
ZL11_12	159521000.3	Konstrukce zámečnické ocel. vč. prolezu	t	0,000	0,00	0,053	132 200,00	0,053	132 200,00
ZL11_13	159521000.2	Srovnávací materiál nerez - max. 5 % z dodávky Ock	soubor	0,000	0,00	1,000	350,33	1,000	350,33
ZL11_14	998767101	Přesun hmoti pro zámečnické konstrukce stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodovodná dorazovní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,000	0,00	0,057	1 550,00	0,057	1 550,00
CELKEM (BEZ DPH)					425 407,32		444 198,78		18 791,46

měněpráce


vícepráce - nové položky

vícepráce - stávající položky


Příloha č. 1b - Individuální kalkulace R - položek

Stavba: stavba č. 44151 TV Rekonstrukce stoky D
 Číslo ZL: 11
 Název ZL: Úprava vodovodní přípojky
 Objekt: SO 05a Přípojka vodovodu

Č. p.	Položka	MJ	Přímé náklady			Nepřímé náklady			Zisk	Odbytová cena	
			Přímý materiál	Přímé mzdy	Stroje	OPN	Subdotávky	Výrobní režie			Správní režie
28654292.R	Isjometová koncovka B75 s vnitřním závitem + záselepka B75	kus	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,94	49,44	31,46	898,83
42221300.R	elektromagnetický ventil na vodu DN 50	kus	5 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,80	381,76	242,95	6 941,54
56241093.R	malé kalové čerpadlo	kus	32 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 568,12	2 152,74	1 369,93	39 140,80

stavba č. 44151 TV Rekonstrukce stoky D		FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZ č. 12	
Komu: INV MHMP		Datum: 17.10.2023	
Odesláno/ předáno:	osobně		osobně
Týká se:		SOD č. DIL/21/08/007142/2021	
Odkazy: na specifikaci:		-	
na výkresy:	Výkres č. D08 a D03 TECHNICKÁ ZPRÁVA (v revizi ze dne 20.6.2023), Výkres č. D3.1 SITUACE PODÉLNÉ A PŘÍČNÉ ŘEZY (v revizi ze dne 20.6.2023)		
na rozpočtové podklady:	Specifikace prací zpracoval: projektant		
na jinou část smlouvy:	-		
kategorizace položek:	Smlouva o dílo, ÚRS		
<p>Změna je vyvolaná požadavkem budoucího správce (OCP) ohledně nahrazení původně navrženého zpevnění koryta výtoku z výústního objektu za lomový kámen (balvanitá rovnanina) s váhou jednoho kusu min. 200 – 500 kg s proštěrkováním a vyklínováním spár. Budoucí správce (OCP) požaduje, aby rovnaniny byly realizovány materiálem z lomu Běllice.</p>			
Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno: Požadavky budoucího správce			
<p>Foto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování návrhu na účelovou změnu (ÚOZ). Nemí tedy potvrzením změny (PoZ).</p>			

111
s. s.
1554/1156
0 Brno
796
42796

stavba č. 44151 TV Rekonstrukce stoky D			FO 2							
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			NOZ č. 12							
NOZ zpracoval: Zhotovitel			Datum: 17.10.2023							
NOZ č. 12 navazuje na:	OZ č. 12	PZ č. -	PL č.: -							
Odesláno/ předáno:	Osobně			osobně						
<p>V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/08/007142/2021 předkládáme návrh úpravy</p> <p>dohodnuté ceny</p> <p>zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady: Příloha k NOZ č. 12 – Změnový rozpočet</p> <p>Cena stavebních prací:</p> <table> <tr> <td>Cena odpočty</td> <td>- 676 631,35 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena přípočty</td> <td>808 767,23 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem</td> <td>132 135,88 Kč</td> </tr> </table> <p>V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/08/007142/2021 Zhotovitel provede Odkladnou-Neodkladnou změnu dle čl. 4 Smlouvy, zpracuje a předloží Příkazníkovi Specifikaci díla a kalkulaci ceny Odkladné-Neodkladné změny. Příkazník provede kontrolu její věcné i množstevní správnosti i určení ceny podle pravidel uvedených v SOD.</p> <p>Počet listů příloh: 2</p>					Cena odpočty	- 676 631,35 Kč	Cena přípočty	808 767,23 Kč	Cena celkem	132 135,88 Kč
Cena odpočty	- 676 631,35 Kč									
Cena přípočty	808 767,23 Kč									
Cena celkem	132 135,88 Kč									
Navrhovaná změna ceny díla (slovy):										
Sto třicet dva tisíc sto třicet pět korun českých osmdesát osm haléřů										
(bez DPH)										
OB										
Dat										



ZMĚNOVÝ ROZPOČET

Příloha č. 1 - Změnový rozpočet

Stavba: stavba č. 44151 TV Rekonstrukce stoky D
 Číslo ZL: 12
 Název ZL: Změna opevnění koryta u výústního objektu
 Objekt: SO 03 Výústní objekt


Por. č.	Kód	POPIS	MJ	SoD		Po změně		Vícepráce/měněpráce	
				Množství celkem	Cena jednotková	Množství celkem	Cena jednotková	Množství celkem	Cena jednotková
		SO 03 Výústní objekt							
		Zemní práce							
ZL12_1	114203301	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárců získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a sousředovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru	m3	0,000	0,00	90,000	403,00	90,000	403,00
38	171151103	Uložení sypání do násypů a rozprostírání sypání ve vrstvách a s hrubým urovňáním	M3	45,000	135,90	85,000	135,90	40,000	135,90
14	58331200	šláchtování neřiděný záhybový	T	135,520	342,48	215,520	342,48	80,000	342,48
ZL12_2	271532212.K	Zakládání							
		Podsypaní pod základové konstrukce se zhuštěním a urovňáním povrchu z kamenniva hrubého, frakce 4 - 32 mm	m3	0,000	0,00	26,000	1 801,54	26,000	1 801,54
3		Svislá a kompletní konstrukce							
12	321213345	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, op.	M3	20,255	9 172,71	0,000	9 172,71	-20,255	9 172,71
13	953981113R	Kotvy chemické s vyvrtáním otvorů do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene (mel, velikost M 12, hloubka 110 mm včetně zámečnických úprav kotvy	KUS	162,000	72,78	0,000	72,78	-162,000	72,78
4		Vodorovné konstrukce							
ZL12_3	467510110.K	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 200 do 500 kg s urovňáním líců	m3	0,000	0,00	90,000	6 250,00	90,000	6 250,00
5		Komunikace pozemní							
ZL12_4	594511113	Kladiení dlažby z lomového kamene lomatsky upraveného v ploše vodorovně nebo ve sklonu na plochu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z betonu	m2	0,000	0,00	2,880	1 450,00	2,880	1 450,00
ZL12_5	58381088	Kámen lomový upravený šifovaný (80, 40, 20 cm), plískovec	t	0,000	0,00	2,160	3 770,00	2,160	3 770,00
14	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kamenniva drobného (léžného C až 4 mm)	M3	1,668	1 455,41	2 427,62	1 455,41	-1 668	1 455,41
15	457971112	Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem bez připravení k podkladu, s potřebným dočasným založením včetně zakotvení okraje o sklonu do 10°, šířky geotextilie p	M2	394,000	45,68	17 997,92	45,68	5 938,40	45,68
17	462451112	Profilní konstrukce z kamenného záhozu cementovou maltou MC-10	M3	22,300	3 534,60	78 821,98	3 534,60	-22 300	3 534,60
18	464511111	Pohoz dna nebo svahu jakékoliv tloušťky z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu	M3	163 800	1 652,85	270 736 83	1 652,85	-143 840	1 652,85
16	69311098	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2	M2	453,100	55,04	24 938,62	55,04	-303 600	55,04
ZL12_6	62995101	Úprava povrchů, podlahy a osazování výplní	m2	0,000	0,00	23,000	76,10	23,000	76,10
ZL12_7	62995201	Odštěpení vnějších ploch litakovou vodou omýlím	m2	0,000	0,00	23,000	253,00	23,000	253,00
8		Trubní vedení							
22	59710706	trouba kamennová glazovaná DN 400 dř 2 50m spojovací systém C Thida 200	M	10,302	7 475,61	77 013,73	7 475,61	-10,302	7 475,61
19	810441811	Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 400 do 600	M	10,000	3 988,54	3 985,40	3 988,54	-10,000	3 988,54
21	831392121	Montáž potrubí z trub kamenných hladových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 400	M	10,000	759,31	7 593,10	759,31	-10,000	759,31
20	890211811	Bourání sáček a jímek různé velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prostého betonu	M3	2,250	4 657,56	10 479,51	4 657,56	-2,250	4 657,56
987		Přesun sutě							
25	997013501R	Čistovzdušná a výbouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením	T	10,960	279,85	3 067,16	279,85	-10,960	279,85
26	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	T	10,960	195,95	2 147,61	195,95	-10,960	195,95

ZMĚNOVÝ ROZPOČET

Stavba: stavba č. 44151 TV Rekonstrukce stoky D
 Číslo ZL: 12
 Název ZL: Změna opevnění koryta u výústního objektu
 Objekt: SO 03 Výústní objekt

Poř. č.	Kod	POPIS	MJ	SoD			Po změně			Vícepráce/méněpráce		
				Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
27	997221961R 998	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (stlačkované) z prosého betonu zeříděného do Katalogu odřadu pod kódem 17 01 91 Přesun hmot	T	10,960	195,70	2 144,87	0,000	195,70	0,00	-10,960	195,70	-2 144,87
28	99R332011 782	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m Dokončovací práce - obklady z kamene	T	426,451	333,87	142 379,20	351,026	333,87	117 197,05	-75,425	333,87	-25 182,14
ZL12_8	782132412	Montáž obkladů stěn z tvrdých kamenů kladených do lepidla ze zlomků desek s upravením stran na místě přisekáním tl. přes 25 do 30 mm	m2	0,000	0,00	0,00	23,000	2 400,00	55 200,00	23,000	2 400,00	55 200,00
ZL12_9	58384670	nepravidelný kámen vápeneč světlolůžný, dlažba D 100-500mm tl 20-30mm	m2	0,000	0,00	0,00	23,000	1 080,00	24 840,00	23,000	1 080,00	24 840,00
ZL12_10	782981111	Obklady z kamene - ostatní práce rekonstrukce podkladu	m2	0,000	0,00	0,00	23,000	83,10	1 911,30	23,000	83,10	1 911,30
ZL12_11	782981116	Obklady z kamene - ostatní práce snárovaní epoxidem	m	0,000	0,00	0,00	115,000	235,00	27 025,00	115,000	235,00	27 025,00
ZL12_12	998782101	Přesun hmot pro obklady kamenné stěnovány z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,000	0,00	0,00	1,879	776,00	1 458,10	1,879	776,00	1 458,10
CELKEM (BEZ DPH)						883 845,14			1 025 981,01			132 135,88

méněpráce
 vícepráce - nové položky
 vícepráce - stávající položky

stavba č. 44151 TV Rekonstrukce stoky D		FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZ č. 13	
Komu: INV MHMP		Datum: 17.10.2023	
Odesláno/ předáno:	osobně		osobně
Týká se:		SOD č. DIL/21/08/007142/2021	
Odkazy: na specifikaci:	-		
na výkresy:	...		
na rozpočtové podklady:	Specifikace prací zpracoval: zhotovitel		
na jinou část smlouvy:	-		
kategorizace položek:	Smlouva o dílo, ÚRS		
Správce komunikace (TSK) ul. V Šáreckém údolí požaduje navýšit rozsah původně navržené opravy části této komunikace u budované nádrže.			
Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno: Požadavkem správce komunikace			
O			
Da			
To zm			

111
54/115b
796

stavba č. 44151 TV Rekonstrukce stoky D			FO 2
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			NOZ č. 13
NOZ zpracoval: Zhotovitel		Datum: 17.10.2023	
NOZ č. 13 navazuje na:	OZ č. 13	PZ č. -	PL č.: -
Odesláno/ předáno:	Osobně		osobně
<p>V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/08/007142/2021 předkládáme návrh úpravy</p> <p>dohodnuté ceny</p> <p>zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady: Příloha k NOZ č. 13 – Změnový rozpočet</p> <p>Cena stavebních prací:</p> <p>Cena odpočty - 11 379,15 Kč Cena přípočty 176 445,44 Kč Cena celkem 165 066,29 Kč</p> <p>V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/08/007142/2021 Zhotovitel provede Odkladnou-Neodkladnou změnu dle čl. 4 Smlouvy, zpracuje a předloží Příkazníkovi Specifikaci díla a kalkulaci ceny Odkladné-Neodkladné změny. Příkazník provede kontrolu její věcné i množství správnosti i určení ceny podle pravidel uvedených v SOD.</p> <p>Počet listů příloh: 1</p>			
Navrhovaná změna ceny díla (slovy):			
Sto šedesát pět tisíc šedesát šest korun českých dvacet devět haléřů			
(bez DPH)			
OBJEDNATEL:	ZHOTOVITEL:	PROJEKTANT:	ČÍSLO ZMĚNY:
[REDACTED]			

ZMĚNOVÝ ROZPOČET

Příloha č. 1 - Ziměnový rozpočet

Stavba: stavba č. 44151 TV Rekonstrukce stoky D
 Číslo ZL: 13
 Název ZL: Navýšení rozsahu opravovaných asfaltových ploch na komunikaci v ulici V Šáreckém údolí
 Objekt: SO 08a Povrchové úpravy - komunikace

Prof. č.	Kód	POPIS	MJ	SoD		Po změně		Vícepráce/měněnípráce	
				Množství celkem	Cena jednotková	Množství celkem	Cena jednotková	Množství celkem	Cena jednotková
1		SO 08a Povrchové úpravy - komunikace							
5	113154263	Zemní práce	M2	135,000	84,29	0,000	84,29	-135,000	84,29
ZL13_1	113154264	Frézování živícného podkladu nebo krytu s neložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m ² s překážkami v trase, pruhy šířky přes 1 m do 2 m, tloušťk. Frézování živícného krytu tl. 100 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m ² s překážkami v trase VV: 4 2 9 8 24 03 7 1	m2	0,000	0,00	211,773	113,00	23 930,35	113,00
40	57321106	Komunikace Poslák spojovací HS bez posyvu kamenným zt. smluču armuze, v množství 0,30 kg/m ² VV: 4 2 9 8 24 03 7 1 2-135	M2	493,000	42,81	278,046	42,81	288,546	12,81
41	577194211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACCO T1 (ABS) s rozprostřením a se ztlukáním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. tl. po ztlukání tl. 40 mm VV: 4 2 9 8 24 03 7 1 2-135	M2	300,000	391,41	298,546	391,41	288,546	391,41
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání							
ZL13_2	919732211	Sycená spára napojení nového živícného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s profézáním	m	0,000	0,00	45,000	116,00	5 220,00	116,00
997		Přesun sutě							
57	997221551R	Vodopravná zornava suší bez nalézení ale se sloužením a s hrubým provedením se sypkých materiálů na střední nebo k těžkosti	T	209,289	51,89	235,463	51,89	33 493	51,89
62	997221875R	Popelník za určení stavebního odpadu na rekvalitizaci skládky (skládkového) asfaltového bez obsahu dlehu zahrnutého do katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	T	62 300	611,50	96 240	611,50	56 554,50	611,50
CELKEM (BEZ DPH)						202 368,99		367 435,28	
									165 066,29

měnípráce
 vícepráce - nové položky
 vícepráce - stávající položky

Příloha č. 1 Dodatku č. 6 Smlouvy: Specifikace díla a kalkulace ceny Dodatku č. 6 Smlouvy – rekapitulace rozpočtu

Stavba: stavba č. 44151 TV Rekonstrukce stoky D

Smlouva č.: DIL/21/08/007142/2021

Změna ceny díla dle Dodatku č. 6 - rekapitulace				
NOZ	Popis	Vícepráce [Kč bez DPH]	Méněpráce [Kč bez DPH]	Cenový nárůst související se změnou [Kč bez DPH]
NOZ3	Změna zařídění stavebního odpadu	7 766 400,00	-3 214 228,73	4 552 171,27
NOZ10	Změna povrchových úprav terénu	2 324 059,47	-2 107 967,42	216 092,05
NOZ11	Úprava vodovodní přípojky	93 612,25	-74 820,79	18 791,46
NOZ12	Změna opevnění koryta u výústního objektu	808 767,23	-676 631,35	132 135,88
NOZ13	Navýšení rozsahu opravovaných asfaltových ploch na komunikaci v ulici V Šáreckém údolí	176 445,44	-11 379,15	165 066,29
	CELKEM	11 169 284,39	-6 085 027,44	5 084 256,95

příloha č. 2 Dodatku č. 6: Specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců – provozovatelů

Specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců – provozovatelů

Číslo a název objektu	Celková cena Díla dle objektů	Ze sl. 2 rozdělení ceny Díla dle budoucích správců – provozovatelů (uvést pouze správce, týkající se konkrétní stavby)	
		PVS	MHMP OCP - odbor ochrany prostředí
		3	4
1	2	3	4
ON Ostatní náklady	4 003 371,06	4 003 371,06	0,00
SO 01 Retenční nádrž OK_3D Evropská	105 023 901,29	105 023 901,29	0,00
SO 02 Odtoková stoka DN300	5 755 408,89	5 755 408,89	0,00
SO 03 Výústní objekt	1 486 713,85	1 356 390,95	130 322,90
SO 04 Přítoková stoka DN2000	16 388 697,28	16 388 697,28	0,00
SO 05a Přípojka vodovodu	1 071 638,18	1 071 638,18	0,00
SO 05b Přípojka el.energie	397 982,58	397 982,58	0,00
SO 06 Zařízení pro MaR a datové přenosy	1 145 616,32	1 145 616,32	0,00
SO 07 Ochrana a přeložky inženýrských sítí	1 210 751,74	1 210 751,74	0,00
SO 08a Povrchové úpravy - komunikace	3 549 223,41	2 143 536,39	1 405 687,02
SO 08b Povrchové úpravy - zeleň	1 218 160,24	1 051 237,89	166 922,35
SO 09 Přípojky pro zařízení staveniště	1 118 335,22	1 118 335,22	0,00
VRN Vedlejší rozpočtové náklady	14 250 984,88	14 250 984,88	0,00
Cena stavby bez DPH	156 620 784,94	154 917 852,67	1 702 932,27
DPH 21 %	32 890 364,84	32 532 749,06	357 615,78
Cena stavby vč. DPH	189 511 149,78	187 450 601,73	2 060 548,05
