

Ev.č.: 65/17-CSMV
Č.J.: TS-484/2017**Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO**u objednatele evidované pod číslem TS-570/OEO-2016
u zhotovitele evidované pod číslem SOD 16 - 017**název akce: „MV – Praha 7 – Stromovka – rekonstrukce a zateplení střechy atletické haly dle projektové dokumentace“**uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)**Článek I.
Smluvní strany**

Název: OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA
organizační složka státu zřízená od 1. ledna 2009 zřizovací
listinou vydanou Ministerstvem vnitra ČR pod č.j. MV61877-
6/TS-2008 ze dne 25. září 2008.

Sídlo: Za Císařským mlýnem 1063, 170 06 Praha 7

IČO: 75151898

DIČ: nejsme plátcí DPH

Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha 1

Číslo účtu: [REDACTED]

Zastoupená: Ing. Jiří Beranem, ředitelem OLYMP CENTRA SPORTU
MINISTERSTVA VNITRA,

Kontaktní osoba: Bc. Michal Janků, tel.: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Název: PROXIMA a.s.

Sídlo: Charlese de Gaulla 3/800, 160 00 Praha 6

Kontaktní adresa: Charlese de Gaulla 3/800, 160 00 Praha 6

IČO: 60916478

DIČ: CZ60916478

Jejmž jménem jedná: Ing. Karel Chorvát, statutární ředitel

Kontaktní osoba: Ing. Rudolf Jiran

Bankovní spojení: KB Praha 6

Číslo účtu: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4616.

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají **tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo evidované pod číslem TS-570/OEO-2016**
(dále jen „smlouva o dílo“), kterým se mění a doplňuje smlouva o dílo v těchto ustanoveních:

I. TERMÍN ZHOTOVENÍ DÍLA, PŘEDÁNÍ DÍLA – DOPLNĚNÍ

Tímto článkem se doplňuje čl. III – ZPŮSOB A TERMÍN ZHOTOVENÍ DÍLA, PŘEDÁNÍ DÍLA – odstavec 5. smlouvy o dílo takto:

Smluvní strany se s ohledem na změnu rozsahu dodávky a klimatické vlivy dohodly na prodloužení termínu zhotovení a předání díla, a to nejpozději do 18. 7. 2017 (tj. dílo tak bude dokončeno a předáno nejpozději do 18. 7. 2017). Důvodem prodloužení termínu jsou nevhodné klimatické podmínky, kdy bylo nutno přerušit práce na díle z důvodu vytrvalého deště po dobu 9 dnů a navýšení rozsahu díla o instalaci nového okapového systému. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č. 1. „Harmonogram prací se zohledněním nepříznivých klimatických podmínek“, příloha č. 2. Harmonogram prací plánovaný a příloha č. 3. Harmonogram zohledňující klimatické vlivy a doplnění rozsahu prací.

Ostatní ustanovení Článku III. smlouvy o dílo ZPŮSOB A TERMÍN ZHOTOVENÍ DÍLA, PŘEDÁNÍ DÍLA zůstávají v platnosti a účinnosti a beze změny.

II. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Jeho platnost končí splněním závazků obou smluvních stran.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech exemplářích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
3. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k tomuto dodatku své podpisy.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo u objednatele evidované pod č. TS-570/OEO-2016 u zhotovitele evidované pod č. SOD 16 - 017 zůstávají beze změn.
5. Tento dodatek tvoří nedílnou součást Smlouvy o dílo u objednatele evidované pod č. TS-570/OEO-2016 u zhotovitele evidované pod č. SOD 16 - 017.

Přílohy:

- č. 1. *Harmonogram prací se zohledněním nepříznivých klimatických podmínek (1 list)*
- č. 2. *Harmonogram prací plánovaný (1 list)*
- č. 3. *Harmonogram prací zohledňující klimatické vlivy a doplnění rozsahu prací (1 list)*

V Praze dne 30.06.2017

Za objednatele:



Ing. Jiří Beran

(Ředitel)
OLYMP CENTRUM SPORTU
MINISTERSTVA VNITRA



Za zhotovitele:



Ing. Karel Chorvát
statutární ředitel
PROXIMA a.s.




ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	XII 2016		I 2017		II 2017		III 2017		IV 2017		V 2017		VI 2017		VII 2017		VIII 2017		IX 2017		X																			
						14	21	28	5	12	19	26	2	9	16	23	30	6	13	20	27	6	13	20	27	3	10	17	24	1	8	15	22	29	5	12	19	26	3	10	17	24	31	7	14
1	Převzetí staveniště,	0 dny	28.11. 16	28.11. 16		28.11. ◆ Převzetí staveniště.																																							
2	Zařízení staveniště.	3 dny	28.11. 16	30.11. 16 1		28.11. ▣ Zařízení staveniště.																																							
3	Přerušení stavby z klimatických důvodů	0 dny	3.12. 16	3.12. 16		3.12. ◆ Přerušení stavby z klimatických důvodů																																							
4	Zahájení prací v roce 2017	0 dny	22.3. 17	22.3. 17		22.3. ◆ Zahájení prací v roce 2017																																							
5	Zajištění vstupů do haly,	3 dny	22.3. 17	24.3. 17 4		22.3. ▣ Zajištění vstupů do haly.																																							
6	Odstranění hromosvodu.	7 dny	22.3. 17	28.3. 17 4		22.3. ▣ Odstranění hromosvodu.																																							
7	Příprava střechy (v několika etapách)	55 dny	28.3. 17	21.5. 17		28.3. ▣ Lešení.																																							
8	Lešení.	45 dny	28.3. 17	11.5. 17 6FS-1 den		28.3. ▣ Lešení.																																							
9	Odstranění doplňků střešního pláště.	45 dny	31.3. 17	14.5. 17 8SS+3 dny		31.3. ▣ Odstranění doplňků střešního pláště.																																							
10	Odstranění asfaltové krytiny a bonských šindelů.	45 dny	1.4. 17	15.5. 17 9SS+1 den		1.4. ▣ Odstranění asfaltové krytiny a bonských šindelů.																																							
11	Odstranění dřevěného bednění vč. odhřebikování a uložení pro zpětné použití.	45 dny	4.4. 17	18.5. 17 10SS+3 dny		4.4. ▣ Odstranění dřevěného bednění vč. odhřebikování a uložení pro zpětné použití.																																							
12	Odstranění původní minerální vaty a pojistné izolace.	45 dny	7.4. 17	21.5. 17 11SS+3 dny		7.4. ▣ Odstranění původní minerální vaty a pojistné izolace.																																							
13	Realizace střechy (v několika epatách)	76 dny	9.4. 17	23.6. 17		9.4. ▣ Prohlídka mykologem.																																							
14	Prohlídka mykologem.	45 dny	9.4. 17	23.5. 17 12SS+2 dny		9.4. ▣ Prohlídka mykologem.																																							
15	Ochranný nátěr dřevěných kci.	45 dny	10.4. 17	24.5. 17 14SS+1 den		10.4. ▣ Ochranný nátěr dřevěných kci.																																							
16	Minerální izolace vč. zajištění proti sesunutí.	45 dny	11.4. 17	25.5. 17 15SS+1 den		11.4. ▣ Minerální izolace vč. zajištění proti sesunutí.																																							
17	Celoplošné bednění.	45 dny	18.4. 17	1.6. 17 16SS+7 dny		18.4. ▣ Celoplošné bednění.																																							
18	Pojistná fólie.	45 dny	21.4. 17	4.6. 17 17SS+3 dny		21.4. ▣ Pojistná fólie.																																							
19	Kontralatě a latě.	45 dny	24.4. 17	7.6. 17 18SS+3 dny		24.4. ▣ Kontralatě a latě.																																							
20	Velkoformátová krytina.	45 dny	27.4. 17	10.6. 17 19SS+3 dny		27.4. ▣ Velkoformátová krytina.																																							
21	Detaily napojení a provětavání.	45 dny	4.5. 17	17.6. 17 20SS+7 dny		4.5. ▣ Detaily napojení a provětavání.																																							
22	Dokončovací práce - zpětná mtž dopřků střešního pláště.	45 dny	7.5. 17	20.6. 17 21SS+3 dny		7.5. ▣ Dokončovací práce - zpětná mtž dopřků střešního pláště.																																							
23	Dmtž lešení.	45 dny	10.5. 17	23.6. 17 22SS+3 dny		10.5. ▣ Dmtž lešení.																																							
24	Montáž hromosvodu.	14 dny	11.6. 17	24.6. 17 20		11.6. ▣ Montáž hromosvodu.																																							
25	Úklid a drobné dokončovací práce.	14 dny	20.6. 17	3.7. 17 23FS-4 dny		20.6. ▣ Úklid a drobné dokončovací práce.																																							
26	Předání stavby.	0 dny	3.7. 17	3.7. 17 25		3.7. ◆ Předání stavby.																																							

Střešní plášť atletické haly Otakara Jandery Centrum sportu MV ČR	Úkol		Vnější úkoly		Pouze s dobou trvání	
	Milník		Souhrn projektu		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
	Souhrnný		Seskupit podle souhrnu		Ruční souhrn	
	Zahrnutý úkol		Neaktivní úkol		Pouze zahájení	
	Zahrnutý milník		Neaktivní milník		Pouze s datem dokončení	
	Zahrnutý průběh		Neaktivní souhrn		Průběh	
	Rozdělení		Ruční úkol			

Harmonogram prací se zohledněním nepříznivých klimatických podmínek

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	XII 2016												I 2017												II 2017												III 2017												IV 2017												V 2017												VI 2017												VII 2017												VIII 2017												IX 2017												X											
						14.	21.	28.	5.	12.	19.	26.	2.	9.	16.	23.	30.	6.	13.	20.	27.	6.	13.	20.	27.	3.	10.	17.	24.	1.	8.	15.	22.	29.	5.	12.	19.	26.	3.	10.	17.	24.	31.	7.	14.	21.	28.	4.	11.	18.	25.																																																																																						
1	Převzetí staveniště.	0 dny	28.11. 16	28.11. 16		28.11.	◆ Převzetí staveniště.																																																																																																																																		
2	Zařízení staveniště.	3 dny	28.11. 16	30.11. 16		28.11.	■ Zařízení staveniště.																																																																																																																																		
3	Přerušení stavby z klimatických důvodů	0 dny	3.12. 16	3.12. 16		3.12.	◆ Přerušení stavby z klimatických důvodů																																																																																																																																		
4	Zahájení prací v roce 2017	0 dny	22.3. 17	22.3. 17																																																																																																																																					
5	Zajištění vstupů do haly.	3 dny	22.3. 17	24.3. 17																																																																																																																																					
6	Odstranění hromosvodu.	7 dny	22.3. 17	28.3. 17																																																																																																																																					
7	Příprava střechy (v několika etapách)	55 dny	28.3. 17	21.5. 17																																																																																																																																					
8	Lešení.	45 dny	28.3. 17	11.5. 17	6FS-1 den																																																																																																																																				
9	Odstranění doplnků střešního pláště.	45 dny	31.3. 17	14.5. 17	8SS+3 dny																																																																																																																																				
10	Odstranění asfaltové krytiny a bonských šindelů.	45 dny	1.4. 17	15.5. 17	9SS+1 den																																																																																																																																				
11	Odstranění dřevěného bednění vč. odhřebikování a uložení pro zpětné použití.	45 dny	4.4. 17	18.5. 17	10SS+3 dny																																																																																																																																				
12	Odstranění původní minerální vaty a pojistné izolace.	45 dny	7.4. 17	21.5. 17	11SS+3 dny																																																																																																																																				
13	Realizace střechy (v několika etapách)	85 dny	9.4. 17	2.7. 17																																																																																																																																					
14	Prohlídka mykologem.	45 dny	9.4. 17	23.5. 17	12SS+2 dny																																																																																																																																				
15	Ochranný nátěr dřevěných kci.	45 dny	10.4. 17	24.5. 17	14SS+1 den																																																																																																																																				
16	Minerální izolace vč. zajištění proti sesunutí.	45 dny	11.4. 17	25.5. 17	15SS+1 den																																																																																																																																				
17	Celoplošné bednění.	45 dny	18.4. 17	1.6. 17	16SS+7 dny																																																																																																																																				
18	Pojistná fólie.	45 dny	21.4. 17	4.6. 17	17SS+3 dny																																																																																																																																				
19	Kontralaté a latě.	45 dny	24.4. 17	7.6. 17	18SS+3 dny																																																																																																																																				
20	Velkoformátová krytina.	45 dny	6.5. 17	19.6. 17	19SS+12 dny																																																																																																																																				
21	Detaily napojení a prověťování.	45 dny	13.5. 17	26.6. 17	20SS+7 dny																																																																																																																																				
22	Dokončovací práce - zpětná mtz doplnků střešního pláště.	45 dny	16.5. 17	29.6. 17	21SS+3 dny																																																																																																																																				
23	Dmť lešení.	45 dny	19.5. 17	2.7. 17	22SS+3 dny																																																																																																																																				
24	Montáž hromosvodu.	14 dny	20.6. 17	3.7. 17	20																																																																																																																																				
25	Úklid a drobné dokončovací práce.	14 dny	29.6. 17	12.7. 17	23FS-4 dny																																																																																																																																				
26	Dodávka a montáž nového okapu	6 dny	13.7. 17	18.7. 17	25																																																																																																																																				
27	Předání stavby.	0 dny	18.7. 17	18.7. 17	26																																																																																																																																				

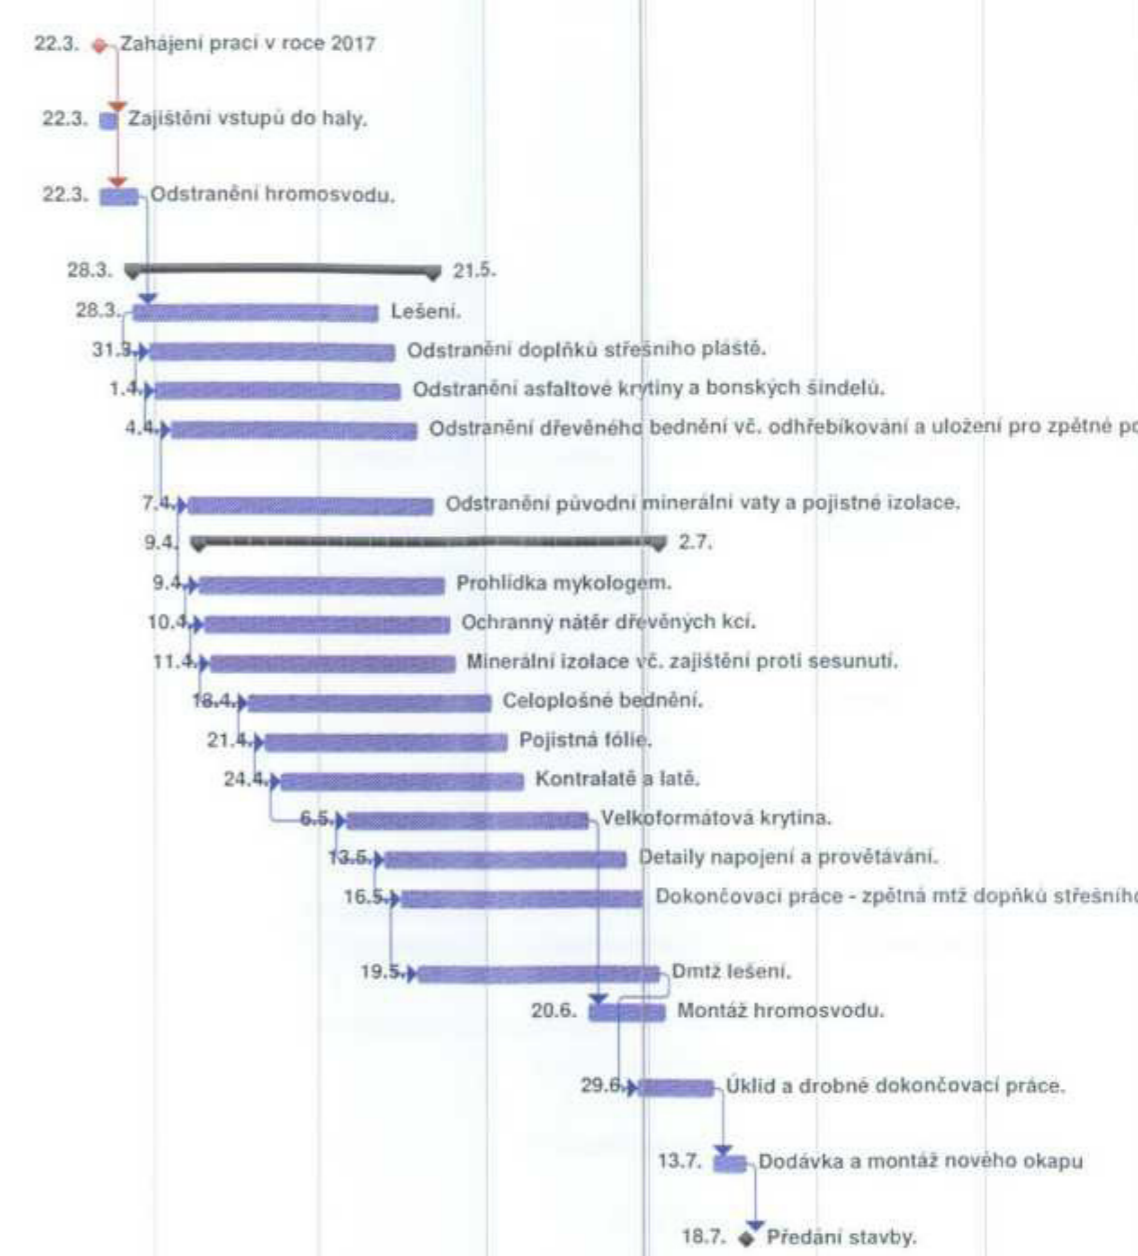

Sřešní plášť atletické haly Otakara Jandery Centrum sportu MV ČR	Úkol	■	Vnější úkol	■	Pouze s dobou trvání	■	
	Milník	◆	Souhrn projektu	◆	Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	◆	
	Souhrnný	■	Seskupil podle souhrnu	■	Ruční souhrn	■	
	Zahrnutý úkol	■	Neaktivní úkol	□	Pouze zahájení	□	
	Zahrnutý milník	◆	Neaktivní milník	◇	Pouze s datem dokončení	◇	
	Zahrnutý průběh	■	Neaktivní souhrn	■	Průběh	■	
	Rozdělení	Ruční úkol	■			

Harmonogram prací se zohledněním nepříznivých klimatických podmínek

Příloha č. 3
