

**Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo  
ze dne 11. 7. 2022**

(dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů)  
(dále jen „**Dodatek č. 3**“)

**I. Smluvní strany**

**Fakultní nemocnice Ostrava**

se sídlem: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava

IČ: 00843989

DIČ: CZ00843989 (je plátcem DPH)

zastoupená: MUDr. Jiřím Havrlantem, MHA, ředitelem

zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990, č. j. OP-054-25.11.90

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**PENTA PROJEKT s.r.o.**

se sídlem: Mrštíkova 1166/12, 586 01 Jihlava

IČ: 47916621

DIČ: CZ47916621 (je plátcem DPH)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 117727

zastoupená: Mgr. Zuzanou Homolkovou, jednatelkou

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně jako „**Smluvní strany**“)

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají výše uvedené Smluvní strany tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 11. 7. 2022, ve znění pozdějších dodatků, evidenční číslo Objednatele 001/OVZ/22/050-OD, evidenční číslo Zhotovitele A 18 - 22 (dále jen „**Smlouva**“).

## II. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly k dnešnímu dni na této změně Smlouvy, ve znění pozdějších dodatků, jejímž předmětem je „**FN Ostrava – Výstavba objektu Comprehensive cancer center – projektová dokumentace**“ a další činnosti dle Smlouvy.

1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 3 dohodly na změně termínu předání díla v části DPS, stanovené v čl. 6. odst. 6.1 Smlouvy, ve znění pozdějších dodatků. Smluvní strany se dohodly, že DPS bude Zhotovitelem provedena a Objednateli předána nejpozději do 31. 7. 2024.
2. Bližší odůvodnění dodatečných požadavků Objednatele, jež vedly k nutnosti posunu termínu předání díla v části DPS, je uvedeno v Oznámení o změnách akce č. 4, které tvoří přílohu č. 1 k tomuto Dodatku č. 3 (dále jen „**Příloha č. 1**“).

## III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy, tímto Dodatkem č. 3 výslovně nedotčená, zůstávají i nadále v platnosti a účinnosti.
2. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že se Smluvní strany na elektronické podobě neshodnou, bude Dodatek č. 3 vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá ze Smluvních stran.
3. Tento Dodatek č. 3 bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, v registru smluv. Uveřejnění Dodatku č. 3 v registru smluv zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 je Příloha č. 1 – Oznámení o změnách akce č. 4.
6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 3 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Ostravě dne \_\_\_\_\_

**Ing. Petra  
Lampartová**

Digitálně podepsal  
Ing. Petra Lampartová  
Datum: 2024.05.31  
07:35:07 +02'00'

### Objednatel

MUDr. Jiří Havrlant, MHA  
ředitel Fakultní nemocnice Ostrava

V Jihlavě dne \_\_\_\_\_

Digitálně podepsal Mgr. Zuzana  
Homolková  
Datum: 2024.05.30 08:15:05 +02'00'

### Zhotovitel

Mgr. Zuzana Homolková  
jednatelka spol. PENTA PROJEKT s.r.o.


#### Oznámení o změnách akce č 4.

<b>Identifikační údaje akce</b>	
Název	„FN Ostrava – Výstavba objektu Comprehensive cancer center – projektová dokumentace“
SOD ev.č. 001/OVZ/22/050-OD	
<b>Objednatel:</b>	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
<b>Zhotovitel</b>	
Název	PENTA PROJEKT s.r.o., IČ:47916621
Adresa	Mrštíkova 1166/12, 58601 Jihlava
<b>Oznámení vystavil:</b>	
[REDAKCE]	
<b>Navrhované změny akce</b>	
Prověření realizace dodatečných požadavků objednatele na případný další obsah projektové dokumentace, které si vyžádalo dodatečnou časovou náročnost na dokončení DPS.	
Konkrétně na základě jednání ze dne 18. 4. byla ještě upravena dispozice 1.PP Objektu MSOC a byla 22.4.2024 zaslána cenová nabídka dodatečné prověření ze strany projektanta možnosti zřízení nové strojovny potrubní pošty na střeše objektu energocentra s napojením nové lékárny a objektu MSOC na rozvod potrubní pošty. Zároveň byl požadavek na dodatečné zřízení datového centra v objektu MSOC.	
Na jednání dne 20. 5. 2024 dohodnuta konečná podoba DPS a řešení, která bude obsahovat.	
Uvedené vyžaduje posun termínu plnění pro předání DPS do 31. 7. 2024. Žádné cenové navýšení v souvislosti s touto činností, nebude uplatněno.	
<b>Zdůvodnění navrhovaných změn</b>	
Navrhované změny byly vyvolány dodatečnými požadavky objednatele.	
<b>Cena méně prací bez DPH:</b>	<b>Cena víceprací bez DPH:</b>
0,- Kč	0,- Kč
<b>Výsledná cena změn bez DPH:</b>	
	0,- Kč
	<b>Výsledná celková cena změny DPH</b>
	0,- Kč
	<b>Výsledná celková cena změny vč. DPH</b>
	0,- Kč
<b>Nově sjednaná lhůta dokončení díla:</b>	
31.7.2024	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum:

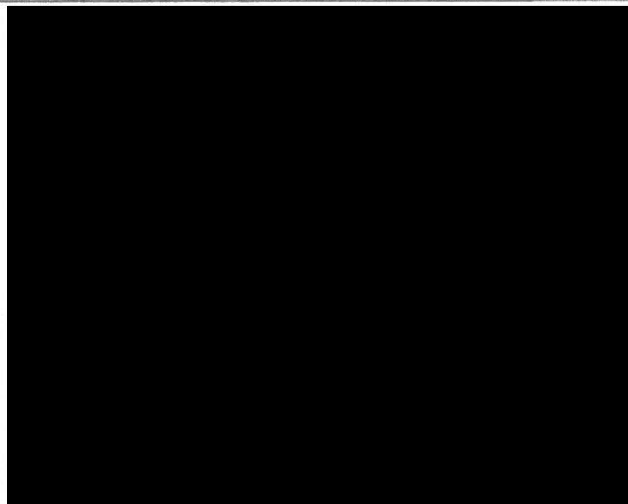

.....  
**Ing. Marek Veselý**  
náměstek ředitele pro techniku a provoz na základě

Datum:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Ing. arch.  
Jaromír  
Homolka, CSc.  
.....  
**Ing. arch. Jaromír Homolka**  
jednatel

Digitálně podepsal Ing. arch.  
Jaromír Homolka, CSc.  
Datum: 2024.05.23 14:36:51  
+02'00'

Stanovisko TDI:

Datum:

Podpis TDI:

.....

Stanovisko projektanta stavby:

Datum:

Podpis projektanta stavby:

.....

Seznam příložených dokladů:

--
