

Číslo objednatele: VZ-13057/2024

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

Smluvní strany

Zhotovitel:

| | |
|-----------------------------|---|
| Název/Jméno: | V2M stavby s.r.o. |
| Sídlo: | Terezińska 343, 41156 Bohušovice nad Ohří |
| Zastoupený: | Kateřina Vávrová, jednatelka |
| IČO: | 09433864 |
| DIČ: | CZ09433864 |
| Bank. spojení: | číslo účtu: 235171058 / 0600 |
| Zástupce pro věcná jednání: | Kateřina Vávrová, jednatelka |
| E-mail/telefon: | info@V2Mstavby.cz / +420 608 331 440 |
| www: | https://v2mstavby.cz/ |

(dále jen „Zhotovitel“)

A

Objednatel:

| | |
|---|---|
| Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace | |
| Sídlo: | Dlouhá 362/75, 410 02 Lovosice |
| Zastoupený: | Ing. Jindřich Vinkler, ředitel |
| IČO: | 00080195 |
| DIČ: | CZ00080195 |
| Bank. spojení: | Komerční banka, a.s. číslo účtu: 126471/0100 |
| Zástupce pro věcná jednání: | Ing. Petr Jakubíček, Ph.D., projektový manažer pjakubicek@csplitomerice.cz / +420 605 942 921 |
| | Bc. Petra Chmátalová, vedoucí zařízení pchmatalova@csplitomerice.cz / +420 723 988 735 |
| Zástupce pro technická jednání: | Bohumil Maršík, stavební technik bmarsik@csplitomerice.cz / 777 481 001 |
| www: | https://www.csplitomerice.cz/ |

(dále jen „Objednatel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO:

I.
Předmět Dodatku č. 1


1. Předmětem Dodatku č. 1 je úprava práv a povinností smluvních stran při plnění veřejné zakázky „**Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci zázemí Sociálně terapeutických dílen v Litoměřicích**“, ev.č. **VZ-13057/2024** (dále jako „předmět díla“).
2. V čl. 2.1 původní SOD je doba provedení díla uvedena do 30.5.2024. Z důvodů spočívajících na straně objednatele je třeba prodloužit termín plnění smlouvy do 30.9.2024. Těmito důvody je zejména prodloužení převodu majetku z KÚÚK na CSP Litoměřice. Proto bude do 30.5.2024 zpracována jen projektová dokumentace ve stupni pro stavební řízení (DSP) a PENB k začátku rekonstrukce. **Ostatní části PD budou zpracovány až k 30.9.2024**, kdy lze důvodně očekávat, že převod majetku Sociálně terapeutických dílen v Litoměřicích z KÚÚK do rukou CSP Litoměřice p.o. bude již dokončen.
3. Objednatel tak postupuje v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), kdy bude vydávat peněžní prostředky efektivně, účelně a hospodárně až za ten majetek, který opravu nabyde. Co se týká DSP a PENB k začátku rekonstrukce, tj. s dobou realizace do 30.5.2024, jde o účelně vynaložené peníze, neboť je chápe objednatel jako pasportizaci majetku, který bude nabývat. Ve své podstatě jde o nezbytné náklady přípravy převodu majetku.
4. Ostatní části SOD zůstávají nedotčeny.

II.
Závěrečná ustanovení


1. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 paré s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

III.
Podpisy smluvních stran

1. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy.

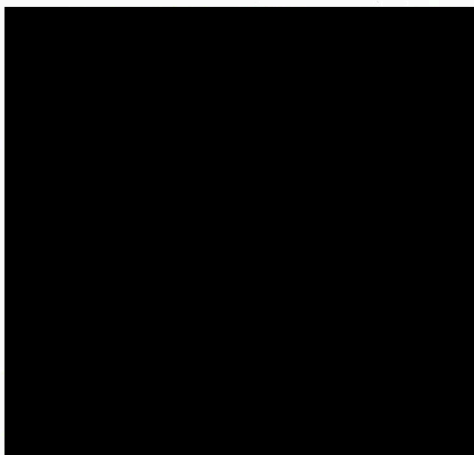

V Lovosicích, dne 20.5.2024



V2M stavby s.r.o.
