

# ZMĚNOVÝ LIST

NPU, SHZ Bečov nad Teplou - Restaurování hradu

reg.č.stavby:	134V15100025	<b>číslo ZL:</b>  <b>11</b>
smlouva:	NPÚ-ÚPS Praha 2026H1230007	
objednatel:	Národní památkový ústav, IČ: 75032333	
zhotovitel:	Bolid M s.r.o., IČO: 26347741	

<b>název ZL:</b>	<b>EPS - Elektronická požární signalizace</b>
------------------	---

**předmět změny:**  
Předmětem změny je celková změna systému provedení slaboproudých rozvodů elektronické požární signalizace (dále jen EPS) a částečně taktéž drobné navýšení počtu sirén a počtu čidel EPS, a to zejména pak na základě jednoznačného a odůvodněného požadavku orgánů památkové péče zasahovat pouze v co nejmenší možné míře do historického zdiva a jiných konstrukcí (stropy, podlahy apod.). Zásadní změnou oproti původní a odsouhlasené projektové dokumentaci je tedy **nezasahovat pokud možno do zdiva a ostatních konstrukcí, neprovádět vlastní rozvody v nově frézovaných a následně omítaných drážkách, ale vést toto buď skrytě volně, nebo viditelně v chráničkách respektujících celkový památkový odkaz objektu.**

**zdůvodnění nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.):**  
EPS - elektronická požární signalizace - Požadavek OPP na minimální stavební zásahy do jakékoliv historické konstrukce

**zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:**  
Jedná se o požadavek jak orgánů odborné i výkonné památkové péče, tak i správce areálu a vlastně i investora, který tímto opatřením ušetří nemalé finanční zdroje. Lze konstatovat, že provedení rozvodů skrytě v drážkách by znamenalo v taktu památkově citlivé celkové obnovy gotického hradu trvalý a nevratný zásah do celkové koncepce obnovy již od začátku pojaté jako minimalistické, resp. pouze s minimálními zásahy odstraňující opravdu zásadní a nepřehlédnutelná pochybení předchozích stavebních zásahů.

**zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:**  
Jedná se o změnu, kterou z důvodu koordinace s přímo navazujícími restaurátorskými pracemi, není vhodné, ekonomicky efektivní ani časově výhodné zadat samostatně. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a samostatně zadat.

<b>vliv na cenu díla:</b>	<b>ANO</b>	<b>rozpočet:</b>	<b>méněpráce</b>
		<b>cena:</b>	<b>ANO</b>
		bez DPH	-451 493,71 Kč
		21%DPH	-94 813,68 Kč
		<b>celkem</b>	<b>-546 307,39 Kč</b>


<b>vliv na cenu díla:</b>	<b>ANO</b>	<b>rozpočet:</b>	<b>vícepráce</b>
		<b>cena:</b>	<b>ANO</b>
		bez DPH	154 115,75 Kč
		21%DPH	32 364,31 Kč
		<b>celkem</b>	<b>186 480,06 Kč</b>

<b>CELKOVÁ BILANCE MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ</b>	<b>cena:</b>	bez DPH	-297 377,96 Kč
		21%DPH	-62 449,37 Kč
		<b>celkem</b>	<b>-359 827,33 Kč</b>

**vliv na termín dokončení:**  
práce **nemají** vliv na termín dokončení akce SMVS

**jiné vlivy (na změnu PD apod.):**

**přílohy :**

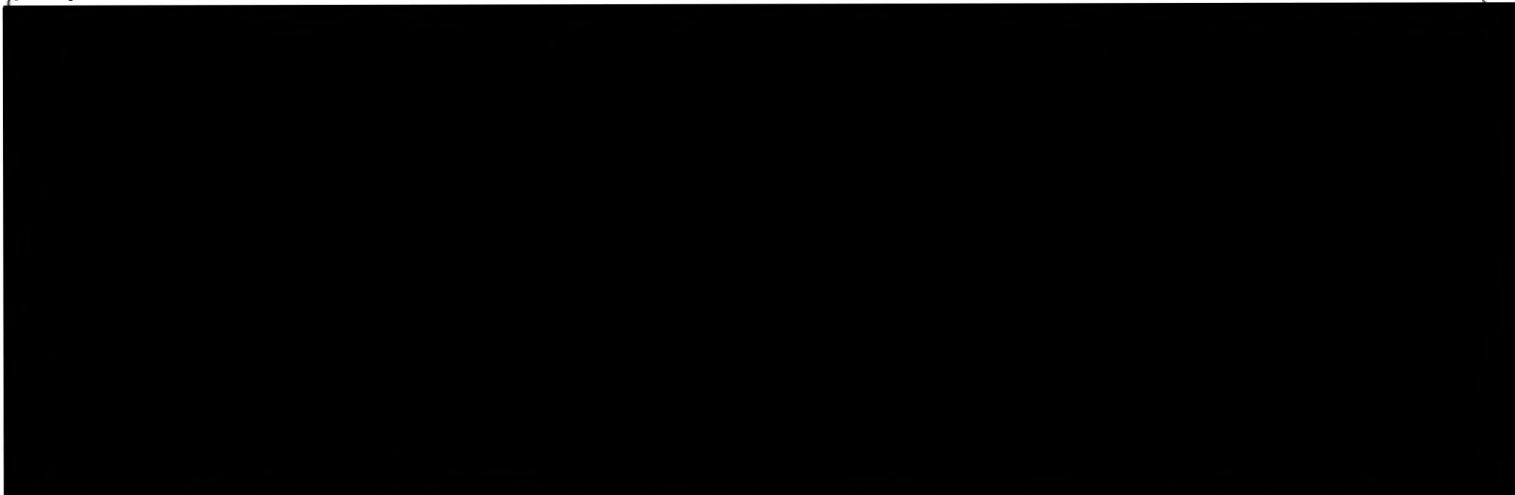

číslo ZL:

11

**Vyjádření Projektanta**

*Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav a umožnil docílit využití v souladu jak s požadavky objednatele, tak zejména s požadavky orgánů památkové péče. Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (6).*

**Vyjádření TDS**

bez výhrad

**Vyjádření objednatele**

*Realizace těchto prací bude na základě zjištěného skutečného stavu při provádění stavebních prací v souladu se slučitelností s již provedenými pracemi, a to při respektování požadavku orgánu státní památkové péče. Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (6).*

**Další vyjádření**

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **946-11**      **SHaZ Bečov nad Teplou, SO 05 - RESTAUROVÁNÍ HORNÍHO HRADU - ZL č.11**

Objednatel: **Národní památkový ústav**      IČO: **75032333**  
**Valdštejnské náměstí 162/3**      DIČ: **CZ75032333**  
**11800      Praha-Malá Strana**

Zhotovitel: **BOLID M s.r.o.**      IČO: **26347741**  
**Voršilská 2085/3**      DIČ: **CZ26347741**  
**11000      Praha 1**

Vypracoval: 

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-252 529,69
PSV			0,00
MON			-44 848,27
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>-297 377,96</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-297 377,96 CZK
Základní DPH	21 %	-62 449,37 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH -359 827,33 CZK**



## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>03</b>	<b>EPS</b>	<b>0,00</b>	<b>-297 377,96</b>	<b>-62 449,37</b>	<b>-359 827,33</b>	<b>100</b>
01	Méněpráce	0,00	-451 493,71	-94 813,68	-546 307,39	152
02	Vícepráce	0,00	154 115,75	32 364,31	186 480,06	-52
Celkem za stavbu		0,00	-297 377,96	-62 449,37	-359 827,33	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			-211 164,84	71,0
96	Bourání konstrukcí	HSV			-126 763,75	42,6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-25 900,77	8,7
Část:	EPS - dodávka a motáž	HSV			111 299,67	-37,4
M46	Zemní práce při montážích	MON			-44 848,27	15,1
Cena celkem					-297 377,96	100,0

## Položkový rozpočet

S:	946-11	SHaZ Bečov nad Teplou, SO 05 - RESTAUROVÁNÍ HORNÍHO HRADU - ZL č.11
O:	03	EPS
R:	01	Měněpráce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>-211 164,84</b>
1	612403380	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 30 x 30 mm	m	-1 117,80000	165,80	-185 331,24
				položka z SOD č.51 : -1117,8		-1 117,80000
2	611403380	Hrubé zaplnění rýh ve stropech maltou ze suchých směsí 30 x 30 mm	m	-124,20000	208,00	-25 833,60
				položka z SOD č.52 : -124,2		-124,20000
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>-126 763,75</b>
3	974051513R00	Frézování drážek pro instalace ve zdivu betonovém hloubky do 30 mm, šířky do 30 mm	m	-1 242,00000	88,80	-110 289,60
				položka z SOD č.35 : -1242		-1 242,00000
4	979011211	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	-2,77904	720,00	-2 000,91
				položka z SOD č.53 : -2,77904		-2,77904
5	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-2,77904	720,00	-2 000,91
				položka z SOD č.54 : -2,77904		-2,77904
6	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	-55,58080	45,60	-2 534,48
				položka z SOD č.55 : -55,5808		-55,58080
7	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	-2,77904	720,00	-2 000,91
				položka z SOD č.56 : -2,77904		-2,77904
8	979082121	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	-55,58080	49,20	-2 734,58
				položka z SOD č.57 : -55,5808		-55,58080
9	979990101R00	Poplatek za skládku směsí betonu a cihel do 30x30 cm, skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	-2,77904	1 872,00	-5 202,36
				položka z SOD č.58 : -2,77904		-2,77904
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>-25 900,77</b>
10	999281151	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, nošením	t	-1,93752	7 080,00	-13 717,64
				položka z SOD č.59 : -1,93752		-1,93752
11	999281193	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	-1,93752	6 288,00	-12 183,13
				položka z SOD č.60 : -1,93752		-1,93752
<b>Díl: Část:</b>		<b>EPS - dodávka a motáz</b>				<b>-42 816,08</b>
12	Pol_1	jistič 10A	ks	-1,00000	304,26	-304,26
				položka z SOD č.1 : -1		-1,00000
13	Pol_35	prostup z výkopu do objektu	ks	-2,00000	2 972,52	-5 945,04
				položka z SOD č.42 : -2		-2,00000
14	3457114701R	trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr.= 50,0 mm; vnitřní pr.= 41,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až	m	-30,00000	105,16	-3 154,80
				položka z SOD č.43 : -30		-30,00000

## Položkový rozpočet


S:	946-11	SHaZ Bečov nad Teplou, SO 05 - RESTAUROVÁNÍ HORNÍHO HRADU - ZL č. 11
O:	03	EPS
R:	01	Měněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
15	34126167R	kabel TCEPKPFLE; sdělovací; pevné uložení vnitřní, pevné uložení do země a vně; Cu plná holá jádra; počet prvků 3; počet žil v prvku 4; vnější průměr 15,0 mm; jmen.prům.jádra 0,80 mm; teplota použití	m	-36,00000	84,73	-3 050,28
		položka z SOD č.44 : -36		-36,00000		
16	Pol_39	PVC žlab 13*18 hnědá	m	-125,00000	85,84	-10 730,00
		položka z SOD č.46 : -125		-125,00000		
17	34571523R	krabice elektroinstalační pod omítku; odbočná s víčkem; mat. PVC samozhášivé; teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr, hloubka pr.103x50 mm	kus	-22,00000	109,20	-2 402,40
		položka z SOD č.48 : -22		-22,00000		
18	Pol_53	Autorský dozor	kpl	-1,00000	17 229,30	-17 229,30
		položka z SOD č.69 : -1		-1,00000		
<b>Díl: M46</b>		<b>Zemní práce při montážích</b>				<b>-44 848,27</b>
19	460010024	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru	km	-0,01200	22 356,00	-268,27
		položka z SOD č.33 : -0,012		-0,01200		
20	460200815	Výkop kabelové rýhy 80/50 cm hor.5, ruční výkop rýhy	m	-12,00000	1 500,00	-18 000,00
		položka z SOD č.36 : -12		-12,00000		
21	460570815	Zához rýhy 80/50 cm, hornina tř. 5, se zhutněním	m	-12,00000	650,00	-7 800,00
		položka z SOD č.37 : -12		-12,00000		
22	460600001	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	-1,20000	2 500,00	-3 000,00
		položka z SOD č.38 : -1,2		-1,20000		
23	460620015	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 5, ruční vyrovnání a zhutnění	m2	-10,00000	450,00	-4 500,00
		položka z SOD č.39 : -10		-10,00000		
24	460420022	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, lože tloušťky 20 cm	m	-12,00000	890,00	-10 680,00
		položka z SOD č.40 : -12		-12,00000		
25	460490012	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	m	-12,00000	50,00	-600,00
		položka z SOD č.41 : -12		-12,00000		


## Položkový rozpočet


S:	946-11	SHaZ Bečov nad Teplou, SO 05 - RESTAUROVÁNÍ HORNÍHO HRADU - ZL č.11
O:	03	EPS
R:	02	Vícepráce


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: Část:</b>		<b>EPS - dodávka a motáž</b>				<b>154 115,75</b>
1	Pol_13	senzor interaktivní optický	ks	3,00000	3 123,25	9 369,75
		položka z SOD č.13 : 3		3,00000		
2	Pol_14	patice senzoru	ks	3,00000	405,50	1 216,50
		položka z SOD č.14 : 3		3,00000		
3	341350122R	kabel PRAFlaCom 2x2x0,8	m	18,00000	84,64	1 523,52
		položka z SOD č.28 :				
		kabeláž pro doplnění 3 senzorů : 18		18,00000		
4	Pol_30	kabel PRAFlaGuard 2x2x0.8 (SIR)	m	54,00000	92,88	5 015,52
		položka z SOD č.30 :				
		kabeláž pro doplnění 2ks sirén : 54		54,00000		
5	Pol_32	přichytka pro 1 kabel - funkční trasa EN 8025	m	706,00000	135,83	95 895,98
		položka z SOD č.31 :				
		kabeláž položka č.28 + kabeláž pro doplnění 3 senzorů : 850+18		868,00000		
		kabeláž položka č.29 : 88		88,00000		
		kabeláž položka č.30 + kabeláž pro doplnění 2 sirén : 76+54		130,00000		
		výměra dle SOD : -228		-228,00000		
		kabeláž uložená v ocelových lakovaných trubkách : -152		-152,00000		
6	Pol_33	příprava kabelových tras	m	72,00000	54,09	3 894,48
		položka z SOD č.32 :				
		kabeláž pro doplnění senzorů : 18		18,00000		
		kabeláž pro doplnění sirén : 54		54,00000		
7	001	D+M vnitřní sirény bez majáku	ks	2,00000	1 728,00	3 456,00
		nová položka : 2		2,00000		
8	002	D+M trubka ocelová lakovaná černá vč. tvarovek, přichytek a krabic	m	152,00000	222,00	33 744,00
		nová položka : 152		152,00000		















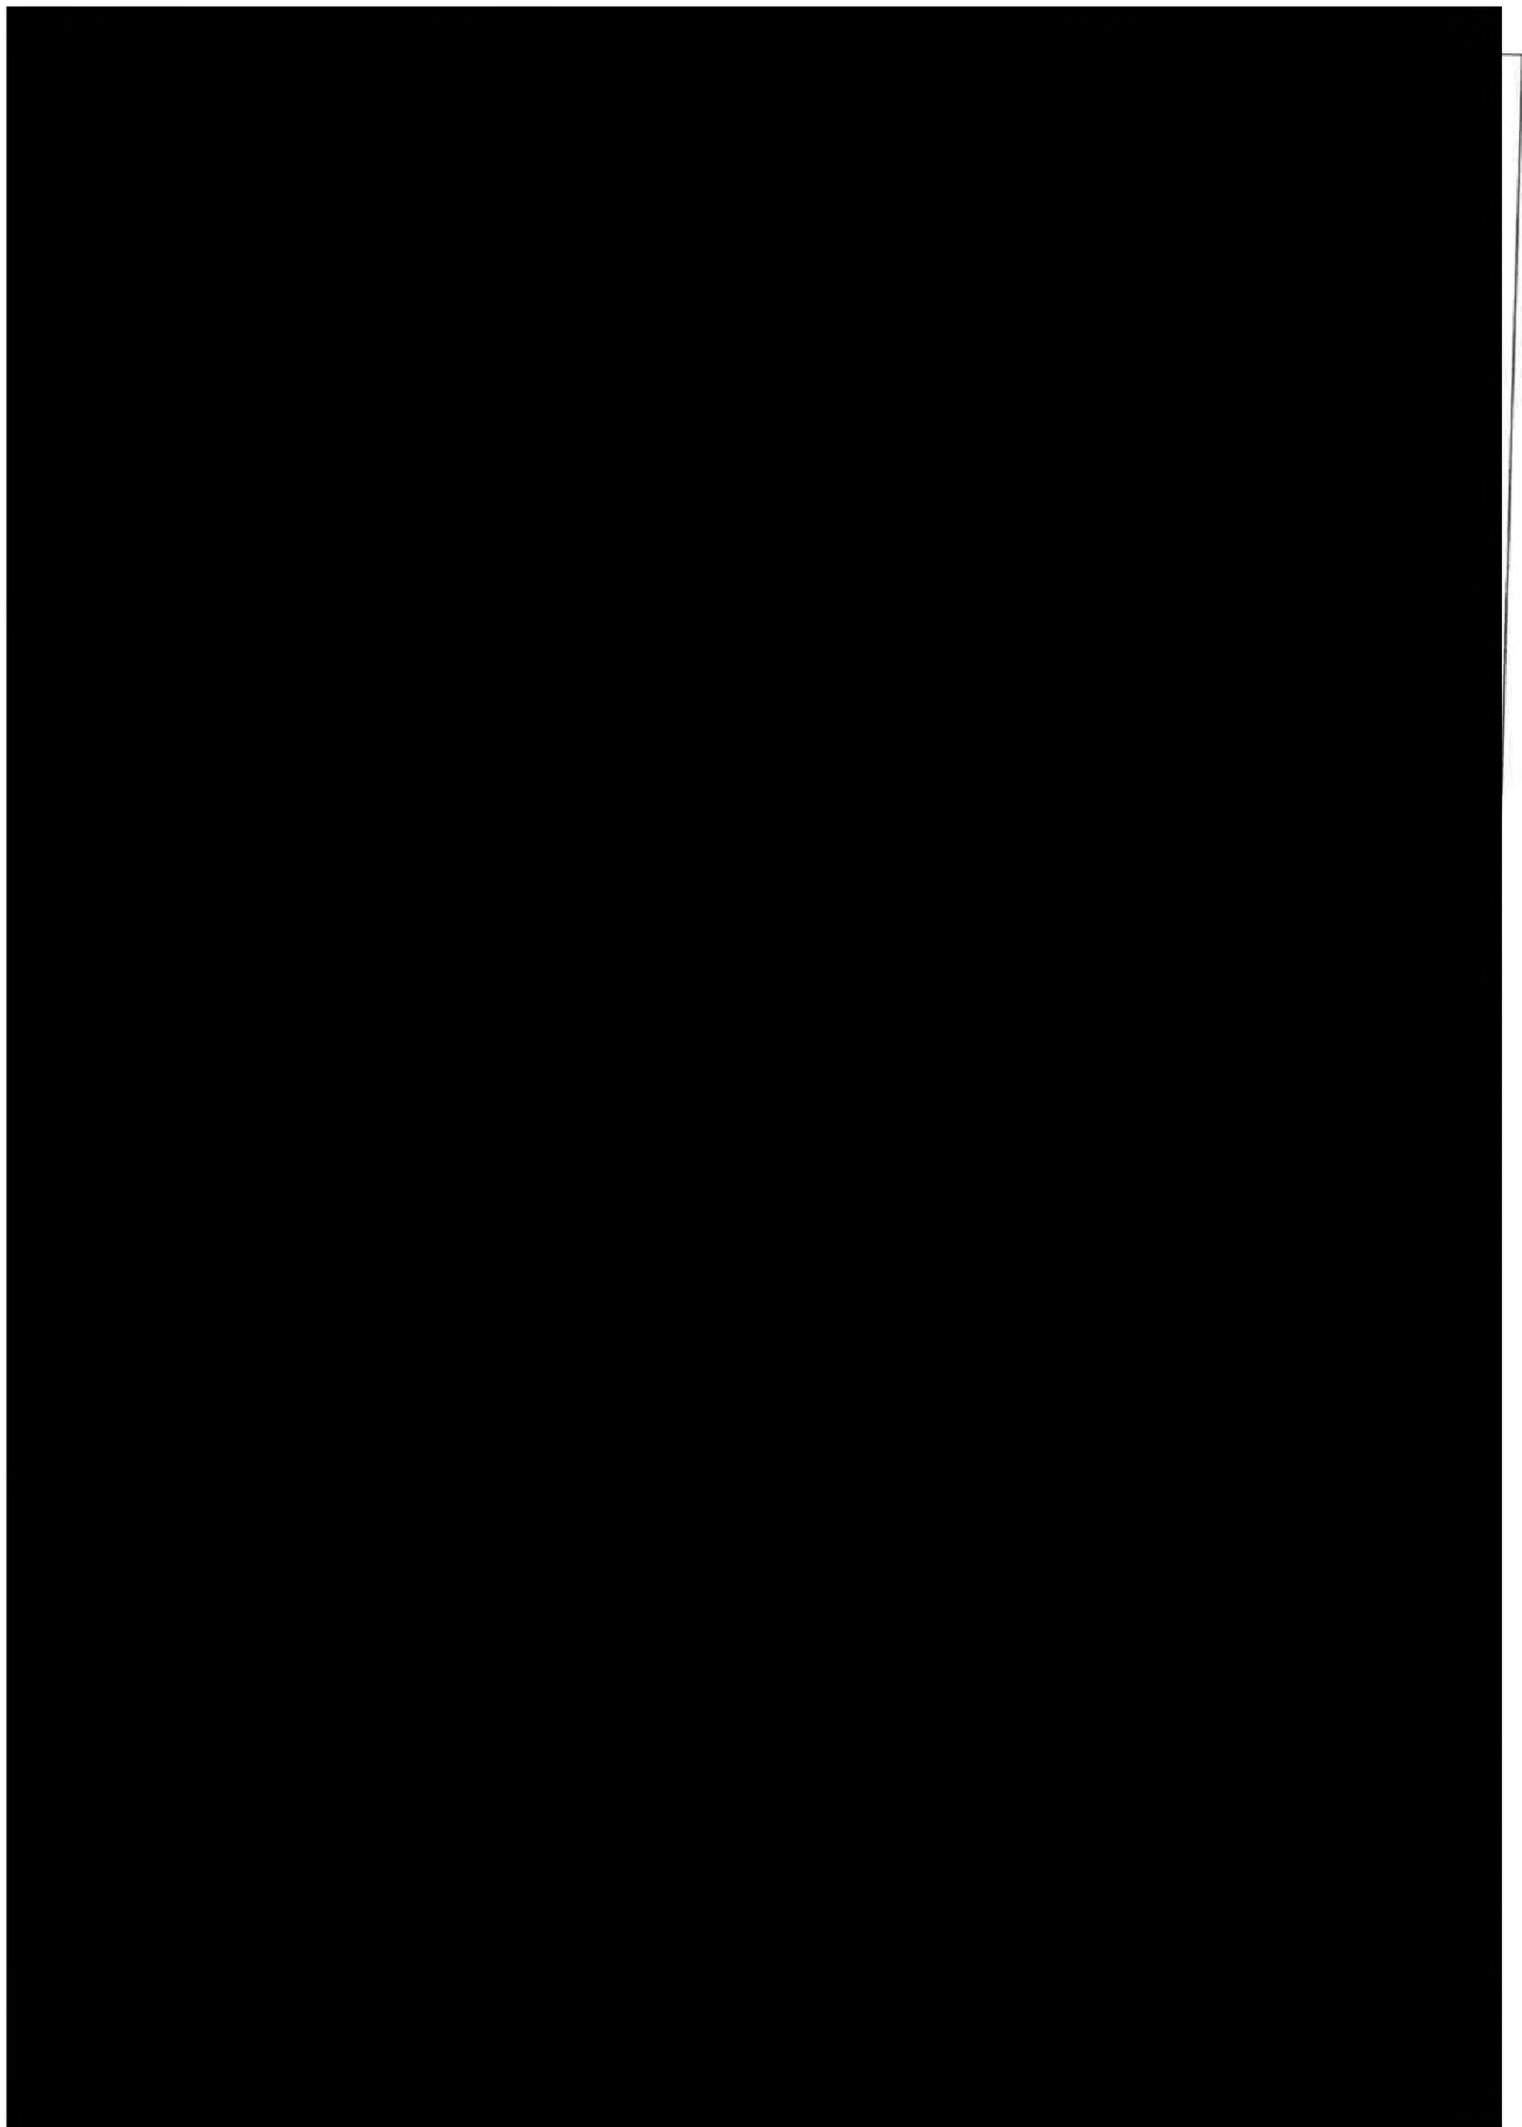

# ZMĚNOVÝ LIST

NPU, SHZ Bečov nad Teplou - Restaurování hradu

reg.č.stavby:	134V15100025	číslo ZL:
smlouva:	NPÚ-ÚPS Praha 2026H1230007	12
objednatel:	Národní památkový ústav, IČ: 75032333	
zhotovitel:	Bolid M s.r.o., IČO: 26347741	

název ZL: **Udržovací nátěr šindelové krytiny horního hradu**

předmět změny:

Předmětem této nepodstatné změny smluvního závazku je udržovací nátěr šindelové krytiny horního hradu. Tento cyklicky se opakující nátěr je nezbytnou podmínkou zajištění životnosti šindelové střechy horního hradu. Investir si odpovědně vyhodnotil veškerá možná rizika případného možného provedení těchto prací jiným zhotovitelem, než tím, kterému tento horní hrad v minulém roce předal s veškerou odpovědností z tohoto kroku vylývajícím. Dále lze dovodit, že s ohledem na očekávané prodloužení spojené s realizací hradní kaple min. do poloviny roku 2025 by nebylo pravděpodobně možné tyto práce provést jiným zhotovitelem ani v roce 2025.

**zdůvodnění nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.):**

Udržovací nátěr šindelové krytiny horního hradu - požadavek investora vyplývající z logistické nemožnosti, resp. vysoké rizikovitosti provádět výškové a tudíž rizikové práce nad prostorem, jež byl předán jinému zhotoviteli k užívání jako staveniště. Investorovi se v tuto chvíli jeví jako optimální zadat tyto práce, jež jsou pro životnost šindelové střechy naprosto nezbytné, zadat tomu právnímu subjektu, jež za předané staveniště odpovídá v plném rozsahu.

**zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:**

Jedná se o požadavek investora, kterým bude zajištěna životnost šindelové střechy horního hradu na dalších min. 5 let dopředu. Jedná se o očištění severní strany střechy mechanicky kartáči, dále pak revize a dotlučení vyčnívajících hřebů a nátěr Karbolineum extra jantar. Vše za použití horolezecké techniky kdy budou k jistění využity stávající kotvící body

**zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:**

Jedná se o změnu, kterou z důvodu koordinace se stavebními a restaurátorskými pracemi, nacházejícími se v jednom objektu a zejména pak na jednom předaném staveništi, není vhodné, ekonomicky efektivní ani časově výhodné zadat samostatně. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a samostatně zadat.

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	méněpráce NE
		cena:	bez DPH 0,00 Kč
			21%DPH 0,00 Kč
			celkem 0,00 Kč

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	vícepráce ANO
		cena:	bez DPH 227 934,00 Kč
			21%DPH 47 866,14 Kč
			celkem 275 800,14 Kč

<b>CELKOVÁ BILANCE MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ</b>	cena:	bez DPH 227 934,00 Kč
		21%DPH 47 866,14 Kč
		celkem 275 800,14 Kč

vliv na termín dokončení:

práce nemají vliv na termín dokončení akce SMVS

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

přílohy :

číslo ZL:

12

**Vyjádření Projektanta**

*Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav a umožnil docílit využití v souladu jak s požadavky objednatele, tak i s požadavky orgánů památkové péče. Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (4).*

**Vyjádření TDS**

BEZ VYJÁDŘENÍ

**Vyjádření objednatele**

*Realizace těchto prací bude na základě zjištěného skutečného stavu při provádění stavebních prací v souladu se slučitelností s již provedenými pracemi, a to při respektování požadavku orgánu státní památkové péče. Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (4).*

**Další vyjádření**

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 946-12 SHaZ Bečov nad Teplou, SO 05 - RESTAUROVÁNÍ HORNÍHO HRADU - ZL č.12  
**Objekt:** 02 - DJ Horní hrad  
**Rozpočet:** 01 Vícepráce - udržovací nátěr šindelové krytiny horního hradu

**Objednatel:** Národní památkový ústav IČO: 75032333  
 Valdštejnské náměstí 162/3 DIČ: CZ75032333  
 11800 Praha-Malá Strana

**Zhotovitel:** BOLID M s.r.o. IČO: 26347741  
 Voršilská 2085/3 DIČ: CZ26347741  
 11000 Praha 1

**Vypracoval:** XXXXXXXXXX


Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	227 934,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>227 934,00</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	227 934,00 CZK
Základní DPH	21 %	47 866,14 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 275 800,14 CZK**





## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
783	Nátěry	PSV			227 934,00	100,0
Cena celkem					227 934,00	100,0

## Položkový rozpočet

S:	946-12	SHaZ Bečov nad Teplou, SO 05 - RESTAUROVÁNÍ HORNÍHO HRADU - ZL č.12
O:	02 - DJ	Horní hrad
R:	01	Vícepráce - udržovací nátěr šindelové krytiny horního hradu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				<b>227 934,00</b>
1	783-001	Dotlučení hřebíků a očištění	m2	323,00000	48,00	15 504,00

očištění severní strany střechy kartáči :

uvolněné a vyčnívající hřebíky budou dotlučeny :

předpoklad 1/3 celkové plochy :

za použití horolezecké techniky : 323

323,00000

2	783-002	Nátěr střechy - Karbolineum extra jantar za použití horolezecké techniky	m2	970,00000	219,00	212 430,00
---	---------	--	----	-----------	--------	------------

materiál - Karbolineum extra jantar :

výrobce - Detecha, chemické výrobní družstvo :

nátěr bude prováděn za použití horolezecké techniky, k

jištění budou využity stávající kotvicí body : 970

970,00000

# ZMĚNOVÝ LIST

NPU, SHZ Bečov nad Teplou - Restaurování hradu

reg.č.stavby:	134V15100025	číslo ZL:
smlouva:	NPÚ-ÚPS Praha 2026H1230007	13
objednatel:	Národní památkový ústav, IČ: 75032333	
zhotovitel:	Bolid M s.r.o., IČO: 26347741	

**název ZL:** Restaurátorské práce - 2. NP - Zajištění vnitřních omítek dle restaurátorského záměru

**předmět změny:**

Předmětem změny jsou Restaurátorské práce - 2. NP - Zajištění vnitřních omítek dle restaurátorského záměru. Tento Změnový list je vyhotoven na základě dokumentace vypracované podrobným restaurátorským průzkumem zhotovitele, jež je nedílnou a vyžadovanou součástí akce. Tato dokumentace "Restaurátorský průzkum a záměr zajištění vnitřních omítek 2. NP Horního hradu NKP SHaZ Bečov nad Teplou" je taktéž přiložena k tomuto Změnovému listu.

**zdůvodnění nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.):**

Předmět změny: Restaurátorské práce - 2. NP - Zajištění vnitřních omítek dle restaurátorského záměru

**zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:**

Jedná se o požadavek investora, resp. vyplývající z vydaného Závazného stanoviska (KK/1641/KR/21-07) k projektové dokumentaci pro provedení stavby - SHaZ Bečov nad Teplou, SO 05 - Restaurování Horního hradu, kdy, kromě jiného, je obnova hradu Bečov n.T. přípustná při dodržení následující podmínky: Krajskému úřadu bude před zahájením oprav omítkových ploch předložen návrh/ návrhy přesného postupu/ přesných postupů jednotlivých typů omítkových ploch. Správnost navržených postupů a finálního vzhledu při opravě různých druhů omítkových ploch bude ověřena provedením vzorků o velikosti cca 1x1m. Po posouzení vzorků zástupci NPÚ GnŘ a krajského úřadu a po konstatování krajského úřadu, že vzorek odpovídá technologickým, materiálovým a vzhledovým požadavkům uvedeným v projektové dokumentaci, lze dané práce provést jako celek.

**zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:**

Jedná se o změnu, kterou z důvodu koordinace s přímo navazujícími restaurátorskými pracemi, není vhodné, ekonomicky efektivní ani časově výhodné zadat samostatně. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a samostatně zadat.

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	méněpráce ANO
		cena: bez DPH -81 740,40 Kč	
		21%DPH -17 165,48 Kč	
		celkem -98 905,88 Kč	
vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	vícepráce ANO
		cena: bez DPH 586 364,23 Kč	
		21%DPH 123 136,49 Kč	
		celkem 709 500,72 Kč	
CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ		cena: bez DPH 504 623,83 Kč	
		21%DPH 105 971,01 Kč	
		celkem 610 594,84 Kč	

**vliv na termín dokončení:**

práce nemají vliv na termín dokončení akce SMVS

**jiné vlivy (na změnu PD apod.):**

číslo ZL:

13

**Vyjádření Projektanta**

*Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav a umožnil docílit využití v souladu s požadavky objednatele. Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (6).*

**Vyjádření TDS**

BEZ MONITORINGU

**Vyjádření objednatele**

*Realizace těchto prací bude na základě zjištěného skutečného stavu při provádění stavebních prací v souladu se slučitelností s již provedenými pracemi, a to při respektování požadavku orgánu státní památkové péče. Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (6).*

**Další vyjádření**

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **946-13** SHaZ Bečov nad Teplou, SO 05 - RESTAUROVÁNÍ HORNÍHO HRADU - ZL č.13

Objednatel: **Národní památkový ústav** IČO: 75032333  
**Valdštejnské náměstí 162/3** DIČ: CZ75032333  
**11800 Praha-Malá Strana**

Zhotovitel: **BOLID M s.r.o.** IČO: 26347741  
**Voršilská 2085/3** DIČ: CZ26347741  
**11000 Praha 1**

Vypracoval: 

Rozpis ceny

Celkem

HSV			516 803,83
PSV			-12 180,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>504 623,83</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	504 623,83 CZK
Základní DPH	21 %	105 971,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 610 594,83 CZK**

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>02 - DJ - R</b>	<b>Horní hrad - restaurátorské práce</b>	<b>0,00</b>	<b>504 623,83</b>	<b>105 971,01</b>	<b>610 594,84</b>	<b>100</b>
01	Měněpráce - 2.NP - zajištění vnitřních omítek dle	0,00	-81 740,40	-17 165,48	-98 905,88	-16
02	Vícepráce - 2.NP - zajištění vnitřních omítek dle restaurátorského záměru	0,00	586 364,23	123 136,49	709 500,72	116
Celkem za stavbu		0,00	504 623,83	105 971,01	610 594,84	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			156 690,60	31,1
61	Úpravy povrchů vnitřní - stavební část	HSV			374 764,03	74,3
61 a	Úpravy povrchů vnitřní - restaurování stavebních prvků	HSV			-14 650,80	-2,9
799-01	Restaurátorské práce	PSV			-12 180,00	-2,4
Cena celkem					504 623,83	100,0

## Položkový rozpočet

S:	946-13	SHaZ Bečov nad Teplou, SO 05 - RESTAUROVÁNÍ HORNÍHO HRADU - ZL č.13
O:	02 - DJ - R	Horní hrad - restaurátorské práce
R:	01	Méněpráce - 2.NP - zajištění vnitřních omítek dle restaurátorského záměru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>-4 730,40</b>
1	300-01	Sanace lokálních trhlin zdí hl.spárováním	m	-4,38000	1 080,00	-4 730,40

položka z SOD č.3 - 2.NP - stavební část :

výměra dle SOD : -14,56

-14,56000

Mezisoučet

-14,56000

výměry dle skutečnosti a zpracovaného restaurátorského průzkumu a záměru :

SK\_201 :

- lokální trhlina dl. cca 4380 mm : 4,38

4,38000

- lokální trhlina dl. cca 775 mm (vstup do kaple) : 0,775

0,77500

Mezisoučet

5,15500

DJ\_201 :

- lokální trhlina dl. cca 1125 mm : 1,125

1,12500

Mezisoučet

1,12500

DJ\_202 :

- lokální trhlina dl. cca 3900 mm : 3,9

3,90000

Mezisoučet

3,90000

<b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní - stavební část</b>						<b>-17 280,00</b>
2	612401291	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,09 do 0,25 m <sup>2</sup> , vápennou štukovou omítkou	kus	-12,00000	1 440,00	-17 280,00

položka č.13 - 2.NP stavební část :

místnost č. DJ\_201 - nový roznášecí průvlak (zhora i zdola) : -2\*2

-4,00000

místnost č. DJ\_202 - nový roznášecí průvlak (zhora i zdola) : -2\*2

-4,00000

místnost č. DJ\_203- nový roznášecí průvlak (zhora i zdola) : -2\*2

-4,00000

Mezisoučet

-12,00000

<b>Díl: 61 a Úpravy povrchů vnitřní - restaurování stavebních prvků</b>						<b>-47 550,00</b>
3	611-02	Úprava omítek v místě zhlaví měněných trámů	m <sup>2</sup>	-12,65000	3 000,00	-37 950,00

položka č.3 - 2.NP - restaurování stavebních prvků :

DJ\_201 (pod stropními trámy) 25.30 bm; 06,35 m<sup>2</sup> : -6,35

-6,35000

DJ\_202 (pod stropními trámy) 12.70 bm; 03,20 m<sup>2</sup> : -3,2

-3,20000

DJ\_203 (pod stropními trámy) 12.60 bm; 03,10 m<sup>2</sup> : -3,1

-3,10000

Mezisoučet

-12,65000

4	611-03	GÁZOVÉ PŘELEPY UVOLNĚNÉ OMÍTKY POD STROPĚM SEVERNÍ A JIŽNÍ STĚNY	m <sup>2</sup>	-2,00000	4 800,00	-9 600,00
---	--------	--	----------------	----------	----------	-----------

položka č.4 - 2.NP - restaurování stavebních prvků :

místnost č. DJ\_203 - S a J stěna - předpoklad : -2

-2,00000

Mezisoučet

-2,00000

<b>Díl: 799-01 Restaurátorské práce</b>						<b>-12 180,00</b>
5	799-02	Restaurování nástěnných maleb - ryté kresby na stěnách	m <sup>2</sup>	-1,45000	8 400,00	-12 180,00

## Položkový rozpočet

S:	946-13	SHaZ Bečov nad Teplou, SO 05 - RESTAUROVÁNÍ HORNÍHO HRADU - ZL č.13
O:	02 - DJ - R	Horní hrad - restaurátorské práce
R:	01	Méněpráce - 2.NP - zajištění vnitřních omítek dle restaurátorského záměru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

položka č.2 - 2.NP - restaurování maleb a trámový strop :

výměra dle SOD : -8 -8,00000

Mezisoučet -8,00000

výměry dle skutečnosti a zpracovaného restaurátorského průzkumu a záměru :

SK\_201 :

jižní stěna : 0,52 0,52000

Mezisoučet 0,52000

DJ\_201 :

západní stěna : 1,56 1,56000

Mezisoučet 1,56000

DJ\_202 :

východní stěna : 1,72 1,72000

jižní stěna : 2,75 2,75000

Mezisoučet 4,47000



## Položkový rozpočet

S:	946-13	SHaZ Bečov nad Teplou, SO 05 - RESTAUROVÁNÍ HORNÍHO HRADU - ZL č.13
O:	02 - DJ - R	Horní hrad - restaurátorské práce
R:	02	Vícepráce - 2.NP - zajištění vnitřních omítek dle restaurátorského záměru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>161 421,00</b>
1	300-02	Sanace tenkých lokálních trhlin zdí hl.spárováním	m	206,95000	780,00	161 421,00
		položka z SOD č.4 - 2.NP - stavební část :				
		výměra dle SOD : -52,51		-52,51000		
		<b>Mezisoučet</b>		<b>-52,51000</b>		
		výměry dle skutečnosti a zpracovaného restaurátorského průzkumu a záměru :				
		<b>SK_201 :</b>				
		lokální trhlina dl. cca 4195 mm : 4,195		4,19500		
		úprava ozn. T1- lokální trhliny dl. Cca 2400 mm : 2,4		2,40000		
		úprava ozn. T1- lokální trhliny dl. Cca 11100 mm : 11,1		11,10000		
		úprava ozn. T1- lokální trhliny dl. Cca 1000 mm : 1		1,00000		
		místnost č.SK_201 - lokální svislé trhliny dl. cca 7285 mm : 7,285		7,28500		
		úprava ozn. T1- lokální trhliny dl. Cca 2700 mm : 2,7		2,70000		
		<b>Mezisoučet</b>		<b>28,68000</b>		
		<b>DJ_201 :</b>				
		- lokální trhlina dl. cca 3850 mm : 3,85		3,85000		
		- lokální trhlina dl. cca 3900 mm : 3,9		3,90000		
		- lokální trhlina dl. cca 1860 mm : 1,86		1,86000		
		úprava ozn. T1- lokální trhliny dl. Cca 800 mm : 0,8		0,80000		
		- lokální trhlina dl. cca 1750 mm : 1,75		1,75000		
		lokální trhlina dl. cca 1880 mm : 1,88		1,88000		
		<b>Mezisoučet</b>		<b>14,04000</b>		
		<b>DJ_202 :</b>				
		lokální trhlina dl. cca 1960 mm : 1,96 : 1,96		1,96000		
		úprava ozn. T1- lokální trhliny dl. Cca 1500 mm : 1,5		1,50000		
		úprava ozn. T1- lokální trhliny dl. cca 700 mm : 0,7		0,70000		
		úprava ozn. t2- lokální trhliny dl. cca 3600 mm : 3,6		3,60000		
		- lokální trhlina dl. cca 6850 mm : 6,85		6,85000		
		úprava ozn. T1- lokální trhliny dl. cca 2700 mm : 2,7		2,70000		
		úprava ozn. t2- lokální trhliny dl. cca 3800 mm : 3,8		3,80000		
		- lokální trhlina dl. cca 4850 mm : 4,85		4,85000		
		úprava ozn. T1- lokální trhliny dl. cca 3900 mm : 3,9		3,90000		
		<b>Mezisoučet</b>		<b>29,86000</b>		
		<b>DJ_203 :</b>				
		- lokální trhlina dl. cca 3900 mm : 3,9		3,90000		
		- lokální trhlina dl. Cca 3850 mm : 3,85		3,85000		
		lokální trhlina dl. cca 1580 mm : 1,58		1,58000		
		úprava ozn. T1- lokální trhliny dl. cca 2950 mm : 2,95		2,95000		
		úprava ozn. T1- lokální trhliny dl. cca 1600 mm : 1,6		1,60000		
		- lokální trhlina dl. cca 1900 mm : 1,9		1,90000		
		úprava ozn. T1- lokální trhliny dl. cca 400 mm : 0,4		0,40000		
		- lokální trhlina dl. cca 7750 mm : 7,75		7,75000		
		úprava ozn. T1- lokální trhliny dl. Cca 3400 mm : 3,4		3,40000		
		<b>Mezisoučet</b>		<b>27,33000</b>		

## Položkový rozpočet

S:	946-13	SHaZ Bečov nad Teplou, SO 05 - RESTAUROVÁNÍ HORNÍHO HRADU - ZL č.13
O:	02 - DJ - R	Horní hrad - restaurátorské práce
R:	02	Vícepráce - 2.NP - zajištění vnitřních omítek dle restaurátorského záměru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

úprava ozn. O - zajištění uvolněných okrajů - složeno ze 2 položek :

1. položka 300-02 Sanace tenkých lokálních trhlin zdí hl. spárováním :
2. položka 611-01 Závěrečná celoplošná retuš prováděná restaurátorem, trhliny a kavery :

SK\_201 :

západní stěna : 6,25	6,25000
východní stěna : 3,8	3,80000
severní stěna : 2,6	2,60000
jižní stěna : 8,25	8,25000
<b>Mezisoučet</b>	<b>20,90000</b>

DJ\_201 :

západní stěna : 31,6	31,60000
východní stěna : 30,9	30,90000
severní stěna : 3,6	3,60000
jižní stěna : 5,82	5,82000
<b>Mezisoučet</b>	<b>71,92000</b>

DJ\_202 :

západní stěna : 4,43	4,43000
východní stěna : 4,27	4,27000
severní stěna : 9,29	9,29000
jižní stěna : 3,5	3,50000
<b>Mezisoučet</b>	<b>21,49000</b>

DJ\_203 :

západní stěna : 10,29	10,29000
východní stěna : 8,5	8,50000
severní stěna : 13	13,00000
jižní stěna : 13,45	13,45000
<b>Mezisoučet</b>	<b>45,24000</b>

<b>Díl: 61</b>	<b>Úpravy povrchů vnitřní - stavební část</b>					<b>392 044,03</b>
2	611-02	Podtmelení okrajů omítkových ploch a omítkových ker, lokální tmelení, případně injektáž probarvenou, vápennou mikromaltou s předzpevněním vápennou disperzí	m2	30,62000	960,00	29 395,20

položka z SOD č.14 - 2.NP - stavební část :

výměra dle SOD : -29,7	-29,70000
<b>Mezisoučet</b>	<b>-29,70000</b>

výměry dle skutečnosti a zpracovaného restaurátorského průzkumu a záměru :

úprava ozn. e - vápenná omítka s dutinami :

SK\_201 :

západní stěna : 2,99	2,99000
východní stěna : 2,76	2,76000
severní stěna : 4,59	4,59000

## Položkový rozpočet

S:	946-13	SHaZ Bečov nad Teplou, SO 05 - RESTAUROVÁNÍ HORNÍHO HRADU - ZL č.13
O:	02 - DJ - R	Horní hrad - restaurátorské práce
R:	02	Vícepráce - 2.NP - zajištění vnitřních omítek dle restaurátorského záměru

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		jižní stěna : 10,56		10,56000		
		Mezisoučet		20,90000		
		DJ_201 :				
		západní stěna : 4,64		4,64000		
		východní stěna : 3,32		3,32000		
		severní stěna : 2,28		2,28000		
		jižní stěna : 2,86		2,86000		
		Mezisoučet		13,10000		
		DJ_202 :				
		západní stěna : 4,98		4,98000		
		východní stěna : 0,75		0,75000		
		severní stěna : 6,58		6,58000		
		jižní stěna : 1,38		1,38000		
		Mezisoučet		13,69000		
		DJ_203 :				
		západní stěna : 1,84		1,84000		
		východní stěna : 2,09		2,09000		
		severní stěna : 5,62		5,62000		
		jižní stěna : 3,08		3,08000		
		Mezisoučet		12,63000		
3	611-03	Úprava stávajícího povrchu režného cihelného zdiva	m2	4,87000	921,60	4 488,19
		položka z SOD č.15 - 2.NP - stavební část :				
		výměra dle SOD : -3,85		-3,85000		
		Mezisoučet		-3,85000		
		výměry dle skutečnosti a zpracovaného restaurátorského průzkumu a záměru :				
		úprava ozn. h :				
		DJ_201 :				
		režné cihelné zdivo jižní stěny : 2,82		2,82000		
		Mezisoučet		2,82000		
		DJ_202 :				
		režné cihelné zdivo severní stěny : 0,75		0,75000		
		Mezisoučet		0,75000		
		DJ_203 :				
		režné cihelné zdivo východní stěny : 0,6		0,60000		
		jižní stěna : 4,55		4,55000		
		Mezisoučet		5,15000		
4	611-04	Stabilizace a konzervace lokálně poškozených či uvolněných omítek a nátěrů, odborné práce pod dohledem restaurátorů	m2	254,36000	1 344,00	341 859,84
		položka z SOD č.16 - 2.NP - stavební část :				
		výměra dle SOD : -248,2		-248,20000		
		Mezisoučet		-248,20000		
		výměry dle skutečnosti a zpracovaného restaurátorského průzkumu a záměru :				

## Položkový rozpočet

S:	946-13	SHaZ Bečov nad Teplou, SO 05 - RESTAUROVÁNÍ HORNÍHO HRADU - ZL č.13
O:	02 - DJ - R	Horní hrad - restaurátorské práce
R:	02	Vícepráce - 2.NP - zajištění vnitřních omítek dle restaurátorského záměru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		úprava ozn. c - vápenná omítka s lícem a s vrstvami lokálně nesoudržných vápenných nátěrů :				
		úprava ozn. d - vápenná omítka s lokálně nesoudržným nebo chybějícím lícem :				
		úprava ozn. e - vápenná omítka s dutinami :				
		úprava ozn. g - vápenná omítka s lícem se souvislým vápenným nátěrem :				
		úprava ozn. f - stabilní vápenná omítka bez vápenného nátěru :				
		úprava ozn. b - doplněná chybějící jednovrstvá vápenná omítka :				
		 SK_201 :				
		západní stěna :				
		úprava ozn. B (skládá se z B, b1, b2 ,b3) : 1,2		1,20000		
		úprava ozn. c : 6,88		6,88000		
		úprava ozn. d : 9,6		9,60000		
		úprava ozn. G : 17,38		17,38000		
		<b>Mezisoučet</b>		<b>35,06000</b>		
		východní stěna :				
		úprava ozn. B (skládá se z B, b1, b2 ,b3) : 2,95		2,95000		
		úprava ozn. c : 6,66		6,66000		
		úprava ozn. d : 3,39		3,39000		
		úprava ozn. F : 1,29		1,29000		
		úprava ozn. G : 14,23		14,23000		
		<b>Mezisoučet</b>		<b>28,52000</b>		
		severní stěna :				
		úprava ozn. B (skládá se z B, b1, b2 ,b3) : 10,93		10,93000		
		úprava ozn. c : 28,68		28,68000		
		úprava ozn. D : 7,21		7,21000		
		úprava ozn. G : 23,93		23,93000		
		<b>Mezisoučet</b>		<b>70,75000</b>		
		jižní stěna :				
		úprava ozn. B (skládá se z B, b1, b2 ,b3) : 2,09		2,09000		
		úprava ozn. c : 3,14		3,14000		
		úprava ozn. D : 6,66		6,66000		
		úprava ozn. F+G : 34,53		34,53000		
		<b>Mezisoučet</b>		<b>46,42000</b>		
		DJ_201 :				
		západní stěna :				
		úprava ozn. B : 1,07		1,07000		
		úprava ozn. c : 11,38		11,38000		
		úprava ozn. d : 10,53		10,53000		
		úprava ozn. F : 1,7		1,70000		
		úprava ozn. G : 21,35		21,35000		
		<b>Mezisoučet</b>		<b>46,03000</b>		
		východní stěna :				
		úprava ozn. c : 12,42		12,42000		

## Položkový rozpočet

S:	946-13	SHaZ Bečov nad Teplou, SO 05 - RESTAUROVÁNÍ HORNÍHO HRADU - ZL č.13
O:	02 - DJ - R	Horní hrad - restaurátorské práce
R:	02	Vícepráce - 2.NP - zajištění vnitřních omítek dle restaurátorského záměru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		úprava ozn. d : 20,07		20,07000		
		úprava ozn. F : 0,86		0,86000		
		úprava ozn. G : 15,53		15,53000		
		<b>Mezisoučet</b>		<b>48,88000</b>		
		<b>severní stěna :</b>				
		úprava ozn. B (skládá se z B, b1, b2 ,b3) : 0,04		0,04000		
		úprava ozn. c : 3,95		3,95000		
		úprava ozn. d : 5,8		5,80000		
		úprava ozn. G : 13,59		13,59000		
		<b>Mezisoučet</b>		<b>23,38000</b>		
		<b>jižní stěna :</b>				
		úprava ozn. c : 8,81		8,81000		
		úprava ozn. d : 3,97		3,97000		
		úprava ozn. G : 10,65		10,65000		
		<b>Mezisoučet</b>		<b>23,43000</b>		
		<b>DJ_202 :</b>				
		<b>západní stěna :</b>				
		úprava ozn. B (skládá se z B, b1, b2 ,b3) : 1,72		1,72000		
		úprava ozn. c : 20,29		20,29000		
		úprava ozn. F : 8,86		8,86000		
		<b>Mezisoučet</b>		<b>30,87000</b>		
		<b>východní stěna :</b>				
		úprava ozn. B (skládá se z B, b1, b2 ,b3) : 0,53		0,53000		
		úprava ozn. c : 11,74		11,74000		
		úprava ozn. D : 3,86		3,86000		
		<b>Mezisoučet</b>		<b>16,13000</b>		
		<b>severní stěna :</b>				
		úprava ozn. B (skládá se z B, b1, b2 ,b3) : 0,53		0,53000		
		úprava ozn. c : 17,2		17,20000		
		úprava ozn. D : 1,44		1,44000		
		úprava ozn. F : 0,53		0,53000		
		<b>Mezisoučet</b>		<b>19,70000</b>		
		<b>jižní stěna :</b>				
		úprava ozn. B (skládá se z B, b1, b2 ,b3) : 9,39		9,39000		
		úprava ozn. c : 7,15		7,15000		
		úprava ozn. D : 0,06		0,06000		
		úprava ozn. G : 14,9		14,90000		
		<b>Mezisoučet</b>		<b>31,50000</b>		
		<b>DJ_203 :</b>				
		<b>západní stěna :</b>				
		úprava ozn. B (skládá se z B, b1, b2 ,b3) : 3,66		3,66000		
		úprava ozn. c : 14,2		14,20000		
		úprava ozn. D : 0,26		0,26000		
		úprava ozn. F : 1,49		1,49000		
		<b>Mezisoučet</b>		<b>19,61000</b>		
		<b>východní stěna :</b>				
		úprava ozn. B (skládá se z B, b1, b2 ,b3) : 0,6		0,60000		

## Položkový rozpočet

S:	946-13	SHaZ Bečov nad Teplou, SO 05 - RESTAUROVÁNÍ HORNÍHO HRADU - ZL č.13
O:	02 - DJ - R	Horní hrad - restaurátorské práce
R:	02	Vícepráce - 2.NP - zajištění vnitřních omítek dle restaurátorského záměru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		úprava ozn. c : 8,2		8,20000		
		úprava ozn. d : 1,66		1,66000		
		úprava ozn. G : 13,02		13,02000		
		Mezisoučet		23,48000		
		severní stěna :				
		úprava ozn. B (skládá se z B, b1, b2 ,b3) : 0,32		0,32000		
		úprava ozn. c : 19,2		19,20000		
		úprava ozn. d : 1,57		1,57000		
		úprava ozn. G : 4,91		4,91000		
		Mezisoučet		26,00000		
		jižní stěna :				
		úprava ozn. B (skládá se z B, b1, b2 ,b3) : 0,36		0,36000		
		úprava ozn. c : 2,2		2,20000		
		úprava ozn. d : 3		3,00000		
		úprava ozn. G : 7,24		7,24000		
		Mezisoučet		12,80000		
5	611-05	Úprava stávajícího povrchu odhaleného kamenného zdiva s nesoudržnou hlinitou maltou, Tabulka místností a omítky, úprava ozn. i	m2	11,32000	1 440,00	16 300,80

položka z SOD č.11 - 3.NP - stavební část :

výměry dle skutečnosti a zpracovaného restaurátorského průzkumu a záměru :

úprava ozn. a - stěny z lomového kamene s fragmenty omítek ve sparách :

úprava ozn. k - smíšené zdivo s fragmenty omítek ve sparách :

úprava ozn. i :

Mezisoučet

SK\_201 :

východní stěna : 0,12

0,12000

severní stěna : 0,09

0,09000

jižní stěna : 2,02

2,02000

Mezisoučet

2,23000

DJ\_201 :

západní stěna : 1,57+0,32

1,89000

východní stěna : 0,3

0,30000

severní stěna : 1,8

1,80000

jižní stěna : 0,2

0,20000

Mezisoučet

4,19000

DJ\_202 :

východní stěna : 0,42

0,42000

Mezisoučet

0,42000

DJ\_203 :

západní stěna : 0,72

0,72000

východní stěna : 0,16

0,16000

severní stěna : 0,57+0,95

1,52000

jižní stěna : 1,62+0,46

2,08000

## Položkový rozpočet

S:	946-13	SHaZ Bečov nad Teplou, SO 05 - RESTAUROVÁNÍ HORNÍHO HRADU - ZL č.13
O:	02 - DJ - R	Horní hrad - restaurátorské práce
R:	02	Vícepráce - 2.NP - zajištění vnitřních omítek dle restaurátorského záměru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Mezisoučet

4,48000

<b>Díl: 61 a</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní - restaurování stavebních prvků</b>				<b>32 899,20</b>
6	611-01	Závěrečná celoplošná retuš prováděná restaurátorem, trhlíny a kaverny	m2	17,13500	1 920,00	32 899,20

položka z SOD č.2 - 2.NP - restaurování stavebních prvků

:

výměra dle SOD : -9,821

-9,82100

Mezisoučet

-9,82100

výměry dle skutečnosti a zpracovaného restaurátorského průzkumu a záměru :

SK\_201 :

- lokální trhlina dl. cca 4195 mm : 4,195\*0,1

0,41950

úprava ozn. T1- lokální trhlíny dl. Cca 2400 mm : 2,4\*0,1

0,24000

- lokální trhlina dl. cca 4380 mm : 4,38\*0,1

0,43800

- lokální trhlina dl. cca 775 mm (vstup do kaple) : 0,775\*0,1

0,07750

úprava ozn. T1- lokální trhlíny dl. Cca 11100 mm : 11,1\*0,1

1,11000

úprava ozn. T1- lokální trhlíny dl. Cca 1000 mm : 1\*0,1

0,10000

místnost č.SK\_201 - lokální svislé trhlíny dl. cca 7285 mm : 7,285\*0,1

0,72850

úprava ozn. T1- lokální trhlíny dl. Cca 2700 mm : 2,7\*0,1

0,27000

Mezisoučet

3,38350

DJ\_201 :

- lokální trhlina dl. cca 3850 mm : 3,85\*0,1

0,38500

- lokální trhlina dl. cca 3900 mm : 3,9\*0,1

0,39000

- lokální trhlina dl. cca 1860 mm : 1,86\*0,1

0,18600

úprava ozn. T1- lokální trhlíny dl. Cca 800 mm : 0,8\*0,1

0,08000

- lokální trhlina dl. cca 1125 mm : 1,125\*0,1

0,11250

místnost č.DJ\_201 - lokální trhlina dl. cca 1750 mm : 1,75\*0,1

0,17500

- lokální trhlina dl. cca 1880 mm : 1,88\*0,1

0,18800

Mezisoučet

1,51650

DJ\_202 :

- lokální trhlina dl. cca 3900 mm : 3,9\*0,1

0,39000

místnost č.DJ\_202 - lokální trhlina dl. cca 1960 mm : 1,96\*0,1

0,19600

úprava ozn. T1- lokální trhlíny dl. Cca 1500 mm : 1,5\*0,1

0,15000

úprava ozn. T1- lokální trhlíny dl. cca 700 mm : 0,7\*0,1

0,07000

úprava ozn. t2- lokální trhlíny dl. cca 3600 mm : 3,6\*0,1

0,36000

- lokální trhlina dl. cca 6850 mm : 6,85\*0,1

0,68500

## Položkový rozpočet

S:	946-13	SHaZ Bečov nad Teplou, SO 05 - RESTAUROVÁNÍ HORNÍHO HRADU - ZL č.13
O:	02 - DJ - R	Horní hrad - restaurátorské práce
R:	02	Vícepráce - 2.NP - zajištění vnitřních omítek dle restaurátorského záměru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		úprava ozn. T1- lokální trhliny dl. cca 2700 mm : 2,7*0,1			0,27000	
		úprava ozn. t2- lokální trhliny dl. cca 3800 mm : 3,8*0,1			0,38000	
		- lokální trhlina dl. cca 4850 mm : 4,85*0,1			0,48500	
		úprava ozn. T1- lokální trhliny dl. cca 3900 mm : 3,9*0,1			0,39000	
		<b>Mezisoučet</b>			<b>3,37600</b>	
		DJ_203 :				
		- lokální trhlina dl. cca 3900 mm : 3,9*0,1			0,39000	
		- lokální trhlina dl. cca 3770 mm : 3,77*0,1			0,37700	
		místnost č.DJ_203 - lokální trhlina dl. cca 1580 mm : 1,58*0,1			0,15800	
		úprava ozn. T1- lokální trhliny dl. cca 2950 mm : 2,95*0,1			0,29500	
		úprava ozn. T1- lokální trhliny dl. cca 1600 mm : 1,6*0,1			0,16000	
		- lokální trhlina dl. cca 1900 mm : 1,9*0,1			0,19000	
		úprava ozn. T1- lokální trhliny dl. cca 400 mm : 0,4*0,1			0,04000	
		- lokální trhlina dl. cca 7750 mm : 7,75*0,1			0,77500	
		úprava ozn. T1- lokální trhliny dl. Cca 3400 mm : 3,4*0,1			0,34000	
		<b>Mezisoučet</b>			<b>2,72500</b>	
		úprava ozn. O - zajištění uvolněných okrajů - složeno ze 2 položek :				
		1. položka 300-02 Sanace tenkých lokálních trhlin zdí hl. spárováním :				
		2. položka 611-01 Závěrečná celoplošná retuš prováděná restaurátorem, trhliny a kavery :				
		SK_201 :				
		západní stěna : 6,25*0,1			0,62500	
		východní stěna : 3,8*0,1			0,38000	
		severní stěna : 2,6*0,1			0,26000	
		jižní stěna : 8,25*0,1			0,82500	
		<b>Mezisoučet</b>			<b>2,09000</b>	
		DJ_201 :				
		západní stěna : 31,6*0,1			3,16000	
		východní stěna : 30,9*0,1			3,09000	
		severní stěna : 3,6*0,1			0,36000	
		jižní stěna : 5,82*0,1			0,58200	
		<b>Mezisoučet</b>			<b>7 19200</b>	
		DJ_202 :				
		západní stěna : 4,43*0,1			0,44300	
		východní stěna : 4,27*0,1			0,42700	
		severní stěna : 9,29*0,1			0,92900	
		jižní stěna : 3,5*0,1			0,35000	
		<b>Mezisoučet</b>			<b>2 14900</b>	



### Položkový rozpočet

S:	946-13	SHaZ Bečov nad Teplou, SO 05 - RESTAUROVÁNÍ HORNÍHO HRADU - ZL č. 13
O:	02 - DJ - R	Horní hrad - restaurátorské práce
R:	02	Vícepráce - 2.NP - zajištění vnitřních omítek dle restaurátorského záměru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		DJ_203 :				
		západní stěna : 10,29*0,1		1,02900		
		východní stěna : 8,5*0,1		0,85000		
		severní stěna : 13*0,1		1,30000		
		jižní stěna : 13,45*0,1		1,34500		
		Mezisoučet		4,52400		

# ZMĚNOVÝ LIST

NPU, SHZ Bečov nad Teplou - Restaurování hradu

reg.č.stavby:	134V15100025	číslo ZL:
smlouva:	NPÚ-ÚPS Praha 2026H1230007	14
objednatel:	Národní památkový ústav, IČ: 75032333	
zhotovitel:	Bolid M s.r.o., IČO: 26347741	

**název ZL:** Částečné zapojení finanční rezervy

**předmět změny:**

Částečné zapojení finanční rezervy - položka č 18 / 005261030R

**zdůvodnění nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.):**

Využití finanční rezervy k těmto účelům vyhrazené

**zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:**

Využití finanční rezervy jako volného zdroje stanoveného k pokrytí potřeb uvedených a specifikovaných v ZL č. 13: Předmětem změny jsou Restaurátorské práce - 2. NP - Zajištění vnitřních omítek dle restaurátorského záměru. Tento Změnový list je vyhotoven na základě dokumentace vypracované podrobným restaurátorským průzkumem zhotovitele, jež je nedílnou a vyžadovanou součástí akce.

**zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:**

Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a samostatně zadat.

<b>vliv na cenu díla:</b>	ANO	<b>rozpočet:</b>	<b>méněpráce</b> ANO
		<b>cena:</b>	
		bez DPH	- 435 179,87 Kč
		21%DPH	- 91 387,77 Kč
		<b>celkem</b>	<b>- 526 567,64 Kč</b>

<b>vliv na cenu díla:</b>	ANO	<b>rozpočet:</b>	<b>vícepráce</b> NE
		<b>cena:</b>	
		bez DPH	0,00 Kč
		21%DPH	0,00 Kč
		<b>celkem</b>	<b>0,00 Kč</b>

<b>CELKOVÁ BILANCE MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ</b>		<b>cena:</b>	
		bez DPH	- 435 179,87 Kč
		21%DPH	- 91 387,77 Kč
		<b>celkem</b>	<b>- 526 567,64 Kč</b>

**vliv na termín dokončení:**  
práce nemají vliv na termín dokončení akce SMVS

**jiné vlivy (na změnu PD apod.):**

číslo ZL:

14

**Vyjádření Projektanta**

*Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav a umožnil docílit využití v souladu s požadavky objednatele. Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (4).*

**Vyjádření TDS**

bez námítek!

**Vyjádření objednatele**

*Realizace těchto prací bude na základě zjištěného skutečného stavu při provádění stavebních prací v souladu se slučitelností s již provedenými pracemi, a to při respektování požadavku orgánu státní památkové péče. Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (4).*

**Další vyjádření**

## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	946-14	SHaZ Bečov nad Teplou, SO 05 - RESTAUROVÁNÍ HORNÍHO HRADU - ZL č.14
Objekt:	02 - DJ	Horní hrad
Rozpočet:	01	Méněpráce

Objednatel:	Národní památkový ústav Valdštejnské náměstí 162/3 11800 Praha-Malá Strana	IČO: 75032333 DIČ: CZ75032333
-------------	--	----------------------------------


Zhotovitel:	BOLID M s.r.o. Voršilská 2085/3 11000 Praha 1	IČO: 26347741 DIČ: CZ26347741
-------------	---	----------------------------------

Vypracoval: XXXXXXXXXX

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	-435 179,87
<b>Celkem</b>	<b>-435 179,87</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-435 179,87 CZK
Základní DPH	21 %	-91 387,77 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

<b>Cena celkem s DPH</b>	<b>-526 567,64 CZK</b>
--------------------------	------------------------



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
ON	Ostatní náklady	ON			-435 179,87	100,0
Cena celkem					-435 179,87	100,0

### Položkový rozpočet

S:	946-14	SHaZ Bečov nad Teplou, SO 05 - RESTAUROVÁNÍ HORNÍHO HRADU - ZL č.14
O:	02 - DJ	Horní hrad
R:	01	Měněpráce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>-435 179,87</b>
1	005261030R	Finanční rezerva	kč	-1,00000	435 179,87	-435 179,87
		položka z SOD č.7 - Objekt Ostatní a vedlejší náklady : -1		-1,00000		

# ZMĚNOVÝ LIST

NPU, SHZ Bečov nad Teplou - Restaurování hradu

reg.č. stavby:	134V15100025	číslo ZL:
smlouva:	NPÚ-ÚPS Praha 2026H1230007	15
objednatel:	Národní památkový ústav, IČ: 75032333	
zhotovitel:	Bolid M s.r.o., IČO: 26347741	

název ZL: **Restaurátorské práce - 1. NP - Zajištění vnitřních omítek dle restaurátorského záměru**

předmět změny:

Předmětem změny jsou Restaurátorské práce - 1. NP - Zajištění vnitřních omítek dle restaurátorského záměru. Tento Změnový list je vyhotoven na základě dokumentace vypracované podrobným restaurátorským průzkumem zhotovitele, jež je nedílnou a vyžadovanou součástí akce. Tato dokumentace "Restaurátorský průzkum a záměr zajištění vnitřních omítek 1. NP Horního hradu NKP SHaZ Bečov nad Teplou" je taktéž přiložena k tomuto Změnovému listu.

**zdůvodnění nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.):**

Předmět změny: Restaurátorské práce - 1. NP - Zajištění vnitřních omítek dle restaurátorského záměru

**zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:**

Jedná se o požadavek investora, resp. vyplývající z vydaného Závazného stanoviska (KK/1641/KR/21-07) k projektové dokumentaci pro provedení stavby - SHaZ Bečov nad Teplou, SO 05 - Restaurování Horního hradu, kdy, kromě jiného, je obnova hradu Bečov n.T. přípustná při dodržení následující podmínky: Krajskému úřadu bude před zahájením oprav omítkových ploch předložen návrh/ návrhy přesného postupu/ přesných postupů jednotlivých typů omítkových ploch. Správnost navržených postupů a finálního vzhledu při opravě různých druhů omítkových ploch bude ověřena provedením vzorků o velikosti cca 1x1m. Po posouzení vzorků zástupci NPÚ GnŘ a krajského úřadu a po konstatování krajského úřadu, že vzorek odpovídá technologickým, materiálovým a vzhledovým požadavkům uvedeným v projektové dokumentaci, lze dané práce provést jako celek.

**zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:**

Jedná se o změnu, kterou z důvodu koordinace s přímo navazujícími restaurátorskými pracemi, není vhodné, ekonomicky efektivní ani časově výhodné zadat samostatně. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a samostatně zadat.

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	méněpráce ANO
		cena:	
		bez DPH	-16 965,12 Kč
		21%DPH	-3 562,68 Kč
		celkem	-20 527,80 Kč
vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	vícepráce ANO
		cena:	
		bez DPH	579 947,74 Kč
		21%DPH	121 789,08 Kč
		celkem	701 736,77 Kč
CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ		cena:	
		bez DPH	562 982,62 Kč
		21%DPH	118 226,35 Kč
		celkem	681 208,97 Kč

**vliv na termín dokončení:**

práce nemají vliv na termín dokončení akce SMVS

**jiné vlivy (na změnu PD apod.):**

číslo ZL:

15

**Vyjádření Projektanta**

*Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav a umožnil docílit využití v souladu s požadavky objednatele. Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (6).*

**Vyjádření TDS**

Bez úprav

**Vyjádření objednatele**

*Realizace těchto prací bude na základě zjištěného skutečného stavu při provádění stavebních prací v souladu se slučitelností s již provedenými pracemi, a to při respektování požadavku orgánu státní památkové péče. Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (6).*

**Další vyjádření**



## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **946-15** SHaZ Bečov nad Teplou, SO 05 - RESTAUROVÁNÍ HORNÍHO HRADU - ZL č.15

Objednatel: **Národní památkový ústav** IČO: 75032333  
**Valdštejnské náměstí 162/3** DIČ: CZ75032333  
**11800 Praha-Malá Strana**

Zhotovitel: **BOLID M s.r.o.** IČO: 26347741  
**Voršilská 2085/3** DIČ: CZ26347741  
**11000 Praha 1**

Vypracoval: 

Rozpis ceny Celkem


HSV			520 394,62
PSV			42 588,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>562 982,62</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	562 982,62 CZK
Základní DPH	21 %	118 226,35 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 681 208,97 CZK**



## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>02 - DJ - R</b>	<b>Horní hrad - restaurátorské práce</b>	<b>0,00</b>	<b>562 982,62</b>	<b>118 226,35</b>	<b>681 208,97</b>	<b>100</b>
01	Měněpráce - 1.NP - zajištění vnitřních omítek dle	0,00	-16 965,12	-3 562,68	-20 527,80	-3
02	Vícepráce - 1.NP - zajištění vnitřních omítek dle restaurátorského záměru	0,00	579 947,74	121 789,03	701 736,77	103
Celkem za stavbu		0,00	562 982,62	118 226,35	681 208,97	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			111 406,20	19,8
61	Úpravy povrchů vnitřní - stavební část	HSV			423 937,54	75,3
61 a	Úpravy povrchů vnitřní - restaurování stavebních prvků	HSV			-14 949,12	-2,7
799-01	Restaurátorské práce	PSV			42 588,00	7,6
Cena celkem					562 982,62	100,0

## Položkový rozpočet

S:	946-15	SHaZ Bečov nad Teplou, SO 05 - RESTAUROVÁNÍ HORNÍHO HRADU - ZL č.15
O:	02 - DJ - R	Horní hrad - restaurátorské práce
R:	01	Měněpráce - 1.NP - zajištění vnitřních omítek dle restaurátorského záměru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>-2 016,00</b>
1	300-03	Sanace větších trhlin zdí hl.spárováním	m	-1,40000	1 440,00	-2 016,00

položka z SOD č.5 - stavební část 1.NP :

- větší trhlina dl. cca 1400 mm : -1,4

-1,40000

Mezisoučet

-1,40000

<b>Díl: 61 a</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní - restaurování stavebních prvků</b>				<b>-14 949,12</b>
2	611-01	Závěrečná celoplošná retuš prováděná restaurátorem, trhlina a kaverny	m2	-7,78600	1 920,00	-14 949,12

položka z SOD č.2 - 1.NP - restaurování stavebních prvků

:

výměra dle SOD : -24,5135

-24,51350

Mezisoučet

-24,51350

výměry dle skutečnosti a zpracovaného restaurátorského průzkumu a záměru :

SK\_101 :

místnost č.SK\_101 - lokální trhlina dl. cca 1600 mm :  
1,6\*0,1

0,16000

- lokální trhlina dl. cca 1450 mm : 1,45\*0,1

0,14500

úprava ozn. T1- lokální trhlina dl. cca 500 mm : 0,5\*0,1

0,05000

úprava ozn. t2- lokální trhlina dl. cca 1200 mm : 1,2\*0,1

0,12000

Mezisoučet

0,47500

DJ\_101 :

místnost č.DJ\_101 - lokální trhlina dl. cca 1780 mm :  
1,78\*0,1

0,17800

úprava ozn. T1- lokální trhlina dl. Cca 400 mm : 0,04

0,04000

úprava ozn. T1- lokální trhlina dl. Cca 400 mm : 0,04

0,04000

úprava ozn. T1- lokální trhlina dl. Cca 700 mm : 0,07

0,07000

- lokální trhlina dl. cca 1400 mm : 1,4\*0,1

0,14000

úprava ozn. T1- lokální trhlina dl. Cca 400 mm : 0,04

0,04000

úprava ozn. T1- lokální trhlina dl. Cca 1200 mm : 0,12

0,12000

Mezisoučet

0,62800

DJ\_102 :

místnost č.DJ\_102 - lokální trhlina dl. cca 3500 mm :  
3,5\*0,1

0,35000

- lokální trhlina dl. cca 1300 mm : 1,3\*0,1

0,13000

- lokální trhlina dl. cca 1400 mm : 1,4\*0,1

0,14000

úprava ozn. T1- lokální trhlina dl. cca 400 mm : 0,4\*0,1

0,04000

- lokální trhlina dl. cca 1255 mm : 1,255\*0,1

0,12550

úprava ozn. T1- lokální trhlina dl. cca 500 mm : 0,5\*0,1

0,05000

úprava ozn. T2- lokální trhlina dl. Cca 0,5 mm : 0,5\*0,1

0,05000

- lokální trhlina dl. cca 1300 mm : 1,3\*0,1

0,13000

úprava ozn. T2- lokální trhlina dl. cca 1850 mm : 1,85\*0,1

0,18500

## Položkový rozpočet

S:	946-15	SHaZ Bečov nad Teplou, SO 05 - RESTAUROVÁNÍ HORNÍHO HRADU - ZL č.15
O:	02 - DJ - R	Horní hrad - restaurátorské práce
R:	01	Méněpráce - 1.NP - zajištění vnitřních omítek dle restaurátorského záměru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Mezisoučet		1,20050		
		DJ_103 :				
		místnost č.DJ_103 - lokální trhlina dl. cca 3750 mm : 0,38		0,38000		
		- lokální trhlina dl. cca 3750 mm : 0,38		0,38000		
		- lokální trhlina dl. cca 1600 : 0,16		0,16000		
		- lokální trhlina dl. cca 3750 mm : 0,38		0,38000		
		- lokální trhliny t1: 1,95*0,1 : 0,195		0,19500		
		- lokální trhliny t1: 0,7*0,1 : 0,07		0,07000		
		- lokální trhliny t1: 3,1*0,1 : 0,31		0,31000		
		- lokální trhliny t2: 0,4*0,1 : 0,04		0,04000		
		- lokální trhliny t1: 2,8*0,1 : 0,28		0,28000		
		Mezisoučet		2.19500		
		úprava ozn. O - zajištění uvolněných okrajů - složeno ze 2 položek :				
		1. položka 300-02 Sanace tenkých lokálních trhlín zdí hl. spárováním :				
		2. položka 611-01 Závěrečná celoplošná retuš prováděná restaurátorem, trhliny a kavery :				
		SK_101 :				
		západní stěna : 6,2*0,1		0,62000		
		východní stěna : 8,65*0,1		0,86500		
		severní stěna : 21,55*0,1		2,15500		
		jižní stěna : 7,8*0,1		0,78000		
		Mezisoučet		4.42000		
		DJ_101 :				
		západní stěna : 11,3*0,1		1,13000		
		východní stěna : 10,4*0,1		1,04000		
		severní stěna : 9,92*0,1		0,99200		
		jižní stěna : 7,75*0,1		0,77500		
		Mezisoučet		3,93700		
		DJ_102 :				
		západní stěna : 7,9*0,1		0,79000		
		východní stěna : 6,72*0,1		0,67200		
		severní stěna : 8,55*0,1		0,85500		
		jižní stěna : 7,4*0,1		0,74000		
		Mezisoučet		3,05700		
		DJ_103 :				
		západní stěna : 0,3*0,1		0,03000		
		severní stěna : 4,25*0,1		0,42500		
		jižní stěna : 3,6*0,1		0,36000		
		Mezisoučet		0,81500		

## Položkový rozpočet

S:	946-15	SHaZ Bečov nad Teplou, SO 05 - RESTAUROVÁNÍ HORNÍHO HRADU - ZL č.15
O:	02 - DJ - R	Horní hrad - restaurátorské práce
R:	02	Vícepráce - 1.NP - zajištění vnitřních omítek dle restaurátorského záměru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>113 422,20</b>
1	300-01	Sanace lokálních trhlin zdí hl.spárováním	m	16,70000	1 080,00	18 036,00
		položka z SOD č.3 - 1.NP - stavební část :				
		výměra dle SOD : -28,135			-28,13500	
		<b>Mezisoučet</b>			<b>-28,13500</b>	
		výměry dle skutečnosti a zpracovaného restaurátorského průzkumu a záměru :				
		<b>SK_101 :</b>				
		místnost č.SK_101 - lokální trhlina dl. cca 1600 mm : 1,6			1,60000	
		- lokální trhlina dl. cca 1450 mm : 1,45			1,45000	
		úprava ozn. T1- lokální trhliny dl. cca 500 mm : 0,5			0,50000	
		úprava ozn. t2- lokální trhliny dl. cca 1200 mm : 1,2			1,20000	
		<b>Mezisoučet</b>			<b>4,75000</b>	
		<b>DJ_101 :</b>				
		místnost č.DJ_101 - lokální trhlina dl. cca 1780 mm : 1,78			1,78000	
		úprava ozn. T1- lokální trhliny dl. Cca 400 mm : 0,4			0,40000	
		úprava ozn. T1- lokální trhliny dl. Cca 400 mm : 0,4			0,40000	
		úprava ozn. T1- lokální trhliny dl. Cca 700 mm : 0,7			0,70000	
		- lokální trhlina dl. cca 1400 mm : 1,4			1,40000	
		úprava ozn. T1- lokální trhliny dl. Cca 400 mm : 0,4			0,40000	
		úprava ozn. T1- lokální trhliny dl. Cca 1200 mm : 1,2			1,20000	
		<b>Mezisoučet</b>			<b>6,28000</b>	
		<b>DJ_102 :</b>				
		místnost č.DJ_102 - lokální trhlina dl. cca 3500 mm : 3,5			3,50000	
		- lokální trhlina dl. cca 1300 mm : 1,3			1,30000	
		- větší trhlina dl. cca 1400 mm : 1,4			1,40000	
		úprava ozn. T1- lokální trhliny dl. cca 400 mm : 0,4			0,40000	
		- lokální trhlina dl. cca 1255 mm : 1,255			1,25500	
		úprava ozn. T1- lokální trhliny dl. cca 500 mm : 0,5			0,50000	
		úprava ozn. T2- lokální trhliny dl. Cca 0,5 mm : 0,5			0,50000	
		- lokální trhlina dl. cca 1300 mm : 1,3			1,30000	
		úprava ozn. T2- lokální trhliny dl. cca 1850 mm : 1,85			1,85000	
		<b>Mezisoučet</b>			<b>12,00500</b>	
		<b>DJ_103 :</b>				
		místnost č.DJ_103 - lokální trhlina dl. cca 3750 mm : 3,75			3,75000	
		- lokální trhlina dl. cca 3750 mm : 3,75			3,75000	
		- lokální trhlina dl. cca 1600 mm : 1,6			1,60000	
		- lokální trhlina dl. cca 3750 mm : 3,75			3,75000	
		- lokální trhliny t1 : 1,95			1,95000	
		- lokální trhliny t1 : 0,7			0,70000	
		- lokální trhliny t1 : 3,1			3,10000	
		- lokální trhliny t2 : 0,4			0,40000	
		- lokální trhliny t1 : 2,8			2,80000	

## Položkový rozpočet

S:	946-15	SHaZ Bečov nad Teplou, SO 05 - RESTAUROVÁNÍ HORNÍHO HRADU - ZL č.15
O:	02 - DJ - R	Horní hrad - restaurátorské práce
R:	02	Vícepráce - 1.NP - zajištění vnitřních omítek dle restaurátorského záměru

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		<b>Mezisoučet</b>		<b>21,80000</b>		
2	300-02	Sanace tenkých lokálních trhlin zdí hl.spárováním	m	122,29000	780,00	95 386,20

položka z SOD č.4 - 2.NP - stavební část :

**Mezisoučet**

výměry dle skutečnosti a zpracovaného restaurátorského průzkumu a záměru :

**Mezisoučet**

úprava ozn. O - zajištění uvolněných okrajů - složeno ze 2 položek :

1. položka 300-02 Sanace tenkých lokálních trhlin zdí hl. spárováním :
2. položka 611-01 Závěrečná celoplošná retuš prováděná restaurátorem, trhliny a kavery :

SK\_101 :

západní stěna : 6,2	6,20000
východní stěna : 8,65	8,65000
severní stěna : 21,55	21,55000
jižní stěna : 7,8	7,80000
<b>Mezisoučet</b>	<b>44.20000</b>

DJ\_101 :

západní stěna : 11,3	11,30000
východní stěna : 10,4	10,40000
severní stěna : 9,92	9,92000
jižní stěna : 7,75	7,75000
<b>Mezisoučet</b>	<b>39.37000</b>

DJ\_102 :

západní stěna : 7,9	7,90000
východní stěna : 6,72	6,72000
severní stěna : 8,55	8,55000
jižní stěna : 7,4	7,40000
<b>Mezisoučet</b>	<b>30.57000</b>

DJ\_103 :

západní stěna : 0,3	0,30000
severní stěna : 4,25	4,25000
jižní stěna : 3,6	3,60000
<b>Mezisoučet</b>	<b>8,15000</b>

<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní - stavební část</b>				<b>423 937,54</b>
3	611-02	Podtmelení okrajů omítkových ploch a omítkových ker, lokální tmelení, případně injektáž probarvenou, vápennou mikromaltou s předzpevněním vápennou disperzí	m2	5,47800	960,00	5 258,88

položka z SOD č.16 - 1.NP - stavební část :

výměra dle SOD : -32,622

-32,62200

**Mezisoučet**

**-32,62200**

výměry dle skutečnosti a zpracovaného restaurátorského průzkumu a záměru :

## Položkový rozpočet

S:	946-15	SHaZ Bečov nad Teplou, SO 05 - RESTAUROVÁNÍ HORNÍHO HRADU - ZL č.15
O:	02 - DJ - R	Horní hrad - restaurátorské práce
R:	02	Vícepráce - 1.NP - zajištění vnitřních omítek dle restaurátorského záměru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

úprava ozn. e - vápenná omítka s dutinami :

SK\_101 :

západní stěna : 1,1	1,10000
východní stěna : 4,4	4,40000
severní stěna : 4,37	4,37000
jižní stěna : 4,72	4,72000
<b>Mezisoučet</b>	<b>14,59000</b>

DJ\_101 :

západní stěna : 2,33	2,33000
východní stěna : 5,29	5,29000
severní stěna : 1,42	1,42000
jižní stěna : 1,15	1,15000
<b>Mezisoučet</b>	<b>10,19000</b>

DJ\_102 :

západní stěna : 1,89	1,89000
východní stěna : 3,54	3,54000
severní stěna : 2,64	2,64000
jižní stěna : 0,67	0,67000
<b>Mezisoučet</b>	<b>8,74000</b>

DJ\_103 :

západní stěna : 0,44	0,44000
východní stěna : 0,89	0,89000
severní stěna : 2,83	2,83000
jižní stěna : 0,42	0,42000
<b>Mezisoučet</b>	<b>4,58000</b>

4	611-03	Úprava stávajícího povrchu režného cihelného zdiva	m2	9,21000	921,60	8 487,94
---	--------	--	----	---------	--------	----------

položka z SOD č.15 - 2.NP - stavební část :

**Mezisoučet**

výměry dle skutečnosti a zpracovaného restaurátorského průzkumu a záměru :

úprava ozn. h :

SK\_101 :

severní stěna : 2,62	2,62000
jižní stěna : 0,04	0,04000
<b>Mezisoučet</b>	<b>2,66000</b>

DJ\_101 :

východní stěna : 6,55	6,55000
<b>Mezisoučet</b>	<b>6,55000</b>

5	611-04	Stabilizace a konzervace lokálně poškozených či uvolněných omítek a nátěrů, odborné práce pod dohledem restaurátorů	m2	257,33000	1 344,00	345 851,52
---	--------	---	----	-----------	----------	------------

položka z SOD č.18 - 1.NP - stavební část :

výměra dle SOD : -117,92

**Mezisoučet**

-117,92000

-117 92000

## Položkový rozpočet

S:	946-15	SHaZ Bečov nad Teplou, SO 05 - RESTAUROVÁNÍ HORNÍHO HRADU - ZL č.15
O:	02 - DJ - R	Horní hrad - restaurátorské práce
R:	02	Vícepráce - 1.NP - zajištění vnitřních omítek dle restaurátorského záměru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

výměry dle skutečnosti a zpracovaného restaurátorského průzkumu a záměru :

úprava ozn. c - vápenná omítka s lícem a s vrstvami lokálně nesoudrzných vápenných nátěrů :  
 úprava ozn. d - vápenná omítka s lokálně nesoudrzným nebo chybějícím lícem :  
 úprava ozn. e - vápenná omítka s dutinami :  
 úprava ozn. g - vápenná omítka s lícem se souvislým vápenným nátěrem :  
 úprava ozn. f - stabilní vápenná omítka bez vápenného nátěru :  
 úprava ozn. b - doplněná chybějící jednovrstvá vápenná omítka :

SK\_201 :

západní stěna :

úprava ozn. B (skládá se z b1, b2 ,b3) : 0,53	0,53000
úprava ozn. d : 12,2	12,20000
úprava ozn. G : 3,07	3,07000
<b>Mezisoučet</b>	<b>15 80000</b>

východní stěna :

úprava ozn. B (skládá se z b1, b2 ,b3) : 3,78	3,78000
úprava ozn. c : 0,85	0,85000
úprava ozn. d : 3,32	3,32000
úprava ozn. G : 21,02	21,02000
<b>Mezisoučet</b>	<b>28,97000</b>

severní stěna :

úprava ozn. B (skládá se z b1, b2 ,b3) : 3,56	3,56000
úprava ozn. d : 16,5	16,50000
úprava ozn. G : 10,49	10,49000
<b>Mezisoučet</b>	<b>30.55000</b>

jižní stěna :

úprava ozn. B (skládá se z b, b1, b2 ,b3) : 19,71	19,71000
úprava ozn. c : 1,9	1,90000
úprava ozn. D : 1,95	1,95000
úprava ozn. F + g : 16,05	16,05000
<b>Mezisoučet</b>	<b>39.61000</b>

DJ\_101 :

západní stěna :

úprava ozn. B (skládá se z b1, b2 ,b3) : 2,08	2,08000
úprava ozn. d : 5,13	5,13000
úprava ozn. G : 26,04	26,04000
<b>Mezisoučet</b>	<b>33.25000</b>

východní stěna :

úprava ozn. c : 4,5	4,50000
úprava ozn. d : 8,1	8,10000
úprava ozn. G : 23,63	23,63000
<b>Mezisoučet</b>	<b>36,23000</b>



## Položkový rozpočet

S:	946-15	SHaZ Bečov nad Teplou, SO 05 - RESTAUROVÁNÍ HORNÍHO HRADU - ZL č.15
O:	02 - DJ - R	Horní hrad - restaurátorské práce
R:	02	Vícepráce - 1.NP - zajištění vnitřních omítek dle restaurátorského záměru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		severní stěna :				
		úprava ozn. B (skládá se z b1, b2 ,b3) : 1,05		1,05000		
		úprava ozn. c : 3,2		3,20000		
		úprava ozn. d : 9,3		9,30000		
		úprava ozn. G : 6,36		6,36000		
		<b>Mezisoučet</b>		<b>19,91000</b>		
		jižní stěna :				
		úprava ozn. d : 2,19		2,19000		
		úprava ozn. G : 10,51		10,51000		
		<b>Mezisoučet</b>		<b>12,70000</b>		
		DJ_102 :				
		západní stěna :				
		úprava ozn. B (skládá se z b1, b2 ,b3) : 1,06		1,06000		
		úprava ozn. D : 0,65		0,65000		
		úprava ozn. G : 18,83		18,83000		
		<b>Mezisoučet</b>		<b>20,54000</b>		
		východní stěna :				
		úprava ozn. B (skládá se z b1, b2 ,b3): 2,35 : 2,35		2,35000		
		úprava ozn. c : 1,07 : 1,07		1,07000		
		úprava ozn. d : 2,15 : 2,15		2,15000		
		úprava ozn. G : 11,03 : 11,03		11,03000		
		<b>Mezisoučet</b>		<b>16,60000</b>		
		severní stěna :				
		úprava ozn. d : 1,9 : 1,9		1,90000		
		úprava ozn. G : 18,84 : 18,84		18,84000		
		<b>Mezisoučet</b>		<b>20,74000</b>		
		jižní stěna :				
		úprava ozn. d : 9,14		9,14000		
		úprava ozn. G : 12,6		12,60000		
		<b>Mezisoučet</b>		<b>21,74000</b>		
		DJ_103 :				
		západní stěna :				
		úprava ozn. B (b1, b2, b3) : 0,97		0,97000		
		úprava ozn. D : 0,4		0,40000		
		úprava ozn. F : 1,24		1,24000		
		úprava ozn. G : 12,37		12,37000		
		úprava ozn. c : 4,87		4,87000		
		<b>Mezisoučet</b>		<b>19 85000</b>		
		východní stěna :				
		úprava ozn. B (b1, b2, b3) :1,45 : 1,45		1,45000		
		úprava ozn. c : 6,8 : 6,8		6,80000		
		úprava ozn. G :12,07 : 12,07		12,07000		
		<b>Mezisoučet</b>		<b>20,32000</b>		
		severní stěna :				
		úprava ozn. B (b1, b2, b3) :1,91 : 1,91		1,91000		
		úprava ozn. c : 1,6 : 1,6		1,60000		
		úprava ozn. D :0,7 : 0,7		0,70000		

## Položkový rozpočet

S:	946-15	SHaZ Bečov nad Teplou, SO 05 - RESTAUROVÁNÍ HORNÍHO HRADU - ZL č.15
O:	02 - DJ - R	Horní hrad - restaurátorské práce
R:	02	Vícepráce - 1.NP - zajištění vnitřních omítek dle restaurátorského záměru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

úprava ozn. F :2,65 : 2,65		2,65000
úprava ozn. G :14,52 : 14,52		14,52000
<b>Mezisoučet</b>		<b>21,38000</b>
jižní stěna :		
úprava ozn. B (b1, b2, b3) : 1,03		1,03000
úprava ozn. c : 3,4		3,40000
úprava ozn. d : 1,25		1,25000
úprava ozn. G : 11,38		11,38000
<b>Mezisoučet</b>		<b>17,06000</b>

6	611-05	Úprava stávajícího povrchu odhaleného kamenného zdiva s nesoudžnou hlinitou maltou, Tabulka místností a omítky, úprava ozn. i	m2	44,68000	1 440,00	64 339,20
---	--------	---	----	----------	----------	-----------

položka z SOD č.11 - 3.NP - stavební část :  
 výměry dle skutečností a zpracovaného restaurátorského průzkumu a záměru :

úprava ozn. a - stěny z lomového kamene s fragmenty omítek ve sparách :

úprava ozn. k - smíšené zdivo s fragmenty omítek ve sparách :

úprava ozn. i :

**Mezisoučet**

SK\_101 :

západní stěna : 11,97+0,35 12,32000

východní stěna : 0,6 0,60000

severní stěna : 14,38 14,38000

**Mezisoučet** **27,30000**

DJ\_101 :

západní stěna : 3,22 3,22000

východní stěna : 2,88 2,88000

severní stěna : 0,12 0,12000

jižní stěna : 4,01+1,51 5,52000

**Mezisoučet** **11,74000**

DJ\_102 :

východní stěna : 4,97 4,97000

**Mezisoučet** **4,97000**

DJ\_103 :

západní stěna : 0,41 0,41000

severní stěna : 0,26 0,26000

**Mezisoučet** **0,67000**

<b>Díl: 799-01</b>		<b>Restaurátorské práce</b>				<b>42 588,00</b>
7	799-02	Restaurování nástěnných maleb - ryté kresby na stěnách	m2	5,07000	8 400,00	42 588,00

položka č.2 - 2.NP - restaurování maleb a trámový strop :

**Mezisoučet**

výměry dle skutečnosti a zpracovaného restaurátorského průzkumu a záměru :

### Položkový rozpočet

S:	946-15	SHaZ Bečov nad Teplou, SO 05 - RESTAUROVÁNÍ HORNÍHO HRADU - ZL č.15
O:	02 - DJ - R	Horní hrad - restaurátorské práce
R:	02	Vícepráce - 1.NP - zajištění vnitřních omítek dle restaurátorského záměru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		SK_101 :				
		jižní stěna : 0,09		0,09000		
		Mezisoučet		0,09000		
		DJ_101 :				
		západní stěna : 0,09		0,09000		
		východní stěna : 0,4		0,40000		
		severní stěna : 0,4		0,40000		
		Mezisoučet		0,89000		
		DJ_102 :				
		jižní stěna : 0,09		0,09000		
		Mezisoučet		0,09000		
		DJ_103 :				
		východní stěna : 0,25		0,25000		
		jižní stěna : 3,75		3,75000		
		Mezisoučet		4,00000		

# ZMĚNOVÝ LIST

NPU, SHZ Bečov nad Teplou - Restaurování hradu

reg.č.stavby:	134V15100025	číslo ZL:
smlouva:	NPÚ-ÚPS Praha 2026H1230007	16
objednatel:	Národní památkový ústav, IČ: 75032333	
zhotovitel:	Bolid M s.r.o., IČO: 26347741	

**název ZL:** Částečné zapojení finanční rezervy

**předmět změny:**

Částečné zapojení finanční rezervy - položka č 18 / 005261030R

**zdůvodnění nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.):**

Využití finanční rezervy k těmto účelům vyhrazené

**zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:**

Využití finanční rezervy jako volného zdroje stanoveného k pokrytí potřeb uvedených a specifikovaných v ZL č. 15: Předmětem změny jsou Restaurátorské práce - 1. NP - Zajištění vnitřních omítek dle restaurátorského záměru. Tento Změnový list je vyhotoven na základě dokumentace vypracované podrobným restaurátorským průzkumem zhotovitele, jež je nedílnou a vyžadovanou součástí akce.

**zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:**

Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a samostatně zadat.

<b>vliv na cenu díla:</b>	ANO	<b>rozpočet:</b>	<b>méněpráce</b>
		<b>cena:</b>	ANO
		bez DPH	- 562 982,62 Kč
		21%DPH	- 118 226,35 Kč
		celkem	- 681 208,97 Kč

<b>vliv na cenu díla:</b>	ANO	<b>rozpočet:</b>	<b>vícepráce</b>
		<b>cena:</b>	NE
		bez DPH	0,00 Kč
		21%DPH	0,00 Kč
		celkem	0,00 Kč

<b>CELKOVÁ BILANCE MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ</b>	<b>cena:</b>	bez DPH	- 562 982,62 Kč
		21%DPH	- 118 226,35 Kč
		celkem	- 681 208,97 Kč

**vliv na termín dokončení:**

práce nemají vliv na termín dokončení akce SMVS

**jiné vlivy (na změnu PD apod.):**

**přílohy :**  
Položkový rozpočet + rekapitulace

číslo ZL:

16

**Vyjádření Projektanta**

*Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav a umožnil docílit využití v souladu s požadavky objednatele. Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (4).*

**Vyjádření TDS**

DEZ STANOVENÍ

**Vyjádření objednatele**

*Realizace těchto prací bude na základě zjištěného skutečného stavu při provádění stavebních prací v souladu se slučitelností s již provedenými pracemi, a to při respektování požadavku orgánu státní památkové péče. Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (4).*

**Další vyjádření**

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **946-16** SHaZ Bečov nad Teplou, SO 05 - RESTAUROVÁNÍ HORNÍHO HRADU - ZL č.16

Objekt: **02 - DJ** Horní hrad

Rozpočet: **01** Méněpráce

Objednatel: **Národní památkový ústav** IČO: **75032333**  
**Valdštejnské náměstí 162/3** DIČ: **CZ75032333**  
**11800 Praha-Malá Strana**

Zhotovitel: **BOLID M s.r.o.** IČO: **26347741**  
**Voršilská 2085/3** DIČ: **CZ26347741**  
**11000 Praha 1**

Vypracoval: XXXXXXXXXX


Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	-562 982,62
<b>Celkem</b>	<b>-562 982,62</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>-562 982,62 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>-118 226,35 CZK</b>

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH -681 208,97 CZK**



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
ON	Ostatní náklady	ON			-562 982,62	100,0
Cena celkem					-562 982,62	100,0

### Položkový rozpočet

S:	946-16	SHaZ Bečov nad Teplou, SO 05 - RESTAUROVÁNÍ HORNÍHO HRADU - ZL č.16
O:	02 - DJ	Horní hrad
R:	01	Měněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>-562 982,62</b>
1	005261030R	Finanční rezerva	kč	-1,00000	562 982,62	-562 982,62
		položka z SOD č.7 - Objekt Ostatní a vedlejší náklady : -1		-1,00000		
