

Dodatek č. 2

CES 01623/24

k CES 1847/2023/OLCE Smlouvě ze dne 14.08.2023

Smluvní strany:

1. Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sídlo: Přitkovská 1689, 415 50 Teplice

zastoupena: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 490 99 469

DIČ: CZ 490 99 469

Bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

a

2. Zhotovitel:

ERKA Žatec s. r. o.

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 24522

sídlo: Lounská 3022, 438 01 Žatec.

zastoupen: Roman Komárek, jednatel

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 27326764

DIČ: CZ27326764

bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Kadaň č. ú: 218327604/0300

telefon: [REDACTED]

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu CES 1847/2023/OLCE ze dne 14.08.2023 (dále jen „smlouva“).

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č.1, kterým se mění smlouva níže uvedeným způsobem.

Čl. I

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se mění čl. IV:

1.1. Text článku III. Čas plnění, bod 3.2. se ruší v plném rozsahu a nahrazuje se novým zněním – termín dokončení stavby se stanovuje do 15.08.2024.

1.2. Text článku IV. Cena za dílo, bod 4.1. se ruší v plném rozsahu a nahrazuje se novým zněním. Cena za dílo dle tohoto Dodatku je stanovena na 3.042.926,61 Kč bez DPH. DPH 21%, cena předmětu plnění s DPH činí celkem 3.681.941,20 Kč.

1.3. V souladu s článkem IV. Cena za dílo, bod 4.5. bude jako Příloha č. 1 tohoto Dodatku změnový list č. 02/2024.

2. Smluvní strany se dále dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se Smlouva doplňuje o článek Registr smluv, a to ve vztahu k zákonu č. Zákon č. 340/2015 Sb. Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v následujícím znění:

„V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona o registru smluv se smluvní strany dohodly, že SVS zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu této Smlouvy její znění příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Obec může Smlouvu zveřejnit za předpokladu, že SVS umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.

Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění této Smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění této Smlouvy podléhat anonymizaci.

Smlouva je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.

V případě změny, doplnění či zrušení této Smlouvy dodatkem dle postupu uvedeného v bodu XX čl. Závěrečné ujednání této Smlouvy platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.

K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud tato Smlouva nesplňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá tato Smlouva účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.“

3. Smluvní strany se dále dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se upravuje čl. Ochrana osobních údajů takto:
„SVS informuje druhou smluvní stranu a její zástupce, že osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů, které jsou dostupné webu SVS v sekci GDPR (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/gdpr/>). V tomto dokumentu jsou také uvedeny informace o účelech a době zpracování, právních titulech a o právech, které v souvislosti se zpracováním osobních údajů subjektům údajů náleží.

Každá ze smluvních stran informuje své případné zaměstnance a další subjekty údajů o zpracování osobních údajů druhou smluvní stranou. SVS zpracovává osobní údaje v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů dle předchozího odstavce.“

4. Smluvní strany se dále dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se Smlouva doplňuje o nový čl. Protikorupční doložka v následujícím znění:

„Obě smluvní strany potvrzují, že měly možnost se seznámit s Deklarací protikorupčního jednání skupiny Severočeská voda, jejímž členem je SVS. Deklarace je dostupná na webu SVS v sekci Compliance (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/compliance/>).

Každá ze smluvních stran se zavazuje, že:

- a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
- b) nebude tolerovat žádné formy korupce, uplácení ani jiného neetického jednání či střetu zájmů a že podezření na takové jednání oznámí druhé smluvní straně, pokud druhá smluvní strana poskytne pro tento účel komunikační kanály a zaváže se, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání,
- c) neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,

- d) úplatek nepřijme, ani si jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
- e) nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení,
- f) zdrží se jiného jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení, nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

Podezření na korupční a neetické jednání či střet zájmů je možné oznamovat SVS prostřednictvím komunikačních kanálů, kterými jsou:

- a) Elektronická adresa: compliance@svs.cz,
- b) Korespondenční adresa: Compliance officer, Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice,
- c) další způsoby, které SVS aktuálně využívá.

SVS se zavazuje, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání.

SVS má právo v případě, že druhá smluvní strana poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v této protikorupční doložce, dočasně přerušit plnění uzavřené smlouvy nebo ji okamžitě ukončit odstoupením nebo výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči druhé smluvní straně.

Pro vyloučení pochybností se uvádí, že SVS si vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace týkající se porušení této protikorupční doložky (či kteroukoli jejich část) orgánům činným v trestním řízení, regulačním orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám, vyhrazuje si právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání náhrady škod, které jí byly způsobeny v důsledku porušení tohoto ustanovení."

Čl. II

Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.
2. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
3. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

V dne: 28.6.2024

Za Zhotovitele:

Roman Komárek
Jednatel
ERKA Žatec s.r.o.

ERKA Žatec s.r.o.
provozovna: Lounská ul. 3022, 438 01 Žatec
IČO: 273 26 764, DIČ: CZ27326764
tel.: 415 711 026, fax: 415 710 994
HHH... f... K... M... B... f... M... R... R... f... R...

V dne:

Za Objednatele:

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost, a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469
(39)

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 02/2024	
Zhotovitel:		ERKA Žatec s.r.o., Lounská 3022, 438 01 Žatec			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost, a.s., Teplice		Datum: 27.06.2024	
Název akce: LN 028 027 Lenešice, ČSOV Dobroměřice 1 – Lenešická – zkapacitnění					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci: SD – str. 12638, 12640,00161			
		Zápis z Kontrolních dnů č. 4 (21.03.2024), č. 5 (25.04.2024)			
		na výkresy: ano – ČSOV, rozměry kruhová nádrž, úprava hrubých česlí			
		na rozpočtové podklady: ano			
		na jinou část smlouvy: ano, dle čl. č. 4.1, 4.2 SoD CES 1847/23 ze dne 14.08.2023			
Popis a zdůvodnění změny:					
Navrhované změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 5 ZZVZ – tzv. nezbytné práce. V průběhu stavby bylo zjištěno, že provedení vyždění akumulární čtvercové šachty pro osazení hrubých česlí je vzhledem ke zjištěné vysoké hladině podzemní vody technicky nevyhovující. Z tohoto důvodu byla navržena jiná technologie provedení, a to monolitická šachta v kruhovém provedení, která současně vyžadovala úpravu rozměrů hrubých česlí. V soupisu rozpočtových položek je chybně uvedeno provedení zkušebního provozu, projektová dokumentace ani SoD tento požadavek neobsahuje.					
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatel	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	Jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 1 x Situace stavby					
Ocenění změny: + 123 266,04 Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla + 3 042 926,61 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): Lhůta na dokončení stavby prodloužena do 15.08.2024.		
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí + 700 450,34 Kč bez DPH , tj. + 25,26 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí – 577 184,30 Kč bez DPH , tj. – 20,82 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí + 700 450,34 Kč bez DPH , tj. + 25,26 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí – 577 184,30 Kč bez DPH , tj. – 20,82 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (rozpočet): 15					

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum 27.06.2024

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Použity ceny z uzavřené smlouvy o dílo nebo použity z ceníku URS.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
- vícepráce / méněpráce jsou nezbytné
- nedojde ke změně zhotovitele
- změna v osobě dodavatele (zhotovitele):
 - není možná z ekonomických nebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem (objednatelem) v původní veřejné zakázce; a
 - způsobila by zadavateli (objednateli) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek podle § 222 odst. 7 ZZVZ)

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 18.6.2024

Zástupce objednatele:


Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

12-07-2024

Datum

Datum 12.7.2024

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

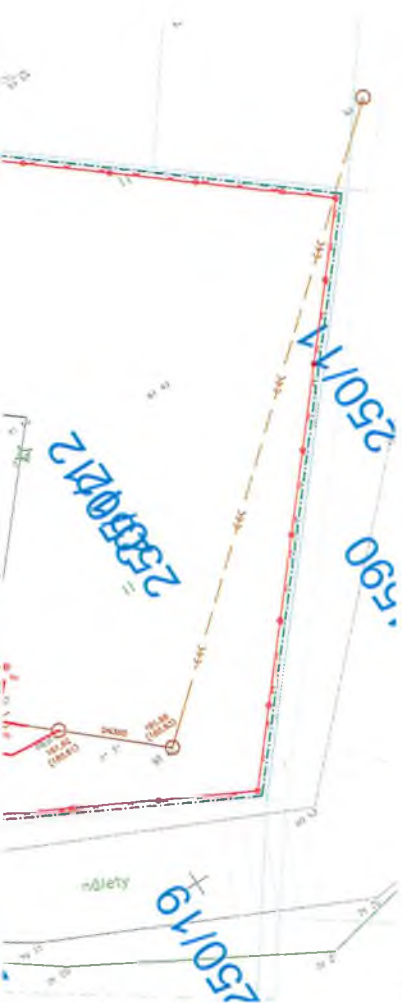

SO 01 Akumulace ČSOV

Zkapacitnění - prefabrikovaná nádrž Ø3,35 x 2,80 m

Úprava trasy výtlaku

HD-PE PE100 RC+, SDR11, DN/OD 90 PAS 1075-TYP .02, dl.1,90m

Provizorní výtlak

HD-PE PE100 RC+, SDR11, DN/OD 90 PAS 1075-TYP .02, dl.13 m



SO 02 Oplocení areálu ČSOV

Oplocení - pletivo (pole 2,5 m), dl.celkem 91,43 m, sloupek - 39 ks

36 ks sloupek plotový, 3 ks sloupek pro bránu a branku

Brána křídlová s pohonem 2x2000/1800 mm


Branka 1000/1800 mm

PS 01 Hrubé česle

Provizorní obtok Flexi PUR DN300, dl.8,90m

Hrubé strojní česle s ručním obtokem a automatickým lisem

SČE 400x1200/1000x40/75°



SOURADNICOVÝ SYSTÉM JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT P.V.



SVIS TCE, spol. s r.o.

Za Chlumem 814
418 01 BILINA



SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZACE
AKČIOVÁ SPOLEČNOST

ÚTVAR PROJEKCE
SLADOVNICKÁ 1082
463 11 LIBEREC - VRATISLAVICE

VYPRACOVAL: J.KOTNAUER	ZODPOVÍDĚLÝ PROJEKTANT: ING.Z.KARÁSEK	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING.PROCHÁZKA	MANAŽER OTVÁR: ING.FRIDRICH	TECHNICKÁ KONTROLA: ING.PROCHÁZKA
INVESTOR: SVIS o.s.	STAVBA: ÚSTĚCKÝ	POBUDITEL: 3 x A4	DATUM: 4.2024	STUPEN: DOP/DPS
PRŮBĚH: SO 01 AKUMULACE ČSOV, PS 01 HRUBÉ ČESLE SO 02 OPLOCENÍ AREÁLU ČSOV KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES REVIZE Č.1 - ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM			OSLOUŽENÍ: 11/24/2.8	OSLOUŽENÍ: 11/24/2.8
AKČIOVÝ: LN 028 027 Lenešice, ČSOV Dobroměřice 1- Lenešická - zkapacitnění	HOŠŤOVKA: 1:100	OSLOUŽENÍ: C.3	OSLOUŽENÍ: C.3	OSLOUŽENÍ: C.3
